
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos

Proyectos de Transformación 2026 · PersCom
Informe ejecutivo · detalle por iniciativa · modelo PMO · anexos de riesgos e impactos ·

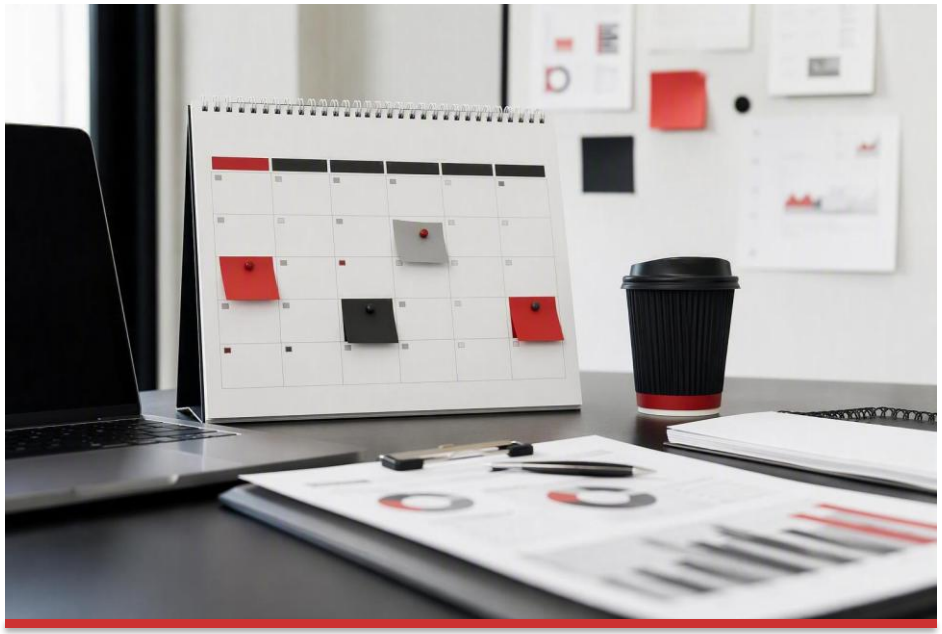

Semana 30 · 20/07/2026 – 24/07/2026

INFORME EJECUTIVO

Proyectos Estratégicos 2026

Proyectos de transformación



Vision consolidada · avance · riesgos · prioridades

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

Los proyectos avanzan, retos:

IA Voz y Contact Center (CCaaS) lideran el avance pero surgen frenos en en el CC derivados de la personalización que solicitan las áreas (en revisión; el proyecto de Agilidad, define las formas de trabajar y los equipos de trabajo de la mayor parte de los proyectos y esta constando tener una primera propuesta, retrasada a Septiembre (Eraneos), Reingeniería SyP concluyendo el modelo “As-Is” y definiendo los Quick Wins para iniciar el 1 de Septiembre seria necesario contar con su dominio de trabajo definido y Calidad Hogar arrancando.

MAYOR AVANCE

IA Voz + Contact Center

IA Voz avanza, principalmente en Asistencia en formato piloto (ver Ficha de IA VOZ ASIVIA). Definido un embudo de llamadas a digitalizar se prevén barreras.
Contact Center pendiente de evaluar las personalizaciones por las áreas y la revisión de la planificación de proyecto.

MAYOR RIESGO

Nuevas formas de organizar el trabajo

La transición del modelo de trabajo actual al modelo de agiLiDAd, la definición de roles y funciones y la composición de los equipos, **son el principal punto de atención**.
Foco en posible riesgo de “**sobredimensionar**” vs “**sobrecarga**” de trabajo en los equipo con doble dependencias (funcionales y jerárquicas).

FOCO ACTUAL

Arranque, estructura y seguimiento

CRM, Gobierno del dato, Salud y Calidad Hogar que siguen consolidando equipos, iniciando diagnósticos y actividades de implantación.

Avance del proyecto de Contact Center y seguimiento de IA Voz en ASIVIA, poniendo el foco en los Call Center Externo en coloración con Responsable de proyecto IA Voz (Casi).

Prioridades inmediatas

Sin bloqueos globales.

- **Contact Center** Completar formación (Minsait) por etapas y avanzar hitos PaP: Internacional y Calidad Cartera (replanificado del 22 al 28 del 07)
- **Reingeniería SyP** Cerrar análisis AS-IS, lanzar Quick Wins Septiembre y definir modelo To-Be.
- **Agilidad** Consolidar mapa de dominios y reducir incertidumbre sobre modelo, roles necesarios y funciones claras.
- **IA ASIVIA** Gestion de los impactos de la IA en las personas y en los CallCenter Externos.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Dimensiones RRHH identificadas para el área

Foco de trabajo de Personas/PersCom: organizar los nuevos modelos de trabajo, acompañar la estrategia de negocio en la implantación y a las personas.

Trabajando en (1) Diagnósticos de Call Center Externos y posible impactos de la IA en llamadas externalizadas para gestionar. (2) Coordinar los KPIS de los proyectos estratégicos con la PMO (seguimiento de negocio y de impacto en personas). (3) Seguimiento de Perseo.

Modelo y organización

01 Nuevos roles

- Proyecto agiLiDAd: definir roles en los equipos y funciones, modelo/estructura organizativa y como transitar.

02 Impacto Organizativo

- Definir personas de los equipos y comunicarlo: SyP, GB…
- Convivencia de los proyectos estratégicos y las nuevas formar de trabajar (Todos: Hogar, SyP…).

03 Diagnóstico talento

- Detectar necesidades: Res. de Dominio y POs de Transformación.
- Identificar los perfiles necesarios para los proyectos (anticipación).

04 Gestión del cambio

- Pulsos de Opinión colectivos.
- Gestion de inquietudes individuales.

Activación de funciones necesarias

05 Incorporaciones

- Coordinar vacantes: Líder TD SyP, Líder de Suscripción, POs,, Líder Gobierno del Dato…

06 Formación

- Contact Center: avance por equipos, a cargo de Mindsait.

07 Marco de trabajo

- Retribución. Fijar RV Trim 3Q y 4Q.
- PS/HCM: Registrar en PS las personas por colectivos, dedicación y “figuras” especificas.
- Modelo de trabajo RRHH. Afinar PMO (Herramientas y funciones), avanzando la coordinación con la PMO de Cia.

08 Productividad

- Recogiendo impactos en plan 2026.
- Proyectar impactos en el plan 2027.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Avances de PMO Área Transformación

PMO Transformación: hoja de ruta, KPIs y modelo de gobierno

Seguimiento actualizado al 24/07 · síntesis ejecutiva para contextualizar la cartera de proyectos.

En progreso

Avances activos

- **Nuevo Portfolio Hogar:** en curso; previsto el envío de documentación técnica a Proyectos y Seguros el 27/07.
- **Mascotas:** en curso; recibido el calendario de entregas del nuevo producto veterinario.
- **Contact Center / CCaaS:** en curso el análisis de la planificación del resto de servicios; se revisan plazos de desarrollo y pruebas por la complejidad de Internacional. Posible replanificación de hitos.

Foco Actual

Trabajando en ello

- **Itinerario de los 8 proyectos estratégicos:** mapa de ruta estratégico y puntos de confluencia entre iniciativas.
- **Visión e interdependencias:** línea de visión común para anticipar dependencias, solapes y “choques de caminos”.
- **KPIs y gobierno:** seguimiento de KPIs de negocio y modelo de gobierno coordinado con KPIs de Personas.

Coordinado con el equipo de Personas

Mensaje ejecutivo

- **Ritmo**

  PMO esta estructurando el itinerario y dependencias de los 8 proyectos estratégicos.

- **Seguimiento**

  Alinear KPIs de negocio y Personas bajo un modelo de gobierno común.

DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual del portfolio: cada ficha sintetiza estado, KPIs de Personas, hitos relevantes y próximos pasos para facilitar la lectura ejecutiva.

Estado · KPIs · hitos · próximos pasos



1 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CRM

Sin información nueva

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega**

Objetivo de Proyecto: Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar.

Tareas Proyecto

En curso

Kick-Off	Equipo Proyecto	01/07
RV trimestral (reunión de contexto) Definidos incentos 3Q	Compensación	07/07
Preparación de Escuchas en Negocio y Grabaciones de pantalla (Galgo)	Talento Negocio	18, 19, 25 y 26/08
Pulsos (encuestas empleados)	Talento Negocio, Comunicación y Talento Corporativo	Trabajo en Julio y Agosto Lanzamiento Septiembre
Selección externa de Equipo	Selección	Incorporación Lunes 20/07 En búsqueda.
Proyecto: Revision RV Mensual previo al CRM	Compensacion	2027

Impactos Proyecto

Encuestas(EX), Talento negocio, comunicación, Talento Corporativo. Compensación y Selección.

Riesgos

(1) Impacto CRM en **incentivos mensuales** (2027)

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	0 %	-	0 %
avance	Retribución Variable	Productividad	Absentismo	Avance de implantación (personas)

Hasta 2027 no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia: Referencia Raquel Pelaez (julio 2026)

- Sin impacto en 2026,
- Considerando impactos en 2027 tras análisis de BC en Seprtiembre.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

2 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CONTACT CENTER

Proyecto con Anexo

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo (sustitucion ….)**

Objetivo de Proyecto: Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS

Tareas Proyecto

En curso

Despliegue de formación Minsait - **iniciado:** **1 Calidad, 2 Internacional,**	**Finalizada 22/07**
PaP Internacional – *(Vigilar impacto en RV mensual)*.	Retraso 22/07 al 28/07
PaP Calidad Cartera	Retraso 22/07 al 28/07
Entrada proximos equipos: Empresas (Formación y PaP)	Septiembre
Encuestas de opinión Quejas	En curso Julio
Encuestas de opinión Internacional y Calidad	Finales de Agosto

Impactos Proyecto en funciones

Analítica, Compensión (RV Mensual.) y Formación negocio (Convocatorias).
Adaptación en negocio, se solicitan adaptaciones/vacaciones y ha requerido replanificación. El impacto es mayor en los equipos de soporte y análisis que en los operadores

Riesgos

(1) Adaptar modelo de datos desde BI para el modelo de incentivos (*sensible*)
(2) Posible impacto de la formación en sala por volumen (*noviembre 2026 y febrero 2027*)*.
(3) Sobrecarga equipos de análisis en los PaP por cambio en los sistemas de obtencion de los indicadores

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

KPIs a seguir en equipos migrados: seguimiento de impacto en abandonos y calidad (NSS)

35
2,33 % del colectivo completo
Avance implantación (personas)

Análisis KPIs: la migración no parece afectar al abandono del grupo de Quejas.

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



Quick Wins Eficiencias 2026

- Ahorro en gestión operativa de 15 minutos por FTE en el CallCenter.
- Mejora en la información disponible para el Análisis y explotación de los datos (equipo de Análisis).
- Optimización del presupuesto de Callcenter Externos
- Omnicanalidad reducción de rellamadas del 5%.
- Facilitador y acelerador para el proyecto de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

3 – Ficha de seguimiento del Proyecto: REINGENIERIA SYP

Coordinador Proyecto: **Arancha Fernández**

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). **El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la viison de cliente.**

Tareas Proyecto

En curso

Levantamiento/Análisis de Modelo AS-IS	En curso 17/07
Análisis de 90 iniciativas para priorizar QuickWins	En curso 24/07
Crear Equipo de trabajo (07/09 entran en proyecto Agildad)	17/07
Kickoff al Equipo de proyecto	17/07
Presentación ejecutiva del diagnostico AS-IS a la CEO	Replanificada del 23/07 al 30/07
Lanzamiento de QuickWins y comienzo del diseño del modelo objetivo	01/09

Impactos Proyecto

Análisis, Laboral – Formación y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral

Riesgos

(1)Urge montar equipo de Trabajo, cruce con Agile (Definición de perímetro de squad).
(2) Vigilar la resistencia al cambio
(3) Captura de productividad(FTEs y costes)..
(4) Composicion de la plantilla (antigüedad, edad y especialización. Sin relevo.)
(5) No existe documentación de procedimientos.

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	2,86 %	26.744	4,68 %	0
avance	Abandonos Acumulado mes	Llamadas Acumuladas	Absentismo Area	Avance de implantación (personas)

Hasta Septiembre no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Pendiente analizar ppt enviada por BIP. Objetivo cumplimiento plan FTEs 2026

Avances: Se detectan necesidades tecnológicas, plataforma, herramientas,

rno - No compartir fuera de la organización.

linea directa

4 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CALIDAD HOGAR

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega**

Sin información nueva

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

Tareas Proyecto

En curso

Kick-off Equipo de Proyecto	07/07
Crear Equipo	En curso 21/07
Cambio de ubicación Equipo a TC1	31/07
Apertura delegada IPAS	En curso 31/08
Apertura delegada HomeServe	En curso Octubre 2026

Impactos Proyecto

-

Riesgos

(1) No están trabajando en modo Agile y no entraran hasta Septiembre
(2) Equipo sobredimensionado

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

5,35 %
10.049 LL
Abandonos Hogar

IPAS COB COMPL	11.776	11,47%
IPAS HOGAR	19.849	7,83%

Abandonos IPAs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

5 – Ficha de seguimiento del Proyecto: AGILIDAD Tecnología y Transformación

Coordinador Proyecto: **Pilar Uget**

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

Tareas Proyecto

En curso

Creación de el dominio Canales Digital · Squad Formación	02/07
Que hacer con equipos ya montados (SYP Motor, Hogar y IA)	07/07
Borrador Mapa de dominios	17/07
Definicion de personas en equipos	Septiembre
Dominio Servicios y Prestaciones es el siguiente que se sube a la agilidad.	07/09

Impactos Proyecto

Organización, Incentivos Trimestrales,

Riesgos

(1) Transición entre modelos, Roles actuales vs nueva estructura, incertidumbres sobre las función.
(2) Resistencia al cambio con separar los productos.

Bloqueos

(1) Colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	21
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

6 – Ficha de seguimiento del Proyecto: GOBIERNO DEL DATO

Coordinador Proyecto: **Pilar Uget**

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre dominios definidos (clientes, pólizas, siniestros, calidad, finanzas…), sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

Tareas Proyecto

En curso

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward)	En curso Diciembre 2026
Cambio de plataforma Analítica	En curso 18/09
integrador SDG está realizando un diagnóstico	En curso
TownHall	31/07
Encuentro de Comunicada nombramiento data Owner, Roadmap y lanzamiento Development Center	18/09

Impactos Proyecto

Organización
Nuevos roles y funciones
Formación gestión de cambio
Comunicación

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	29
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

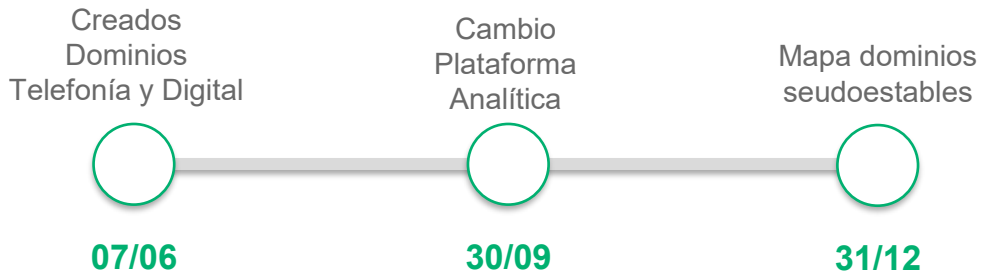

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

7 – Ficha de seguimiento del Proyecto: SALUD

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Alicia Gutiérrez**

Objetivo de Proyecto: Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

Tareas Proyecto

	En curso
Montado equipo de trabajo	07/07
Cambio de TPA (HNA)	En curso
Supervisión de Proveedor (HNA)	En curso
Solicitud de Vacante interna y externa (abiertas)	En curso
Plan de formación Preparacion	Agosto
Plan de comunicacion	Noviembre

Impactos Proyecto

Formacion, Selección Externa e interna, Organización, Comunicación interna y externa, Gestion del cambio

Riesgos

(1) Falta de recursos internos futuro (Septiembre 2026)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-	-
avance	NPS	Satisfaccion Formacion	Autorizaciones gestionadas	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Equipo de Trabajo

07/07

QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia: Sin impacto en 2026, el cambio de TPA no se implanta hasta finales de Enero del 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

		En curso
IA Voz — PaP Precio RW		29/04
Venta Patinetes		10/06
PaP Asistencia Viaje (productividad 8% de las llamadas)	EN SEGUIMIENTO (FICHA APARTE)	30/06
PaP Cobertura		16/07
SyP Motor		En definicion

Impactos Proyecto

Disminucion de el abandona de llamadas

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	242K	4.887	-
avance	Total Llamadas Julio 26	Total Autogestionadas Julio 26	Avance de implantación (personas)

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ ASIVIA

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

Seguimiento Mensual

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en servicios de Asistencia en Viaje.

Tareas Proyecto

	En curso
PaP Asistencia Viaje (productividad 8% de las llamadas)	30/06
Apertura 100% Asistencia en viaje de 8:00h a 22:00 hSingularidades 0 y 1	21/07
PaP Mejoras Asistencia	22/07

Impactos Proyecto

Disminucion del abandona de llamadas y aumento de la digitalización de clientes.

Riesgos

(1) Impacto de la eficiencia en la personas (a gestionar)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	3,95%	3,90 %	71,20 %	9 %	64,92 %
avance	Absentismo	Abandono	Digitalizacion	Digital IA Voz	NSS

-2,1 %		-5 %
FTE Interno	Acumulado Mes Julio	FTE Externo

Análisis KPIs: Buen avance de la Digitalización IA Voz, pero se prevén barreras.

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Venta Patinetes	Asistencia Viaje	Apertura 100%	Mejoras Asivia
10/06	30/06	24/07	22/07

QuickWins Eficiencias 2026

En construccion

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA CHAT (Lupe)

Próxima reunión para profundizar

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

		En curso
Consulta Póliza		20/05
Venta en el Chat		10/06
Reentrenamiento SyP Motor	Revisar con proyecto BIP y Calidad	17/06
Reentrenamiento de SyP Hogar		25/06
Reentrenamiento GP		En curso
Reentrenamiento Generales (Temáticas recibos y cambios de póliza)		En curso

Impactos Proyecto

Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ IMPACTO CC Externo

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

Próxima reunión para profundizar

Seguimiento Mensual

Objetivo de Proyecto: Impactos de los proyectos deIA Voz en CallCenter Externos.

Tareas Proyecto

En curso

Diagnostico de situación en Cartera, Comercial, SyP y ASIVIA (Funciones externalizadas, volucmenes, conversión en FTEs, e identificación de los callcenter)	●	30/07
Identificar iniciativas IA que impactaran	●	31/07

Nota: Estamos avanzando conjuntamente con el equipo de IA Voz, en un análisis específico sobre el impacto de la IA en los servicios externalizados, buscando una visión integrada entre eficiencia, operación y personas.
El trabajo se está estructurando en cuatro focos principales:

(1) Impacto de la IA en los Call Centers Externos.
(2) Lupe (Retención).
(3)Refuerzo para SyP.
(4) Iniciativas de IA vinculadas a SyP.

Impactos Proyecto

Riesgos

(1) La gestión segura de la reducción de las llamadas externalizadas
(2) Impactos de la IA en la gestión de las relaciones con las personas, gestion responsable)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

avance	KPI	KPIS	Digitalizacion
Verde	-	-	-

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Diagnostico Situacion	Identificar Iniciativas	
30/07	31/07	

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

KPIs DE PERSONAS

Información de KPIs

A continuación, se presentan los indicadores clave de Personas para revisar estado, evolución y principales focos de seguimiento del portfolio.

Seguimiento · métricas · evolución · decisiones




KPIs Resumen Junio 2026

linea directa

Año: 2026 | Mes: junio | Clasificación: Todas | Grupo profesional: Todas | Area: Todas | Clasificación Vacante: Todas


Personas por cuadrante

Distribución de personas por cuadrante




Formación por cuadrante

Distribución de Horas de formación por cuadrante



Vacantes YTD

Suma de Vacantes contratadas por CLASIFICACIÓN



Bajas


45	34	11
NUM_BAJAS	BAJAS_OBL	BAJAS_VOL

Rotación mensual


2,05 %	1,55 %	0,50 %
rot_total	rot_obl	rot_vol

Formación por cuadrante

Promedio Horas Formación



Vacantes



292
Suma de Vacantes contratadas

ANEXOS DE CONTEXTO

Información de contexto

Cartelas de apoyo para interpretar el informe, alinear criterios y consultar marcos de trabajo específicos cuando sea necesario.

Modelo de trabajo · riesgos · funciones Perscom · Anexos



ANEXOS DE CONTEXTO

Modelo de trabajo PMO

Marco operativo para gestionar el portfolio: gobierno, cadencia de seguimiento, roles y mecanismos de coordinación para asegurar foco, trazabilidad y ejecución.

Gobierno · roles · cadencia · seguimiento



Modelo de trabajo | Funciones y roles

La coordinación operativa y las oficinas transversales aseguran avance, adopción y medición.

Cada figura tiene un ámbito claro de responsabilidad y un punto de conexión definido dentro del modelo.

01 Coordinador de proyecto

- Identifica necesidades, impactos, puntos de dolor y personas afectadas.
- Alinea equipos y controla avance, documentación y plazos.
- Anticipa riesgos y coordina directamente con la PMO.

02 Coordinador funcional

- Identifica implicaciones y riesgos para su función.
- Asegura entregables e hitos y moviliza a las personas del equipo.
- Informa al coordinador de proyecto sobre avances y frenos.

Oficinas transversales

Aportan gobierno, adopción y medición a todos los proyectos del área.

Oficina de Proyectos (PMO)

Gestiona el porfolio: ordena, planifica y centraliza; anticipa obstáculos y prioridades; homogeneiza criterios, comparte prácticas y habilita agentes IA.

Oficina de Gestión del Cambio (CMO)

Acompaña la adopción de los proyectos, impulsa la gestión del cambio y ayuda a anticipar impactos sobre equipos y personas.

Seguimiento de métricas y KPIs

Define los indicadores de seguimiento y monitoriza el avance para facilitar decisiones y escalados.

Modelo de trabajo | Ciclo de seguimiento

Cada semana se prepara, sincroniza, alinea y comunica la información de los proyectos

01 Preparación

MARTES

Sesión individual Coordinador Proyectos y PMO para actualizar estado, hitos, riesgos y bloqueos.

02 Sincronización

MIÉRCOLES

Reunión conjunta para alinear tareas y dependencias.

03 Alineación PMOs

JUEVES

Alinear PMO Transformación (negocio) y PMO RRHH (Personas).

04 Comunicación

VIERNES

Consolidar y enviar entregable de seguimiento cada viernes.

05 Escalado mensual

FIN DE MES

Cierre mensual con Dirección PersCom para elevar el estado global.

Entregables de la PMO

Se remite todos los viernes tras consolidar seguimiento, alineación PMO y la información enviada por Transformación.

01 Resumen ejecutivo del porfolio

Visión global para dirección: estado, hitos, riesgos, decisiones y asuntos que requieren escalado.

02 Detalle por proyecto

Seguimiento operativo de cada iniciativa: avance, próximos hitos, dependencias, riesgos y responsables.

03 Modelo vivo y evolutivo

La PMO revisa el funcionamiento del ciclo y ajusta sesiones, ceremonias y entregables a medida que avanza.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE CONTEXTO

Glosario de riesgos funcionales

Referencia común para identificar, clasificar y escalar riesgos de las áreas funcionales de Perscom que participan en los proyectos.

Riesgos · escalado · funciones Perscom



linea directa

Anexo: Glosario de Riesgos

Sesión 22/07 realizada:
tarea 01 · Lista de riesgos

De la sesión salió una tarea para cada coordinador funcional: listar los riesgos funcionales que pueden darse en los proyectos. Haremos seguimiento durante la próxima semana y después se priorizarán y estandarizarán los riesgos recibidos.

SITUACIÓN ACTUAL

Tarea 01 · Lista de riesgos

Los coordinadores funcionales preparan su listado de riesgos; la PMO hará seguimiento la próxima semana.

01 Lista de riesgos

Cada coordinador funcional identifica los riesgos funcionales que pueden aparecer en sus proyectos. Seguimiento la próxima semana.

02 Priorizar

Consolidar y ordenar los riesgos recibidos por impacto, probabilidad y urgencia.

03 Estandarizar riesgos

Definir criterios comunes y un catálogo estándar para seguimiento y escalado.

Participantes: coordinadores funcionales + oficinas transversales

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA. + PMO PERSONAS

Cuadro de mando global de KPIs

Seguimiento y gobierno coordinado de KPIs de negocio y KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos para disponer de una visión global de evolución e impactos.

Negocio · Personas · PMO Cía. · PMO Personas



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA + PMO PERSONAS

Cuadro de Mando global de KPIs de proyectos

Iniciar el trabajo conjunto para gobernar los KPIs de negocio y los KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos, con una visión única de evolución, impactos y decisiones.

01 **Gobierno coordinado**
PMO de la Cía. y PMO Personas con una cadencia común.

02 **Seguimiento integrado**
Negocio y Personas analizados en el mismo marco de decisión.

03 **Detección temprana**
Alertas sobre la evolución de KPIs por efecto de los proyectos en curso.

8 **Proyectos estratégicos**

Negocio + Personas

Un único cuadro de mando para entender cómo evolucionan los indicadores y dónde deben activarse decisiones o escalados.

Arranque de trabajo: coordinación PMO Cía. + PMO Personas

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tarea PMO · Gobierno de KPIs

Modelo de seguimiento y gobierno de KPIs

Construir una visión integrada de los 8 proyectos estratégicos para seguir evolución, impactos y decisiones en Negocio y Personas.

KPIs negocio

Indicadores de avance, operación, calidad, eficiencia y adopción de cada proyecto.

KPIs personas

Impactos en personas, FTE, formación, productividad, adopción, clima y capacidades.

Cuadro de mando global de proyectos

Vista única para comparar evolución, desviaciones y señales de impacto en los 8 proyectos estratégicos.

Gobierno y decisiones

PMO Cía. + PMO Personas

Cadencia común de seguimiento, lectura de alertas y escalado de decisiones cuando los KPIs muestren desviaciones o impactos relevantes.

01 Definir catálogo
KPI, fuente, owner y frecuencia.

02 Consolidar datos
Negocio + Personas en una vista común.

03 Activar alertas
Detectar evolución e impactos por proyecto.

04 Gobernar acciones
Seguimiento, decisiones y escalados.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE CONTEXTO

Funciones Perscom en proyectos

Mapa de funciones expertas para anticipar impactos, activar soporte transversal y clarificar responsabilidades durante la ejecución.



Funciones expertas · impactos · soporte transversal

Impactos y responsabilidades de cada función

Mapa de funciones expertas donde anticipar impactos y activar soporte transversal.

Relación empleado

condiciones de trabajo, horarios, RRLL, subcontratación, políticas y procedimientos.

Compensación

retribución fija, incentivos y posibles revisiones salariales. Incoherencia retributiva.

HR Analytics

KPIs de proyecto, datos de personas, equipos, FTE y organigrama numérico. Impacto en plan de personas: Productividad y Eficiencia.

Formación

skilling, re-skilling y nuevas habilidades.

Desarrollo

vacantes, designaciones, recolocaciones y planes de carrera, potenciales, desempeño y medición de skills.

Procesos

impactos con PeopleSoft, accesos, árboles organizativos, gestión de la PMO y herramientas.

Selección

incorporaciones externas: plantilla o mercantiles.

Organización

Impacto en estructura organizativa, nuevos roles y medición de la experiencia.

Comunicación

Mensajes, activación interna y gestión del cambio. Escaletas y conversaciones.

Rol de Gestión del Cambio: Visión Global de la Organización y sus impactos. Coherencia Organizativa. Avance en la transformación.
PMO: planificación y coordinación.



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE PROYECTOS


Documentación adicional de los proyectos



Anexos de proyectos tecnológicos

Anexo: Plan de proyecto CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

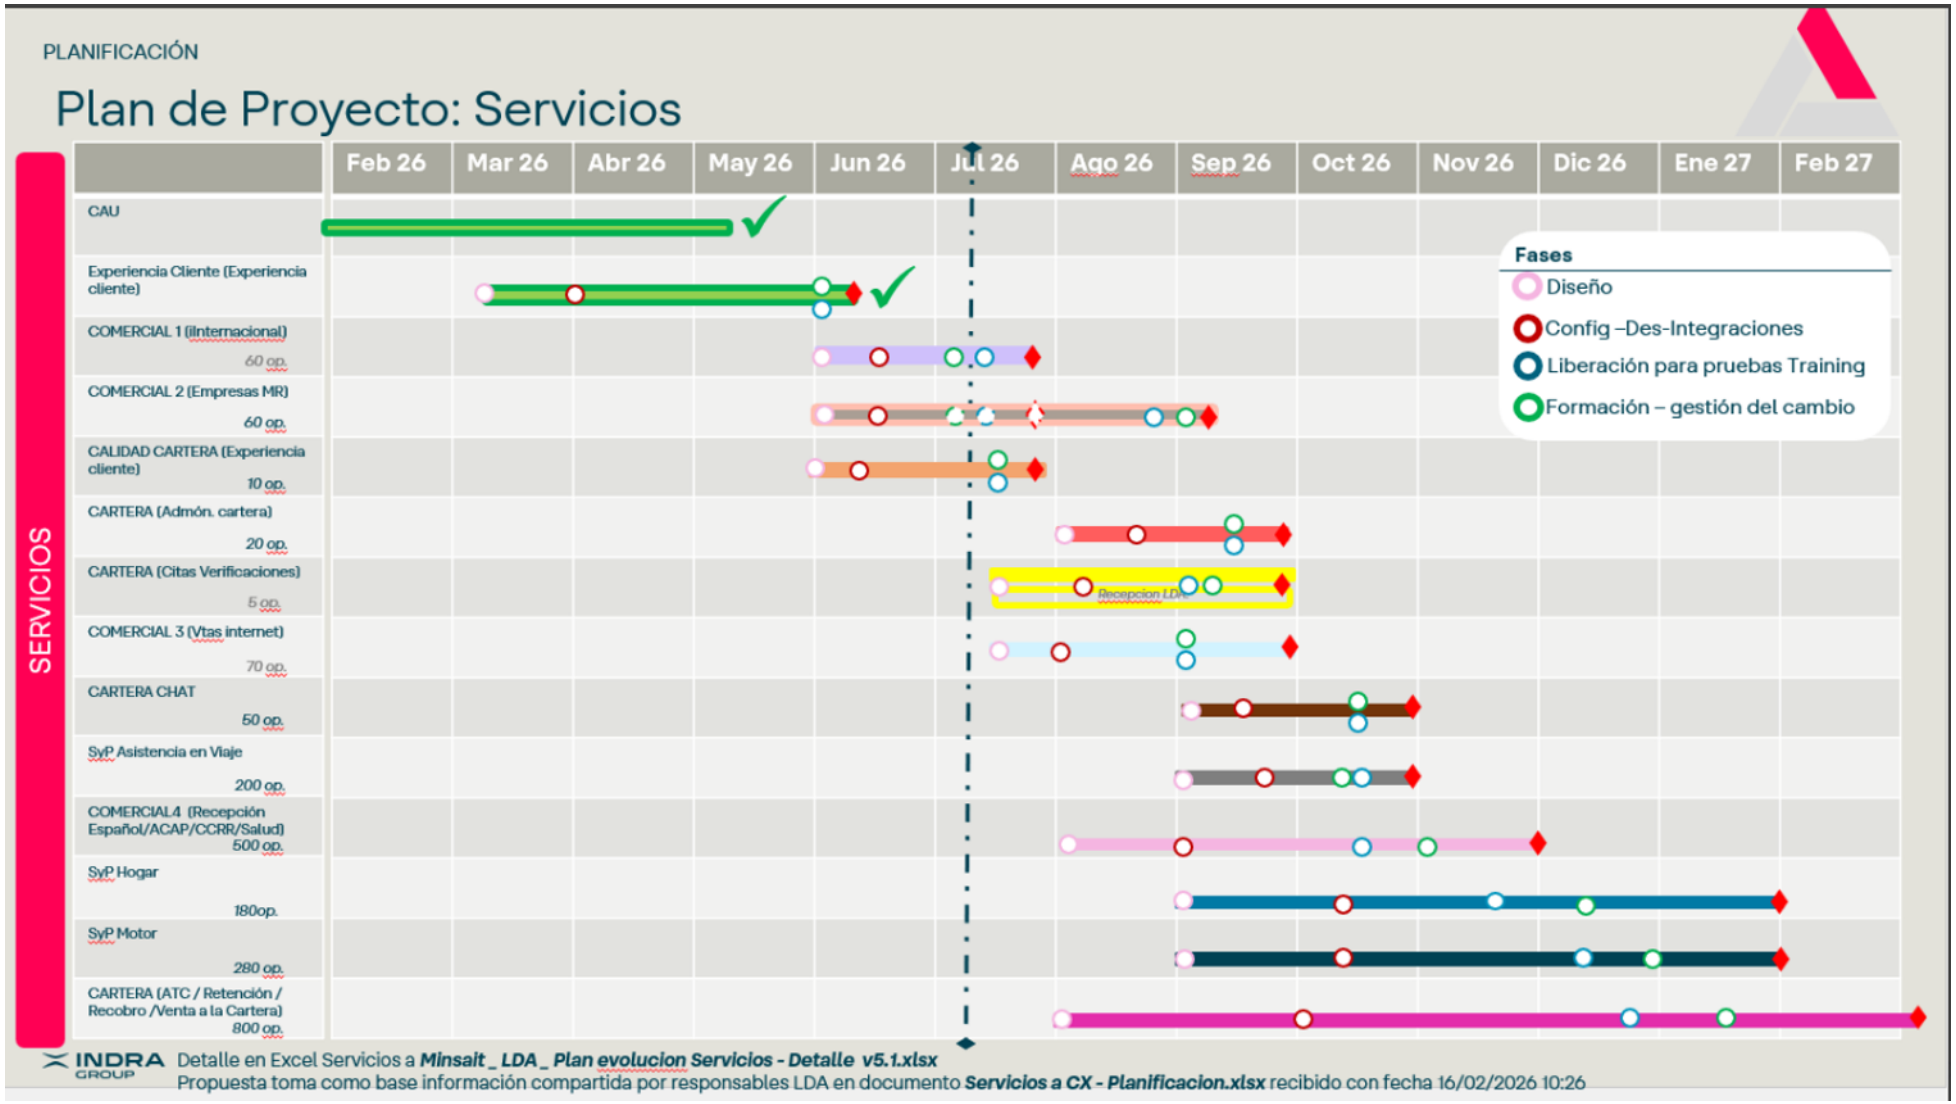


linea directa

Anexo: Plan de proyecto CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

Interno

Plan de proyecto: Global

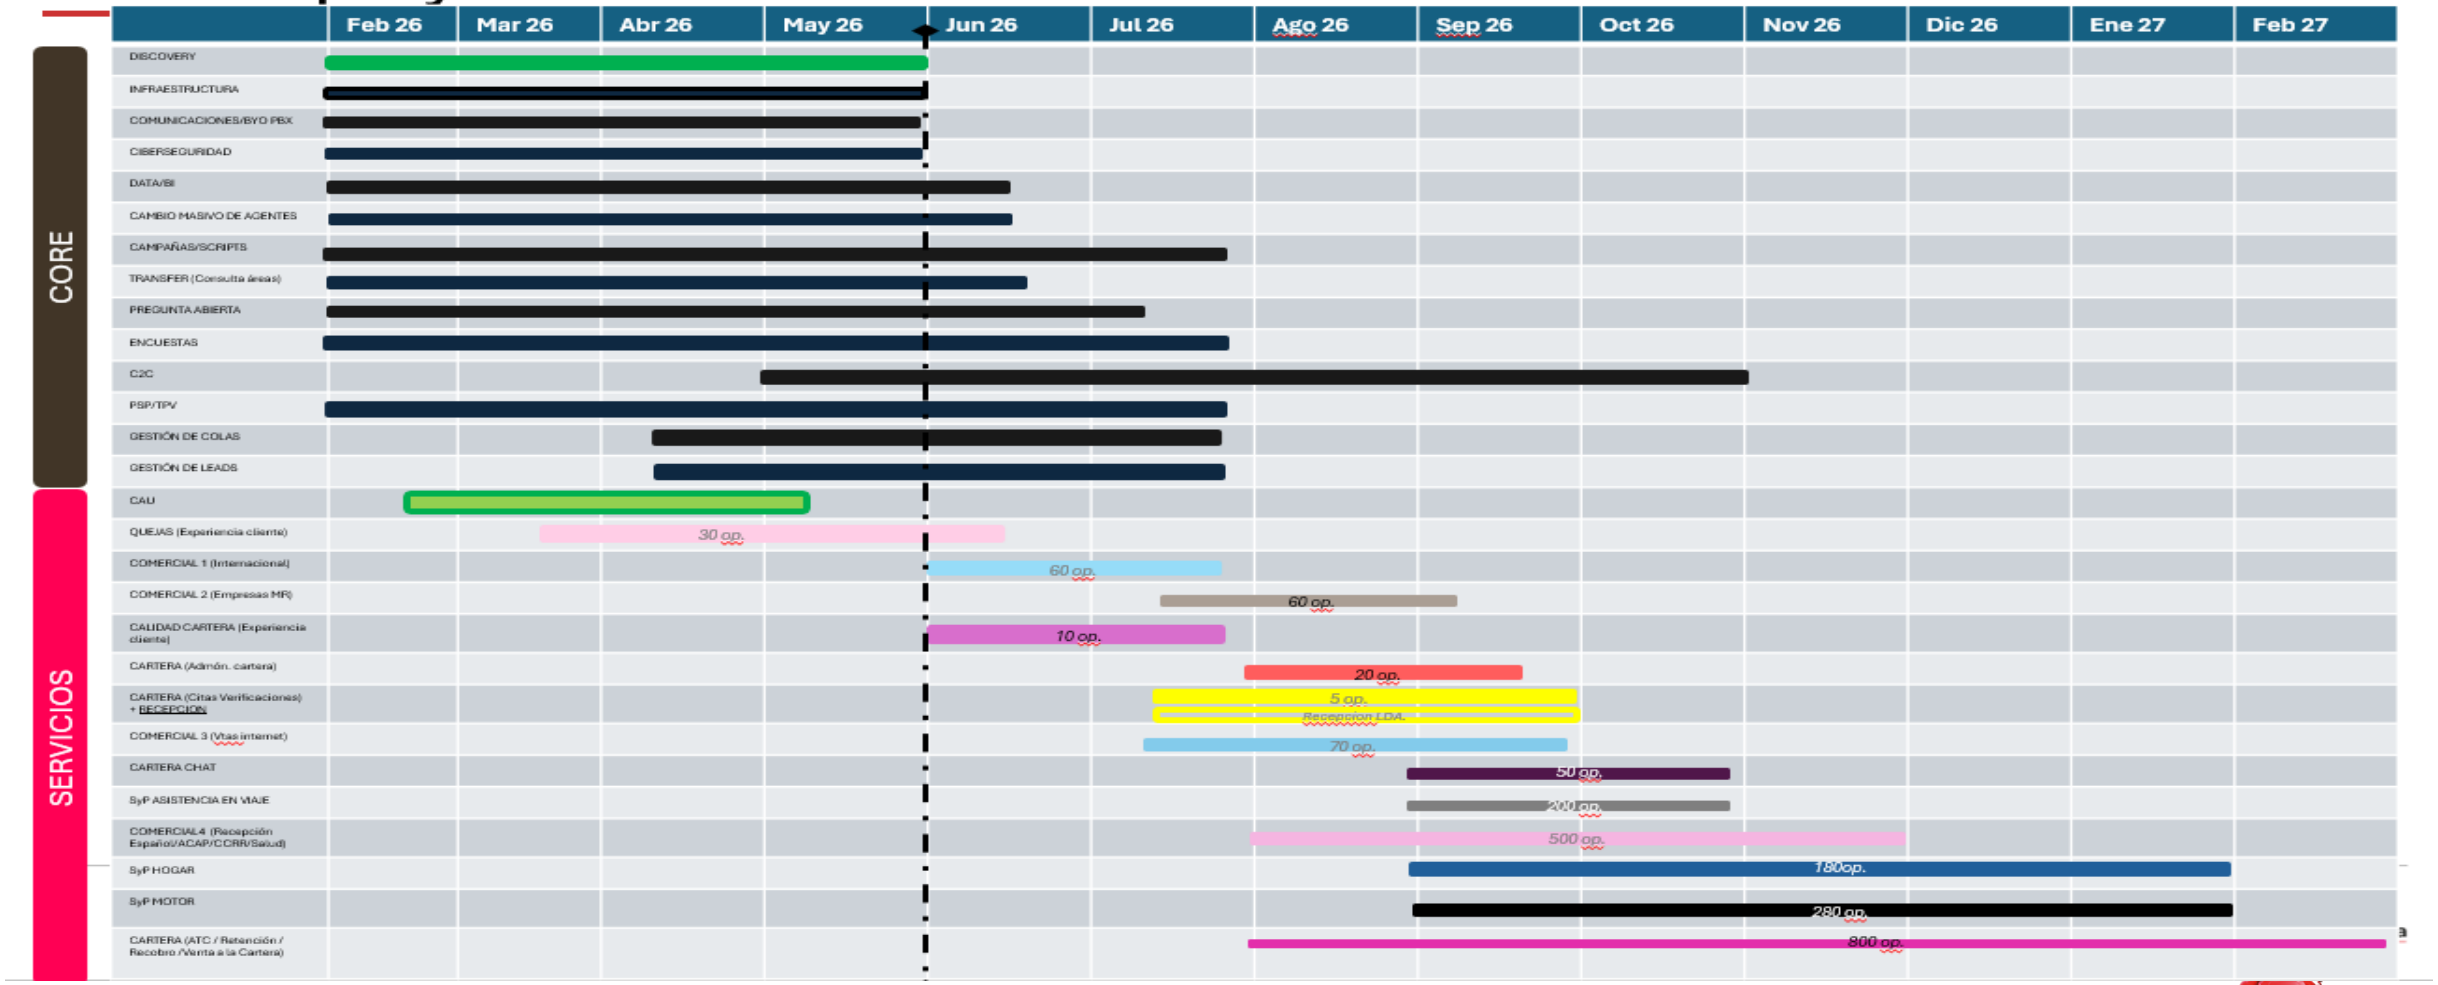

Anexo: Identificacion de Quick Wins y aportación de valor CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

INICIATIVA : CONSOLA UNICA INTEGRADA CON EL SSO.

- Descripcion:
  - La nueva plataforma de Contact Center proporcionará una **consola única de gestión y operación**, integrada con el sistema corporativo de **Single Sign-On (SSO)**, que permitirá a los usuarios acceder de forma segura a todas las funcionalidades necesarias para su trabajo mediante una única autenticación corporativa.
  - Desde esta consola centralizada, agentes, supervisores, planificadores y administradores podrán acceder a capacidades como atención omnicanal, gestión de interacciones, monitorización, reporting, calidad, grabación, workforce management e integraciones con CRM y aplicaciones corporativas, sin necesidad de utilizar múltiples credenciales o cambiar entre diferentes aplicaciones.
- Beneficios Esperados:
  - Mejora de la productividad de los usuarios
  - Experiencia de usuario más sencilla y eficiente
  - Mayor seguridad y cumplimiento
  - Reducción de incidencias y soporte
  - Incorporación y movilidad más ágiles
- Posible Estimación :
  - Ahorro gestión operativa : 15 minutos día * **x** personas de CC. (estimación)
  - Reducción incidencias contraseñas
  - Ahorro formativo inicial compañía y en actualizaciones o subidas de versión

INICIATIVA : ANALISIS Y EXPLOTACION DE DATOS

- Descripcion:
  - Vamos a disponer de un único, unificado y consolidado Modelo de Datos. Podremos tener un ID único de interacción con toda la información y visión cliente. No habrá que consolidar ni unificar modelos de datos.
- Beneficios esperados:
  - ¡¡ 2026 y primer Q 2027 impacto negativo en los equipos de BI y análisis y soporte sala, planificación, ya que en un primer momento supone adaptar todos los procesos de análisis y explotación a un nuevo modelo de datos.
  - Una vez rehechos dichos procesos, debería mejorar :
    - La visión global de cliente
    - Calidad en el dato. Unificación de criterios (englobado y perfectamente coordinado además con el gobierno del dato).
    - Evitamos interpretaciones distintas, y macheo o verificación de datos.
    - Mejor calidad de las decisiones.
- Posible Estimación :
  - Tiempo en consolidación y explotación de distintos modelos de datos : Deberámos estimar cuanto tiempo, en los cierres de mes, en el cálculo de incentivos o en creación de módelos o análisis se invierte en la interpretación, corrección de errores y macheo sinnecesari. Ese tiempo * **x analistas** (pendiente de estimar tiempo de dedicación a estas tareas)

linea directa

Anexo: Identificacion de Quick Wins y aportación de valor CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

INICIATIVA : TRANCRIPCION

- Descripción:
  - Disponibilidad de la transcripción de la conversación del cliente, para revisión o analytics posterior para conseguir eficiencias, argumentarios, información de la competencia, etc....
- Beneficio esperado:
  - En un primer momento (2027) hay que construir o adaptar el modelo de explotación de estas transcripciones. Una vez hecho los beneficios pueden ser:
    - Argumentarios de ventas o retención
    - Conocimiento de la competencia
    - Mejora de la calidad percibida por el cliente
- Posible estimación:
  - ¿Incremento de la retención?
  - ¿incremento de la venta?

INICIATIVA OMNICANALIDAD.

- Descripción.
  - Posibilidad de gestionar las interacciones del cliente por el canal más conveniente para generar la mejor de las experiencias.
- Beneficio esperado.
  - Facilidad en la gestión de la operación
  - Mejor experiencia de cliente
- Posible estimación:
  - Reducción de rellamada (5%)

INICIATIVA : VISIBILIDAD SOBRE CC EXTERNOS

- Descripción :
  - Posibilidad de grabar las conversaciones de nuestros clientes aunque vaya a cc externo. (generalistas, PYMES, etc.....)
- Beneficio esperado:
  - Control de la interacción
  - Aumento de la calidad al poder revisar estos audios
  - Optimización del presupuesto destinado a CC Externo.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: IA VOZ: Clasificacion de llamadas ASIVIA

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

	jul-26		
Solicitud Grua	**15/07/2026**	**Tot Jul/26**	**%**
Total Llamadas	1.955	**19.863**	
No Identificados	159	**1.686**	8,49%
No es Cliente Activo	26	**123**	0,62%
Cobertura Neumáticos	27	**244**	1,23%
No tiene Asistencia en Viaje	3	**43**	0,22%
LOPD KO	175	**1.783**	8,98%
Cliente VIP		**1**	
Mayor 80 años	8	**76**	0,38%
Marca Fraude		**2**	
Póliza Empresas		**8**	
Mas de 3 Solic 30d	5	**32**	0,16%
Desvio WEB	305	**3.085**	15,53%
Extranjero	5	**55**	0,28%
Exp Grua Abierto	714	**7.659**	38,56%
Rellamada en 24 hras		**25**	0,13%
Cuelgues	146	**1.468**	7,39%
Total Autogestión (completa o parcial)	**375**	**3.561**	**17,93%**
Sin Expediente creado	159	**1.622**	45,55%
Con expediente creado	216	**1.939**	54,45%
Autogestión completa (no quiere nada más)	**202**	**1.831**	**51,42%**
¿Quiere Algo Mas? (autogestión parcial)	**14**	**109**	**3,06%**

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE PROYECTOS

Listado de tareas pendientes

Seguimiento de pendientes, responsables y próximos pasos para asegurar el cierre y activar escalados cuando sea necesario.

Pendientes · responsables · fechas objetivo · estado



Objetivo: pasar del listado al cierre efectivo.

Cada pendiente debe tener dueño, fecha objetivo y una próxima acción clara.

ANEXO · SEGUIMIENTO PMO

Listado de tareas pendientes

Tarea	Pendiente	Próximo paso	Resp./apoyo	Fecha obj.	Estado
IA Voz	Reunión con Casi para entender IA Voz y solicitar datos a Sergio.	Pedir reunión y preparar preguntas.	PMO + Casi/Sergio	Lunes 27/07	**Pendiente**
IA Voz	Slide de externalización tras proyectos de IA.	Preparar borrador y validar mensaje.	PMO	Pte.	**Pendiente**
IA Voz	Reunión Asivia para entender los datos.	Agendar sesión y recopilar fuentes.	PMO + Asivia	22/07	**Realizado**
Encuestas opinión	Arrancar con C. Ex; SyP queda para más adelante al no tener equipos definidos.	Confirmar alcance inicial y dependencias.	PMO	Pte.	**A priorizar**
KPIs proyectos	Revisar KPIs de proyectos con Almudena.	Cerrar sesión de revisión.	Almudena	22/07	**Realizado**
Sitios	Entender el tema sitios.	Recopilar contexto e impacto en Personas.	PMO	Pte.	**Pendiente**
HCM	Preparar información HCM.	Ver siguientes pasos…	PMO	Pte.	**Pendiente**
Coste proyectos	Coste de proyectos: Personas, Almudena y Sergio.	Alinear datos y criterios de coste.	Pers. + Almudena/Sergio	Pte.	**Pendiente**
Perseo	Replantear seguimiento de Proyecto de Perseo	Ver siguientes pasos…	PMO + Pedro Sanchez		**Pendiente**

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
