
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos

Proyectos de Transformación 2026 · PersCom
Informe ejecutivo · detalle por iniciativa · modelo PMO · anexos de riesgos e impactos ·

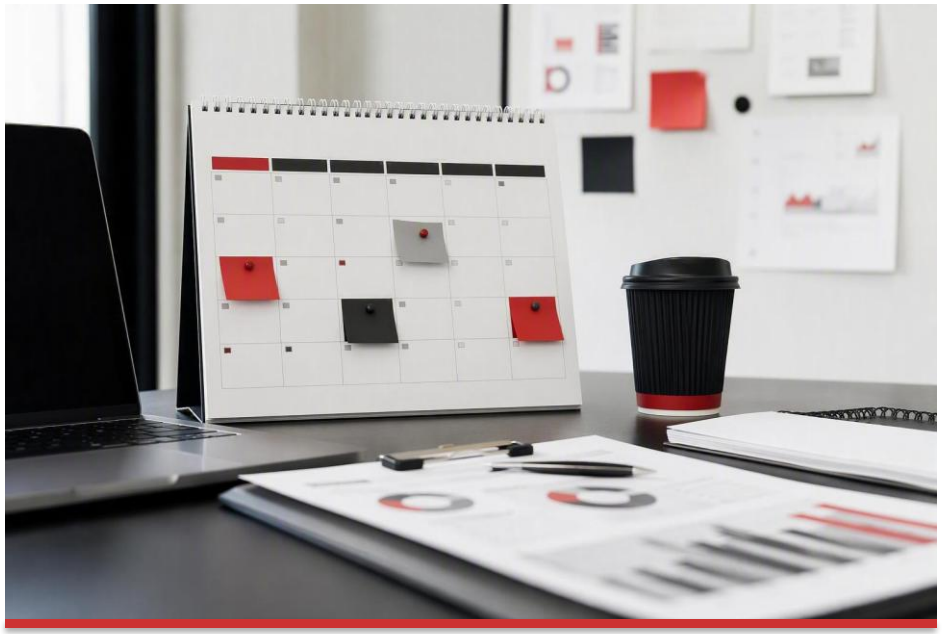

Semana 34 · 17/08/2026 – 21/08/2026

linea directa

INFORME EJECUTIVO

Índice

01 Resumen ejecutivo, avance proyectos
Status Agosto

02 Dimensiones RRHH identificadas para el área

03 Detalle por iniciativa
Fichas de proyectos estratégicos

04 Anexos de Contexto
Marco Común de Kpis, Metodología, glosarios, material de apoyo

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

Los proyectos avanzan, retos:

IA Voz y Contact Center (CCaaS) son los proyectos más maduros, con servicio ya operativo y despliegues todavía en curso; los frenos se concentran en el Contact Center derivados de la personalización que solicitan las áreas (en revisión) y de los ajustes del plan de formación; el proyecto de Agilidad, define las formas de trabajar y los equipos de trabajo de la mayor parte de los proyectos y esta constando tener una primera propuesta, retrasada a Septiembre (Eraneos), CRM arrancan con las escuchas y grabaciones en sala, se publican la guías de soporte a managers y la encuesta Voz del Usuario, la planificación se esta actualizando con todas las tareas con owner, fecha y bucket, y se actualiza la red de Train the Trainers y Champions.

FOCO ACTUAL

Contact Center

El foco actual está en el plan de formación y en la replanificación de los pases a producción de los próximos grupos.

IA Voz

Aunque durante estas semanas se ha realizado una pausa temporal en los PaP ordinarios, el proyecto continúa consolidando sus indicadores operativos. En agosto se han completado 3.503 autogestiones, se mantienen más de 1.700 expedientes abiertos mediante IA Voz y el NSA en Asistencia en Viaje alcanza el 67%.

Prioridades inmediatas

Sin bloqueos globales.

- **Contact Center** Preparar empresas replanificado para la ultima semana de Septiembre, ajustar formación y cerrar la replanificación de PaPs.
- **CRM** Completar escuchas y grabaciones en sala, dejar la planificación actualizada con owner, fecha y bucket por tarea.
- **Agilidad** Consolidar mapa de dominios y reducir incertidumbre sobre modelo, roles necesarios y funciones claras.
- **IA ASIVIA** Gestion de los impactos de la IA en las personas y en los CallCenter Externos.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Dimensiones RRHH identificadas para el área

Foco de trabajo de Personas/PersCom: organizar los nuevos modelos de trabajo, acompañar la estrategia de negocio en la implantación y a las personas.

Trabajando en (1) Diagnósticos de Call Center Externos y posible impactos de la IA en llamadas externalizadas para gestionar. (2) Coordinar los KPIS de los proyectos estratégicos con la PMO (seguimiento de negocio y de impacto en personas). (3) Seguimiento de Perseo.

Modelo y organización

01 Nuevos roles

- Proyecto agiLiDAd: definir roles en los equipos y funciones, modelo/estructura organizativa y como transitar.

02 Impacto Organizativo

- Definir personas de los equipos y comunicarlo: SyP, GB…
- Convivencia de los proyectos estratégicos y las nuevas formar de trabajar (Todos: Hogar, SyP…).

03 Diagnóstico talento

- Detectar necesidades: Res. de Dominio y POs de Transformación.
- Identificar los perfiles necesarios para los proyectos (anticipación).

04 Gestión del cambio

- Pulsos de Opinión colectivos.
- Gestion de inquietudes individuales.

Activación de funciones necesarias

05 Incorporaciones

- Coordinar vacantes: Líder TD SyP, Líder de Suscripción, POs,, Líder Gobierno del Dato…

06 Formación

- Contact Center: rediseño de formación para próximos colectivos, reforzando soporte previo, píldora de refresco y contenidos prácticos.

07 Marco de trabajo

- Retribución. Fijar RV Trim 3Q y 4Q.
- PS/HCM: Registrar en PS las personas por colectivos, dedicación y “figuras” especificas.
- Modelo de trabajo RRHH. Afinar PMO (Herramientas y funciones), avanzando la coordinación con la PMO de Cia.

08 Productividad

- Recogiendo impactos en plan 2026.
- Proyectar impactos en el plan 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual del portfolio: cada ficha sintetiza estado, KPIs de Personas, hitos relevantes y próximos pasos para facilitar la lectura ejecutiva.

Estado · KPIs · hitos · próximos pasos



1 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CRM

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar.

Tareas Proyecto

En curso

Incio de Escuchas en Negocio y Grabaciones de pantalla (Galgo)	Talento Negocio	18, 19, 25 y 26/08
Pulsos (encuestas empleados)	Talento Negocio, Comunicación y Talento Corporativo	Trabajo en Julio y Agosto Lanzamiento Septiembre
Selección externa de Equipo	Selección	En búsqueda (1 pers).
Revision RV Mensual previo al CRM (Incentivos de los comerciales)	Compensacion	Reunión final Agosto

Impactos Proyecto

Encuestas(EX), Talento negocio, comunicación, Talento Corporativo. Compensación y Selección.

Riesgos

(1) Impacto CRM en **incentivos mensuales** (2027)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	0 %	-	0 %
avance	Retribución Variable	Productividad	Absentismo	Avance de implantación (personas)

Hasta 2027 no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia:

- Sin impacto en 2026,
- Considerando impactos en 2027 tras análisis de BC en Seprtiembre.

linea directa

2 – Ficha de seguimiento del Proyecto: AGILIDAD Tecnología y Transformación

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Marta Ruano)

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

Tareas Proyecto

En curso

Definicion de personas en equipos	**Septiembre**
Dominio Servicios y Prestaciones es el siguiente que se sube a la agilidad.	07/09

Impactos Proyecto

Organización, Incentivos Trimestrales,

Riesgos

(1) Transición entre modelos, Roles actuales vs nueva estructura, incertidumbres sobre las función.
(2) Resistencia al cambio con separar los productos.

Bloqueos

(1) Colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	21
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Definicion de personas en equipos

Sept

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

3 – Ficha de seguimiento del Proyecto: GOBIERNO DEL DATO

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Amaya Hurtado)

Objetivo de Proyecto: Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre dominios definidos (clientes, pólizas, siniestros, calidad, finanzas…), sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

Tareas Proyecto

En curso

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward)	En curso Diciembre 2026
Cambio de plataforma Analítica	En curso 18/09
integrador SDG está realizando un diagnóstico	En curso
Encuentro de Comunicada nombramiento data Owner, Roadmap y lanzamiento Development Center	18/09

Impactos Proyecto

Organización
Nuevos roles y funciones
Formación gestión de cambio
Comunicación

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	29
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

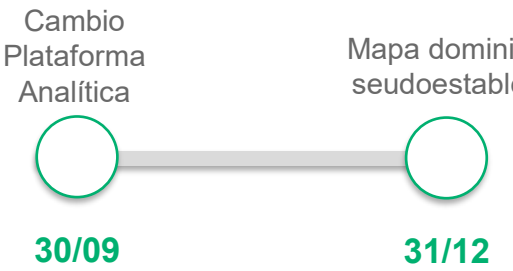

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

4 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CONTACT CENTER

Proyecto con Anexo

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo** (Backup Quique Cid)

Objetivo de Proyecto: Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS

Tareas Proyecto

	En curso
PaP Internacional – *(Vigilar impacto en RV mensual)*.	**29/07**
Replanificación en cascada del anexo Contact Center	En curso
Incorporar cláusula específica asociada al uso de IA en Genesys	En curso
PaP Calidad Cartera	30/07
Entrada proximos equipos: **Empresas**: preparación reforzada, reunión final de agosto y nuevo calendario Teleco pendiente.	Previso semana del 28 -Septiembre
Encuestas de opinión Quejas y Calidad	Fianlizadas
Encuestas de opinión Internacional	Finales Septiembre

Impactos Proyecto en funciones

Analítica, Compensación, Formación negocio, Comunicación, Relación empleado y PMO. Internacional ha evidenciado que el impacto se concentra más en planificación, soporte, supervisión, formación y análisis que en una limitación tecnológica. Se requiere reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de próximos PaP

Riesgos

(1) Incremento puntual de abandono en PaP complejos por dimensionamiento, vacaciones, bajas/licencias y adaptación operativa.
(2) Sobrecarga de equipos de soporte, supervisión y análisis durante los PaP.
(3) Necesidad de replanificar en cascada los próximos despliegues para evitar solapes, picos de negocio y falta de preparación previa.
(4) Información a empleados y externos sobre grabación, transcripción y uso de IA en Genesys Cloud.

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

KPIs a seguir en equipos migrados: seguimiento de impacto en abandonos y calidad (NSS)

70
4,66 % del colectivo completo
Avance implantación (personas)

Análisis KPIs: en Internacional se observa un incremento puntual del abandono, explicado principalmente por factores de dimensionamiento, adaptación operativa y menor capacidad de desborde durante el arranque. No se identifica como una limitación tecnológica de Genesys Cloud..

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

FORMACIONES (EXT) — **En curso**

FORMACIONES (INT) — **SIN PREVISION**

Quick Wins Eficiencias 2026

- Ahorro en gestión operativa de 15 minutos por FTE en el CallCenter.
- Mejora en la información disponible para el Análisis y explotación de los datos (equipo de Análisis).
- Optimización del presupuesto de Callcenter Externos
- Omnicanalidad reducción de rellamadas del 5%.
- Facilitador y acelerador para el proyecto de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

5 – Ficha de seguimiento del Proyecto: REINGENIERIA SYP

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Arancha Fernández** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). **El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la viison de cliente.**

Tareas Proyecto

	En curso	
Presentación ejecutiva del diagnostico AS-IS a la CEO	●	30/07
TO BE: Identificación de iniciativas y lanzamiento de quick-wins	●	30/09
TO BE: Rediseño y modelado de procesos	●	16/11
TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos	●	30/11
Business case y plan de implantación	●	09/12

Impactos Proyecto

Análisis, Laboral – Formación y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral

Riesgos

(1) Urge montar equipo de Trabajo, cruce con Agile (Definición de perímetro de squad).
(2) Vigilar la resistencia al cambio
(3) Captura de productividad(FTEs y costes)..
(4) Composicion de la plantilla (antigüedad, edad y especialización. Sin relevo.)
(5) No existe documentación de procedimientos.

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	2,86 %	26.744	4,68 %	0
avance	Abandonos Acumulado mes	Llamadas Acumuladas	Absentismo Area	Avance de implantación (personas)

Hasta Septiembre no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Pendiente analizar ppt enviada por BIP. Objetivo cumplimiento plan FTEs 2026

Avances: Se detectan necesidades tecnológicas, plataforma, herramientas,

linea directa

rno - No compartir fuera de la organización.

6 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CALIDAD HOGAR

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

Objetivo de Proyecto: Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

Tareas Proyecto

En curso

Apertura delegada IPAS	Realizado
Apertura delegada HomeServe	En curso Octubre 2026
Rehuses de apertura: Comunicaciones por grupo de causa. Seguimiento por tipo de rehuse	En curso En curso

Impactos Proyecto

-

Riesgos

(1) No están trabajando en modo Agile y no entraran hasta Septiembre
(2) Equipo sobredimensionado

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

5,35 %
10.049 LL
Abandonos Hogar

IPAS COB COMPL	11.776	11,47%
IPAS HOGAR	19.849	7,83%

Abandonos IPAs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Rehuses de apertura	Apertura delegada HomeServe
En curso	31/10

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

7 – Ficha de seguimiento del Proyecto: SALUD

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Alicia Gutiérrez** (Backup Quique Cid)

Objetivo de Proyecto: Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

Tareas Proyecto

En curso

Cambio de TPA (HNA)	En curso 01/27
Supervisión de Proveedor (HNA)	En curso
Solicitud de Vacante ~~interna~~ y externa (abiertas) **Pasan a ser las dos externas)**	En curso Septiembre 26
Plan de formación Pendiente de validación por equipo de proyecto.	21/Agosto
Plan de comunicacion	Noviembre

Impactos Proyecto

Formacion, Selección Externa e interna, Organización, Comunicación interna y externa, Gestion del cambio

Riesgos

(1) Falta de recursos internos futuro (equipo asistencial (Septiembre 2026)
(2) Entrada en vigor de cambio de TPA después del Enero para renovaciones de Colectivos y la mayoría de las polizas de salud
(3) Formacion muy adelantada al PaP de la Tpa al equipo aisistencias que generar retrabajos de formación.

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-	-
avance	NPS	Satisfaccion Formacion	Autorizaciones gestionadas	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia: Sin impacto en 2026, el cambio de TPA no se implanta hasta finales de Enero del 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ CHAT CLIENTES

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

		En curso
Gestion SyP Motor (Definicion Casos de uso – Gestion de pendencias SYP Motor)		**En definicion**
Apertura SyP (Analisis dependencias para apertura de partes en IA VOZ)		En definicion

Impactos Proyecto

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas).

Riesgos

Migración del chat, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP.

Bloqueos


Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	242K	3.503 / 4.887	-
avance	Total Llamadas Julio 26	Total Autogestionadas Acumulado a 13 Agosto 26	Avance de implantación (personas)

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ ASIVIA

Proyecto con Anexo

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en servicios de Asistencia en Viaje.

Tareas Proyecto

En curso

Analisis Insatisfechos en encuestas y llamadas de gestión de asistencia (Deteccion de mejoras) - Deteccion correcta de teléfonos, direcciones y valoraciones en en encuestas	Continuo/periódico (diario)

Impactos Proyecto

Disminucion del abandona de llamadas y aumento de la digitalización de clientes.

Riesgos

(1) Impacto de la eficiencia en la personas (a gestionar)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	3,95%	4,64% ↑	65,01 % ↓	10,74 % ↑	67 %
avance	Absentismo	3,90 % Abandono	65,89% Exp. Digitalizacion	10,24% Exp. Digital IA Voz	NSA

Acumulado Mes Agosto

-2,3 %	-6,7 %
FTE Interno	FTE Externo

Análisis KPIs: avance positivo en digitalización IA Voz y mejoras de identificación/LOPD; las eficiencias FTE corresponden a ASIVIA y deben separarse del seguimiento general de IA Voz y Chat.

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Identificacion ANI
Repregunta LOPD

29/07

QuickWins Eficiencias 2026

En construccion

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA CHAT (Lupe)

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

En curso

Reentrenamiento GP		En curso
Reentrenamiento Generales (Temáticas recibos y cambios de póliza)		En curso

Impactos Proyecto

Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ IMPACTO CC Externo

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Impactos de los proyectos deIA Voz en CallCenter Externos.

Tareas Proyecto

En curso

Diagnostico de situación en Cartera, Comercial, SyP y ASIVIA (Funciones externalizadas, volucmenes, conversión en FTEs, e identificación de los callcenter)	●	30/07
Identificar iniciativas IA que impactaran	●	31/07

Nota: Estamos avanzando juntamente con el equipo de IA Voz, en un análisis específico sobre el impacto de la IA en los servicios externalizados, buscando una visión integrada entre eficiencia, operación y personas.
El trabajo se está estructurando en cuatro focos principales:

(1) Impacto de la IA en los Call Centers Externos.
(2) Lupe (Retención).
(3)Refuerzo para SyP.
(4) Iniciativas de IA vinculadas a SyP.

Impactos Proyecto

Riesgos

(1) La gestión segura de la reducción de las llamadas externalizadas
(2) Impactos de la IA en la gestión de las relaciones con las personas, gestion responsable)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

avance	KPI	KPIS	Digitalizacion
Verde	-	-	-

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Comercial

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

Objetivo de Proyecto: Monitoreo, etiquetado y marcado de ítems de calidad de una muestra de las llamadas de comercial para mejorar 1) Calidad 2) Argumentos/procesos 3) Coachings 4) Fraude

Tareas Proyecto

Desplegado en todo comercial.	En producción
Empresas está empezando	En producción
Analizando mejoras en ratios de cancelación	En curso
Vigilancia de los coachings	En curso
Caso de uso fraude:	Pendiente
Productos pequeños. Necesidad de más muestra de llamadas analizadas	Pendiente
Dashboard para formación	Pendiente

Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio.

Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

Bloqueos

Producto Salud. Revisiones con OPD

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

	Absentismo	Rotación Voluntaria	Póliza/llamada Recepción Motor
Recepción	8,7% -2,0	7,3% -0,5	28,9% +0,7
Internet	14,8% -1,4	17,6% +0,1	28,6% -0,9

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Dashboard formación

14/08

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Cartera

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

Objetivo de Proyecto: Monitoreo, etiquetado y análisis de llamadas para mejorar el coste de negociación

Tareas Proyecto

Perseo desplegado en sala retención	En producción
Coaching	En producción
Analizando mejoras en costes de negociación	En curso
Validación información Cross Interno	En curso
Análisis de los tiempos de llamada	En curso

Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio

Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

Bloqueos

Venta Cross EXTERNO pendiente cláusulas de contrato

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Absentismo	Rotación Voluntaria	CM Salvada Core
9,7% -0,3	8,9% -1,4	pte pte

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Producción



31/07

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

ANEXOS DE CONTEXTO

Información de contexto

Cartelas de apoyo para interpretar el informe, alinear criterios y consultar marcos de trabajo específicos cuando sea necesario.

Modelo de trabajo · riesgos · funciones Perscom · Anexos



ANEXOS DE CONTEXTO

Marco común de KPIs

Primera propuesta de catálogo corporativo de indicadores: qué incluye, cómo seleccionar los KPIs de cada proyecto y qué familias están disponibles para medir avance e impacto con criterios comunes.

Catálogo · KPIs y KRIs · selección · reporte



Marco común de KPIs: primera propuesta del catálogo

El equipo de People Analytics ya ha compartido la primera propuesta de catálogo de indicadores para el seguimiento de proyectos.

Qué tenemos disponible

Un catálogo con **120 indicadores**: 10 de People Analytics, con posibilidad de drilldown, y 110 KRIs corporativos.

Está publicado en la carpeta compartida y es una propuesta abierta: no es una lista cerrada, se puede modificar y enriquecer.

Cómo lo usamos

Cada responsable de proyecto elige los indicadores útiles para medir su proyecto.

Se analizarán las propuestas de indicadores nuevos que no estén recogidos en el catálogo.

Los indicadores no accesibles para el equipo de análisis no podrán reportarse.

Objetivo: un marco común de KPIs para medir y comparar el avance de los proyectos con criterios homogéneos.
Próximo paso: cada coordinador revisa el catálogo y propone nuevos indicadores y selecciona sus indicadores de seguimiento de su proyecto.

Catálogo de indicadores: familias disponibles

120 indicadores agrupados en 12 familias, para que cada proyecto seleccione los que mejor miden su avance e impacto.

Personas, cliente y tecnología

People Analytics **10**
Personas y talento **8**
Ciberseguridad y tecnología **11**
Cliente y servicio **14**
Cumplimiento y regulación **8**
Digital y canales **13**

Negocio, riesgo y operación

Finanzas, solvencia y riesgo **14**
Marca y reputación **5**
Operaciones y eficiencia **5**
Productos y negocio asegurador **11**
Proyectos estratégicos **2**
Siniestros, reservas y recobro **20**

Los 10 indicadores de People Analytics permiten drilldown; los 110 KRIs recogen la visión corporativa de riesgo y negocio. ¿Falta algo? Se pueden proponer indicadores nuevos y se analizará su incorporación al catálogo.

ANEXOS DE CONTEXTO

Modelo de trabajo PMO

Marco operativo para gestionar el portfolio: gobierno, cadencia de seguimiento, roles y mecanismos de coordinación para asegurar foco, trazabilidad y ejecución.

Gobierno · roles · cadencia · seguimiento



Modelo de trabajo | Funciones y roles

La coordinación operativa y las oficinas transversales aseguran avance, adopción y medición.

Cada figura tiene un ámbito claro de responsabilidad y un punto de conexión definido dentro del modelo.

01 Coordinador de proyecto

- Identifica necesidades, impactos, puntos de dolor y personas afectadas.
- Alinea equipos y controla avance, documentación y plazos.
- Anticipa riesgos y coordina directamente con la PMO.

02 Coordinador funcional

- Identifica implicaciones y riesgos para su función.
- Asegura entregables e hitos y moviliza a las personas del equipo.
- Informa al coordinador de proyecto sobre avances y frenos.

Oficinas transversales

Aportan gobierno, adopción y medición a todos los proyectos del área.

Oficina de Proyectos (PMO)

Gestiona el porfolio: ordena, planifica y centraliza; anticipa obstáculos y prioridades; homogeneiza criterios, comparte prácticas y habilita agentes IA.

Oficina de Gestión del Cambio (CMO)

Acompaña la adopción de los proyectos, impulsa la gestión del cambio y ayuda a anticipar impactos sobre equipos y personas.

Seguimiento de métricas y KPIs

Define los indicadores de seguimiento y monitoriza el avance para facilitar decisiones y escalados.

Modelo de trabajo | Ciclo de seguimiento

Cada semana se prepara, sincroniza, alinea y comunica la información de los proyectos

01 Preparación

MARTES

Sesión individual Coordinador Proyectos y PMO para actualizar estado, hitos, riesgos y bloqueos.

02 Sincronización

MIÉRCOLES

Reunión conjunta para alinear tareas y dependencias.

03 Alineación PMOs

JUEVES

Alinear PMO Transformación (negocio) y PMO RRHH (Personas).

04 Comunicación

VIERNES

Consolidar y enviar entregable de seguimiento cada viernes.

05 Escalado mensual

FIN DE MES

Cierre mensual con Dirección PersCom para elevar el estado global.

Entregables de la PMO

Se remite todos los viernes tras consolidar seguimiento, alineación PMO y la información enviada por Transformación.

01 Resumen ejecutivo del porfolio

Visión global para dirección: estado, hitos, riesgos, decisiones y asuntos que requieren escalado.

02 Detalle por proyecto

Seguimiento operativo de cada iniciativa: avance, próximos hitos, dependencias, riesgos y responsables.

03 Modelo vivo y evolutivo

La PMO revisa el funcionamiento del ciclo y ajusta sesiones, ceremonias y entregables a medida que avanza.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE CONTEXTO · BORRADOR

Escucha EX en Proyectos

Procedimiento de la Oficina de Gestión del Cambio (CMO) para medir cómo viven las personas los proyectos organizativos y detectar a tiempo necesidades de información, claridad de rol, motivación, confianza y resistencias al cambio.

Objetivo · alcance · calendario · encuestas



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Escucha EX | Objetivo y alcance (BORRADOR)

Escuchamos a las personas del proyecto y a los colectivos impactados.

Cada colectivo tiene momentos de escucha y objetivos de medición definidos dentro del procedimiento.

01 Personas del proyecto

- Se les pregunta desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto.
- Mide comprensión, claridad de rol, coordinación, autonomía, información, motivación y confianza.
- Detecta de forma temprana posibles resistencias al cambio.

02 Colectivos impactados

- Se les pregunta al inicio, para conocer sus expectativas ante el cambio.
- Y cuando el proyecto ya tiene funcionamiento real o entregables visibles.
- Identifica si entienden el cambio, qué impacto perciben y si les aporta valor.

Para qué sirve la medición

La escucha permite acompañar, comunicar mejor y activar mejoras durante todo el proyecto.

Acompañar a los equipos

Detecta a tiempo necesidades de información, claridad de rol y coordinación para dar el apoyo adecuado.

Ajustar la comunicación

Adapta mensajes y canales según cómo viven el proyecto las personas participantes e impactadas.

Detectar palancas de mejora

Identifica motivación, confianza y posibles resistencias para activar mejoras durante el desarrollo.

Escucha EX | Calendario y encuestas (BORRADOR)

Escuchamos tras el Kick Off, en el mes 1, cada 3 meses y tras cada formación.

01 Tras el Kick Off

LANZAMIENTO

Encuesta tras el Kick Off: valida si entienden el propósito, ven valor y se sienten motivados.

02 Mes 1

PRIMERAS SEMANAS

Medición inicial (solo si no hubo Kick Off): primera foto de cómo viven el proyecto.

03 Cada 3 meses

SEGUIMIENTO

Seguimiento periódico: mide evolución de comprensión, valor, confianza, motivación y adopción.

04 Tras formación

APRENDIZAJE

Evalúa si la formación ayuda a trabajar mejor y adaptarse con éxito al cambio.

05 Colectivos impactados

TOWNHALL / SEMESTRAL

Encuesta inicial tras Townhall y medición semestral a las áreas impactadas.

Tipología de encuestas

Cuestionarios cortos y comparables que miden las mismas dimensiones en cada momento de escucha.

01 A personas del proyecto

Kick Off, mes 1, seguimiento trimestral y tras formación, con preguntas comunes y comparables.

02 A colectivos impactados

Encuesta inicial tras Townhall y medición semestral o tras hitos con impacto visible.

03 Dimensiones comunes

Comprensión, claridad de rol, valor percibido, confianza, motivación y adopción del cambio.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA. + PMO PERSONAS

Cuadro de mando global de KPIs

Seguimiento y gobierno coordinado de KPIs de negocio y KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos para disponer de una visión global de evolución e impactos.

Negocio · Personas · PMO Cía. · PMO Personas



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA + PMO PERSONAS

Cuadro de Mando global de KPIs de proyectos

Iniciar el trabajo conjunto para gobernar los KPIs de negocio y los KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos, con una visión única de evolución, impactos y decisiones.

01 **Gobierno coordinado**
PMO de la Cía. y PMO Personas con una cadencia común.

02 **Seguimiento integrado**
Negocio y Personas analizados en el mismo marco de decisión.

03 **Detección temprana**
Alertas sobre la evolución de KPIs por efecto de los proyectos en curso.

8 **Proyectos estratégicos**

Negocio + Personas

Un único cuadro de mando para entender cómo evolucionan los indicadores y dónde deben activarse decisiones o escalados.

Arranque de trabajo: coordinación PMO Cía. + PMO Personas

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tarea PMO · Gobierno de KPIs

Modelo de seguimiento y gobierno de KPIs

Construir una visión integrada de los 8 proyectos estratégicos para seguir evolución, impactos y decisiones en Negocio y Personas.

KPIs negocio

Indicadores de avance, operación, calidad, eficiencia y adopción de cada proyecto.

KPIs personas

Impactos en personas, FTE, formación, productividad, adopción, clima y capacidades.

Cuadro de mando global de proyectos

Vista única para comparar evolución, desviaciones y señales de impacto en los 8 proyectos estratégicos.

Gobierno y decisiones

PMO Cía. + PMO Personas

Cadencia común de seguimiento, lectura de alertas y escalado de decisiones cuando los KPIs muestren desviaciones o impactos relevantes.

01 Definir catálogo
KPI, fuente, owner y frecuencia.

02 Consolidar datos
Negocio + Personas en una vista común.

03 Activar alertas
Detectar evolución e impactos por proyecto.

04 Gobernar acciones
Seguimiento, decisiones y escalados.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA DE RETROSPECTIVA · MEJORA EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Glosario unificado y Kit de Supervivencia

Dos tareas de mejora surgidas de la retrospectiva mensual: generar un glosario de términos unificado y un kit de supervivencia para la gestión de proyectos, dirigidos a los gestores de proyectos.

Glosario unificado · kit de supervivencia · gestores de proyectos




En marcha: glosario común y Kit de Supervivencia

Ambos entregables ya están disponibles para el equipo de gestión de proyectos: ahora toca mantenerlos vivos y actualizados.

Glosario de terminología común

Ya creado y en uso: un vocabulario único para que todos los gestores de proyectos hablemos de lo mismo.

Se ha creado un **agente de IA** de soporte a la PMO orientado a facilitar la consulta del glosario y la terminología utilizada en los proyectos de transformación



Kit de supervivencia

Ya disponible la primera versión del Kit de Supervivencia para Coordinadores de Proyecto, fruto de los acuerdos de la última retrospectiva mensual.

Manual en texto: metodología, herramientas, recomendaciones y material de apoyo en detalle.
Versión visual: mismo contenido resumido en presentación para consulta rápida.

Estado: material ya compartido y en uso; es una primera versión revisable, abierta a comentarios y propuestas de mejora.
Próximo paso: mantenimiento continuo para que no quede obsoleto y biblioteca de guías rápidas con infografías temáticas.

ANEXOS DE CONTEXTO

Funciones Perscom en proyectos

Mapa de funciones expertas para anticipar impactos, activar soporte transversal y clarificar responsabilidades durante la ejecución.



Funciones expertas · impactos · soporte transversal

Impactos y responsabilidades de cada función

Mapa de funciones expertas donde anticipar impactos y activar soporte transversal.

Relación empleado

condiciones de trabajo, horarios, RRLL, subcontratación, políticas y procedimientos.

Compensación

retribución fija, incentivos y posibles revisiones salariales. Incoherencia retributiva.

HR Analytics

KPIs de proyecto, datos de personas, equipos, FTE y organigrama numérico. Impacto en plan de personas: Productividad y Eficiencia.

Formación

skilling, re-skilling y nuevas habilidades.

Desarrollo

vacantes, designaciones, recolocaciones y planes de carrera, potenciales, desempeño y medición de skills.

Procesos

impactos con PeopleSoft, accesos, árboles organizativos, gestión de la PMO y herramientas.

Selección

incorporaciones externas: plantilla o mercantiles.

Organización

Impacto en estructura organizativa, nuevos roles y medición de la experiencia.

Comunicación

Mensajes, activación interna y gestión del cambio. Escaletas y conversaciones.

Rol de Gestión del Cambio: Visión Global de la Organización y sus impactos. Coherencia Organizativa. Avance en la transformación.
PMO: planificación y coordinación.



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE PROYECTOS

Documentación adicional de los proyectos



Anexos de proyectos tecnológicos

Anexo: Plan de proyecto CRM

Coordinador Proyecto: **Jesus Ortega**

Esta previsto alcanzar este año que es lo siguiente: Cumplimiento de los hitos de proyecto CRM para 2026:

(1) Adjudicación de plataforma de CRM e implantador.
(2) Definición del set-up tecnológico para poder desarrollar el proyecto, comprendiendo decisiones de arquitectura funcional, arquitectura de datos, desarrollo e implementación.
(3) Implementación de las Fase I del proyecto (Ficha de cliente, Agendas, CTI, Identificación de cliente, datos).

Anexo: Plan de proyecto CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**


Pendiente de replanificación

Anexo: Plan de proyecto CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

Interno

Plan de proyecto: Global

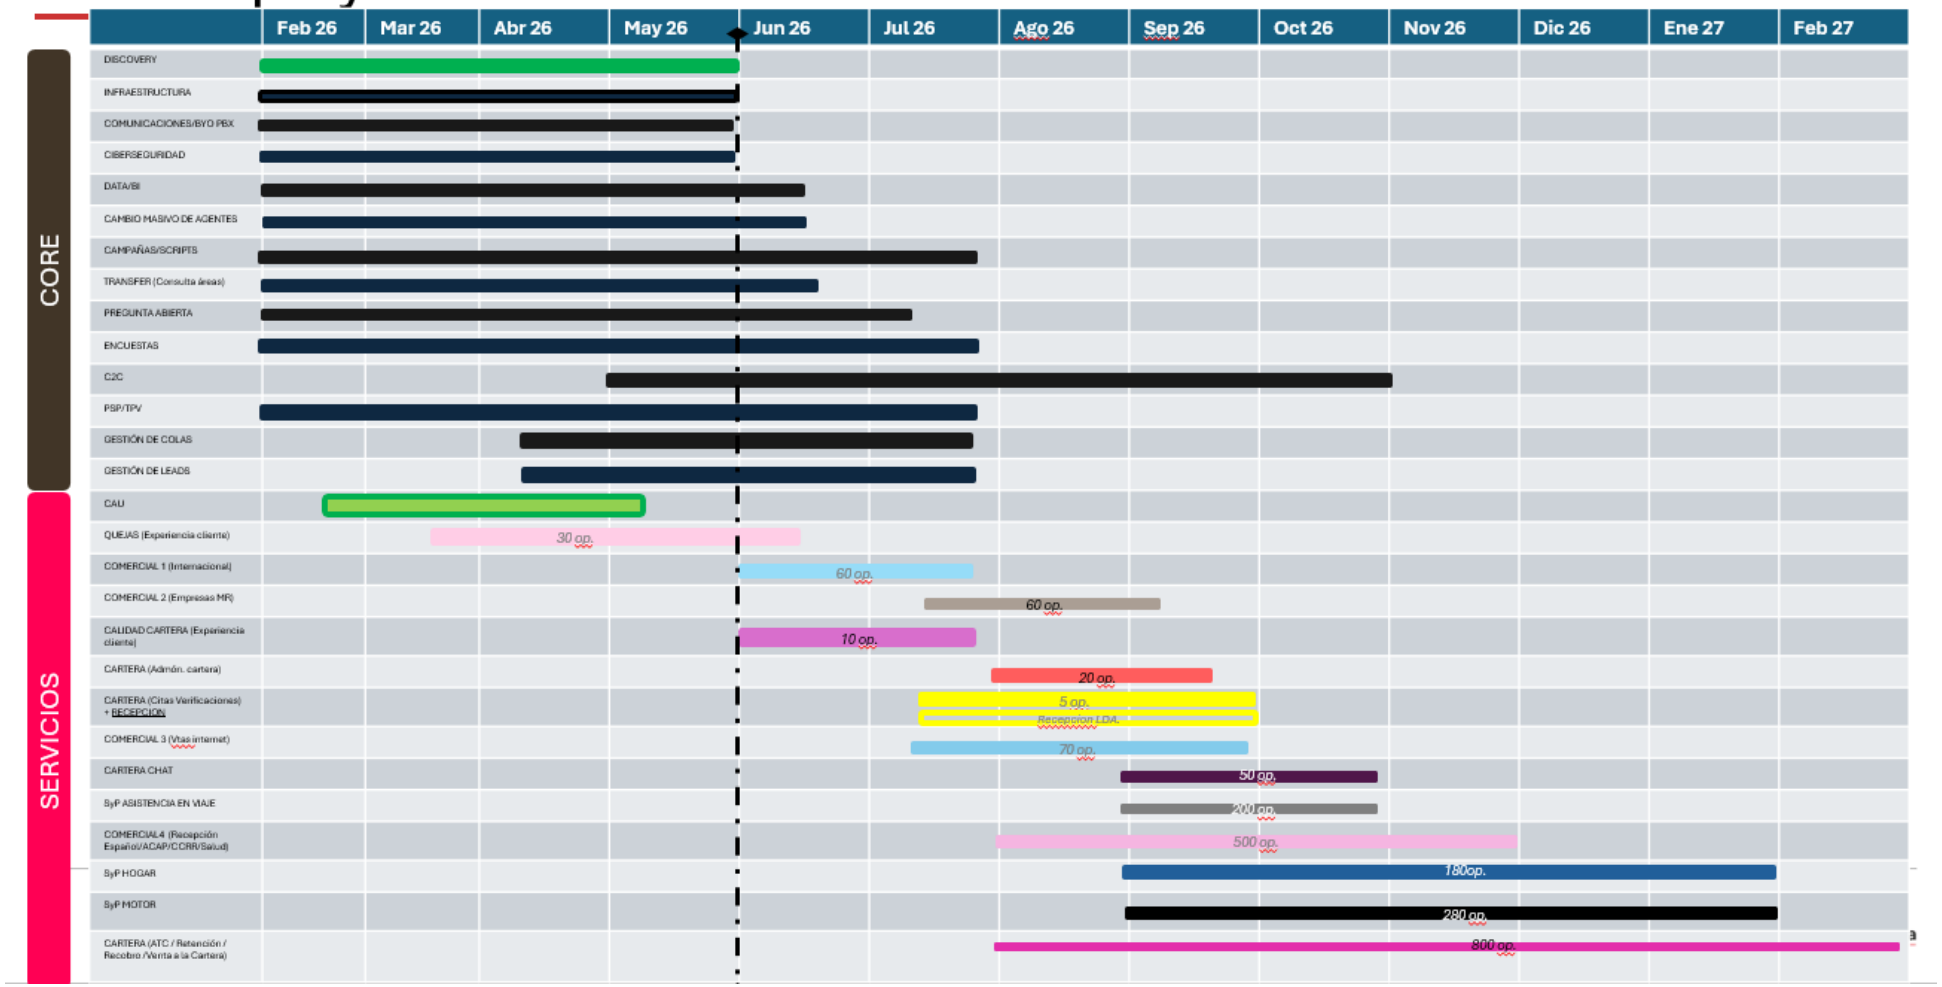

Anexo: Identificacion de Quick Wins y aportación de valor CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

INICIATIVA : CONSOLA UNICA INTEGRADA CON EL SSO.

- Descripcion:
  - La nueva plataforma de Contact Center proporcionará una **consola única de gestión y operación**, integrada con el sistema corporativo de **Single Sign-On (SSO)**, que permitirá a los usuarios acceder de forma segura a todas las funcionalidades necesarias para su trabajo mediante una única autenticación corporativa.
  - Desde esta consola centralizada, agentes, supervisores, planificadores y administradores podrán acceder a capacidades como atención omnicanal, gestión de interacciones, monitorización, reporting, calidad, grabación, workforce management e integraciones con CRM y aplicaciones corporativas, sin necesidad de utilizar múltiples credenciales o cambiar entre diferentes aplicaciones.
- Beneficios Esperados:
  - Mejora de la productividad de los usuarios
  - Experiencia de usuario más sencilla y eficiente
  - Mayor seguridad y cumplimiento
  - Reducción de incidencias y soporte
  - Incorporación y movilidad más ágiles
- Posible Estimación :
  - Ahorro gestión operativa : 15 minutos día * **x** personas de CC. (estimación)
  - Reducción incidencias contraseñas
  - Ahorro formativo inicial compañía y en actualizaciones o subidas de versión

INICIATIVA : ANALISIS Y EXPLOTACION DE DATOS

- Descripcion:
  - Vamos a disponer de un único, unificado y consolidado Modelo de Datos. Podremos tener un ID único de interacción con toda la información y visión cliente. No habrá que consolidar ni unificar modelos de datos.
- Beneficios esperados:
  - ¡¡ 2026 y primer Q 2027 impacto negativo en los equipos de BI y análisis y soporte sala, planificación, ya que en un primer momento supone adaptar todos los procesos de análisis y explotación a un nuevo modelo de datos.
  - Una vez rehechos dichos procesos, debería mejorar :
    - La visión global de cliente
    - Calidad en el dato. Unificación de criterios (englobado y perfectamente coordinado además con el gobierno del dato).
    - Evitamos interpretaciones distintas, y macheo o verificación de datos.
    - Mejor calidad de las decisiones.
- Posible Estimación :
  - Tiempo en consolidación y explotación de distintos modelos de datos : Deberámos estimar cuanto tiempo, en los cierres de mes, en el cálculo de incentivos o en creación de módelos o análisis se invierte en la interpretación, corrección de errores y macheo sinnecesari. Ese tiempo * **x analistas** (pendiente de estimar tiempo de dedicación a estas tareas)

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: Identificacion de Quick Wins y aportación de valor CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

INICIATIVA : TRANCRIPCION

- Descripción:
  - Disponibilidad de la transcripción de la conversación del cliente, para revisión o analytics posterior para conseguir eficiencias, argumentarios, información de la competencia, etc....
- Beneficio esperado:
  - En un primer momento (2027) hay que construir o adaptar el modelo de explotación de estas transcripciones. Una vez hecho los beneficios pueden ser:
    - Argumentarios de ventas o retención
    - Conocimiento de la competencia
    - Mejora de la calidad percibida por el cliente
- Posible estimación:
  - ¿Incremento de la retención?
  - ¿incremento de la venta?

INICIATIVA OMNICANALIDAD.

- Descripción.
  - Posibilidad de gestionar las interacciones del cliente por el canal más conveniente para generar la mejor de las experiencias.
- Beneficio esperado.
  - Facilidad en la gestión de la operación
  - Mejor experiencia de cliente
- Posible estimación:
  - Reducción de rellamada (5%)

INICIATIVA : VISIBILIDAD SOBRE CC EXTERNOS

- Descripción :
  - Posibilidad de grabar las conversaciones de nuestros clientes aunque vaya a cc externo. (generalistas, PYMES, etc.....)
- Beneficio esperado:
  - Control de la interacción
  - Aumento de la calidad al poder revisar estos audios
  - Optimización del presupuesto destinado a CC Externo.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: IA VOZ: Clasificacion de llamadas ASIVIA

Coordinador Proyecto: **Quique Cid**

Solicitud Grua	jul-26 29/07/2026	Tot Jul/26	% Total Jul	% 29/07
Total Llamadas	2.053	**45.603**		
No Identificados	165	**3.534**	7,75%	8,04%
No es Cliente Activo	32	**494**	1,08%	1,56%
Cobertura Neumáticos	22	**549**	1,20%	1,07%
No tiene Asistencia en Viaje	8	**125**	0,27%	0,39%
LOPD KO	87	**3.663**	8,03%	4,24%
Cliente VIP		**4**	0,01%	0,00%
Mayor 80 años	8	**165**	0,36%	0,39%
Marca Fraude		**6**	0,01%	0,00%
Poliza Empresas		**12**	0,03%	0,00%
Mas de 3 Solic 30d	6	**76**	0,17%	0,29%
Desvio WEB	296	**6.931**	15,20%	14,42%
Extranjero	3	**118**	0,26%	0,15%
Exp Grua Abierto	761	**17.487**	38,35%	37,07%
Rellamada en 24 hras	1	**41**	0,09%	0,05%
Cuelgues	228	**3.922**	8,60%	11,11%
Total Autogestión (completa o parcial)	**430**	**8.385**	**18,39%**	**20,94%**
Sin Expediente creado	175	**3.781**	45,09%	40,70%
Con expediente creado	255	**4.604**	54,91%	59,30%
Autogestion completa (no quiere nada más)	**241**	**4.352**	**51,90%**	**56,05%**
¿Quiere Algo Mas? (autogestión parcial)	**14**	**250**	**2,98%**	**3,26%**

Anexo: Objetivos de Proyectos estrategicos

Nuevo TPA: Implementación (OK PAP) de la Fase 0 del cambio de TPA (aquella que cubre la funcionalidad que ahora nos proporciona DKV)

Nuevo Contact Center: migrar CORE y 5 servicios antes de final de año (de un total de 10 servicios identificados)

Reingeniería siniestros hogar: cumplir los objetivos de NSS de hogar con y sin rehúse

Reingeniería siniestros motor: aprobación en Q1 de alcance 2026 y KPIs objetivo.

ANEXOS DE PROYECTOS

Listado de tareas pendientes

Seguimiento de pendientes, responsables y próximos pasos para asegurar el cierre y activar escalados cuando sea necesario.

Pendientes · responsables · fechas objetivo · estado



Objetivo: pasar del listado al cierre efectivo.

Cada pendiente debe tener dueño, fecha objetivo y una próxima acción clara.

ANEXO · SEGUIMIENTO PMO

Listado de tareas pendientes

Tarea	Pendiente	Próximo paso	Resp./apoyo	Fecha obj.	Estado
Proyectos	Marco común de KPIs	Revisión con responsables	PMO + Resp	Agosto 26	**En curso**
IA Voz	Slide de externalización tras proyectos de IA.	Preparar borrador y validar mensaje.	PMO	Pte.	**Pendiente**
Contact Center	Revisión modelo formación PaP.	Diseñar nueva propuesta.	Ana Rodríguez	Agosto 26	**En curso**
Encuestas opinión	Arrancar con C. Ex; SyP queda para más adelante al no tener equipos definidos.	Confirmar alcance inicial y dependencias.	PMO	Pte.	**A priorizar**
Sitios	Entender el tema sitios.	Recopilar contexto e impacto en Personas.	PMO	Pte.	**Pendiente**
HCM	Preparar información HCM.	Ver siguientes pasos…	PMO	Junio 26	**En curso**
Perseo	Completar ficha de Perseo SyP	Definir Tareas, KPIs y bloqueos	Pedro Sanchez	Pte.	**Pendiente**

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
