
SEGUIMIENTO SEMANAL

# Informe de seguimiento de proyectos estratégicos corporativos

## PMO Personas

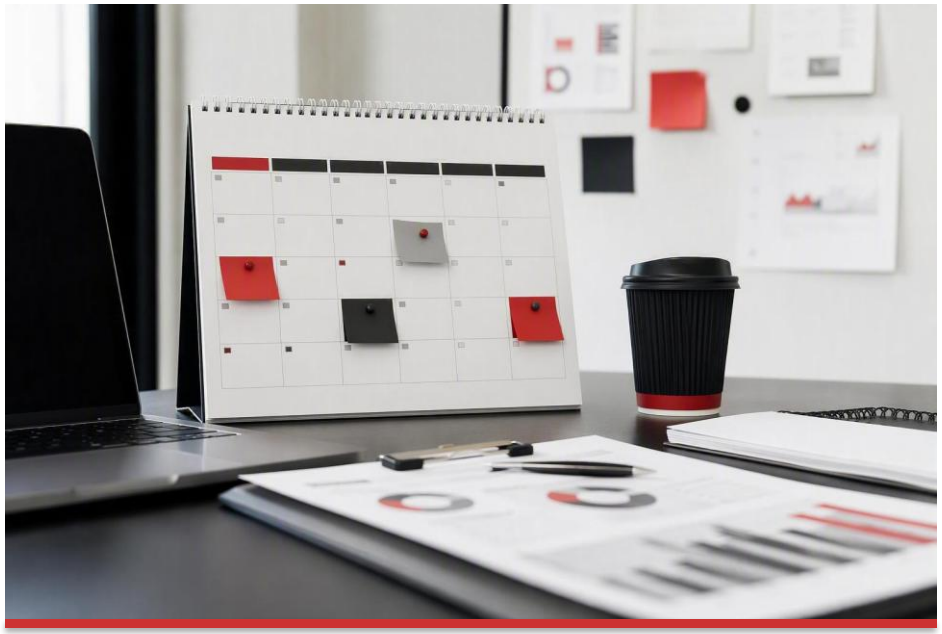

Semana 35 · 24/08/2026 – 28/08/2026

INFORME EJECUTIVO

# Índice


## 01 Resumen ejecutivo, avance de los proyectos
Status Agosto

## 02 Detalle por iniciativa
Fichas de proyectos estratégicos

## 03 Información Calidad Cia.
Objetivos 2026, evolución NSS / NSA / NPS y previsión de agosto

## 04 Dimensiones RRHH identificadas para el área
Palancas de gestión de personas y su impacto en el portfolio

## 05 Anexos de Contexto
KPIs, metodología, funciones Perscom, gobierno de Formación, históricos y material de apoyo


linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

## Los proyectos avanzan, retos:

Proyecto **Contact Center** en curso en negocio (Comercial), analizando las dependencias e impactos futuros con el proyecto **CRM** . El Contact Center pendiente de  replanificación para un mayor ajuste en el PaP de empresas (actualmente pendiente de resolución de incidencias del PaP de internacional y en especial de poder lanzar la emisión). Próxima planificación primera semana de septiembre
En el proyecto de **Agilidad** se sigue trabajando en la creación de los equipos y los dominios y se espera cerrar la información en las próximas semanas, prioridad **SyP** para entrar con todo lo detectado en el primer balance.

FOCO ACTUAL

### Contact Center  | Genesys Cloud

Pendiente recibir y cerrar la replanificación con tiempos de estabilización tras cada PaP. Continúa la revisión del modelo formativo; Calidad y Quejas han cerrado sus encuestas e Internacional lo hará a finales de septiembre.

**KPIS**; En proceso de estudio y acuerdo de KPIS de Personas y de negocio junto con la PMO de Cia.

### IA Voz, ASIVIA, IA Chat y Perseo

IA Voz en análisis nuevos casos de uso para SyP Motor, retención y posibles avances en ASIVIA y analiza dependencias para futuras aperturas.
Perseo extender la clausula de IA responsable a toda la Cia. Y de analizar con LOPD los impactos en los CallCenter Externos.
Haciendo seguimiento de migración de servicios de Chat a Hapyy Robot.

**SyP**; Pendiente reunión con BIP para arranque de prioridades, QuikWin, cierre de equipos Squad (Agile) y coordinación con Hogar.

## Prioridades inmediatas

- **CRM y Contact Center** — Trabajar las sinergias de ambos despliegues y cerrar la replanificación de implantación de nuevos servicios.
- **Agilidad** — Cerrar la **creación de los equipos de los dominios**; se espera la información completa en las próximas semanas.
- **Reingeniería SyP** — Anticipar la formación ante posibles cambios de procesos y operativas que afecten a las personas.
- **Salud** — Avisar con antelación del plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos con el nuevo servicio médico.
- **IA y Perseo** — Priorizar casos de uso con eficiencia real e incorporar métricas de Perseo al seguimiento PMO.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

DETALLE POR INICIATIVA

# Fichas de proyectos

Seguimiento individual de los proyectos



**Estado · KPIs · hitos · próximos pasos**

# 1 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CRM

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

**Objetivo de Proyecto**: Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | | |
|---|---|---|
| Incio de Escuchas en Negocio y Grabaciones de pantalla (Galgo) | Talento Negocio | 18, 19, 25 y 26 de AGOSTO |
| Pulsos (encuestas empleados) | Talento Negocio, Comunicación y Talento Corporativo | Trabajo en Agosto Lanzamiento Septiembre/Octubre |
| Selección externa Freeland | Selección | En búsqueda (1 pers). |
| Revision RV Mensual previo al CRM (Incentivos de los comerciales) | Compensacion | Reunión 26/08 |
| Plan de comunicación | Comunicación interna | En curso Agosto / Septiembre |

## Impactos Proyecto

Encuestas(EX), Talento negocio, comunicación, Talento Corporativo. Compensación y Selección.

## Riesgos

(1) Impacto CRM en **incentivos mensuales** (2027)

## Bloqueos

Sin bloqueos

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | - | 0 % | - | 0 % |
|---|---|---|---|---|
| avance | Retribución Variable | Productividad | Absentismo | Avance de implantación (personas) |

Hasta 2027 no impacta en Personas

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)




## QuickWins Eficiencias 2026

**Eficiencia**:

- Sin impacto en 2026,
- Considerando impactos en 2027 tras análisis de BC en Seprtiembre.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 2 – Ficha de seguimiento del Proyecto: AGILIDAD Tecnología y Transformación

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Marta Ruano)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

**Objetivo de Proyecto:** Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > | En curso

| | |
|---|---|
| **Definicion de personas en equipos** | **Septiembre** |
| Comunicación de creación de dominio Syp a Implicados | Pri, Semana Septiembre |
| Dominio Servicios y Prestaciones es el siguiente que se sube a la agilidad. | 07/09 |
| Definicion de perfiles de Dominio de Servicios y Prestacion | 10/09 |
| Lanzamiento encuestas | ¿? |

## Impactos Proyecto

Organización, Incentivos Trimestrales,

## Riesgos

(1) Transición entre modelos, Roles actuales vs nueva estructura, incertidumbres sobre las función.
(2) Resistencia al cambio con separar los productos. (desconocimiento de como va)
(3) Afecta a RV Trimestral del 3Q
(4) Falta Repsonsables de dominio Suscricion , técnico y POs (ventas cartera….)

## Bloqueos

(1) Colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | 0 | 0 | 21 |
|---|---|---|---|
| avance | KPI 1 | KPI 1 | Avance de implantación (personas) |

Pendiente definir KPIs

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Definicion de personas en equipos

Sept

## QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Interno

# 3 – Ficha de seguimiento del Proyecto: GOBIERNO DEL DATO

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Amaya Hurtado)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

**Objetivo de Proyecto:** Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre dominios definidos (clientes, pólizas, siniestros, calidad, finanzas…), sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | |
|---|---|
| **Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward)** | En curso Diciembre 2026 |
| Cambio de plataforma Analítica | En curso 18/09 |
| **integrador SDG está realizando un diagnóstico** | En curso |
| Encuentro de Comunicación, nombramiento data Owner, Roadmap y lanzamiento Development Center | 18/09 |
| Calendario entregado | 30/09 |
| Pulso | |

## Impactos Proyecto

Organización
Nuevos roles y funciones
Formación gestión de cambio
Comunicación

## Riesgos

Sin riesgos

## Bloqueos

Sin bloqueos


## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | 0 | 0 | 29 |
|---|---|---|---|
| avance | KPI 1 | KPI 1 | Avance de implantación (personas) |

Pendiente definir KPIs

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

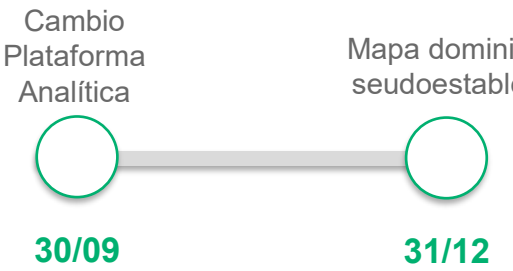


## QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

fuera de la organización.

# 4 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo** (Backup Quique Cid)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Proyecto con Anexo

Seguimiento Semanal

**Objetivo de Proyecto:** Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | | |
|---|---|---|
| **Replanificación en cascada del anexo Contact Center** | ● | **En curso** |
| Incorporar cláusula específica asociada al uso de IA en Genesys | ● | En curso |
| Entrada proximos equipos: **Empresas**: preparación reforzada, reunión final de agosto y nuevo calendario Teleco pendiente. | ● | Previsto semana del 28 -Septiembre |
| Encuestas de opinión Quejas y Calidad | ● | Finalizadas |
| Encuestas de opinión Internacional | | Finales Septiembre |

## Impactos Proyecto en funciones

Analítica, Compensación, Formación negocio, Comunicación, Relación empleado y PMO. Internacional ha evidenciado que el impacto se concentra más en planificación, soporte, supervisión, formación y análisis que en una limitación tecnológica. Se requiere reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de próximos PaP

## Riesgos

(1) Incremento puntual de abandono en PaP complejos por dimensionamiento, vacaciones, bajas/licencias y adaptación operativa.
(2) Sobrecarga de equipos de soporte, supervisión y análisis durante los PaP.
(3) Necesidad de replanificar en cascada los próximos despliegues para evitar solapes, picos de negocio y falta de preparación previa.
(4) Información a empleados y externos sobre grabación, transcripción y uso de IA en Genesys Cloud.
(5) - 3 Vacantes en BI

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

**Verde**
avance

KPIs a seguir en equipos migrados: seguimiento de impacto en abandonos y calidad (NSS)

**70**
**4,66 % del colectivo completo**
Avance implantación (personas)

**Análisis KPIs:** en Internacional se observa un incremento puntual del abandono, explicado principalmente por factores de dimensionamiento, adaptación operativa y menor capacidad de desborde durante el arranque. No se identifica como una limitación tecnológica de Genesys Cloud..

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)




## Quick Wins Eficiencias 2026

- Ahorro en gestión operativa de 15 minutos por FTE en el CallCenter.
- Mejora en la información disponible para el Análisis y explotación de los datos (equipo de Análisis).
- Optimización del presupuesto de Callcenter Externos
- Omnicanalidad reducción de rellamadas del 5%.
- Facilitador y acelerador para el proyecto de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 5 – Ficha de seguimiento del Proyecto: REINGENIERIA SYP

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Arancha Fernández** (Backup Eduardo Castro)

**Objetivo de Proyecto:** Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). **El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la viison de cliente.**

VER HISTÓRICO > En curso

## Tareas Proyecto

| | | |
|---|---|---|
| TO BE: Identificación de iniciativas y lanzamiento de quick-wins | ● | 30/09 |
| TO BE: Rediseño y modelado de procesos | ● | 16/11 |
| TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos | ● | 30/11 |
| Business case y plan de implantación | ● | 09/12 |

## Impactos Proyecto

Análisis, Laboral – **Formación** y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral, Pulsos

## Riesgos

(1) Definición de los **equipos de trabajo** (squad) y perímetros de los quad de motor y hogar para repartir los equipos.
**(2) Incorporaciones externas**: Responsable dominio SyP.
(3) Vigilar la **resistencia al cambio** y composicion de la plantilla (antigüedad, edad y especialización)
(4) Generar impacto posito en primeros casos de uso..
(5) **No existe documentación** de procedimientos
(6) Analizar plan de formacion si es necesario para este proyecto

## Bloqueos

Sin bloqueos

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | 6,66 % | 28.289 | 4,34 % | 0 |
|---|---|---|---|---|
| avance | +3,87 | | -0,34 | |
| | Abandonos Acumulado mes a 24/08 | Llamadas Acumuladas | Absentismo Area | Avance de implantación (personas) |

Hasta Septiembre no impacta en Personas

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)




## QuickWins Eficiencias 2026

Pendiente analizar ppt enviada por BIP. Objetivo cumplimiento plan FTEs 2026

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 6 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CALIDAD HOGAR

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

**Objetivo de Proyecto**: Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | |
|---|---|
| Apertura delegada IPAS | Realizado |
| Apertura delegada HomeServe | En curso Octubre 2026 |
| Rehuses de apertura: Comunicaciones por grupo de causa.<br>Seguimiento por tipo de rehuse | En curso<br>En curso |

## Impactos Proyecto

-

## Riesgos

(1) No están trabajando en modo Agile y no entraran hasta Septiembre
(2) Equipo sobredimensionado frente a motor

## Bloqueos

Sin bloqueos

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

**Verde**
avance

**5,35 %**
**10.049 LL**
Abandonos Hogar

| | | |
|---|---|---|
| IPAS COB COMPL | 11.776 | 11,47% |
| IPAS HOGAR | 19.849 | 7,83% |

Abandonos IPAs

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

| Rehuses de apertura | Apertura delegada HomeServe |
|---|---|
| En curso | 31/10 |

## QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 7 – Ficha de seguimiento del Proyecto: SALUD

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Alicia Gutiérrez** (Backup Quique Cid)

**Objetivo de Proyecto**: Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

VER HISTÓRICO > En curso

## Tareas Proyecto

| | |
|---|---|
| **Cambio de TPA (HNA)** | En curso 01/27 |
| Supervisión de Proveedor (HNA) | En curso |
| Solicitud de Vacante ~~interna~~ y externa (abiertas) **Pasan a ser las dos externas)** | En curso Septiembre 26 |
| Generado Plan de formación Pendiente de validación por equipo de proyecto. | 25/Agosto Validacion 01/09 |
| Plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos clientes con nuevo servicio medico | Noviembre |

## Impactos Proyecto

Formacion, Selección Externa e interna, Organización, Comunicación interna y externa, Gestion del cambio

## Riesgos

(1) Falta de recursos internos futuro (equipo asistencial (Septiembre 2026)
(2) Entrada en vigor de cambio de TPA después del Enero para renovaciones de Colectivos y la mayoría de las polizas de salud
(3) Formacion muy adelantada al PaP de la TPA al equipo aisistencias que generar retrabajos de formación.
(4) 2 vacantes externas (CORGA – EXPPROSALUDCALIDAD)

## Bloqueos

Sin bloqueos


## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| avance | NPS | Satisfaccion Formacion | Autorizaciones gestionadas | Avance de implantación (personas) |

KPIs en definición

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)




## QuickWins Eficiencias 2026

**Eficiencia**: Sin impacto en 2026, el cambio de TPA no se implanta hasta finales de Enero del 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ CHAT CLIENTES

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

**Objetivo de Proyecto:** Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > | En curso

| | | |
|---|---|---|
| **Gestion SyP Motor ( Definicion Casos de uso – Gestion de dendencias SYP Motor - Happy Robot)** | | **En definicion** |
| Apertura SyP (Analisis dependencias para apertura de partes en IA VOZ) | | En definición |
| Migracion de servicios actuales a Happy Robot | | Estimacion sobre Mayo 2027 |

## Impactos Proyecto

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas).

## Riesgos

Migración del chat de casos de uso activos, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP.

## Bloqueos


Sin bloqueos

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | 242K | 3.503 / 4.887 | - |
|---|---|---|---|
| avance | Total Llamadas Julio 26 | Total Autogestionadas Acumulado a 13 Agosto 26 | Avance de implantación (personas) |

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)




## QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

# 8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ ASIVIA

Proyecto con Anexo

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

**Objetivo de Proyecto:** Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en servicios de Asistencia en Viaje.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | |
|---|---|
| **Analisis Insatisfechos en encuestas y llamadas de gestión de asistencia** (Deteccion de mejoras)<br>- Deteccion correcta de teléfonos, direcciones y valoraciones en en encuestas | Continuo/periódico (diario) |

## Impactos Proyecto

Disminucion del abandona de llamadas y aumento de la digitalización de clientes.

## Riesgos

(1) Impacto de la eficiencia en la personas (a gestionar)

## Bloqueos

Sin bloqueos

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | 3,95% | 4,64% | 65,01 % | 10,74% | 67 % |
|---|---|---|---|---|---|
| avance | Absentismo | Abandono | Exp. Digitalizacion | Exp. Digital IA Voz | NSA |
| | | + 0,81 | -0,88 | +3,87 | |

Acumulado Mes Agosto

| -2,3 % | -6,7 % |
|---|---|
| FTE Interno | FTE Externo |

**Análisis KPIs:** avance positivo en digitalización IA Voz y mejoras de identificación/LOPD; las eficiencias FTE corresponden a ASIVIA y deben separarse del seguimiento general de IA Voz y Chat.

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Identificacion ANI
Repregunta LOPD

**29/07**

**QuickWins Eficiencias 2026**

En construccion

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA CHAT (Lupe)

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

**Objetivo de Proyecto:** Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | | |
|---|---|---|
| **Reentrenamiento GP** | | En curso |
| Reentrenamiento Generales (Temáticas recibos y cambios de póliza) | | En curso |

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Verde | - | - | - |
|---|---|---|---|
| avance | KPI 1 | KPI 1 | Avance de implantación (personas) |

KPIs en definición

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

## Impactos Proyecto

Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

## Riesgos

Sin riesgos

## Bloqueos

Sin bloqueos

## QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Comercial

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

**Objetivo de Proyecto:** Monitoreo, etiquetado y marcado de ítems de calidad de una muestra de las llamadas de comercial para mejorar 1) Calidad 2) Argumentos/procesos 3) Coachings 4) Fraude

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

| | |
|---|---|
| Desplegado en todo comercial. | En producción |
| Empresas está empezando | En producción |
| Analizando mejoras en ratios de cancelación | En curso |
| Vigilancia de los coachings | En curso |
| Caso de uso fraude en la venta | Pendiente |
| Productos pequeños. Necesidad de más muestra de llamadas analizadas | Pendiente |
| Dashboard para formación | Pendiente |

## Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio.

## Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

## Bloqueos

Producto Salud. Revisiones con OPD

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recepción | 8,7% -2,0 Absentismo | 7,3% -0,5 Rotación Voluntaria | 28,9% +0,7 Póliza/llamada Recepción Motor |
| Internet | 14,8% -1,4 Absentismo | 17,6% +0,1 Rotación Voluntaria | 28,6% -0,9 Póliza/llamada Emisión Motor |

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Dashboard formación

14/08

## QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# 9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Cartera

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

**Objetivo de Proyecto:** Monitoreo, etiquetado y análisis de llamadas para mejorar el coste de negociación

## Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO >

| | En curso |
|---|---|
| Perseo desplegado en sala retención | En producción |
| Coaching | En producción |
| Analizando mejoras en costes de negociación | En curso |
| Validación información Cross Interno | En curso |
| Análisis de los tiempos de llamada | En curso |

## Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio

## Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

## Bloqueos

Venta Cross EXTERNO pendiente cláusulas de contrato

## KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

| Absentismo | Rotación Voluntaria | CM Salvada Core |
|---|---|---|
| 9,7% ↓ -0,3 | 8,9% ↓ -1,4 | 42,5 ↓ -2,2 |

## Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Producción



31/07

## QuickWins Eficiencias 2026

En revision

KPIs DE CALIDAD

# Información Calidad Compañía


Indicadores de Calidad de la Compañía (NSS, NSA y NPS) facilitados por el equipo de Calidad: objetivos 2026, evolución global y detalle por línea de negocio.


**Satisfacción · recomendación · previsión**



# Objetivos 2026

## Acumulado LDA

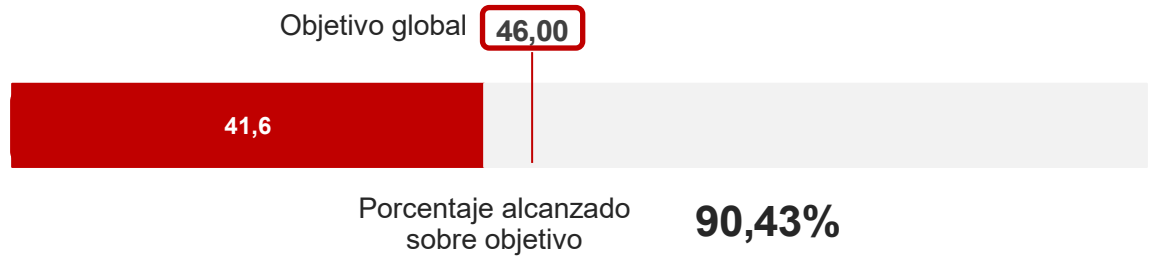

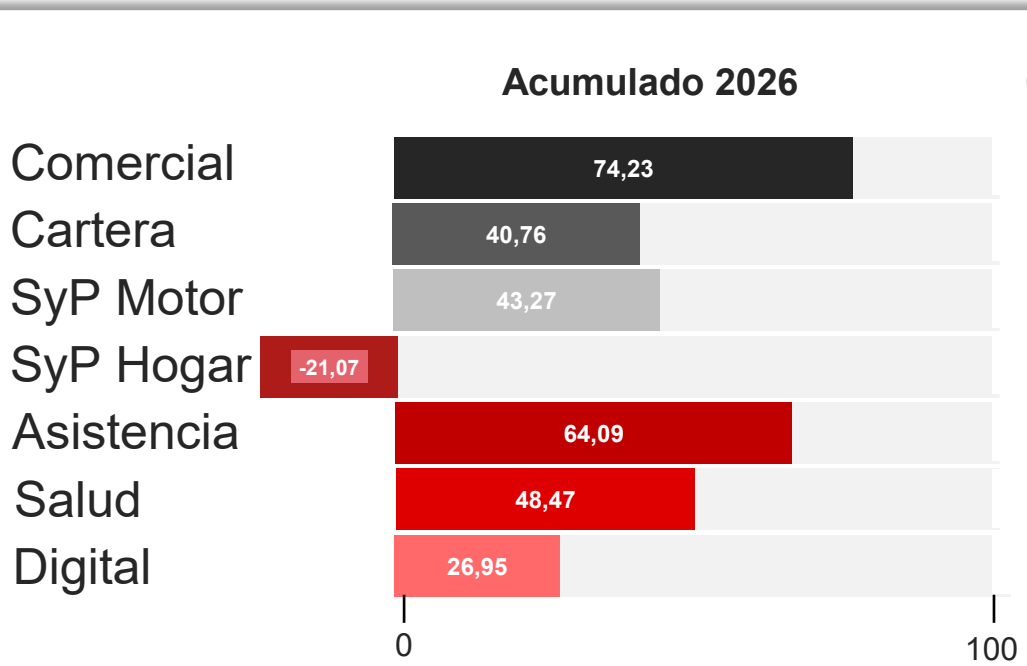




| | Objetivo | Diferencia | Porcentaje alcanzado |
|---|---|---|---|
| Comercial | 74,00 | + 0,23pp | 100,31% |
| Cartera | 45,00 | -4,24pp | 90,58% |
| SyP Motor | 48,00 | -4,73pp | 90,15% |
| SyP Hogar | 0,00 | -21,07pp | -26,62% |
| Asistencia | 65,00 | -0,90pp | 98,60% |
| Salud | 42,00 | + 6,47pp | 115,40% |
| Digital | 32,00 | -5,05pp | 84,22% |

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# EVOLUCIÓN GLOBAL LINEA DIRECTA
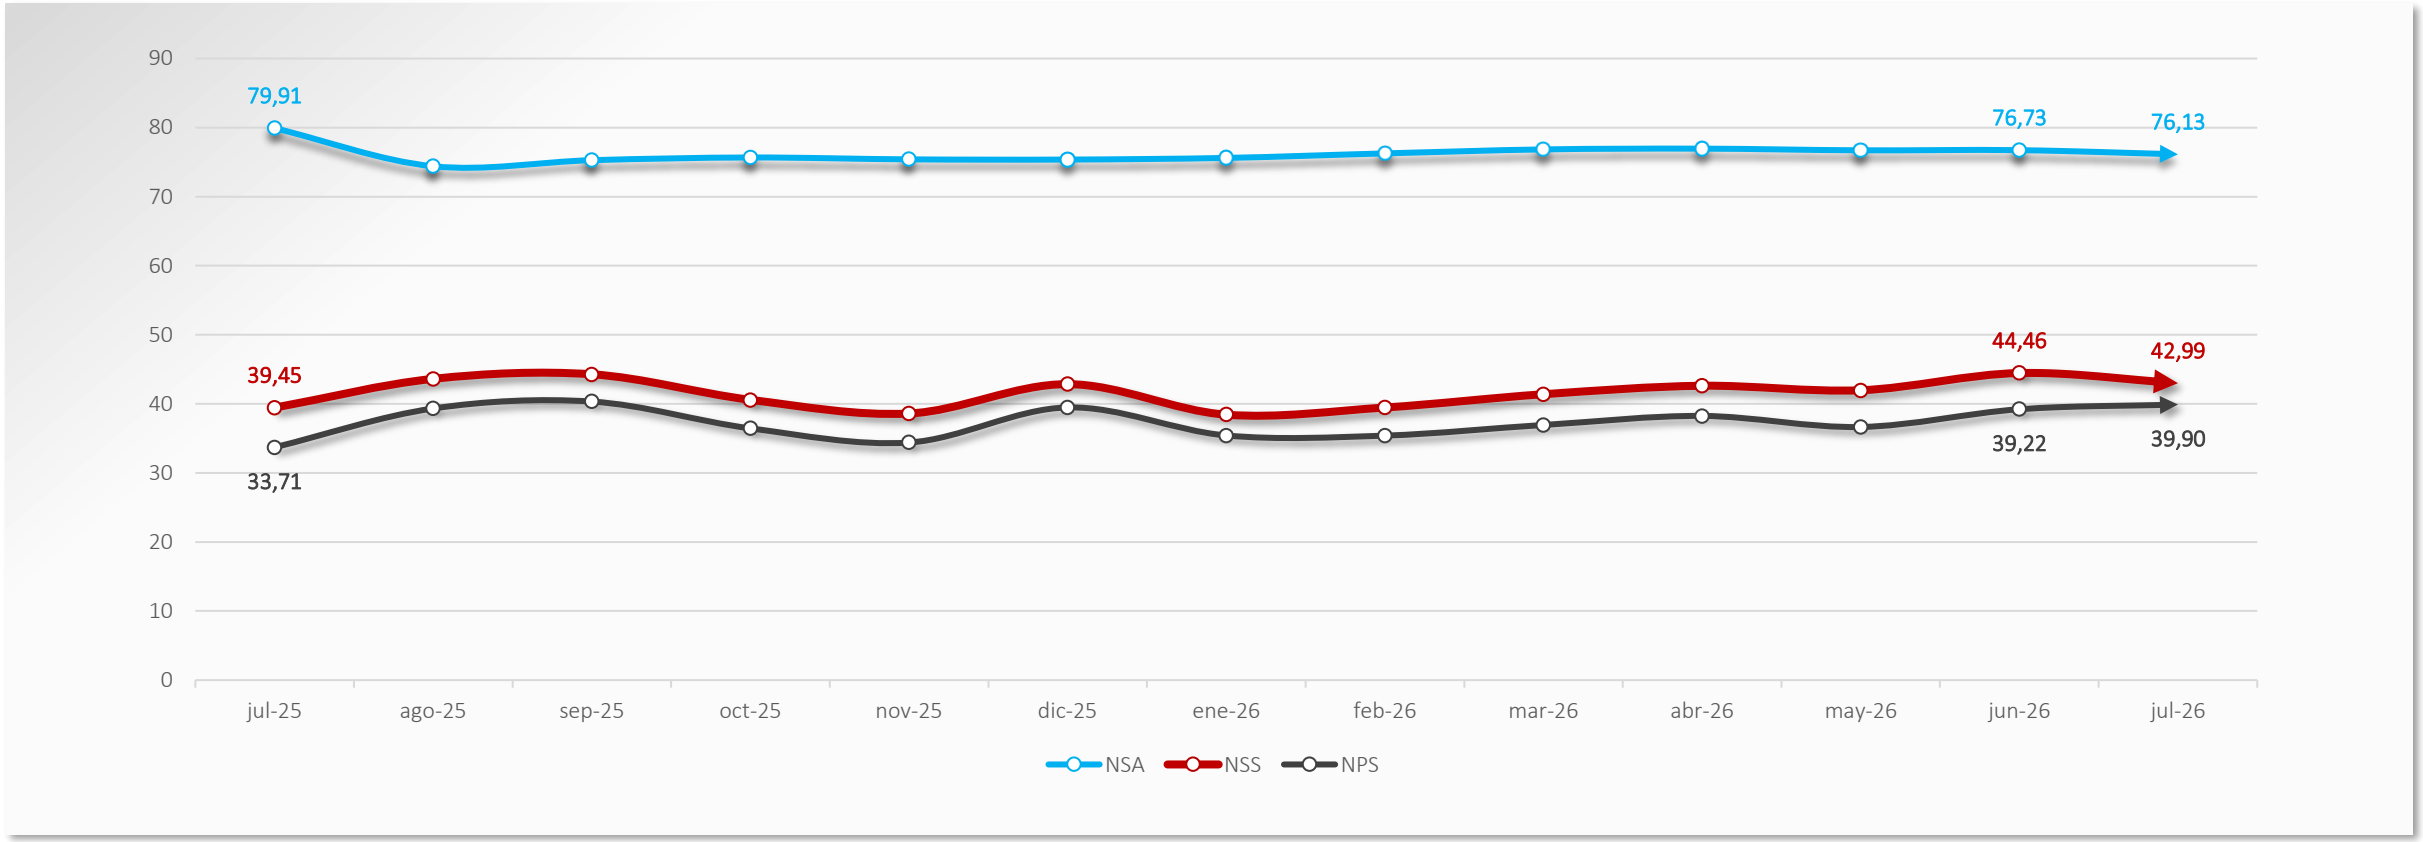
| | | | |
|---|---|---|---|
| nss | 42,99 | -1,47 jun-26 | +3,54 jul-25 |
| nps | 39,90 | +0,68 jun-26 | +6,19 jul-25 |
| nsa | 76,13 | -0,60 jun-26 | -3,78 jul-25 |





linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# Resumen NPS

Datos julio 2026

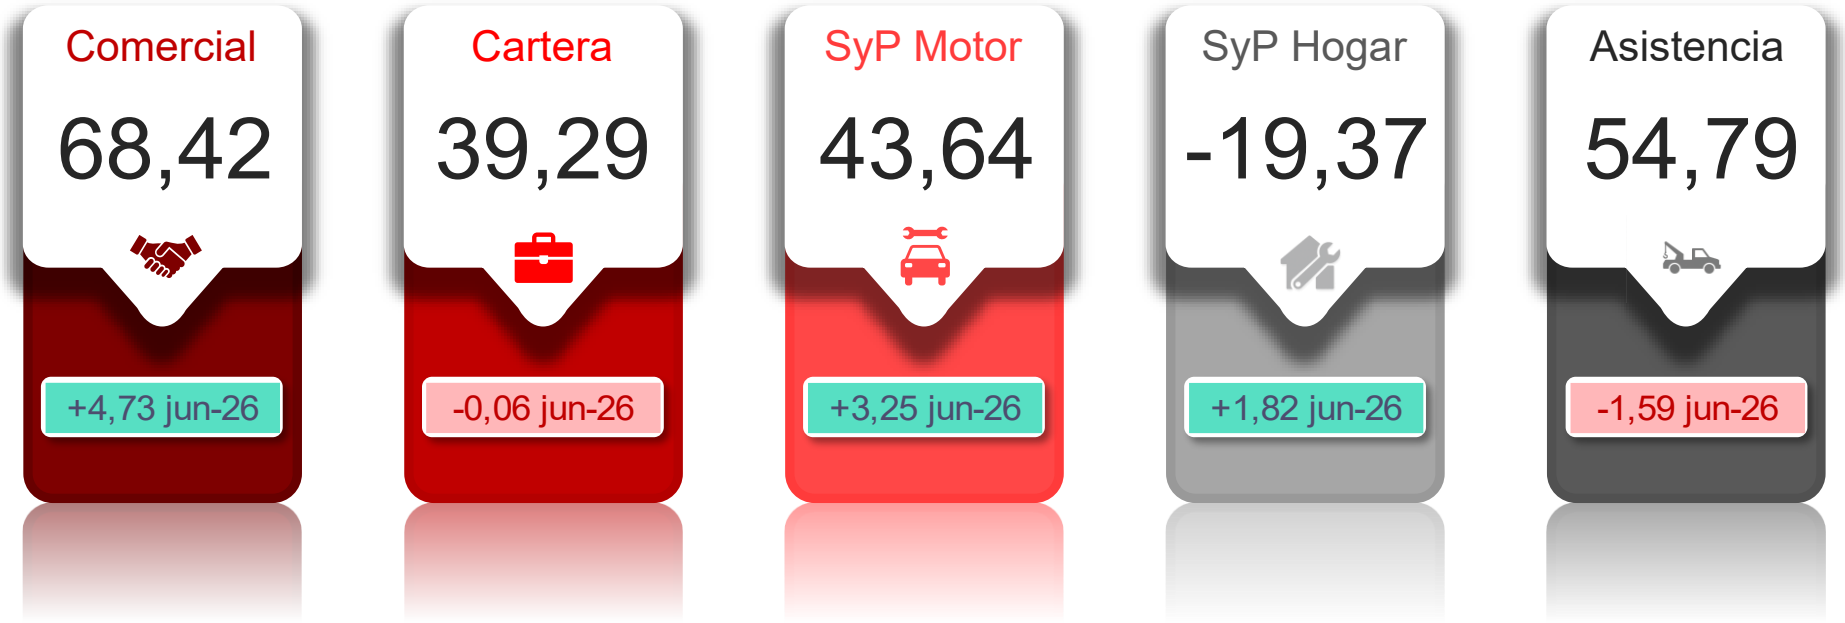


Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

# Evolución Indicadores Calidad

Previsión Agosto 2026 · estimación interna PMO a partir de los datos parciales del mes

**Motivo del deterioro previsto**

Los abandonos registrados durante agosto están presionando a la baja los tres indicadores. La previsión se apoya en los datos parciales del mes y se confirmará con el cierre que remita el equipo de Calidad.

## Julio 2026 vs Agosto 2026

# Dimensiones RRHH identificadas para el área

## Foco de trabajo de Personas/PersCom: organizar los nuevos modelos de trabajo, acompañar la estrategia de negocio en la implantación y a las personas.

Trabajando en (1) Diagnósticos de Call Center Externos y posible impactos de la IA en llamadas externalizadas para gestionar. (2) Coordinar los KPIS de los proyectos estratégicos con la PMO (seguimiento de negocio y de impacto en personas). (3) Seguimiento de Perseo.

### Modelo y organización

**01 Nuevos roles**

- Proyecto agiLiDAd: definir roles en los equipos y funciones, modelo/estructura organizativa y como transitar.

**02 Impacto Organizativo**

- Definir personas de los equipos y comunicarlo: SyP, GB…
- Convivencia de los proyectos estratégicos y las nuevas formar de trabajar (Todos: Hogar, SyP…).

**03 Diagnóstico talento**

- Detectar necesidades: Res. de Dominio y POs de Transformación.
- Identificar los perfiles necesarios para los proyectos (anticipación).

**04 Gestión del cambio**

- Pulsos de Opinión colectivos.
- Gestion de inquietudes individuales.

### Activación de funciones necesarias

**05 Incorporaciones**

- Coordinar vacantes: Líder TD SyP, Líder de Suscripción, POs,, Líder Gobierno del Dato…

**06 Formación**

- Contact Center: rediseño de formación para próximos colectivos, reforzando soporte previo, píldora de refresco y contenidos prácticos.

**07 Marco de trabajo**

- Retribución. Fijar RV Trim 3Q y 4Q.
- PS/HCM: Registrar en PS las personas por colectivos, dedicación y “figuras” especificas.
- Modelo de trabajo RRHH. Afinar PMO (Herramientas y funciones), avanzando la coordinación con la PMO de Cia.

**08 Productividad**

- Recogiendo impactos en plan 2026.
- Proyectar impactos en el plan 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE CONTEXTO

# Información de contexto

Cartelas de apoyo para interpretar el informe, alinear criterios y consultar marcos de trabajo específicos cuando sea necesario.

**iesgos · funciones Perscom · Anexos**



ANEXOS DE CONTEXTO

# Marco común de KPIs

Primera propuesta de catálogo corporativo de indicadores: qué incluye, cómo seleccionar los KPIs de cada proyecto y qué familias están disponibles para medir avance e impacto con criterios comunes.

**Catálogo · KPIs y KRIs · selección · reporte**



# Marco común de KPIs: primera propuesta del catálogo

El equipo de People Analytics ya ha compartido la primera propuesta de catálogo de indicadores para el seguimiento de proyectos.

## Qué tenemos disponible

Un catálogo con **120 indicadores**: 10 de People Analytics, con posibilidad de drilldown, y 110 KRIs corporativos.

Está publicado en la carpeta compartida y es una propuesta abierta: no es una lista cerrada, se puede modificar y enriquecer.

## Cómo lo usamos

**Cada responsable de proyecto elige los indicadores útiles** para medir su proyecto.

Se analizarán las propuestas de indicadores nuevos que no estén recogidos en el catálogo.

Los indicadores no accesibles para el equipo de análisis no podrán reportarse.

**Objetivo: un marco común de KPIs para medir y comparar el avance de los proyectos con criterios homogéneos.**
**Próximo paso: cada coordinador revisa el catálogo y propone nuevos indicadores y selecciona sus indicadores de seguimiento de su proyecto.**

# Catálogo de indicadores: familias disponibles

120 indicadores agrupados en 12 familias, para que cada proyecto seleccione los que mejor miden su avance e impacto.

## Personas, cliente y tecnología

People Analytics **10**
Personas y talento **8**
Ciberseguridad y tecnología **11**
Cliente y servicio **14**
Cumplimiento y regulación **8**
Digital y canales **13**

## Negocio, riesgo y operación

Finanzas, solvencia y riesgo **14**
Marca y reputación **5**
Operaciones y eficiencia **5**
Productos y negocio asegurador **11**
Proyectos estratégicos **2**
Siniestros, reservas y recobro **20**

**Los 10 indicadores de People Analytics permiten drilldown; los 110 KRIs recogen la visión corporativa de riesgo y negocio. ¿Falta algo? Se pueden proponer indicadores nuevos y se analizará su incorporación al catálogo.**

ANEXOS DE CONTEXTO · BORRADOR

# Escucha EX en Proyectos

Procedimiento de la Oficina de Gestión del Cambio (CMO) para medir cómo viven las personas los proyectos organizativos y detectar a tiempo necesidades de información, claridad de rol, motivación, confianza y resistencias al cambio.

**Objetivo · alcance · calendario · encuestas**



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA. + PMO PERSONAS

# Cuadro de mando global de KPIs

Seguimiento y gobierno coordinado de KPIs de negocio y KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos para disponer de una visión global de evolución e impactos.

**Negocio · Personas · PMO Cía. · PMO Personas**



linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA + PMO PERSONAS

# Cuadro de Mando global de KPIs de proyectos

Iniciar el trabajo conjunto para gobernar los KPIs de negocio y los KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos, con una visión única de evolución, impactos y decisiones.

**01** **Gobierno coordinado**
PMO de la Cía. y PMO Personas con una cadencia común.

**02** **Seguimiento integrado**
Negocio y Personas analizados en el mismo marco de decisión.

**03** **Detección temprana**
Alertas sobre la evolución de KPIs por efecto de los proyectos en curso.

**8** **Proyectos estratégicos**

**Negocio + Personas**

Un único cuadro de mando para entender cómo evolucionan los indicadores y dónde deben activarse decisiones o escalados.

**Arranque de trabajo: coordinación PMO Cía. + PMO Personas**

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tarea PMO · Gobierno de KPIs

# Modelo de seguimiento y gobierno de KPIs

Construir una visión integrada de los 8 proyectos estratégicos para seguir evolución, impactos y decisiones en Negocio y Personas.

## KPIs negocio

Indicadores de avance, operación, calidad, eficiencia y adopción de cada proyecto.

## KPIs personas

Impactos en personas, FTE, formación, productividad, adopción, clima y capacidades.

## Cuadro de mando global de proyectos

Vista única para comparar evolución, desviaciones y señales de impacto en los 8 proyectos estratégicos.

## Gobierno y decisiones

**PMO Cía. + PMO Personas**

Cadencia común de seguimiento, lectura de alertas y escalado de decisiones cuando los KPIs muestren desviaciones o impactos relevantes.

**01 Definir catálogo**
KPI, fuente, owner y frecuencia.

**02 Consolidar datos**
Negocio + Personas en una vista común.

**03 Activar alertas**
Detectar evolución e impactos por proyecto.

**04 Gobernar acciones**
Seguimiento, decisiones y escalados.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA DE RETROSPECTIVA · MEJORA EN GESTIÓN DE PROYECTOS

# Glosario unificado y Kit de Supervivencia

Dos tareas de mejora surgidas de la retrospectiva mensual: generar un glosario de términos unificado y un kit de supervivencia para la gestión de proyectos, dirigidos a los gestores de proyectos.




**Glosario unificado · kit de supervivencia · gestores de proyectos**

linea directa


# En marcha: glosario común y Kit de Supervivencia

Ambos entregables ya están disponibles para el equipo de gestión de proyectos: ahora toca mantenerlos vivos y actualizados.

## Glosario de terminología común

Ya creado y en uso: un vocabulario único para que todos los gestores de proyectos hablemos de lo mismo.

Se ha creado un **agente de IA** de soporte a la PMO orientado a facilitar la consulta del glosario y la terminología utilizada en los proyectos de transformación




## Kit de supervivencia

Ya disponible la primera versión del Kit de Supervivencia para Coordinadores de Proyecto, fruto de los acuerdos de la última retrospectiva mensual.

**Manual en texto:** metodología, herramientas, recomendaciones y material de apoyo en detalle.
**Versión visual:** mismo contenido resumido en presentación para consulta rápida.

**Estado: material ya compartido y en uso; es una primera versión revisable, abierta a comentarios y propuestas de mejora.**
**Próximo paso: mantenimiento continuo para que no quede obsoleto y biblioteca de guías rápidas con infografías temáticas.**

ANEXOS DE CONTEXTO

# Funciones Perscom en proyectos

Mapa de funciones expertas para anticipar impactos, activar soporte transversal y clarificar responsabilidades durante la ejecución.



**Funciones expertas · impactos · soporte transversal**


ANEXOS DE CONTEXTO · FUNCIÓN FORMACIÓN

# Formación: calendario global y capacidad

Modelo de trabajo para integrar las formaciones internas y de proyectos, anticipar solapes y validar la capacidad antes de los pases a producción.

**Calendario global · capacidad · riesgos · replanificación**

CALENDARIO GLOBAL · VISTA SEMANAL

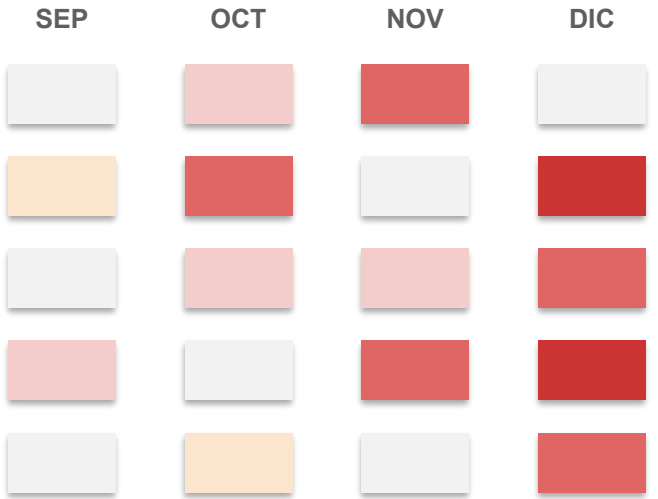


Más intensidad = mayor concurrencia o presión de capacidad

# Formación | Gestión de dependencias y cruces

## La función ordena el calendario global, detecta conflictos y coordina los ajustes necesarios

### 01 Reúne

**PLANIFICACIÓN ≥ 8 SEMANAS**

Recibe de los coordinadores las fechas y colectivos de las formaciones de proyecto y las integra con las formaciones internas.

### 02 Cruza

**CALENDARIO + CAPACIDAD**

Comprueba si coinciden formaciones sobre los mismos grupos o si faltan personas para impartirlas o acompañarlas.

### 03 Resuelve

**ANTES DEL BLOQUEO**

Alinea con los responsables qué priorizar, reforzar o mover y mantiene actualizado el cuadro de mando.

## Resultado: un calendario global viable

Formación anticipa los riesgos y coordina la solución; la PMO da visibilidad ejecutiva a los cruces y decisiones relevantes.

ANEXOS DE PROYECTOS

# Documentación adicional de los proyectos



## Anexos de proyectos tecnológicos
