
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos estratégicos corporativos

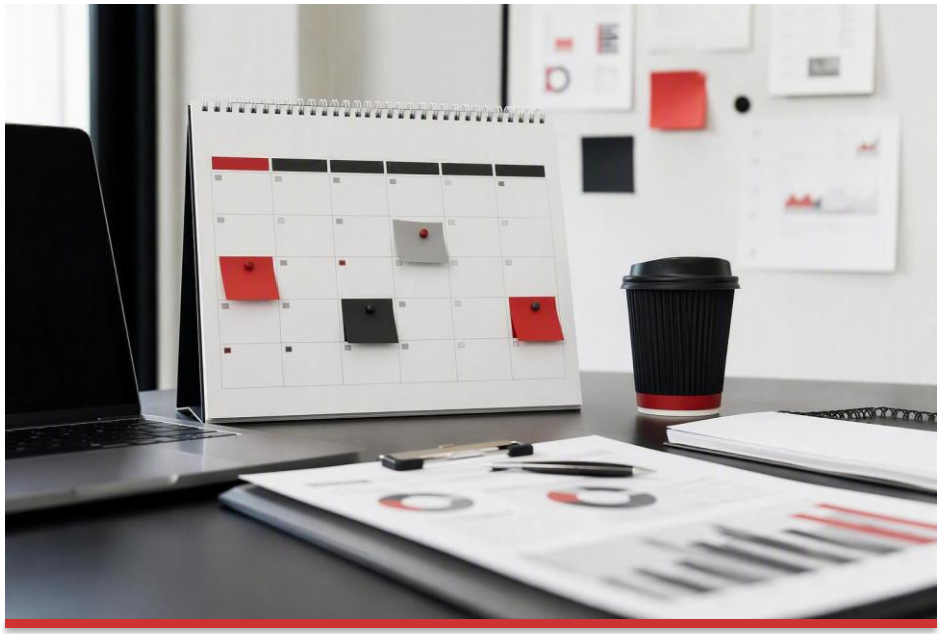

PMO Personas

Semana 36 · 31/08/2026 – 04/09/2026

INFORME EJECUTIVO

Índice

01 Resumen ejecutivo, avance de los proyectos
Status Semana 36

02 Detalle por iniciativa
Fichas de proyectos estratégicos

03 Avances de la PMO PersCom
Mejoras del modelo de seguimiento e histórico de avances

04 Información Calidad Cia.
Objetivos 2026, evolución NSS / NSA / NPS y previsión de agosto

05 Dimensiones RRHH identificadas para el área
Palancas de gestión de personas y su impacto en el portfolio

06 Anexos de Contexto
KPIs, metodología, funciones Perscom, gobierno de Formación, históricos y material de apoyo

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

Los proyectos avanzan, retos, foco y prioridades:

Proyecto Contact Center en curso en negocio (Comercial), analizando las dependencias e impactos futuros con el proyecto CRM . El Contact Center pendiente de replanificación para un mayor ajuste en el PaP de empresas (actualmente pendiente de resolución de incidencias del PaP de internacional y en especial de poder lanzar la emisión). Próxima planificación primera semana de septiembre

En el proyecto de Agilidad se sigue trabajando en la creación de los equipos y los dominios y se espera cerrar la información en las próximas semanas, prioridad SyP para entrar con todo lo detectado en el primer balance.

Foco Actual

Contact Center | Genesys Cloud

Pendiente recibir y cerrar la replanificación con tiempos de estabilización tras cada PaP. Continúa la revisión del modelo formativo; Calidad y Quejas han cerrado sus encuestas e Internacional lo hará a finales de septiembre.

KPIs

En proceso de estudio y acuerdo de KPIS de Personas y de negocio junto con la PMO de Cia.

IA Voz, ASIVIA, IA Chat y Perseo

IA Voz en análisis nuevos casos de uso para SyP Motor, retención y posibles avances en ASIVIA y analiza dependencias para futuras aperturas.

Perseo extender la clausula de IA responsable a toda la Cia. Y de analizar con LOPD los impactos en los CallCenter Externos.

Haciendo seguimiento de migración de servicios de Chat a Hapyy Robot.

Reingeniería SyP

Pendiente reunión con BIP para arranque de prioridades, QuikWin, cierre de equipos Squad (Agile) y coordinación con Hogar.

Prioridades inmediatas

CRM y Contact Center

Trabajar las sinergias de ambos despliegues y cerrar la replanificación de implantación de nuevos servicios.

IA y Perseo

Priorizar casos de uso con eficiencia real e incorporar métricas de Perseo al seguimiento PMO.

Agilidad

Cerrar la creación de los equipos de los dominios; se espera la información completa en las próximas semanas.

Reingeniería SyP

Anticipar la formación ante posibles cambios de procesos y operativas que afecten a las personas.

Salud

Avisar con antelación del plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos con el nuevo servicio médico.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual de los proyectos



Estado · KPIs · hitos · próximos pasos

1 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CRM

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Encuesta predisposición al cambio	Talento Negocio, Comunicación y Organización	Trabajo en Septiembre Lanzamiento Octubre
Selección externa Freeland	Selección	En búsqueda (1 pers).
Revision RV Mensual previo al CRM (Incentivos de los comerciales)	Talento Negocio, Compensacion	Septiembre
Plan de comunicación (Oportunidad de cultura de negocio)	Talento Negocio, Comunicación interna	Lanzamiento semana 12 de Octubre (duración 4 semanas)
Definición de métricas de sala para monitorizar en la implantación (Operación pura)	Talento Negocio, Análisis	Septiembre
Focus validación ficha cliente 360 (maqueta)	Talento Negocio	07 al 11 de Septiembre

Impactos Proyecto

Encuestas(EX), Talento negocio, comunicación, Talento Corporativo. Compensación y Selección.

Riesgos

(1) Impacto CRM en **incentivos mensuales** (2027)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	0 %	-	0 %
avance	Retribución Variable	Productividad	Absentismo	Avance de implantación (personas)

Hasta 2027 no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia:

- Sin impacto en 2026,
- Considerando impactos en 2027 tras análisis de BC en Seprtiembre.

linea directa

2 – Ficha de seguimiento del Proyecto: AGILIDAD Tecnología y Transformación

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Marta Ruano)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > | En curso

Definicion de personas en equipos	**Septiembre**
Comunicación de creación de dominio Syp a Implicados	Pri, Semana Septiembre
Dominio Siniestros con Motor es el siguiente que se sube a la agilidad. (2 Quad)	07/09
Definicion de perfiles de Dominio y proyectos de Servicios y Prestacion	10/09
Definir/repensar Proyecto de Sinisteros Hogar (no entran en modo dominio/Quad)	
Lanzamiento encuestas	¿?
Cambio de herramienta de gestión de demanda (Jira)	¿?

Impactos Proyecto

Organización, Incentivos Trimestrales,

Riesgos

(1) Transición entre modelos, Roles actuales vs nueva estructura, incertidumbres sobre las función.
(2) Resistencia al cambio con separar los productos. (desconocimiento de como va)
(3) Afecta a RV Trimestral del 3Q
(4) Falta Repsonsables de dominio Suscricion , técnico y POs (ventas cartera….)

Bloqueos

(1) Colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	21
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Definicion de personas en equipos

Sept

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

3 – Ficha de seguimiento del Proyecto: GOBIERNO DEL DATO

Coordinador Proyecto: **Pilar Uguet** (Backup Amaya Hurtado)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre dominios definidos (clientes, pólizas, siniestros, calidad, finanzas…), sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward)	En curso Diciembre 2026
Cambio de plataforma Analítica	En curso 18/09
integrador SDG está realizando un diagnóstico	30/09
Encuentro de Comunicación, nombramiento data Owner, Roadmap y lanzamiento Development Center	18/09
Calendario entregado	30/09
Creacion de dominio de datos (Telefonia, Calidad y Digital)	¿?

Impactos Proyecto

Organización
Nuevos roles y funciones
Formación gestión de cambio
Comunicación

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	0	0	29
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

Pendiente definir KPIs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

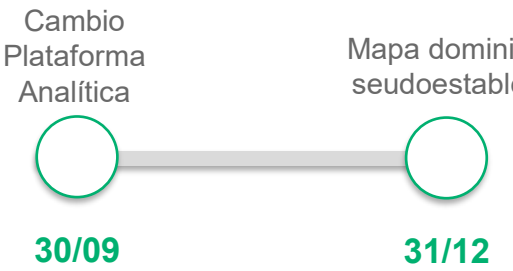

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

fuera de la organización.

linea directa

4 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CONTACT CENTER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo** (Backup Quique Cid)

IMPACTO EN RV Q3 26 >

Proyecto con Anexo

Seguimiento Semanal

Objetivo de Proyecto: Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Replanificación en cascada del anexo Contact Center	🟢	**En curso**
Incorporar cláusula específica asociada al uso de IA en Genesys	🟡	En curso
Entrada proximos equipos: **Empresas**: preparación reforzada, reunión final de agosto y nuevo calendario Teleco pendiente.	🟡	Previsto semana del 14 de Octubre
Encuestas de opinión Quejas y Calidad	🟢	Finalizadas
Encuestas de opinión Internacional		Finales Septiembre

Impactos Proyecto en funciones

Analítica, Compensación, Formación negocio, Comunicación, Relación empleado y PMO. Internacional ha evidenciado que el impacto se concentra más en planificación, soporte, supervisión, formación y análisis que en una limitación tecnológica. Se requiere reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de próximos PaP

Riesgos

(1) Incremento puntual de abandono en PaP complejos por dimensionamiento, vacaciones, bajas/licencias y adaptación operativa.
(2) Sobrecarga de equipos de soporte, supervisión y análisis durante los PaP.
(3) Necesidad de replanificar en cascada los próximos despliegues para evitar solapes, picos de negocio y falta de preparación previa.
(4) Información a empleados y externos sobre grabación, transcripción y uso de IA en Genesys Cloud.
(5) - 3 Vacantes en BI

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

KPIs a seguir en equipos migrados: seguimiento de impacto en abandonos y calidad (NSS)

70
4,66 % del colectivo completo
Avance implantación (personas)

Análisis KPIs: en Internacional se observa un incremento puntual del abandono, explicado principalmente por factores de dimensionamiento, adaptación operativa y menor capacidad de desborde durante el arranque. No se identifica como una limitación tecnológica de Genesys Cloud..

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



Quick Wins Eficiencias 2026

- Ahorro en gestión operativa de 15 minutos por FTE en el CallCenter.
- Mejora en la información disponible para el Análisis y explotación de los datos (equipo de Análisis).
- Optimización del presupuesto de Callcenter Externos
- Omnicanalidad reducción de rellamadas del 5%.
- Facilitador y acelerador para el proyecto de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

5 – Ficha de seguimiento del Proyecto: REINGENIERIA SYP

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Arancha Fernández** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). **El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la viison de cliente.**

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

TO BE: Identificación de iniciativas y ejecución de quick-wins	🟢	Q4
Definición de macroiniciativas de reingeniería del proceso	🟢	En curso
TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos	🟢	30/11
Business case y plan de implantación	🟢	09/12
Definición del KPI objetivo de automatización	🟠	En curso

Impactos Proyecto

Análisis, Laboral – **Formación** y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral, Pulsos

Riesgos

(1) Definición de los **equipos de trabajo** (squad) y perímetros de los quad de motor y hogar para repartir los equipos.
(2) Incorporaciones externas: Responsable dominio SyP.
(3) Vigilar la **resistencia al cambio** y composicion de la plantilla (antigüedad, edad y especialización)
(4) Generar impacto posito en primeros casos de uso..
(5) **No existe documentación** de procedimientos
(6) Analizar plan de formacion si es necesario para este proyecto

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	6,66 %	28.289	4,34 %	0
avance	+3,87		-0,34	
	Abandonos Acumulado mes a 24/08	Llamadas Acumuladas	Absentismo Area	Avance de implantación (personas)

Hasta Septiembre no impacta en Personas

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Alertas en CICOS para evitar reclamaciones incorrectas SDM (< 20.000 €).
Identificación de expedientes no reclamados.
Eliminación u optimización de listados operativos.
Homogeneización de la clasificación documental.
Reducción de accesos a múltiples portales de proveedores

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

6 – Ficha de seguimiento del Proyecto: CALIDAD HOGAR

Seguimiento Semanal

Coordinador Proyecto: **Jesús Ortega** (Backup Belen Ayala)

Objetivo de Proyecto: Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Apertura delegada IPAS	Realizado
Apertura delegada HomeServe	En curso Octubre 2026
Rehuses de apertura: Comunicaciones por grupo de causa. Seguimiento por tipo de rehuse	En curso En curso

Impactos Proyecto

-

Riesgos

(1) No están trabajando en modo Agile y no entraran hasta Septiembre
(2) Equipo sobredimensionado frente a motor

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde
avance

5,35 %
10.049 LL
Abandonos Hogar

IPAS COB COMPL	11.776	11,47%
IPAS HOGAR	19.849	7,83%

Abandonos IPAs

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Rehuses de apertura	Apertura delegada HomeServe
En curso	31/10

QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

7 – Ficha de seguimiento del Proyecto: SALUD

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Alicia Gutiérrez** (Backup Quique Cid)

Objetivo de Proyecto: Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

VER HISTÓRICO > En curso

Tareas Proyecto

Cambio de TPA (HNA)	En curso 01/27
Supervisión de Proveedor (HNA)	En curso
Solicitud de Vacante ~~interna~~ y externa (abiertas) **Pasan a ser las dos externas)**	En curso Septiembre 26
Generado Plan de formación Pendiente de validación por equipo de proyecto.	25/Agosto Validacion 01/09
Plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos clientes con nuevo servicio medico	Noviembre

Impactos Proyecto

Formacion, Selección Externa e interna, Organización, Comunicación interna y externa, Gestion del cambio

Riesgos

(1) Falta de recursos internos futuro (equipo asistencial (Septiembre 2026)
(2) Entrada en vigor de cambio de TPA después del Enero para renovaciones de Colectivos y la mayoría de las polizas de salud
(3) Formacion muy adelantada al PaP de la TPA al equipo aisistencias que generar retrabajos de formación.
(4) 2 vacantes externas (CORGA – EXPPROSALUDCALIDAD)

Bloqueos

Sin bloqueos


KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-	-
avance	NPS	Satisfaccion Formacion	Autorizaciones gestionadas	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

Eficiencia: Sin impacto en 2026, el cambio de TPA no se implanta hasta finales de Enero del 2027.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ CHAT CLIENTES

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > | En curso

Gestion SyP Motor (Definicion Casos de uso – Gestion de dendencias SYP Motor - Happy Robot)		**En definicion**
Apertura SyP (Analisis dependencias para apertura de partes en IA VOZ)		En definición
Migracion de servicios actuales a Happy Robot		Estimacion sobre Mayo 2027

Impactos Proyecto

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas).

Riesgos

Migración del chat de casos de uso activos, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP.

Bloqueos


Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	242K	3.503 / 4.887	-
avance	Total Llamadas Julio 26	Total Autogestionadas Acumulado a 13 Agosto 26	Avance de implantación (personas)

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)



QuickWins Eficiencias 2026

No reportados

linea directa

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA VOZ ASIVIA

Proyecto con Anexo

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en servicios de Asistencia en Viaje.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Analisis Insatisfechos en encuestas y llamadas de gestión de asistencia (Deteccion de mejoras) - Deteccion correcta de teléfonos, direcciones y valoraciones en en encuestas	Continuo/periódico (diario)

Impactos Proyecto

Disminucion del abandona de llamadas y aumento de la digitalización de clientes.

Riesgos

(1) Impacto de la eficiencia en la personas (a gestionar)

Bloqueos

Sin bloqueos

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	3,95%	4,64%	65,01 %	10,74%	67 %
avance	Absentismo	Abandono	Exp. Digitalizacion	Exp. Digital IA Voz	NSA
		+ 0,81	-0,88	+3,87	

Acumulado Mes Agosto

-2,3 %	-6,7 %
FTE Interno	FTE Externo

Análisis KPIs: avance positivo en digitalización IA Voz y mejoras de identificación/LOPD; las eficiencias FTE corresponden a ASIVIA y deben separarse del seguimiento general de IA Voz y Chat.

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Identificacion ANI
Repregunta LOPD

29/07

QuickWins Eficiencias 2026

En construccion

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

8 – Ficha de seguimiento del Proyecto: IA CHAT (Lupe)

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Quique Cid** (Backup Eduardo Castro)

Objetivo de Proyecto: Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Reentrenamiento GP		En curso
Reentrenamiento Generales (Temáticas recibos y cambios de póliza)		En curso

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Verde	-	-	-
avance	KPI 1	KPI 1	Avance de implantación (personas)

KPIs en definición

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Impactos Proyecto

Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

Riesgos

Sin riesgos

Bloqueos

Sin bloqueos

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Comercial

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

Objetivo de Proyecto: Monitoreo, etiquetado y marcado de ítems de calidad de una muestra de las llamadas de comercial para mejorar 1) Calidad 2) Argumentos/procesos 3) Coachings 4) Fraude

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO > En curso

Desplegado en todo comercial.	En producción
Empresas está empezando	En producción
Analizando mejoras en ratios de cancelación	En curso
Vigilancia de los coachings	En curso
Caso de uso fraude en la venta	Pendiente
Productos pequeños. Necesidad de más muestra de llamadas analizadas	Pendiente
Dashboard para formación	Pendiente

Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio.

Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

Bloqueos

Producto Salud. Revisiones con OPD

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Recepción	8,7% -2,0 Absentismo	7,3% -0,5 Rotación Voluntaria	28,9% +0,7 Póliza/llamada Recepción Motor
Internet	14,8% -1,4 Absentismo	17,6% +0,1 Rotación Voluntaria	28,6% -0,9 Póliza/llamada Emisión Motor

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Dashboard formación

14/08

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

9 – Ficha de seguimiento del Proyecto: Perseo Cartera

Seguimiento Mensual

Coordinador Proyecto: **Javier Gómez**

Objetivo de Proyecto: Monitoreo, etiquetado y análisis de llamadas para mejorar el coste de negociación

Tareas Proyecto

VER HISTÓRICO >

	En curso
Perseo desplegado en sala retención	En producción
Coaching	En producción
Analizando mejoras en costes de negociación	En curso
Validación información Cross Interno	En curso
Análisis de los tiempos de llamada	En curso

Impactos Proyecto

Análisis, Formación negocio

Riesgos

(1) Vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.

Bloqueos

Venta Cross EXTERNO pendiente cláusulas de contrato

KPI Personas de seguimiento de Proyecto (mensual)

Identificación con Equipo de Análisis

Absentismo	Rotación Voluntaria	CM Salvada Core
9,7% ↓ -0,3	8,9% ↓ -1,4	42,5 ↓ -2,2

Próximos hitos del proyecto (impacto en personas)

Producción



31/07

QuickWins Eficiencias 2026

En revision

PMO PERSCOM · SEMANA 36 - REUNIÓN DE COORDINADORES DE PROYECTOS Y FUNCIONALES

Resumen de la reunión de coordinadores

REUNIÓN · 2 SEP 2026

PMO PersCom

CRM · Ficha 360 y naming

EN CURSO

Plan de comunicación pendiente de validación; campaña de naming para sustituir a Galgo.
Semana del 7: entrevistas y focus groups sobre la maqueta de Ficha 360.

Agilidad · Dominios y squads

ATENCIÓN

Formaciones de Servicios y Prestaciones desde el día 7; Jira aprobado.
Pendiente la estructura de Calidad Hogar, los Product Owners y roles por cerrar.
Nueva estructura agile con responsables tecnológicos y la figura de facilitador en los squads.

Riesgo: montar los dominios y los equipos lleva más tiempo del planificado.

Plataforma y gobierno del dato

EN CURSO

Nuevo responsable y diagnóstico del proveedor en marcha.
Visión y planificación de implantación a finales de septiembre.
Se están montando tres dominios de datos, con sus roles de Data Owner, Steward y Custodian.

Telefonía · Genesys

ATENCIÓN

Incidencias abiertas tras el último pase a producción.
Siguiente pase no antes de octubre; se valora despliegue por fases.

Riesgo: el PaP de Empresas se replanifica a partir de mediados de octubre, con un retraso importante sobre la planificación inicial.

Reingeniería de SyP

EN CURSO

Diagnóstico presentado; mejoras a concretar en septiembre y ejecutar en el último trimestre.
RFP de IT abierta: sin proveedor ni calendario cerrado.

Calidad Hogar

EN CURSO

Nuevos grupos de causas: agua y daños eléctricos.
Pendiente la estructura de squads y confirmar los hitos de octubre.

Salud

EN CURSO

Gestión del cambio: formación, comunicación interna y a clientes en preparación.
Puesta en producción prevista hacia finales de enero.

IA Voz

EN CURSO

Happy Robot seleccionada como plataforma; migración de los servicios actuales.
Pendiente cerrar la priorización de los nuevos casos de uso.

8

proyectos revisados hoy

DECISIONES DE HOY

Comunicación Interna se incorpora a los seguimientos de proyecto.

En todos los proyectos, los pases a producción se harán con garantías antes que por calendario para no afectar al negocio de la Compañía.

Jira aprobado como herramienta del nuevo modelo de trabajo de dominios Agile.

PUNTOS DE CONTROL

Roles y dependencias: sobre todo en Agilidad y su cruce con Reingeniería SyP.

Capacidad: transversal, con los equipos tecnológicos compartidos entre todos los proyectos.

Fechas y entregables: pendientes de cerrar en Genesys, Reingeniería SyP y Calidad Hogar.

Proveedores: dependencia de la RFP de SyP y del diagnóstico de la plataforma de datos.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

PMO PERSCOM · CÓMO LO VEMOS

Cómo vemos la cartera desde la PMO

NUESTRA LECTURA · 2 SEP 2026

PMO PersCom

Lo que nos llevamos de la reunión de coordinadores y dónde creemos que hay que poner el ojo.

01 Ya no gestionamos proyectos sueltos

LO BUENO

Lo difícil ya no es arrancar. Ahora casi todo se toca entre sí: CRM con Comercial, RRHH, Datos y Telefonía; SyP con Agilidad y Operaciones; Salud con Cartera y Comunicación. Y el dato por debajo de todo.

02 Nos falta capacidad y se nota

OJO AQUÍ

Estamos pidiendo más de lo que los equipos pueden dar: dominios, tecnología y prioridades a la vez. Hoy no hay nada parado, pero la cuerda está tensa y preferimos decirlo antes de que se rompa.

03 Estamos pensando en las personas

BUENA SEÑAL

Ya no hablamos solo de tecnología: CRM cuida la comunicación y la experiencia de quien lo va a usar, Salud prepara formación y mensajes, y SyP mira cómo afecta al día a día. Buena señal: vamos hacia la implantación real.

04 El modelo aún se está colocando

EN DEFINICIÓN

Dominios, squads y roles siguen cerrándose. No nos alarma, pero nos obliga a explicarlo bien: si desde aquí dudamos de quién prioriza, los equipos también van a dudar.

05 Se acaba el papel: toca implantar

CRM empieza a validar con usuarios, Salud prepara la transición, Genesys sigue desplegando y SyP aterriza mejoras. Y cambia lo que nos tiene que quitar el sueño: ya no es definir bien, es que la gente lo adopte, que la operación aguante y que las áreas vayan a la vez.

SI SOLO NOS QUEDAMOS CON UNA IDEA

“Los proyectos avanzan. Lo que nos puede complicar el año no es sacar cada uno por separado, sino sostener a la vez tantas transformaciones que pelean por los mismos equipos y las mismas prioridades.”

NUESTRA CONCLUSIÓN

Vamos bien y nada está bloqueado, pero hemos cambiado de fase. A partir de aquí nos jugamos más en coordinar dependencias, cuidar la capacidad de los equipos y acompañar a quien va a vivir el cambio.

LO QUE NOS PREOCUPA AHORA

- Que el cambio no cale en la gente
- Que la operación sufra en los pases
- Que las áreas no vayan al mismo ritmo

EN QUÉ NOS VAMOS A METER

- Poner sobre la mesa las dependencias
- Dar visibilidad a la capacidad real
- Vigilar que cada proyecto llegue preparado

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

SECCIÓN · PMO PERSCOM EN EVOLUCIÓN

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Seguimiento semanal de lo que la PMO PersCom construye y mejora: gobierno de KPIs, gestión del conocimiento y evolución del propio informe. Mismo formato que el seguimiento de proyectos, con histórico acumulado.

Gobierno de KPIs · Conocimiento · Informe · Histórico



Seguimiento semanal · PMO

PMO PERSCOM · AVANCES DE LA SEMANA

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Qué hemos movido esta semana en gobierno de KPIs, conocimiento y modelo de seguimiento.

SEMANA 31 AGO – 4 SEP 2026

PMO PersCom

AVANCES DE LA SEMANA · AGRUPADOS POR BLOQUES

FOCO · EN CURSO · IMPLANTADO · CONTINUO · PROTOTIPO · DESCARTADO

GOBIERNO DE KPIs

Catálogo corporativo de indicadores — FOCO

Primera propuesta recibida: 120 KPIs y KRIs en familias de negocio, personas, cliente, operaciones, tecnología y riesgo.

Cuadro de mando global de KPIs — FOCO

Trabajo conjunto PMO Compañía + PMO Personas para visualizar de forma integrada los indicadores de negocio y personas.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del conocimiento — CONTINUO

Evolución del glosario común y del Agente IA de soporte a la PMO: terminología, metodología, roles y KPIs.

Kit de Supervivencia del Coordinador de Proyectos — IMPLANTADO

Manual ya entregado a todos los coordinadores y disponible para su uso.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Mejoras en las fichas de seguimiento de proyectos — IMPLANTADO

Incluidos en las fichas si el proyecto se ve Impactado en RV Trimestral y si es así que objetivos tiene, y también generadas las slides de tareas históricas por cada proyecto para no perder la evolución global..

Nuevo prototipo de ficha de seguimiento de proyecto — PROTOTIPO

En diseño: una ficha más visual que jerarquiza la información clave y dirige la atención del lector a lo relevante en un vistazo.

Nueva sección de avances de la PMO en el informe — IMPLANTADO

Este informe incorpora ya la sección semanal de avances de la PMO y su histórico de mejoras implantadas.

AVANCES ACTIVOS · SEMANA EN CURSO

7

tareas en seguimiento en 3 bloques de trabajo

ESTADO DE LOS AVANCES · ACTUALIZACIÓN SEMANAL

2	1	3	1
FOCO	CONTINUO	IMPLANTADO	PROTOTIPO

! FOCO ACTUAL DE LA PMO

Cerrar el catálogo de indicadores y su cuadro de mando global con la PMO de Compañía: es lo que permitirá medir todos los proyectos con el mismo criterio.

Qué necesitamos: que cada coordinador valide sus indicadores antes del cierre de mes.

VER HISTORICO DE AVANCES ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

PMO PERSCOM · HISTÓRICO DE AVANCES

Histórico de avances y mejoras de la PMO

3 AVANCES IMPLANTADOS

Registro acumulado de las mejoras ya implantadas por la PMO, agrupadas por bloque.

INFORME DE SEGUIMIENTO

25 – 29 AGO 2026

Incorporado en las fichas de proyecto el impacto en RV Trimestral junto con los objetivos del proyecto.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Creadas las slides de tareas históricas de proyectos para mantener listadas las tareas ya cerradas.

IMPLANTADO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

25 – 29 AGO 2026

Kit de Supervivencia del Coordinador de Proyectos entregado a todos los coordinadores y disponible para su uso.

IMPLANTADO

PRÓXIMA ENTRADA

Espacio reservado para el próximo avance implantado de este bloque.

3

avances implantados

IMPLANTADO · ÚNICO ESTADO DEL HISTÓRICO

+ CÓMO SE MANTIENE

Cuando un avance se implanta, pasa de la slide de avances de la semana a este histórico, dentro de su bloque.

VER AVANCES DE LA SEMANA ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - KPIs DE CALIDAD

Información Calidad Compañía


Indicadores de Calidad de la Compañía (NSS, NSA y NPS) facilitados por el equipo de Calidad: objetivos 2026, evolución global y detalle por línea de negocio.


Satisfacción · recomendación · previsión



Objetivos 2026

Acumulado LDA



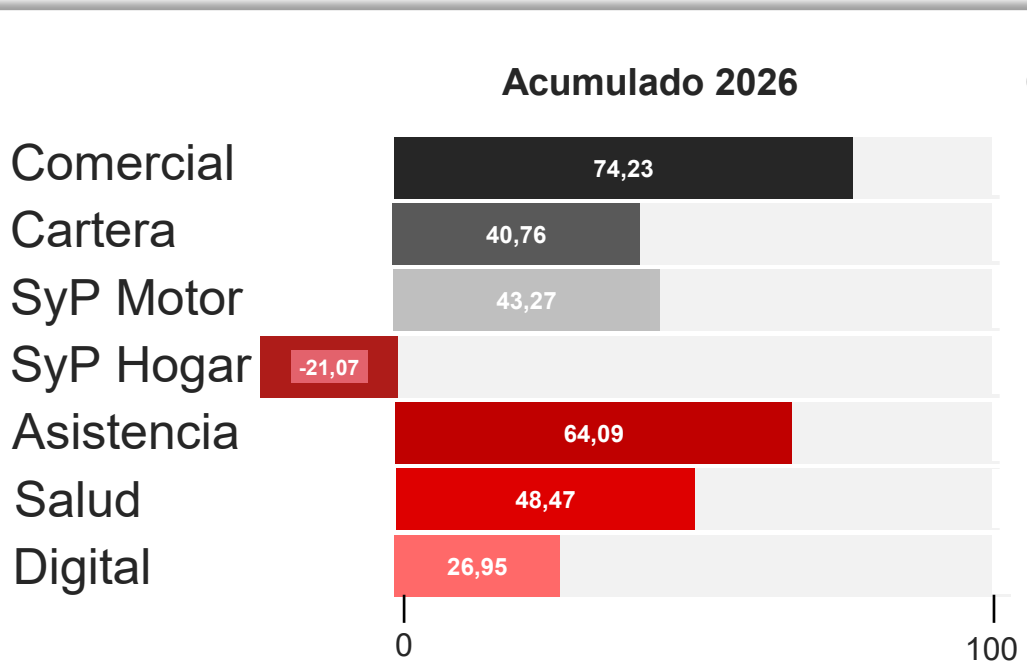


	Objetivo	Diferencia	Porcentaje alcanzado
Comercial	74,00	+ 0,23pp	100,31%
Cartera	45,00	-4,24pp	90,58%
SyP Motor	48,00	-4,73pp	90,15%
SyP Hogar	0,00	-21,07pp	-26,62%
Asistencia	65,00	-0,90pp	98,60%
Salud	42,00	+ 6,47pp	115,40%
Digital	32,00	-5,05pp	84,22%

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

EVOLUCIÓN GLOBAL LINEA DIRECTA

nss	42,99	-1,47 jun-26	+3,54 jul-25
nps	39,90	+0,68 jun-26	+6,19 jul-25
nsa	76,13	-0,60 jun-26	-3,78 jul-25

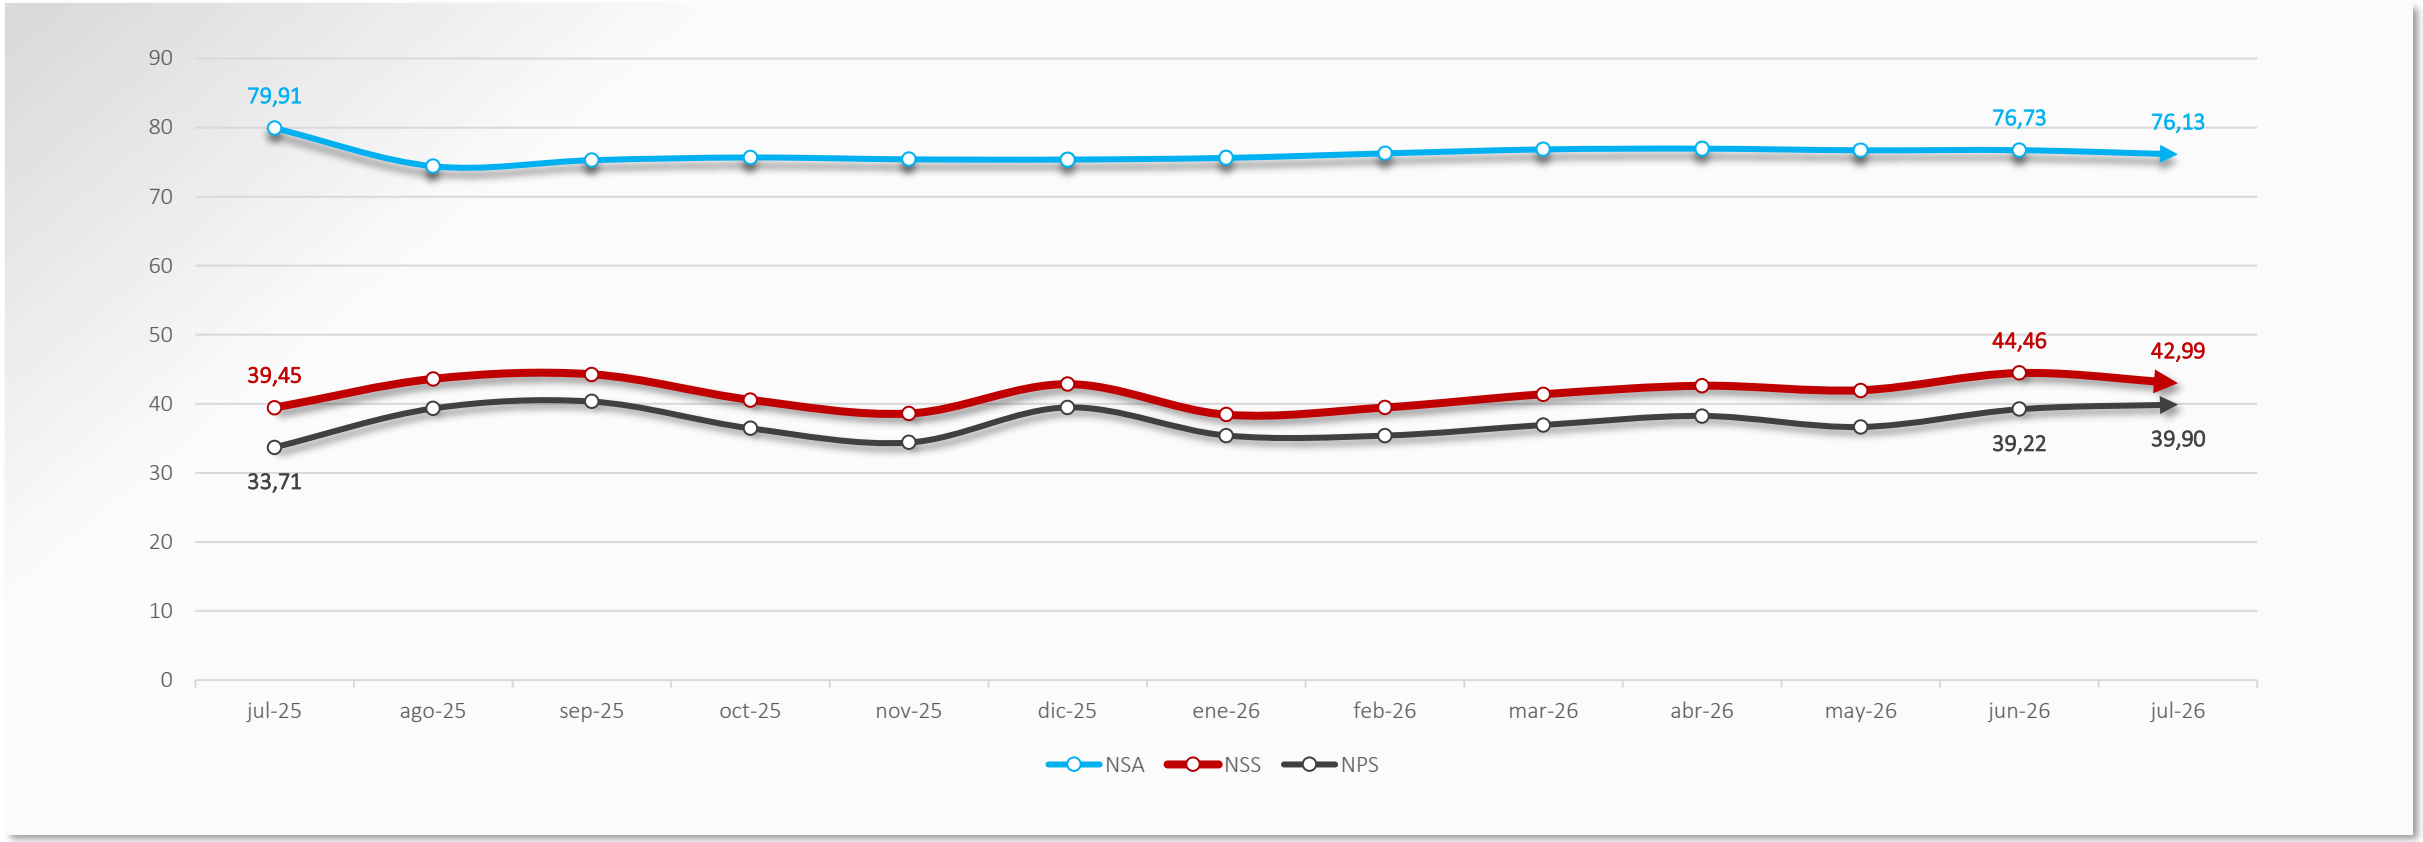


linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Resumen NPS

Datos julio 2026

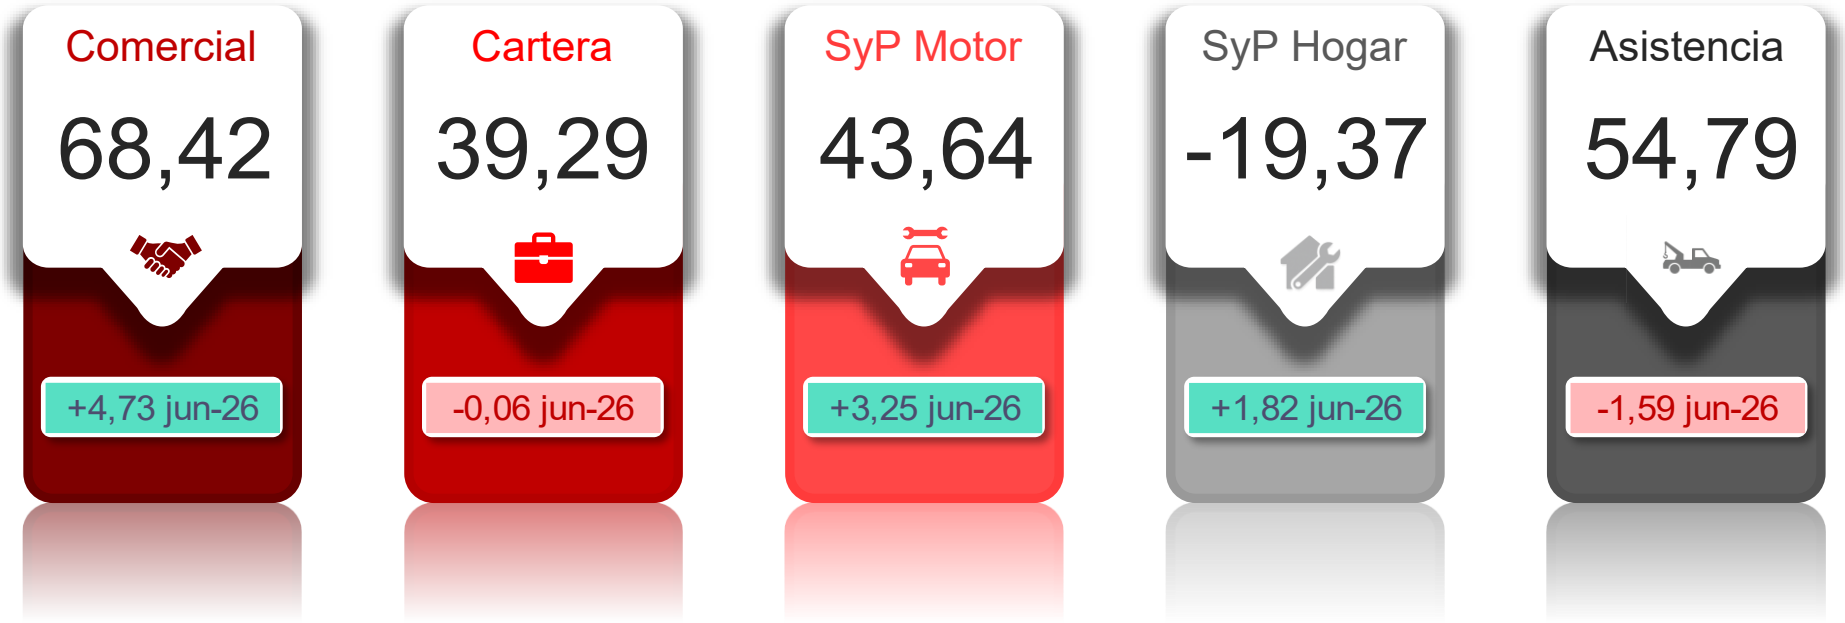

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Evolución Indicadores Calidad

Previsión Agosto 2026 · estimación interna PMO a partir de los datos parciales del mes

Motivo del deterioro previsto

Los abandonos registrados durante agosto están presionando a la baja los tres indicadores. La previsión se apoya en los datos parciales del mes y se confirmará con el cierre que remita el equipo de Calidad.

Julio 2026 vs Agosto 2026

SECCIÓN · MARCOS Y TRABAJOS EN CURSO

Marcos de trabajo y trabajos en curso

Marcos de referencia para interpretar el informe y alinear criterios, junto con los trabajos que la PMO tiene actualmente en curso.

BLOQUES DE ESTA SECCIÓN

Marco común de KPIs	Marco de referencia
Escucha EX en proyectos	Trabajo en curso
Glosario de riesgos funcionales	Trabajo en curso
Cuadro de mando global de KPIs	Trabajo en curso
Glosario unificado y Kit de Supervivencia	Marco de referencia
Formación: calendario global y capacidad	Trabajo en curso

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE · MARCO DE REFERENCIA

Marco común de KPIs Perscom



Primera propuesta de catálogo corporativo de indicadores: qué incluye, cómo seleccionar los KPIs de cada proyecto y qué familias están disponibles para medir avance e impacto con criterios comunes.

Catálogo · KPIs y KRIs · selección · reporte

Marco común de KPIs: primera propuesta del catálogo

El equipo de People Analytics ya ha compartido la primera propuesta de catálogo de indicadores para el seguimiento de proyectos.

Qué tenemos disponible

Un catálogo con **120 indicadores**: 10 de People Analytics, con posibilidad de drilldown, y 110 KRIs corporativos.

Está publicado en la carpeta compartida y es una propuesta abierta: no es una lista cerrada, se puede modificar y enriquecer.

Cómo lo usamos

Cada responsable de proyecto elige los indicadores útiles para medir su proyecto.

Se analizarán las propuestas de indicadores nuevos que no estén recogidos en el catálogo.

Los indicadores no accesibles para el equipo de análisis no podrán reportarse.

Objetivo: un marco común de KPIs para medir y comparar el avance de los proyectos con criterios homogéneos.
Próximo paso: cada coordinador revisa el catálogo y propone nuevos indicadores y selecciona sus indicadores de seguimiento de su proyecto.

Catálogo de indicadores: familias disponibles

120 indicadores agrupados en 12 familias, para que cada proyecto seleccione los que mejor miden su avance e impacto.

Personas, cliente y tecnología

People Analytics **10**
Personas y talento **8**
Ciberseguridad y tecnología **11**
Cliente y servicio **14**
Cumplimiento y regulación **8**
Digital y canales **13**

Negocio, riesgo y operación

Finanzas, solvencia y riesgo **14**
Marca y reputación **5**
Operaciones y eficiencia **5**
Productos y negocio asegurador **11**
Proyectos estratégicos **2**
Siniestros, reservas y recobro **20**

Los 10 indicadores de People Analytics permiten drilldown; los 110 KRIs recogen la visión corporativa de riesgo y negocio. ¿Falta algo? Se pueden proponer indicadores nuevos y se analizará su incorporación al catálogo.

BLOQUE · TRABAJO EN CURSO

Cuadro de mando global de KPIs

Seguimiento y gobierno coordinado de KPIs de negocio y KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos para disponer de una visión global de evolución e impactos.

Negocio · Personas · PMO Cía. · PMO Personas



TAREA ESPECIAL · PMO CÍA + PMO PERSONAS

Cuadro de Mando global de KPIs de proyectos

Iniciar el trabajo conjunto para gobernar los KPIs de negocio y los KPIs de personas de los 8 proyectos estratégicos, con una visión única de evolución, impactos y decisiones.

01 **Gobierno coordinado**
PMO de la Cía. y PMO Personas con una cadencia común.

02 **Seguimiento integrado**
Negocio y Personas analizados en el mismo marco de decisión.

03 **Detección temprana**
Alertas sobre la evolución de KPIs por efecto de los proyectos en curso.

8 **Proyectos estratégicos**

Negocio + Personas

Un único cuadro de mando para entender cómo evolucionan los indicadores y dónde deben activarse decisiones o escalados.

Arranque de trabajo: coordinación PMO Cía. + PMO Personas

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tarea PMO · Gobierno de KPIs

Modelo de seguimiento y gobierno de KPIs

Construir una visión integrada de los 8 proyectos estratégicos para seguir evolución, impactos y decisiones en Negocio y Personas.

KPIs negocio

Indicadores de avance, operación, calidad, eficiencia y adopción de cada proyecto.

KPIs personas

Impactos en personas, FTE, formación, productividad, adopción, clima y capacidades.

Cuadro de mando global de proyectos

Vista única para comparar evolución, desviaciones y señales de impacto en los 8 proyectos estratégicos.

Gobierno y decisiones

PMO Cía. + PMO Personas

Cadencia común de seguimiento, lectura de alertas y escalado de decisiones cuando los KPIs muestren desviaciones o impactos relevantes.

01 Definir catálogo
KPI, fuente, owner y frecuencia.

02 Consolidar datos
Negocio + Personas en una vista común.

03 Activar alertas
Detectar evolución e impactos por proyecto.

04 Gobernar acciones
Seguimiento, decisiones y escalados.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TAREA ESPECIAL · PMO CÍA. + PMO PERSONAS

KPIs por proyecto

KPIs acordados con la PMO de la Compañía para cada proyecto estratégico.

Nuevo Contact Center

- % servicios migrados
- % operadores migrados
- % CC externos con visibilidad
- Menos transferencias entre servicios

Calidad Hogar

- NPS global y NSS del ciclo de vida
- Quejas y bajas con siniestro
- Coste medio y entregas en plazo
- Nota: validar indicadores con negocio

IA en Voz y Chat

- % abandono telefónico
- Eficiencia IA Chat
- Llamadas gestionadas por IA
- NSA voz y % rellamada 1h

AgiLIDAM

- Capacidad de entrega
- Reducción de tiempos de entrega
- NPS y calidad de entregables
- Eliminar actividades sin valor

Transformación del negocio de Salud

- % prestación gestionada por HNA SC
- NSS Salud
- Nº incidencias asistenciales

SyP BIP

- KPIs aportados por Juanjo
- Carga de tareas por persona

CRM y Agilidad

- KPIs aspiracionales a fin de proyecto
- Bajarlos a KPIs operativos medibles

Transversal a todos los proyectos

- KPI de incidencias en el servicio
- Encaje con incentivos trimestrales
- Cobertura de todas las personas

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tarea PMO · Seguimiento de proyectos

Golden KPIs por proyecto

Proyecto	Objetivo	¿Cuándo finaliza el proyecto?	Golden KPIs (objetivo)
Nuevo Contact Center	Operar sobre una plataforma única capaz de comprender, enrutar y gestionar conversaciones con contexto completo del cliente	Cuando el 100% de los servicios hayan migrado, exista visibilidad completa de las interacciones y la plataforma sea la base operativa del modelo omnicanal e IA	% servicios migrados: 100% (13 servicios) · % operadores migrados: 100% (~2.000) · % CC externos con visibilidad: 100% · Reducción de transferencias entre servicios: mejora · % impacto en servicios en producción: 0%
Calidad Hogar	Ofrecer al cliente una experiencia excelente, trazable y transparente durante todo su ciclo de vida	Cuando Hogar sea referente en calidad de servicio, desaparezcan los siniestros abandonados y la experiencia genere retención y recomendación	NPS global Hogar: +1 · NSS en el ciclo de vida: mejora · Nº quejas: mejora · Nº bajas con siniestro: 0 · Coste medio/siniestro: mejora
IA en Voz y Chat	Transformar la atención al cliente con agentes conversacionales capaces de resolver consultas de forma autónoma, escalando al humano solo los casos complejos	Cuando la IA gestione la mayoría de interacciones sencillas con satisfacción equivalente o superior a la atención humana y reduzca abandono y transferencias innecesarias	% abandono telefónico: <5% · Eficiencia IA Chat: 71,20% · Nº llamadas gestionadas por IA: 1M/año · NSA voz: 75% · % rellamada 1h: <13%
AgiLIDAM	Entregar valor de forma continua, priorizar de manera conjunta negocio-tecnología y generar impacto medible en ciclos cortos	Cuando los equipos hayan consolidado una manera estructural y sostenible en velocidad, calidad, alineamiento e impacto sobre el negocio	Capacidad de entrega: x2 · Reducción de tiempos de entrega: -15% a -20% · NPS: +5 a +10 puntos · Eliminar actividades sin valor: -20% a -30% · Mejora en calidad de entregables: +5% a +15%
Transformación del negocio de Salud	Transformar el modelo operativo del ramo para mejorar el servicio y las capacidades digitales, y redefinir la propuesta de valor de Salud para impulsar el crecimiento en particulares y empresas	Cuando toda la operación de salud esté siendo gestionada completamente por HNA SC	% prestación gestionada por HNA SC: 100% · NSS Salud: mejora · Nº incidencias asistenciales: mejora

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.
Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

ANEXOS DE PROYECTOS

Documentación adicional de los proyectos



Anexos de proyectos tecnológicos
