
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos estratégicos corporativos

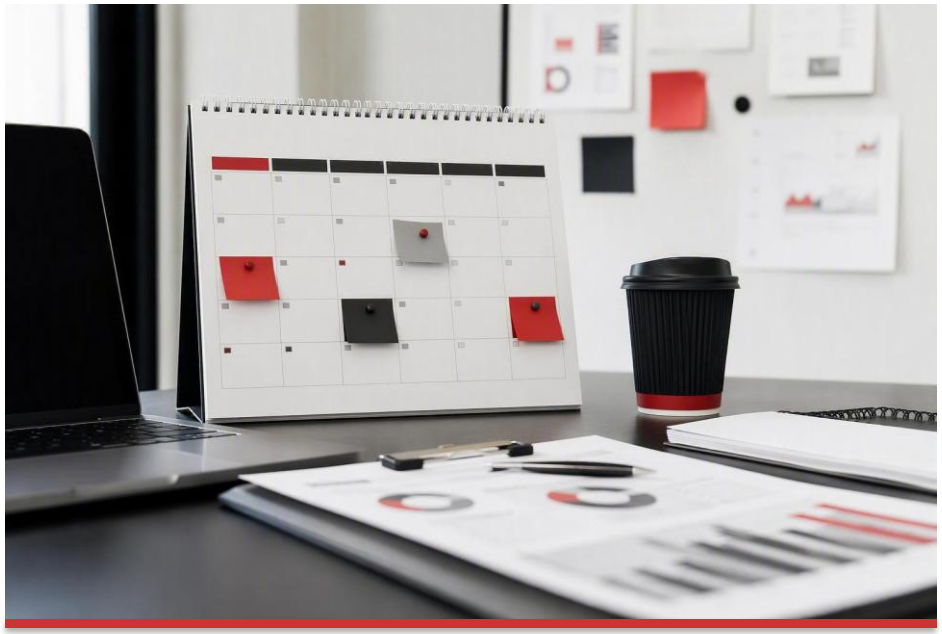

PMO Personas

Semana 38 · 14/09/2026 – 18/09/2026

INFORME EJECUTIVO

Índice

01 Resumen ejecutivo, avance de los proyectos
Status Semana 36

02 Detalle por iniciativa
Fichas de proyectos estratégicos

03 Avances de la PMO PersCom
Mejoras del modelo de seguimiento e histórico de avances

04 Información Calidad Cia.
Objetivos 2026, evolución NSS / NSA / NPS y previsión de agosto

05 Dimensiones RRHH identificadas para el área
Palancas de gestión de personas y su impacto en el portfolio

06 Anexos de Contexto
KPIs, metodología, funciones Perscom, gobierno de Formación, históricos y material de apoyo

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

10 acciones acordadas, 6 con prioridad alta. Contact Center: replantear la encuesta antes de extenderla a Empresas, cerrar la planificación definitiva alineada con CRM y consolidar el canal de soporte e incidencias. SIP: construir con Marcos el plan de comunicación y definir KPIs de adopción y conocimiento. HCM: revisar una planificación realista antes de acelerar y encajar el dominio corporativo. PMO: cerrar los KPIs con Javi y los objetivos e incentivos antes del 30 de septiembre.

Foco Actual

Contact Center · Genesys

Alta

01 · Replantear la encuesta antes de extenderla a Empresas: hoy se percibe que evalúa la gestión del cambio y no la herramienta. 02 · Cerrar la planificación definitiva alineada con CRM, con entrada en Empresas en octubre. 03 · Consolidar el canal de soporte e incidencias: grabación, transcripción e IA por resolver e incentivos afectados por el retraso de la plataforma de datos y las vacantes en BI.

SIP · Reingeniería de siniestros

Alta

04 · Construir con Marcos el plan de comunicación, con avance periódico en reuniones de área, supervisores y newsletters. 05 · Definir KPIs de adopción y conocimiento mediante encuestas propias del colectivo y seguimiento mensual del impacto en personas.

HCM y nuevas formas de trabajar

Alta

06 · Revisar una planificación realista antes de acelerar HCM: riesgo de capacidad abierto y calendario sin confirmar. 07 · Revisar el encaje del dominio corporativo con HCM, por el riesgo con el modelo organizativo.

Seguimiento PMO y objetivos

Media

08 · Cerrar los KPIs con Javi y la PMO de Transformación, limitados a personas y adopción. 09 · Cerrar objetivos e incentivos antes del 30 de septiembre. 10 · Completar la información de colectivos, roles, funciones y porcentajes en PeopleSoft.

Calidad Hogar · Homeserve

Escalado

Único proyecto a escalar: +5 semanas de retraso, por encima de 30 días, por entregas de Homeserve. Plan de acción con control semanal, ajuste de la formación y petición formal de más recursos.

Salud · DKV

Vigilar

Contrato de salida sin formalizar, con primera revisión recibida el 14/09 con desacuerdos y sin recursos de DKV para la migración de informes médicos. Escalado a su dirección para cerrar en septiembre.

AgiLiDAd

Vigilar

Se valora un cambio de estrategia de escalado por la carga de facilitadores, en curso con el proveedor.

Contact Center

Vigilar

Retraso en las entregas y replanificación tras el despliegue de Internacional; se hace seguimiento del próximo despliegue en Empresas.

Prioridades inmediatas

Planificación detallada

Detallar los 8 proyectos para identificar sus hitos críticos y ordenar su secuencia en el mapa global.

Indicadores de avance

Medir avance y consecución para anticiparnos y replantear la estrategia donde no haya impacto.

Información económica

Incorporar el dato contrastado y centralizado desde Finanzas, objetivo a corto plazo.

Herramienta PMO

Primera reunión con Triskell y sesión interna de análisis; TI lo valora con Atlassian Jira.

Modelo de seguimiento

Más detalle sobre los proyectos y posible intervención puntual de los líderes ante eventos relevantes.



linea directa

Uso interno - No compartir fuera de la organización.

Avances de PMO Área Transformación

COORDINACIÓN ENTRE PMO
TRANSFORMACIÓN · PERSONAS

Comité de Transformación con Dirección · 8 proyectos revisados

Reporte de la PMO de Transformación al Comité de Dirección, foto a 16/09: 8 proyectos revisados, con foco en Calidad Hogar, Contact Center, Salud y AgiLiDAd.

Principales Riesgos

- **Calidad Hogar · Homeserve (escalado):** único proyecto a escalar: +5 semanas de retraso, por encima de 30 días, por entregas de Homeserve; plan de acción con control semanal, ajuste de formación y petición formal de más recursos.
- **Salud · Riesgos con DKV (vigilar):** contrato de salida sin formalizar, con primera revisión recibida el 14/09 con desacuerdos, y sin recursos de DKV para la migración de informes médicos; escalado a su dirección para cerrar en septiembre.
- **AgiLiDAd (vigilar):** se valora un cambio de estrategia de escalado por la carga de facilitadores, en curso con el proveedor.

  Contact Center (vigilar):Retraso en las entregas, la replanificación sufrida tras el despliegue de internacional, se hare seguimiento del despliegue próximo de empresas.

Foco Actual

Avances activos

- **Planificación detallada:** detallar los 8 proyectos para identificar sus hitos críticos y ordenar su secuencia en el mapa global.
- **Indicadores de avance:** medir avance y consecución para anticiparnos y replantear la estrategia donde no haya impacto.
- **Información económica:** incorporar el dato contrastado y centralizado desde Finanzas, objetivo a corto plazo.
- **Herramienta PMO:** primera reunión con Triskell y sesión interna de análisis; TI valora con Atlassian Jira.
- **Modelo de seguimiento:** más detalle sobre los proyectos y posible intervención puntual de los líderes ante eventos relevantes.

Mensaje ejecutivo

Dependencias

Dependencias clave identificadas, pero hay proyectos sin planificación detallada y hoy no puede fijarse el **camino crítico** de la transformación.

Foco

4 proyectos con riesgos relevantes a escalar: Contact Center, Salud, Calidad Hogar y AgiLiDAd.

Indicadores

Se revisan también los indicadores, incidiendo en medir **KPIs de avance y consecución** de los objetivos de cada proyecto.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual de los proyectos



Estado · KPIs · hitos · próximos pasos

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CRM · Salesforce Financial Services Cloud

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Análisis del Focus y reuniones viabilidad modificar la ficha cliente 360	Talento Negocio	25/09 · SEGÚN PLAN
Definición de métricas de sala para monitorizar en la implantación	Talento Negocio, Análisis · operación pura	SEPTIEMBRE · SEGÚN PLAN
Revisión RV mensual previo al CRM (incentivos de los comerciales)	Talento Negocio, Compensación	SEPTIEMBRE · SEGÚN PLAN
Encuesta predisposición al cambio	Talento Negocio, Comunicación y Organización · trabajo en septiembre	SEP–OCT · SEGÚN PLAN
Plan de comunicación (oportunidad de cultura de negocio)	Talento Negocio, Comunicación interna · duración 4 semanas	5 - 16 OCT · SEGÚN PLAN
Creación playbook comunicación de proyecto (Primera entrega)	Talento Negocio, Comunicación interna · duración 4 semanas	18/09 · SEGÚN PLAN
Selección externa Freelance	Selección · en búsqueda (1 pers.)	EN CURSO · SEGÚN PLAN
Identificación de métricas con Equipo de Análisis	Equipo de Análisis	REALIZADO · SEGÚN PLAN
Go live	Hito de proyecto · impacto en Personas desde 2027	31/01 · SEGÚN PLAN

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar».

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

0

0 % del colectivo · uso desde 2027

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

7 %

Go live 31/01 · según planificación

ABSENTISMO

–

Sin dato en el mes

PRODUCTIVIDAD

0 %

Sin impacto 2026

RETRIB. VARIABLE

–

Revisión mensual

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 0

! Impacto del CRM en incentivos mensuales (2027)

✓ Sin bloqueos activos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO ›

IMPACTO EN RV Q3 ›

IMPACTOS EN PERSONAS — Encuestas (EX), Talento Negocio, Comunicación, Talento Corporativo, Compensación y Selección

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026; impactos en 2027 pendientes del análisis de business case de septiembre

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

AGILIDAD · Tecnología y Transformación

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Marta Ruano)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Definir/repensar Proyecto de Siniestros Hogar Dominios · no entra en modo dominio/quad	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Lanzamiento de encuestas Personas · se preparan las encuestas de los equipos ya en dominios de agilidad y de los que subirán próximamente	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Primeras reuniones sobre cambio de herramienta de gestión de demanda (Jira) Método · migración de Kambanice a Jira	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Definir los equipos de proyecto de IA Voz y Chat para su entrada en agilidad Dominios · en definición los equipos, el subdominio y los squads	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Documento de criterios comunes entre Agilidad y estructura organizativa El qué (prioridades y trabajo) desde Agilidad; el cómo (acompañamiento, desarrollo y desempeño) desde la estructura organizativa	PLANIFICADA	NUEVA
Cambio de estrategia de escalado con Eraneos Formación de facilitadores internos sin impactar al calendario del programa	EN CURSO	SEGÚN PLAN

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS EN EQUIPOS AGILES

41

+20 personas vs semana anterior (21 → 41)

KPI 1

0

-0,9 vs mes anterior

KPI 1

0

— pendiente definir

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 1

! Riesgo: colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto.

! Bloqueo: transición entre modelos, roles actuales vs nueva estructura e incertidumbre sobre las funciones. Resistencia al cambio. Faltan responsables de dominio (Suscripción, técnico) y POs. Afecta al RV trimestral 3Q.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO ›

IMPACTO EN RV Q3 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

IMPACTOS PROYECTO — Organización, Incentivos Trimestrales

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 — No reportados

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

GOBIERNO Y PLATAFORMA DEL DATO

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Amaya Hurtado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward) Tarea de proyecto	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Identificación con Equipo de Análisis Equipo de Análisis	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Integrador SDG realizando un diagnóstico SDG · Diagnóstico en curso	30/09	SEGÚN PLAN
Encuentro de Comunicación y nombramiento Data Owner Roadmap y lanzamiento Development Center	18/09	SEGÚN PLAN
Cambio de Plataforma Analítica Próximo hito del proyecto	30/09	SEGÚN PLAN
Calendario entregado Tarea de proyecto	30/09	SEGÚN PLAN
Mapa dominios seudoestables Próximo hito del proyecto	31/12	SEGÚN PLAN
Creación de dominio de datos Telefonía, Calidad y Digital	¿?	SEGÚN PLAN

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

29

% del colectivo pendiente de cerrar · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

Pendiente de reportar

KPI 1

0

Var. mensual: -0,9

KPI 1 · AVANCE

0

Pendiente definir KPIs · —

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

✓ Sin riesgos

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTO EN RV Q3 26 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre los dominios de clientes, pólizas, siniestros, calidad y finanzas, sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

IMPACTOS PROYECTO — Organización, nuevos roles y funciones, formación, gestión del cambio y comunicación

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL · PROYECTO CON ANEXO

CONTACT CENTER · Genesys Cloud (CCaaS)

REPLANIFICACION · SEMÁFORO AMARILLO

Coordinación: Almudena Castillo (backup Quique Cid)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Nueva planificación de pasos a producción	Contact Center · anexo en replanificación	CERRADA 17/09 · Retraso de 1 mes
Entrada de próximos equipos · Empresas	Preparación reforzada, reunión final de agosto y calendario Teleco pendiente	14 OCT · SEGÚN PLAN
Replantear la encuesta antes de extenderla a Empresas	Hoy se percibe que evalúa la gestión del cambio y no la herramienta.	CERRADA · SEGÚN PLAN
Plan de comunicación	Comunicación · pendiente de aprobación para lanzar en el próximo PaP	ABPROBADA · SEGÚN PLAN
Plan de acción específico en Internacional	Derivado de los resultados preliminares de la encuesta de opinión	EN CURSO
Formación al próximo equipo · Empresas	Pendiente de preparar material y sesiones de formación	EN CURSO

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

70

4,66 % del colectivo · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

En replanificación · pendiente de reportar

KPI PERSONAS

—

Semáforo mensual de personas

ABANDONO Y NSS

—

−0,9 en el mes · equipos migrados

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- Percepción de los operadores ya migrados en la curva de usabilidad
- Abandono puntual en PaP complejos por dimensionamiento
- Sobrecarga de soporte, supervisión y análisis en los PaP
- Replanificar de los próximos despliegues por impacto en CRM
- Información sobre grabación, transcripción y uso de IA
- 3 vacantes en BI

Análisis KPIs: abandono en Internacional por dimensionamiento, no por Genesys.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO › · IMPACTO EN RV Q3 › · ANEXOS · QUICK WINS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS.

IMPACTOS EN FUNCIONES — Analítica, Compensación, Formación de negocio, Comunicación, Relación con el empleado y PMO · reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de los próximos PaP

QUICK WINS EFICIENCIAS 2026 — 15 min por FTE en gestión operativa · mejor información para Análisis · optimización del presupuesto de call center externo · −5 % de rellamadas · acelerador de CRM e IA Voz

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

linea directa

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

REINGENIERÍA SyP

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Arancha Fernández (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Definición de líneas de trabajo. Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30/09
TO BE: Identificación de iniciativas y ejecución de quick-wins Tarea de proyecto	Q4
Rediseño y modelado de procesos Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	26/10 Adelantado 1 mes
TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos Tarea de proyecto	30/11
Lanzamiento QuickWins Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30/11
Business case y plan de implantación Tarea de proyecto	26/10 Adelantado 1 mes
Definición de macroiniciativas de reingeniería del proceso Tarea de proyecto	EN CURSO
Definición del KPI objetivo de automatización Tarea de proyecto	EN CURSO
Identificación con Equipo de Análisis Tarea de proyecto	—
Coordinación con Comunicación · líneas informativas (adopción)	EN CURSO
Clarificación del funcionamiento del subdominio	EN CURSO
Preparación de encuestas	EN CURSO
Identificación de especialistas de proyectos y colaboradores	EN CURSO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la visión de cliente.

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS)

0 %

Impacto en Personas previsto desde septiembre

LLAMADAS ACUM.

28.289

Acumulado mes a 24/08 · —

ABANDONOS

6,66 %

+3,87 en el mes

ABSENTISMO

CORPORAL	MATERIAL	REDES
XX %	XX %	XX %
−X en el mes	−X en el mes	−X en el mes

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- Definir los equipos (squad) y perímetros de motor y hogar.
- Incorporaciones externas: responsable de dominio SyP.
- Vigilar la resistencia al cambio y composición de plantilla.
- Generar impacto positivo en los primeros casos de uso.
- No existe documentación de procedimientos.
- Analizar el plan de formación si es necesario.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS PROYECTO — Análisis, Laboral – Formación y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral, Pulsos

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 — Alertas CICOS reclamaciones SDM (<20.000 €) · expedientes no reclamados · listados operativos · clasificación documental · accesos a portales

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CALIDAD HOGAR

EN CURSO · SEMÁFORO ROJO

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Rehuses de apertura: comunicaciones por grupo de causa Comunicaciones · por grupo de causa	17/10 REPLANIFICADO	
Apertura delegada HomeServe Implantación · en curso nueva planificación, pendiente cerrar calendario de entregas y plan de pruebas	15/11 REPLANIFICADO Fecha inicial 31/10	
Métricas IPAS	31/09 SEGÚN PLAN	
Emisión refuerzo explicación rehúses (Konecta Portugal)	EN CURSO SEGÚN PLAN	

ABANDONOS HOGAR

5,35 %

10.049 llamadas acumuladas

ABANDONOS IPAs

—

Sin dato reportado

LLAMADAS HOGAR

10.049

Acumulado mensual (LL)

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 3 · Bloqueos: 0 ·

- ! El equipo todavía no trabaja en modo Agile.
- ✓ Sin bloqueos activos documentados.
- ! **Homeserve:** 5 semanas de retraso, por encima de 30 días, lo que sitúa el proyecto en semáforo rojo; dependencia crítica del proveedor en los desarrollos y en las pruebas pendientes.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

IMPACTOS PROYECTO — Apertura delegada HomeServe · Rehuses de apertura · impacto en personas: –

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

NEGOCIO DE SALUD · Cambio de TPA

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Alicia Gutiérrez (backup María Luisa Criado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Cubrir Vacantes	Impacto en personas · prevista para el 01/09, se desvía al 18/09	EN CURSO· 31/09 — CON RETRASO 01/09
Plan de formación	Terminado 01/09 · acordado 07/09 con colectivos	07/09 — SEGÚN PLAN
Encuesta de seguimiento (pulso) al equipo del proyecto	Enviada a todas las personas del proyecto	07–11 SEP — SEGÚN PLAN
Solicitud de vacantes interna y externa	Abiertas; ambas pasan a ser externas · en curso	SEP 26 — SEGÚN PLAN
Plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos	Con nuevo servicio médico; se adelanta a octubre	OCT 26 — SEGÚN PLAN
Formación de HNA a Gestión Asistencial	Procedimientos de HNA para su gestión · pendiente fecha	PENDIENTE — SEGÚN PLAN
Cambio de TPA a HNA	En curso; entrada en vigor del nuevo modelo 01/27	ENE 27 — SEGÚN PLAN
Supervisión del proveedor HNA	En curso	EN CURSO — SEGÚN PLAN

OBJETIVO DEL PROYECTO

Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Recomendación, valoración de usuarios y reclamaciones por el cambio

SATISF. FORMACIÓN	AUTORIZACIONES	NPS
Var. mensual: —	Var. mensual: —	Var. mensual: —

RIESGOS, BLOQUEOS

5 riesgos · 0 bloqueos

- Entrada en vigor del cambio de TPA después de enero para renovaciones de colectivos y la mayoría de las pólizas de salud.
- 2 vacantes externas (CORGA – EXPPROSALUDCALIDAD), iniciado en julio.
- **Contrato de salida DKV:** sigue sin formalizarse; la primera revisión se recibió el 14/09 con desacuerdos relevantes.
- Avisos de renovación previos al cambio: no se comunicará al cliente · riesgo de negocio

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS EN PERSONAS — Formación, selección externa e interna, organización, comunicación interna y externa y gestión del cambio

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026: el cambio de TPA no se implanta hasta finales de enero de 2027

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA en VOZ

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinador Proyecto: Quique Cid (Backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Gestión de SyP Motor
Desarrollo y PaT del caso de uso e inicio de pruebas
05/10
REPLANIFICADO 30/09

Apertura de SyP
Análisis de dependencias para apertura y gestión de partes
EN DEFINICION
SEGÚN PLAN

Comunicación a la sala del despliegue en SyP
Se acuerda trabajar la comunicación interna antes de la puesta en marcha y coordinar el mensaje con los responsables de la sala.
EN DEFINICION
SEGÚN PLAN

Valoración de los siguientes casos de uso
Sobre la mesa la apertura de partes y también casos de uso de Retención
EN ANÁLISIS
SIN FECHA

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS)

Acumulado a 13 de agosto de 2026

TOTAL AUTOGESTIONADAS
4.887
Acum. 13 ago 26

TOTAL LLAMADAS
235K
Julio 26 · −11K

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

0 Riesgos: no reportados.

0 Bloqueos: sin bloqueos.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas)

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Migración del chat de casos de uso activos, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA CHAT · Lupe

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Quique Cid (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Reentrenamiento GP
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-593469: ofrecimientos del operador con los consentimientos a NO (chat Venta)

EN CURSO
SEGÚN PLAN

Reentrenamiento Generales
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-590617 ATC: reentrenamiento en modificación de póliza y recibos

EN CURSO · 18/09
SEGÚN PLAN

Actualizar respuesta deeplinks en chat
PaP 26-597767 · eliminar el indicador mobile en IA para presentar deeplinks en web mobile

EN CURSO · 30/09
SEGÚN PLAN

Pruebas y ajustes en curso
Deeplinks en App, nuevo informe de BI en chat, errores en rebotes de agente App y reorganización del skillset del chat de Retención

EN CURSO
SEGÚN PLAN

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Quick wins · Eficiencias 2026: en revisión

AVANCE IMPLANTACIÓN	KPI 1	KPI 1
—	—	—

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

✓ Sin riesgos

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS

Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · En revisión

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

PERSEO · Comercial

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Javier Gómez

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Mejoras en ratios de cancelación Análisis del impacto comercial	EN CURSO SEGÚN PLAN
Vigilancia de los coachings Uso responsable de la información	EN CURSO SEGÚN PLAN
Caso de uso de fraude en venta Definición y validación pendientes	PENDIENTE SEGÚN PLAN
Ampliar muestra en productos pequeños Necesidad de mayor volumen analizado	PENDIENTE SEGÚN PLAN
Dashboard para formación Próximo hito · 14/08	PENDIENTE CON RETRASO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Monitorizar, etiquetar y marcar ítems de calidad en llamadas comerciales para mejorar calidad, argumentarios, coaching y fraude.

ESTADO DE DESPLIEGUE

EN PRODUCCIÓN

Desplegado en todo Comercial

ABSENTISMO	ROTACIÓN VOLUNTARIA	PÓLIZA/LLAMADA
8,7 % / 14,8 %	7,3 % / 17,6 %	28,9 % / 28,6 %
Rec./Int. · Δ −2,0/−1,4	Rec./Int. · Δ −0,5/+0,1	Rec./Int. · Δ +0,7/−0,9

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 1

- Evitar usos de la información fuera de los casos autorizados.
- Resolver la revisión con OPD para el producto Salud.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS EN PERSONAS

Análisis y formación de negocio

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · En revisión · próximo hito: dashboard de formación (14/08)

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

PERSEO · Cartera

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Javier Gómez

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Analizando mejoras en costes de negociación Tarea de proyecto · en curso	EN CURSO SEGÚN PLAN
Validación información Cross Interno Tarea de proyecto · en curso	EN CURSO SEGÚN PLAN
Análisis de los tiempos de llamada Tarea de proyecto · en curso	EN CURSO SEGÚN PLAN
Identificación con Equipo de Análisis Tarea de proyecto · en curso	EN CURSO SEGÚN PLAN
Producción Próximo hito · impacto en personas	31/07 SEGÚN PLAN

ESTADO DE DESPLIEGUE

EN PRODUCCIÓN

Perseo activo en sala de Retención

ROT. VOLUNTARIA	CM SALVADA CORE	ABSENTISMO
8,9 %	42,5	9,7 %
−2,2	−1,4	−0,3

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 1

- Riesgo: vigilancia para que la información de la IA no se utilice fuera de los casos de uso.
- Bloqueo: Venta Cross EXTERNO pendiente cláusulas de contrato.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Monitoreo, etiquetado y análisis de llamadas para mejorar el coste de negociación

IMPACTOS EN PERSONAS — Análisis, Formación negocio

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · En revisión

SECCIÓN · PMO PERSCOM EN EVOLUCIÓN

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Seguimiento semanal de lo que la PMO PersCom construye y mejora: gobierno de KPIs, gestión del conocimiento y evolución del propio informe. Mismo formato que el seguimiento de proyectos, con histórico acumulado.

Gobierno de KPIs · Conocimiento · Informe · Histórico



Seguimiento semanal · PMO

PMO PERSCOM · AVANCES DE LA SEMANA

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Qué hemos movido esta semana en gobierno de KPIs, conocimiento y modelo de seguimiento.

SEMANA 07 SEP – 11 SEP 2026

PMO PersCom

AVANCES DE LA SEMANA · AGRUPADOS POR BLOQUES

FOCO · EN CURSO · IMPLANTADO · CONTINUO · PROTOTIPO · DESCARTADO

GOBIERNO DE KPIs

Catálogo corporativo de indicadores — FOCO — 04/09/2026

Primera propuesta recibida: 120 KPIs y KRIs en familias de negocio, personas, cliente, operaciones, tecnología y riesgo.

Cuadro de mando global de KPIs — FOCO — 04/09/2026

Trabajo conjunto PMO Compañía + PMO Personas para visualizar de forma integrada los indicadores de negocio y personas.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del conocimiento — CONTINUO — ACTUALIZ. 09/09

Evolución del glosario común y del Agente IA de soporte a la PMO: terminología, metodología, roles y KPIs.

Manual de metodología de gestión de proyectos PersCom — EN CURSO — 14/09 – 19/09

Elaboración del documento de metodología PMO PersCom: marco, roles y estándares de seguimiento. Cierre previsto del 14/09 al 19/09.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Mejoras en las fichas de seguimiento de proyectos — IMPLANTADO — 04/09/2026

Incluidos en las fichas si el proyecto se ve Impactado en RV Trimestral y si es así que objetivos tiene, y también generadas las slides de tareas históricas por cada proyecto para no perder la evolución global..

Nuevo diseño de ficha de seguimiento de proyecto — IMPLANTADO — 09/09/2026

Implantado: las fichas de todos los proyectos pasan al nuevo diseño, ya utilizado en la reunión de coordinadores y en el envío del seguimiento de la semana 37.

Nueva sección de avances de la PMO en el informe — IMPLANTADO — 04/09/2026

Este informe incorpora ya la sección semanal de avances de la PMO y su histórico de mejoras implantadas.

AVANCES ACTIVOS · SEMANA EN CURSO

7

tareas en seguimiento en 3 bloques de trabajo

ESTADO DE LOS AVANCES · ACTUALIZACIÓN SEMANAL

FOCO	EN CURSO	CONTINUO	IMPLANTADO	PROTOTIPO
2	1	1	3	0

! FOCO ACTUAL DE LA PMO

Cerrar el catálogo de indicadores y su cuadro de mando global con la PMO de Compañía: es lo que permitirá medir todos los proyectos con el mismo criterio.

Qué necesitamos: que cada coordinador valide sus indicadores antes del cierre de mes.

VER HISTORICO DE AVANCES ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

PMO PERSCOM · HISTÓRICO DE AVANCES

Histórico de avances y mejoras de la PMO

3 AVANCES IMPLANTADOS

Registro acumulado de las mejoras ya implantadas por la PMO, agrupadas por bloque.

AVANCES IMPLANTADOS · AGRUPADOS POR BLOQUES

INFORME DE SEGUIMIENTO

Impacto en RV Trimestral en las fichas de proyecto

Incorporado en las fichas el impacto en RV Trimestral junto con los objetivos del proyecto y su evolución global.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Slides de tareas históricas de proyectos

Creadas las slides de tareas históricas para mantener listadas las tareas ya cerradas de cada proyecto.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Kit de Supervivencia del Coordinador de Proyectos

Entregado a todos los coordinadores y disponible para consulta permanente como material de referencia.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Próxima entrada

Espacio reservado para el próximo avance de la PMO que pase a implantado.

PENDIENTE

3

avances implantados

IMPLANTADO · ÚNICO ESTADO DEL HISTÓRICO

+ CÓMO SE MANTIENE

Cuando un avance se implanta, pasa de la slide de avances de la semana a este histórico, dentro de su bloque.

VER AVANCES DE LA SEMANA ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - KPIs DE CALIDAD

Información Calidad Compañía


Indicadores de Calidad de la Compañía (NSS, NSA y NPS) facilitados por el equipo de Calidad: objetivos 2026, evolución global y detalle por línea de negocio.


Satisfacción · recomendación · previsión



Objetivos 2026

Acumulado LDA




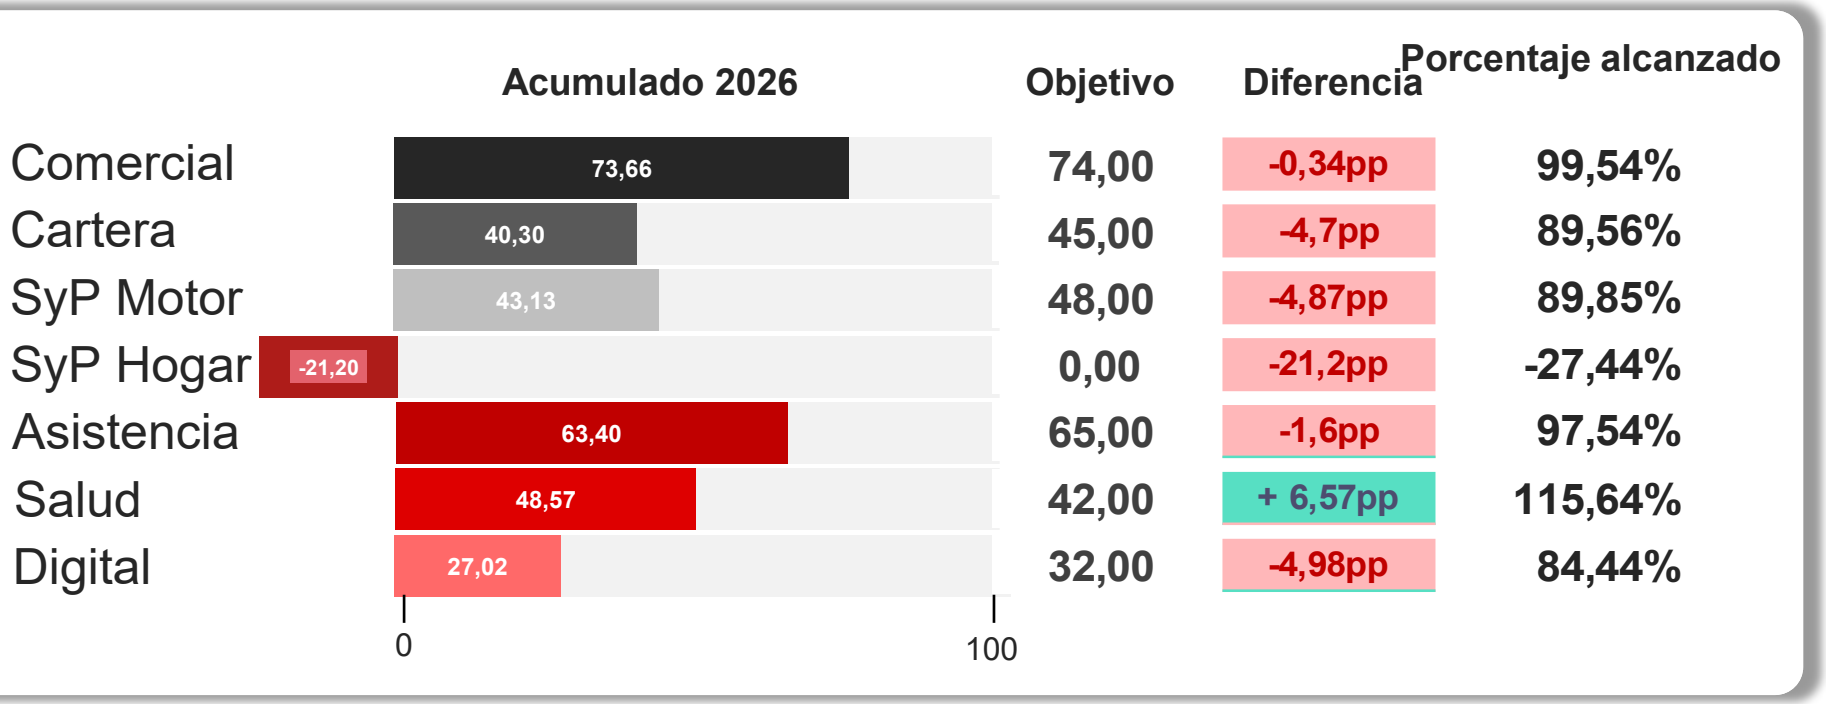

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

EVOLUCIÓN GLOBAL LINEA DIRECTA


nss	38,34	-4,65 jul-26	-5,28 ago-25
nps	34,62	-5,28 jul-26	-4,71 ago-25
nsa	75,92	-0,21 jul-26	+1,52 ago-25

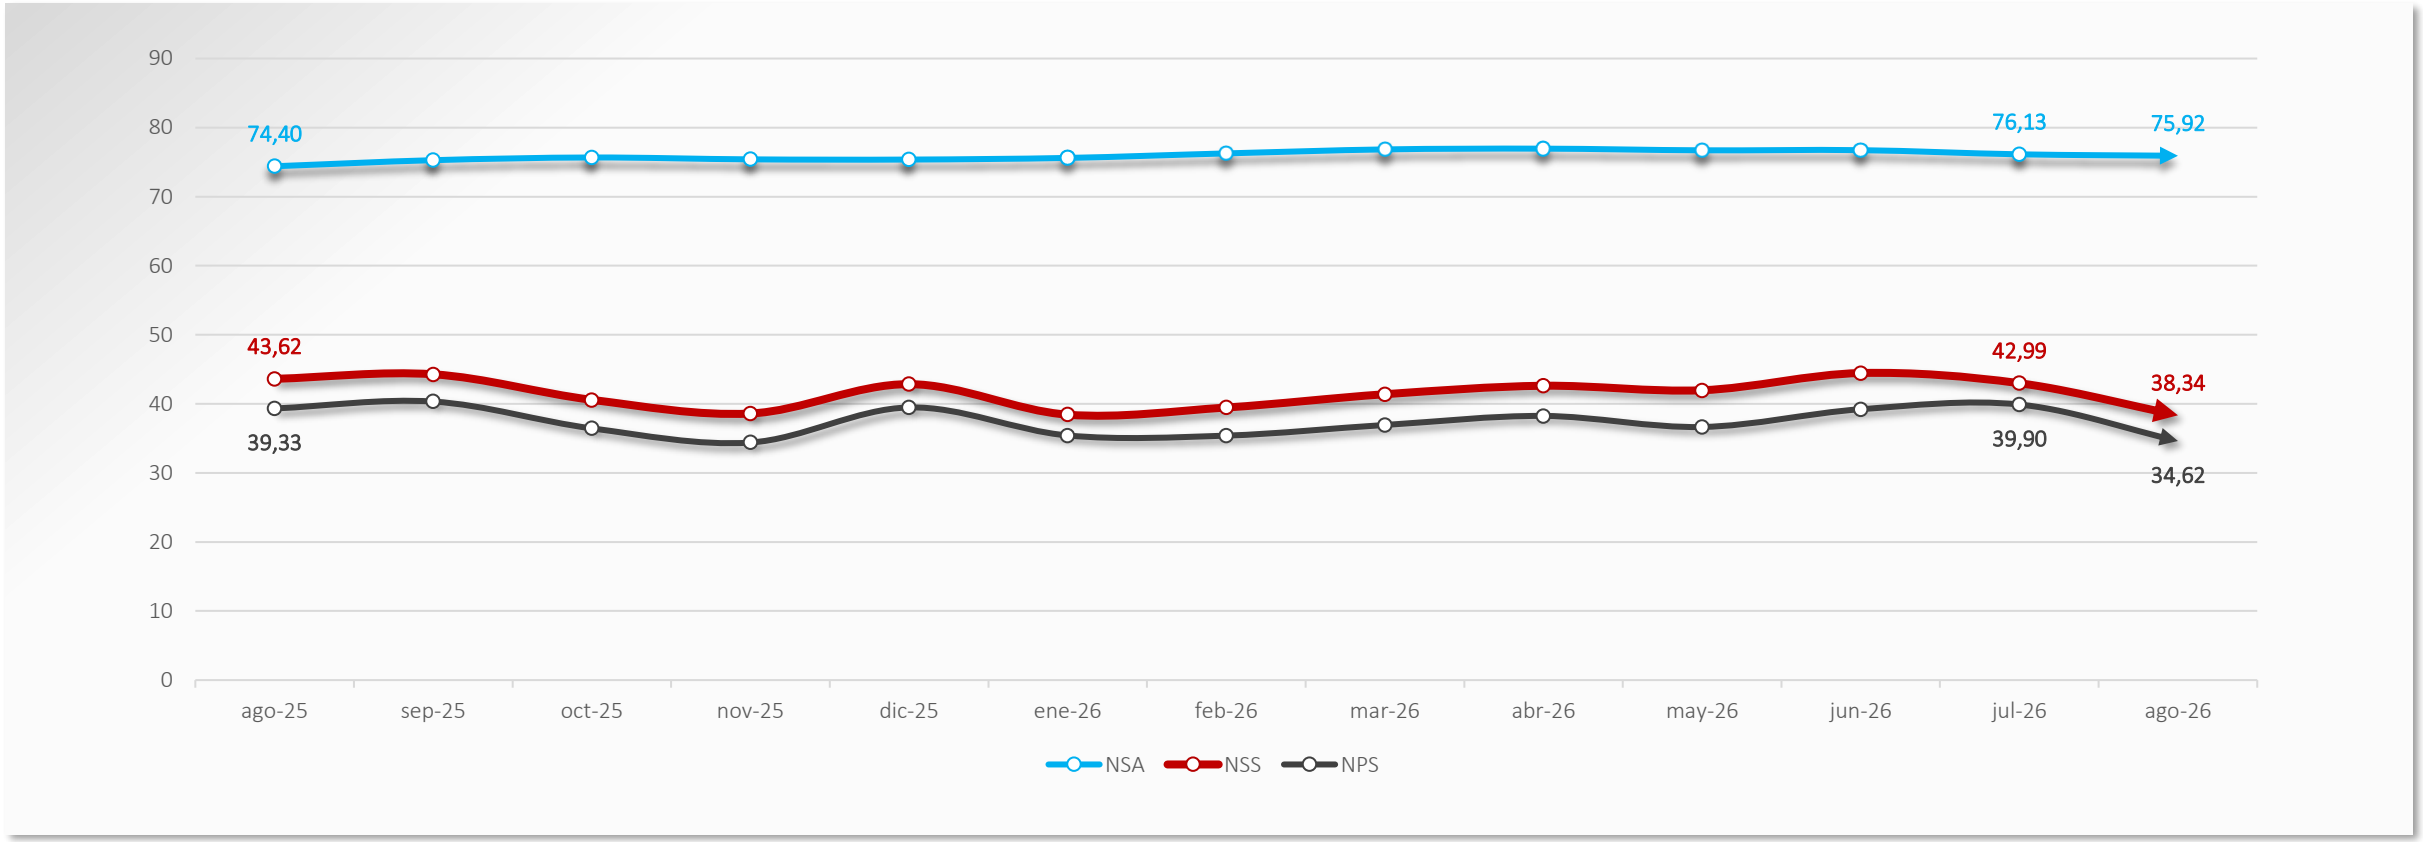

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Resumen NPS

Datos agosto 2026

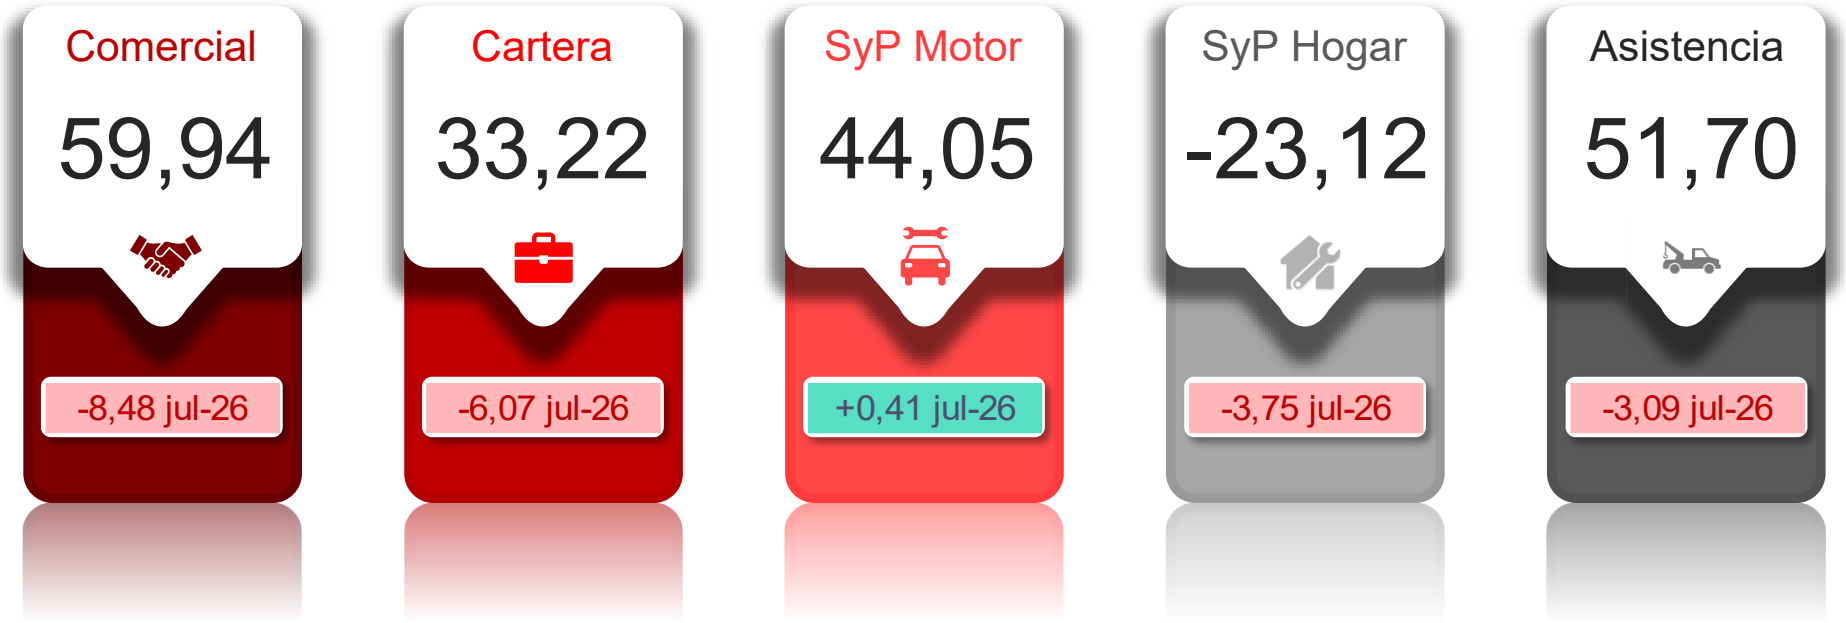

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: NUEVA PLANFIFICACION CONTACT CENTER

< VOLVER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

