
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos estratégicos corporativos

PMO Personas

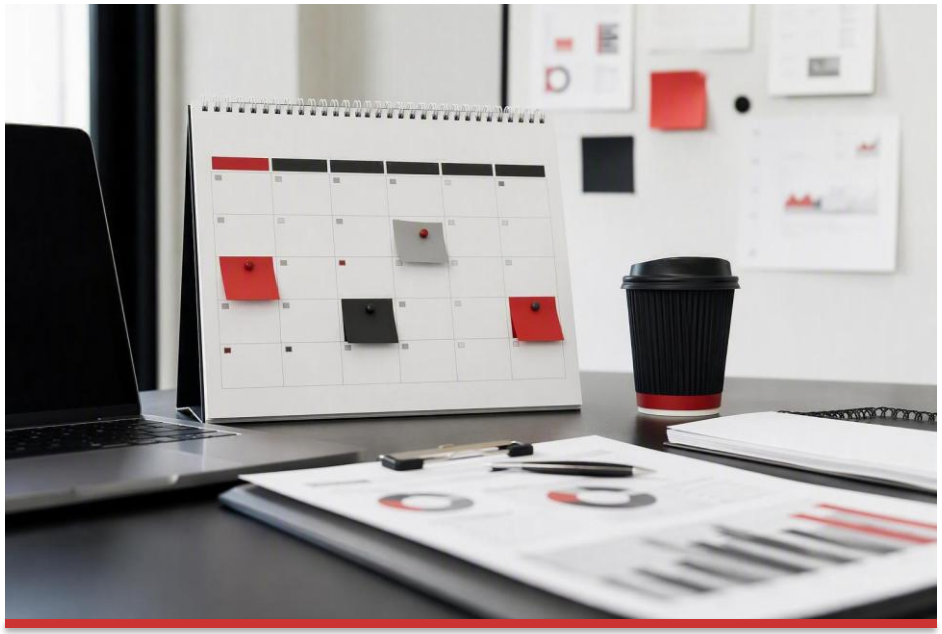

Semana 39 · 21/09/2026 – 25/09/2026

linea directa

INFORME EJECUTIVO

Índice

01 Resumen ejecutivo, avance de los proyectos
Status Semana 36

02 Detalle por iniciativa
Fichas de proyectos estratégicos

03 Avances de la PMO PersCom
Mejoras del modelo de seguimiento e histórico de avances

04 Información Calidad Cia.
Objetivos 2026, evolución NSS / NSA / NPS y previsión de agosto

05 Dimensiones RRHH identificadas para el área
Palancas de gestión de personas y su impacto en el portfolio

06 Anexos de Contexto
KPIs, metodología, funciones Perscom, gobierno de Formación, históricos y material de apoyo

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

Semana 39 · **Contact Center** preparando entrega el 28 de Septiembre para empezar las pruebas del PaP de Empresas en tercera semana de Octubre, proyecto en coordinación con CRM. **Agilidad** ultimando todo la entrega del mapa de dominios, sumando dos squads por sprint (cada 2 semanas); IA Voz y Chat preparan despliegue la primera semana de octubre.. **Reingeniería SyP** Diseño de To-Be y previstos primeros impactos en tramitación Materiales (empezando a coordinar con Comunicación, empezando a incluir trabajo en el backlog del subdominio de SyP); **Calidad Hogar,** afectado por agilidad, pendientes PO Squads, HomeServe en riesgo por retrasos. En **Salud** persiste el riesgo de migración con DKV por el plan de salida y dificultad para trasladar los informes de clientes a HNA. En **Gobierno del Dato** sin información de avances.

Contact Center y CRM · Secuencia

Vigilar

- CCaaS: por la complejidad de un PaP conjunto de Inbound y Outbound, se separa técnicamente la subida a producción.
- Outbound se adelantaría a la 3ª semana de noviembre e Inbound a la 2ª de diciembre (a consensuar con el área).
- Se acompasa con CRM para no solapar: primero Contact Center y después CRM.

Agilidad · Escalado de squads

Avance

- Los nuevos squads entran de inicio con PO, Líder Técnico y Facilitador para facilitar el escalado.
- En cada sprint (2 semanas) entran 2 squads para acelerar la entrada de grupos.
- Próximos: IA Voz e IA Chat la semana del 5 de octubre y SyP Hogar la del 19 de octubre.

IA Voz · Casos de uso

Avance

- Se prioriza el caso de uso de precio de renovación para clientes. (retención)
- Gestión de partes entra en producción el 5 de octubre. (coordinados por impactos en empleados, foco en externos)
- Asistencia: se analiza el caso de grúas para automatizar el traslado al taller seleccionado.

IA Chat · Mascotas y tecnología

Vigilar

- Puesta en producción del nuevo producto de Mascotas la semana del 4 de octubre.
- Se analiza la dependencia con la base documental que da contexto a las respuestas de la IA.
- Continúa el análisis del cambio de la tecnología actual a la IA de Happy Robot.

Salud · DKV

Riesgo alto

Sigue levantado el riesgo de salida con DKV. Continuamos sin disponer de los informes de clientes en DKV necesarios para la migración a HNA.

Contact Center y CRM

Vigilar

La separación de la subida de Outbound e Inbound está pendiente de consensuar con el área afectada; hasta cerrarla se mantiene el riesgo de solape con las implantaciones de CRM.

Reingeniería · Squad SyP Motor

En riesgo

Las primeras necesidades ya figuran en el backlog de SyP Motor y se analizan para los sprint plannings. Riesgo: por presupuesto, la herramienta de documentación podría no adjudicarse en 2026; el área intentará mejorar estos procesos internamente con el equipo de IA de IT.

Calidad Hogar

En riesgo

Tras el PaP de la fase 1 el 17/09, se analiza la fase 2 de Rehúses; HomeServe acumula cinco semanas de retraso y sitúa el proyecto en rojo.

Prioridades inmediatas

Contact Center y CRM

Consensuar con el área la subida separada: Comercial Outbound en noviembre e Comercial Inbound en diciembre, acompasado con CRM.

Escalado de squads

Dos squads por sprint: IA Voz e IA Chat el 5 de octubre y SyP Hogar el 19 de octubre.

Backlog de SyP Motor

Analizar las necesidades ya incluidas para llevarlas a los sprint plannings del squad.

Calidad Hogar · Fase 2

Arrancar el análisis de la segunda fase de Rehúses de apertura.

Riesgo Salud · DKV

Desbloquear los informes de clientes en DKV necesarios para la migración a HNA.

Uso interno - No compartir fuera de la organización.

Avances de PMO Área Transformación

COORDINACIÓN ENTRE PMO
TRANSFORMACIÓN · PERSONAS

Foto de estado a 24/09 · recta final del tercer trimestre

Reporte de la PMO de Transformación, foto a 24/09 y avances desde el seguimiento anterior, con foco en CRM, Calidad Hogar, Mascotas–Fidelización, Salud y Maestro de coberturas.

Principales Riesgos

- **Integración Mascotas–Fidelización (alto):** riesgo alto en la integración de ambos proyectos; el equipo trabaja la estrategia de subida para asegurar ambas entregas con éxito el 04/10.
- **Salud · TPA con DKV (alto):** continúan las negociaciones del plan de salida y de la migración de informes, con plan de contingencia interno en elaboración; el retraso de provisiones y DWH se mitiga automatizando pruebas con el equipo de IA.
- **Maestro de coberturas (muy alto):** nuevo retraso con entrega replanificada al 22/09 y sin nueva fecha; no hay margen para abordar el PaP del 30/09 con garantías.

  Impacto (vigilar): el retraso del Maestro de coberturas ccompromete capacidades futuras de los equipos; el resto de los riesgos se mantiene sin cambios respecto al 17/09.

Foco Actual

Avances activos

- **CRM:** completada la definición de las historias de usuario de Arquitectura y Seguridad “Zero Trust”.
- **Calidad Hogar:** avanza el análisis de mejoras; en la causa de Eléctricos se han identificado puntos a revisar con negocio para elaborar planes de acción.
- **Salud · informes DKV:** se elabora un plan de contingencia interno mientras continúan las negociaciones de la migración de informes con DKV.
- **Provisiones y DWH:** el equipo se apoya en IA para automatizar pruebas y acortar tiempos, buscando el mínimo impacto en el calendario global.

Mensaje ejecutivo

Cierre de Q3

A semana y media del cierre del tercer trimestre, los avances se concentran en CRM y Calidad Hogar, mientras el calendario de PaP sigue tensionado por el Maestro de coberturas.

Foco

Se mantienen los mismos riesgos de la semana anterior: Mascotas–Fidelización Fase III, TPA de Salud y Maestro de coberturas.

PaP 04/10

Fidelización no pudo adelantar su PaP al 20/09 y se planifica **conjuntamente con Mascotas el 04/10**, con la estrategia de subida en preparación.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual de los proyectos



Estado · KPIs · hitos · próximos pasos

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CRM · Salesforce Financial Services Cloud

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Análisis del Focus y reuniones viabilidad modificar la ficha cliente 360 Talento Negocio	30/09	REPLANIFICADO (25/09)
Definición de métricas de sala para monitorizar en la implantación Talento Negocio, Análisis · operación pura	SEPTIEMBRE	SEGÚN PLAN
Revisión RV mensual previo al CRM (incentivos de los comerciales) Talento Negocio, Compensación	OCTUBRE	REPLANIFICADO (30/09)
Encuesta predisposición al cambio Talento Negocio, Comunicación y Organización · trabajo en septiembre	SEP–OCT	SEGÚN PLAN
Plan de comunicación (oportunidad de cultura de negocio) Talento Negocio, Comunicación interna · duración 4 semanas	12 - 25 OCT	REPLANIFICADO (16/10)
Creación playbook comunicación de proyecto (Tercera entrega) Talento Negocio, Comunicación interna · duración 4 semanas	25/09	REPLANIFICADO (18/09)
Selección externa Freelance Selección · en búsqueda (1 pers.)	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Identificación de métricas con Equipo de Análisis Equipo de Análisis	REALIZADO	SEGÚN PLAN
Go live Hito de proyecto · impacto en Personas desde 2027	31/01	SEGÚN PLAN

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implantar Salesforce Financial Services Cloud como CRM único e integrado con IA para dar una visión 360º del cliente en cada interacción, bajo el principio «configurar antes que desarrollar».

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

0

0 % del colectivo · uso desde 2027

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

7 %

Go live 31/01 · según planificación

ABSENTISMO

–

Sin dato en el mes

PRODUCTIVIDAD

0 %

Sin impacto 2026

RETRIB. VARIABLE

–

Revisión mensual

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 0

- ! Impacto del CRM en incentivos mensuales (2027)
- ! Pendiente entrega Planificación Inicial
- ✓ Sin bloqueos activos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO ›

IMPACTO EN RV Q3 ›

IMPACTOS EN PERSONAS — Encuestas (EX), Talento Negocio, Comunicación, Talento Corporativo, Compensación y Selección

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026; impactos en 2027 pendientes del análisis de business case de septiembre

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

AGILIDAD · Tecnología y Transformación

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Marta Ruano)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Activación Squad IA Voz e IA Chat — 5 OCTUBRE · SEGÚN PLAN
Dominios · no entra en modo dominio/quad

Lanzamiento de encuestas — EN CURSO · SEGÚN PLAN
Personas · se preparan las encuestas de los equipos ya en dominios de agilidad y de los que subirán próximamente

Activación Squad SyP Hogar — 19 OCTUBRE · SEGÚN PLAN
Dominios · no entra en modo dominio/quad

Documento de criterios comunes entre Agilidad y estructura organizativa — EN CURSO · NUEVA
El qué (prioridades y trabajo) desde Agilidad; el cómo (acompañamiento, desarrollo y desempeño) desde la estructura organizativa

Cambio de estrategia de escalado con Eraneos — CERRADO · SEGÚN PLAN
Formación de facilitadores internos sin impactar al calendario del programa

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS EN EQUIPOS AGILES

41

+20 personas vs semana anterior (21 → 41)

KPI 1

0

-0,9 vs mes anterior

KPI 1

0

— pendiente definir

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 1

! Riesgo: colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto.

! Bloqueo: transición entre modelos, roles actuales vs nueva estructura e incertidumbre sobre las funciones. Resistencia al cambio. Faltan responsables de dominio (Suscripción, técnico) y POs. Afecta al RV trimestral 3Q.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO › · IMPACTO EN RV Q3 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

IMPACTOS PROYECTO — Organización, Incentivos Trimestrales

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 — No reportados

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

GOBIERNO Y PLATAFORMA DEL DATO

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Amaya Hurtado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward) Tarea de proyecto	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Identificación con Equipo de Análisis Equipo de Análisis	EN CURSO	SEGÚN PLAN
Integrador SDG realizando un diagnóstico SDG · Diagnóstico en curso	30/09	SEGÚN PLAN
Encuentro de Comunicación y nombramiento Data Owner Roadmap y lanzamiento Development Center	18/09	SEGÚN PLAN
Cambio de Plataforma Analítica Próximo hito del proyecto	30/09	SEGÚN PLAN
Calendario entregado Tarea de proyecto	30/09	SEGÚN PLAN
Mapa dominios seudoestables Próximo hito del proyecto	31/12	SEGÚN PLAN
Creación de dominio de datos Telefonía, Calidad y Digital	¿?	SEGÚN PLAN

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

29

% del colectivo pendiente de cerrar · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

Pendiente de reportar

KPI 1

0

Var. mensual: -x,x

KPI 1 · AVANCE

0

Pendiente definir KPIs · —

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

✓ Sin riesgos

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTO EN RV Q3 26 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre los dominios de clientes, pólizas, siniestros, calidad y finanzas, sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

IMPACTOS PROYECTO — Organización, nuevos roles y funciones, formación, gestión del cambio y comunicación

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL · PROYECTO CON ANEXO

CONTACT CENTER · Genesys Cloud (CCaaS)

REPLANIFICACION · SEMÁFORO AMARILLO

Coordinación: Almudena Castillo (backup Quique Cid)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Formación al próximo equipo · Empresas Pendiente de preparar material y sesiones de formación	Semana 3 OCT	REPLANIFICADO
Entrada de próximos equipos · Empresas Preparación reforzada, reunión final de agosto y calendario Teleco pendiente	Semana 4 OCT	REPLANIFICADO
Formación equipo · Cartera Citas Verificación + Recepción Pendiente de preparar material y sesiones de formación	Semana 5 OCT	EN PLAN
Entrada de próximos equipos · Cartera Citas Verificación + Recepción Preparación reforzada, reunión final de agosto y calendario Teleco pendiente	Semana 1 NOV	EN PLAN
Formación equipo · Comercial Ventas internet (Emision) Pendiente de preparar material y sesiones de formación	Semana 5 OCT	EN PLAN
Entrada de próximos equipos · Comercial Ventas internet (Emision) Preparación reforzada, reunión final de agosto y calendario Teleco pendiente	Semana 3 NOV 16-20	EN PLAN

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

70

4,66 % del colectivo · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

En replanificación · pendiente de reportar

KPI PERSONAS

—

Semáforo mensual de personas

ABANDONO Y NSS

—

−0,9 en el mes · equipos migrados

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- ! Replanificar de los próximos despliegues por impacto en CRM
- ! 3 vacantes en BI

OBJETIVO DEL PROYECTO

Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO › · IMPACTO EN RV Q3 › · ANEXOS · QUICK WINS ›

IMPACTOS EN FUNCIONES

Analítica, Compensación, Formación de negocio, Comunicación, Relación con el empleado y PMO · reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de los próximos PaP

QUICK WINS EFICIENCIAS 2026

15 min por FTE en gestión operativa · mejor información para Análisis · optimización del presupuesto de call center externo · −5 % de rellamadas · acelerador de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

REINGENIERÍA SyP

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Arancha Fernández (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Definición de líneas de trabajo. Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30/09
TO BE: Identificación de iniciativas y ejecución de quick-wins Tarea de proyecto	Q4
Rediseño y modelado de procesos Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30/10 Adelantado 1 mes
TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos Tarea de proyecto	30/10
Lanzamiento QuickWins Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30/10
Business case y plan de implantación Tarea de proyecto	30/10 Adelantado 1 mes
Definición de macroiniciativas de reingeniería del proceso Tarea de proyecto	EN CURSO
Definición del KPI objetivo de automatización Tarea de proyecto	EN CURSO
Identificación con Equipo de Análisis Tarea de proyecto	—
Coordinación con Comunicación · líneas informativas (adopción)	EN CURSO
Clarificación del funcionamiento del subdominio	EN CURSO
Preparación de encuestas	EN CURSO
Identificación de especialistas de proyectos y colaboradores	EN CURSO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la visión de cliente.

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS)

— %

Impacto en Personas previsto desde septiembre

LLAMADAS ACUM.

—

Acumulado mes a

ABANDONOS

—

X en el mes

ABSENTISMO

CORPORAL	MATERIAL	REDES
—	—	—
−X en el mes	−X en el mes	−X en el mes

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- Definir los equipos (squad) y perímetros de motor y hogar.
- Incorporaciones externas: responsable de dominio SyP.
- Vigilar la resistencia al cambio y composición de plantilla.
- Generar impacto positivo en los primeros casos de uso.
- No existe documentación de procedimientos. Riesgo: la herramienta podría no adjudicarse en 2026 por presupuesto; el área intentará mejorar los procesos internamente con IA de IT.
- Analizar el plan de formación si es necesario.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS PROYECTO Análisis, Laboral – Formación y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral, Pulsos

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 Alertas CICOS reclamaciones SDM (<20.000 €) · expedientes no reclamados · listados operativos · clasificación documental · accesos a portales

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CALIDAD HOGAR

EN CURSO · SEMÁFORO ROJO

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Rehúses de apertura: comunicaciones por grupo de causa Comunicaciones · por grupo de causa	17/09 REPLANIFICADO
Fase 2 Rehúses de apertura Comunicaciones · por grupo de causa	EN ANALISIS REPLANIFICADO
Apertura delegada HomeServe Implantación · en curso nueva planificación, pendiente cerrar calendario de entregas y plan de pruebas	15/11 REPLANIFICADO Fecha inicial 31/10
Métricas IPAS	31/09 SEGÚN PLAN
Emisión refuerzo explicación rehúses (Konecta Portugal)	EN CURSO SEGÚN PLAN
Análisis de mejoras Identificadas primeras mejoras de causa de Eléctricos, elaborando plan de acción con Negocio	EN CURSO SEGÚN PLAN

ABANDONOS HOGAR

- %

10.049 llamadas acumuladas

ABANDONOS IPAs

—

Sin dato reportado

LLAMADAS HOGAR

—

Acumulado mensual (LL)

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 3 · Bloqueos: 0 ·

- ! El equipo todavía no trabaja en modo Agile.
- ✓ Sin bloqueos activos documentados.
- ! **Homeserve:** 5 semanas de retraso, por encima de 30 días, lo que sitúa el proyecto en semáforo rojo; dependencia crítica del proveedor en los desarrollos y en las pruebas pendientes.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

IMPACTOS PROYECTO — Apertura delegada HomeServe · Rehuses de apertura · impacto en personas: –

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

NEGOCIO DE SALUD · Cambio de TPA

EN CURSO · RIESGO ALTO

Coordinación: Alicia Gutiérrez (backup María Luisa Criado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Cubrir Vacantes	Impacto en personas · prevista para el 01/09, se desvía al 18/09	EN CURSO· 31/09 — CON RETRASO 01/09
Solicitud de vacantes interna y externa	Abiertas; ambas pasan a ser externas · en curso	SEP 26 — SEGÚN PLAN
Plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos	Con nuevo servicio médico; se adelanta a octubre	OCT 26 — SEGÚN PLAN
Formación de HNA a Gestión Asistencial	Procedimientos de HNA para su gestión · pendiente fecha	PENDIENTE — SEGÚN PLAN
Cambio de TPA a HNA	En curso; entrada en vigor del nuevo modelo 01/27	ENE 27 — SEGÚN PLAN
Supervisión del proveedor HNA	En curso	EN CURSO — SEGÚN PLAN
Plan de Salida DKV para migración de informes de clientes	Identificadas primeras mejoras de causa de Eléctricos, elaborando plan de acción con Negocio	EN CURSO — En RIESGO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Recomendación, valoración de usuarios y reclamaciones por el cambio

SATISF. FORMACIÓN	AUTORIZACIONES	NPS
—	—	—
Var. mensual: —	Var. mensual: —	Var. mensual: —

RIESGOS, BLOQUEOS

5 riesgos · 0 bloqueos

- Entrada en vigor del cambio de TPA después de enero para renovaciones de colectivos y la mayoría de las pólizas de salud.
- 2 vacantes externas (CORGA – EXPPROSALUDCALIDAD), iniciado en julio.
- **Contrato de salida DKV:** sigue sin formalizarse; la primera revisión se recibió el 14/09 con desacuerdos relevantes.
- Avisos de renovación previos al cambio: no se comunicará al cliente · riesgo de negocio

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS EN PERSONAS — Formación, selección externa e interna, organización, comunicación interna y externa y gestión del cambio

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026: el cambio de TPA no se implanta hasta finales de enero de 2027

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA en VOZ

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinador Proyecto: Quique Cid (Backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Caso de uso: Gestión de SyP Motor
Desarrollo y PaT del caso de uso e inicio de pruebas

EN CURSO 05/10
REPLANIFICADO 30/09

Comunicación Uso IA a la sala con el despliegue en Gestion Motor SyP
Se acuerda trabajar la comunicación interna antes de la puesta en marcha y coordinar el mensaje con los responsables de la sala.

EN DEFINICION
SEGÚN PLAN

Caso de uso: Apertura partes Motor SyP
Análisis de dependencias para apertura y gestión de partes, Primeros casos de uso para siniestros de daños propios sin contrario

EN ANALISIS
SEGÚN PLAN

Caso de Uso – Precio de renovación - PRIORIZADO
Análisis de alcance, decisión primer filtro de clientes, con despliegue prudente para no impactar en retención ni prima

EN ANALISIS
SEGÚN PLAN

Caso de Uso – Asistencia Grúas
Análisis de la posible automatización de vehículos depositados en base de gruas y traslado a taller.

EN ANALISIS
SEGÚN PLAN

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

TOTAL AUTOGESTIONADAS	ASISTENCIA GRUA AUTOGESTIONADAS	TOTAL LLAMADAS SUSCEPTIBLES
6.525	4.792	117K
Acum. 23 Sep 26	Acum. 23 Sep 26	Sep 26

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

0 Riesgos: no reportados.

0 Bloqueos: sin bloqueos.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas)

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Migración del chat de casos de uso activos, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA CHAT · Lupe

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Quique Cid (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Información de nuevo producto de Mascotas
Incorporado a base de conocimiento la información del producto
EN CURSO · 04/10
SEGÚN PLAN

~~Reentrenamiento GP~~
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-593469: ofrecimientos del operador con los consentimientos a NO (chat Venta)
EN CURSO
SEGÚN PLAN

Reentrenamiento Generales
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-590617 ATC: reentrenamiento en modificación de póliza y recibos
EN CURSO · 18/09
SEGÚN PLAN

Actualizar respuesta deeplinks en chat
PaP 26-597767 · eliminar el indicador mobile en IA para presentar deeplinks en web mobile
EN CURSO · 30/09
SEGÚN PLAN

Pruebas y ajustes en curso
Deeplinks en App, nuevo informe de BI en chat, errores en rebotes de agente App y reorganización del skillset del chat de Retención
EN CURSO
SEGÚN PLAN

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Quick wins · Eficiencias 2026: en revisión

AVANCE IMPLANTACIÓN	KPI 1	KPI 1
—	—	—

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

! Base documental – Conocimiento disponible para futura migración de servicio de Chat a Happy Robot.

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS — Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · En revisión

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

SECCIÓN · PMO PERSCOM EN EVOLUCIÓN

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Seguimiento semanal de lo que la PMO PersCom construye y mejora: gobierno de KPIs, gestión del conocimiento y evolución del propio informe. Mismo formato que el seguimiento de proyectos, con histórico acumulado.

Gobierno de KPIs · Conocimiento · Informe · Histórico



Seguimiento semanal · PMO

PMO PERSCOM · AVANCES DE LA SEMANA

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Qué hemos movido esta semana en gobierno de KPIs, conocimiento y modelo de seguimiento.

SEMANA 21 SEP – 25 SEP 2026

PMO PersCom

AVANCES DE LA SEMANA · AGRUPADOS POR BLOQUES

FOCO · EN CURSO · IMPLANTADO · CONTINUO · PROTOTIPO · DESCARTADO

GOBIERNO DE KPIs

Catálogo corporativo de indicadores — FOCO — 04/09/2026

Primera propuesta recibida: 120 KPIs y KRIs en familias de negocio, personas, cliente, operaciones, tecnología y riesgo.

Cuadro de mando global de KPIs — FOCO — 04/09/2026

Trabajo conjunto PMO Compañía + PMO Personas para visualizar de forma integrada los indicadores de negocio y personas.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del conocimiento — CONTINUO — ACTUALIZ. 09/09

Evolución del glosario común y del Agente IA de soporte a la PMO: terminología, metodología, roles y KPIs.

Manual de metodología de gestión de proyectos PersCom — EN CURSO — 14/09 – 02/10

Elaboración del documento de metodología PMO PersCom: marco, roles y estándares de seguimiento. Cierre previsto del 14/09 al 02/10.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Mejoras en las fichas de seguimiento de proyectos — IMPLANTADO — 04/09/2026

Incluidos en las fichas si el proyecto se ve Impactado en RV Trimestral y si es así que objetivos tiene, y también generadas las slides de tareas históricas por cada proyecto para no perder la evolución global..

Nuevo diseño de ficha de seguimiento de proyecto — IMPLANTADO — 09/09/2026

Implantado: las fichas de todos los proyectos pasan al nuevo diseño, ya utilizado en la reunión de coordinadores y en el envío del seguimiento de la semana 37.

Nueva sección de avances de la PMO en el informe — IMPLANTADO — 04/09/2026

Este informe incorpora ya la sección semanal de avances de la PMO y su histórico de mejoras implantadas.

AVANCES ACTIVOS · SEMANA EN CURSO

7

tareas en seguimiento en 3 bloques de trabajo

ESTADO DE LOS AVANCES · ACTUALIZACIÓN SEMANAL

FOCO	EN CURSO	CONTINUO	IMPLANTADO	PROTOTIPO
2	1	1	3	0

! FOCO ACTUAL DE LA PMO

Cerrar el catálogo de indicadores y su cuadro de mando global con la PMO de Compañía: es lo que permitirá medir todos los proyectos con el mismo criterio.

Qué necesitamos: que cada coordinador valide sus indicadores antes del cierre de mes.

VER HISTORICO DE AVANCES ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

PMO PERSCOM · HISTÓRICO DE AVANCES

Histórico de avances y mejoras de la PMO

3 AVANCES IMPLANTADOS

Registro acumulado de las mejoras ya implantadas por la PMO, agrupadas por bloque.

AVANCES IMPLANTADOS · AGRUPADOS POR BLOQUES

INFORME DE SEGUIMIENTO

Impacto en RV Trimestral en las fichas de proyecto

Incorporado en las fichas el impacto en RV Trimestral junto con los objetivos del proyecto y su evolución global.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Slides de tareas históricas de proyectos

Creadas las slides de tareas históricas para mantener listadas las tareas ya cerradas de cada proyecto.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Kit de Supervivencia del Coordinador de Proyectos

Entregado a todos los coordinadores y disponible para consulta permanente como material de referencia.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Próxima entrada

Espacio reservado para el próximo avance de la PMO que pase a implantado.

PENDIENTE

3

avances implantados

IMPLANTADO · ÚNICO ESTADO DEL HISTÓRICO

+ CÓMO SE MANTIENE

Cuando un avance se implanta, pasa de la slide de avances de la semana a este histórico, dentro de su bloque.

VER AVANCES DE LA SEMANA ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: NUEVA PLANFIFICACION CONTACT CENTER

< VOLVER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

