
SEGUIMIENTO SEMANAL

Informe de seguimiento de proyectos estratégicos corporativos

PMO Personas

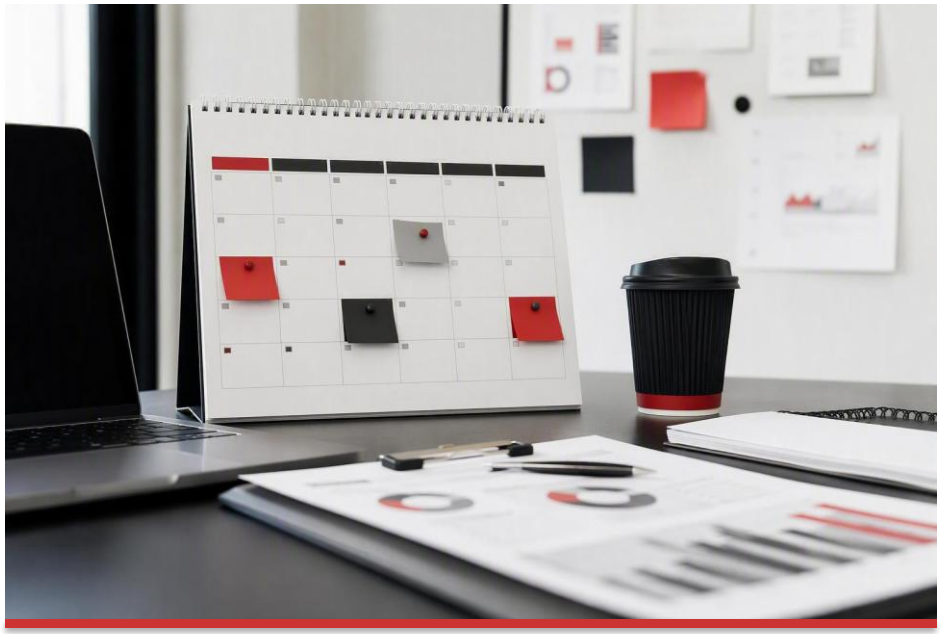

Semana 40 · 29/09/2026 – 02/10/2026

Resumen ejecutivo Perscom: avance de los proyectos estratégicos

Semana 40 · **CRM** comienza a construir la planificación de la Fase I tras completar los cinco DoR el 30/09. **Agilidad** suma 58 personas en equipos ágiles, 17 más que la semana anterior. **Contact Center** prepara las formaciones de Empresas para su próximo PaP. **IA Chat** pone en producción el ofrecimiento al operador con IG a «No» e **IA Voz** ya tiene priorizados los tres casos de uso que se trabajarán en el 4T. **Reingeniería SyP** avanza en las líneas de trabajo y prepara iniciativas y quick wins para octubre. **Calidad Hogar** acumula seis semanas de retraso en HomeServe; en **Salud** sigue abierto el riesgo de salida con DKV.

CRM · Planificación de la Fase I

Avance

- Completados los cinco DoR a 30/09, comienza la construcción de la planificación de la Fase I.
- En Personas, la primera planificación de formación está prevista para el 09/10.

Agilidad · Escalado de squads

Avance

- Ya son 58 personas en equipos ágiles, 17 más que la semana anterior.
- El 02/10 se activan Agente IA, Agente Voz y Arquitectura de Software.
- Nuevos grupos: envío del modelo de escucha, copies y creatividades a medida y enlaces a encuestas.

Contact Center · Formación de Empresas

Vigilar

- Formación de Empresas para el próximo PaP: sesiones de supervisores y operadores el 14/10, y de operadores con supervisores y dos personas de Expats el 15/10.
- Los próximos despliegues se replanifican por su impacto en CRM. El avance sigue pendiente de reportar.

IA Voz · Casos de uso priorizados

Avance

- Ya están priorizados los tres casos de uso para el 4T: gestión SyP Motor, precio de renovación y asistencia grúas.
- SyP Motor: pase previsto el 07/10, con comunicación previa a la sala.

Salud · DKV

Riesgo alto

El contrato de salida con DKV sigue sin formalizarse. El plan de migración de informes continúa en riesgo y con retraso.

IA Chat · Ofrecimiento al operador

Cerrado

El 30/09 se puso en producción el ofrecimiento al operador en Chat Venta cuando los consentimientos están a «NO» (IG = NO).

Reingeniería SyP · Próximos hitos

Avance

Las líneas de trabajo avanzan al 20 %. La identificación de iniciativas y quick wins está prevista para el 26/10 y el rediseño de procesos para el 30/10.

Calidad Hogar · HomeServe

En riesgo

HomeServe acumula seis semanas de retraso. Sigue pendiente cerrar el calendario de entregas y el plan de pruebas para la apertura delegada.

Prioridades inmediatas

CRM · Fase I

Construir la planificación de la Fase I con los cinco DoR cerrados y revisar las dependencias con Contact Center.

Formación · Empresas

Cerrar materiales y sesiones de supervisores y operadores del 14 y 15/10 antes del próximo PaP.

Escalado de squads

Acompañar los tres squads del 02/10 y cerrar responsables de dominio y POs pendientes.

HomeServe · Entregas

Cerrar calendario de entregas y plan de pruebas tras el retraso de seis semanas.

Riesgo Salud · DKV

Desbloquear el plan de salida y los informes de clientes necesarios para migrar a HNA.

Uso interno - No compartir fuera de la organización.

Avances de PMO Área Transformación

COORDINACIÓN ENTRE PMO
TRANSFORMACIÓN · PERSONAS

Foto de estado a 01/10 · cierre oficial del tercer trimestre

Reporte de la PMO de Transformación, foto a 01/10 con el cierre oficial del 3Q2026, con foco en CRM, Chat, Reingeniería del SIR, Contact Center y Maestro de coberturas.

Principales Riesgos

- **Integración Mascotas–Fidelización (alto):** subida a producción el domingo 04/10; el riesgo radica en la subida conjunta en un mismo PaP por la integración de ambos proyectos y su envergadura.
- **Salud · TPA con DKV (alto):** se están cerrando con DKV las negociaciones del plan de salida y migración de informes; el retraso del modelo de provisiones y DWH sigue en plan de mitigación con el equipo de IA, automatizando pruebas para minimizar el impacto en el cambio de TPA.
- **Maestro de coberturas (muy alto):** riesgo materializado: no se realizó la subida planificada el 30/09. Sigue consumiendo capacidad de los equipos de digital y, sin fechas de Training confirmadas, impactará al 4Q.

Impacto (vigilar): el retraso del Maestro de coberturas compromete capacidades futuras de los equipos de digital en el 4Q; el resto de los riesgos se mantiene sin cambios respecto al 24/09.

Foco Actual

Avances activos

- **CRM:** completados los 5 DoR a 30/09, lo que da paso a construir la planificación de la Fase I.
- **IA Chat:** el 30/09 se puso en producción el ofrecimiento de venta a los operadores para clientes con la IG a “No”.
- **Reingeniería del SIR** (Sistema de Interconexión de Registros sede Judicial)**:** el 30/09 pasó a producción la parte operacional que mejora la detección de errores sobre el archivo SIR.
- **Contact Center en la Nube:** cambios de calendario con despliegues por oleadas para controlar el impacto en la operación y garantizar el go-live del CRM en fecha.

Mensaje ejecutivo

Cierre de Q3

Cerrado oficialmente el 3Q2026: CRM completa los 5 DoR, Chat y Reingeniería del SIR pasan a producción el 30/09 y el Contact Center replanifica su calendario por oleadas.

Foco

Se mantienen dos riesgos de la semana anterior (Mascotas–Fidelización Fase III y TPA de Salud) y se materializa el del Maestro de coberturas.

PaP 04/10

Mascotas Veterinario y Fidelización Fase III afrontan la subida a producción conjuntamente con Mascotas el 04/10, en un mismo PaP por la integración de ambos proyectos.

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE - DETALLE POR INICIATIVA

Fichas de proyectos

Seguimiento individual de los proyectos



Estado · KPIs · hitos · próximos pasos

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CRM · Salesforce Financial Services Cloud

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Análisis del Focus y reuniones viabilidad modificar la ficha cliente 360	Talento Negocio	30 SEP · REPLANIFICADO (25/09)
Definición de métricas de sala para monitorizar en la implantación	Talento Negocio, Análisis · operación pura	SEPTIEMBRE · SEGÚN PLAN
Revisión RV mensual previo al CRM (incentivos de los comerciales)	Talento Negocio, Compensación	01 NOV · REPLANIFICADO 30/09 – 01/10
Creación playbook comunicación de proyecto (Tercera entrega)	Talento Negocio, Comunicación interna · duración 4 semanas	07 NOV · REPLANIFICADO (18/09)
Comunicación negocio	Talento Negocio, Comunicación interna	19 - 23 OCT · REPLANIFICADO (16/10)
Encuesta predisposición al cambio	Talento Negocio, Comunicación y Organización · trabajo en septiembre	26 OCT · SEGÚN PLAN
Lanzamiento campaña de naming (CRM)		27 OCT - 23 NOV
Presentación primera planificación calendario de formación	Hito de proyecto · impacto en Personas desde 2027	09 OCT
Selección externa Freelance	Selección · en búsqueda (1 pers.)	EN CURSO · SEGÚN PLAN
Go live	Hito de proyecto · impacto en Personas desde 2027	18 ENE 27 · ADELANTADO DEL 31/01

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

0

0 % del colectivo · uso desde 2027

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

7 %

Go live 18 / 01 · según planificación

ABSENTISMO

–

Sin dato en el mes

PRODUCTIVIDAD

0 %

Sin impacto 2026

RETRIB. VARIABLE

–

Revisión mensual

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 0

- ! Impacto del CRM en incentivos mensuales (2027)
- ! Pendiente entrega Planificación Inicial
- ✓ Sin bloqueos activos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO ›

IMPACTO EN RV Q3 ›

IMPACTOS EN PERSONAS Encuestas (EX), Talento Negocio, Comunicación, Talento Corporativo, Compensación y Selección

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026; impactos en 2027 pendientes del análisis de business case de septiembre

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

AGILIDAD · Tecnología y Transformación

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Marta Ruano)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Activación 3 squads: Agente IA y Agente Voz (Canales) + Arquitectura de Software — 2 OCT
Canales · Agente IA, Agente Voz y Arquitectura de Software

Envío encuestas EX · modelo de escucha — EN CURSO
Envíos 05–09 OCT · copies, creatividades y enlaces adaptados por grupo

- Agente IA · envío de encuesta EX
- Agente Voz · envío de encuesta EX
- Arquitectura de Software · envío de encuesta EX

Town Hall Tecnología + Transformación: avances del proyecto — 15 OCT
Tecnología y Transformación · comunicación de avances

Activación Servicios Corporativos (1 squad) y Finanzas (1 squad) — 2 NOV
Escalado · 2 squads por sprint (cada 2 semanas)

Habilitadores: Soporte Técnico y Documentación y Comunicaciones — 16 NOV
Equipos habilitadores · soporte y comunicación del modelo

Habilitadores: Plataforma y Arquitectura IA y Diseño de Frontales — 30 NOV
Equipos habilitadores · plataforma, IA y diseño

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS EN EQUIPOS AGILES

58

+17 personas vs semana anterior (41 → 58)

KPI 1

0

-0,9 vs mes anterior

KPI 1

0

— pendiente definir

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 1 · Bloqueos: 1

! Riesgo: colisión entre proyectos con nuevo método con inicio de proyecto.

! Bloqueo: transición entre modelos, roles actuales vs nueva estructura e incertidumbre sobre las funciones. Resistencia al cambio. Faltan responsables de dominio (Suscripción, técnico) y POs. Afecta al RV trimestral 3Q.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO ›

IMPACTO EN RV Q3 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Rediseñar cómo trabajan juntos Tecnología, Transformación y Negocio. Es el habilitador transversal que determina la velocidad a la que se ejecuta todo el resto del portfolio.

IMPACTOS PROYECTO — Organización, Incentivos Trimestrales

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 — No reportados

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

GOBIERNO Y PLATAFORMA DEL DATO

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Pilar Uguet (backup Amaya Hurtado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Identificación de Roles (Data Owner y Data Steward)	Tarea de proyecto	EN CURSO · SEGÚN PLAN
Identificación con Equipo de Análisis	Equipo de Análisis	EN CURSO · SEGÚN PLAN
Integrador SDG realizando un diagnóstico	SDG · Diagnóstico en curso	30 SEP · SEGÚN PLAN
Encuentro de Comunicación y nombramiento Data Owner	Roadmap y lanzamiento Development Center	18 SEP · SEGÚN PLAN
Cambio de Plataforma Analítica	Próximo hito del proyecto	30 SEP · SEGÚN PLAN
Calendario entregado	Tarea de proyecto	30 SEP · SEGÚN PLAN
Mapa dominios seudoestables	Próximo hito del proyecto	31 DIC · SEGÚN PLAN
Creación de dominio de datos	Telefonía, Calidad y Digital	¿? · SEGÚN PLAN

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

29

% del colectivo pendiente de cerrar · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

Pendiente de reportar

KPI 1

0

Var. mensual: -x,x

KPI 1 · AVANCE

0

Pendiente definir KPIs · —

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

✓ Sin riesgos

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTO EN RV Q3 26 ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer un modelo formal de propiedad y calidad del dato (Data Owner, Data Steward, Data Custodian) sobre los dominios de clientes, pólizas, siniestros, calidad y finanzas, sostenido en una nueva plataforma analítica tipo Lakehouse (Databricks).

IMPACTOS PROYECTO — Organización, nuevos roles y funciones, formación, gestión del cambio y comunicación

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL · PROYECTO CON ANEXO

CONTACT CENTER · Genesys Cloud (CCaaS)

REPLANIFICACION · SEMÁFORO AMARILLO

Coordinación: Almudena Castillo (backup Quique Cid)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Formación al próximo equipo · Empresas Pendiente de preparar material y sesiones de formación	13 OCT REPLANIFICADO
Entrada de próximos equipos · Empresas Preparación reforzada, reunión final de agosto y calendario Teleco pendiente	Semana 4 OCT REPLANIFICADO
Formación equipo Empresas · supervisores y operadores Formación · impacto en personas	SEMANA 12 OCT
1 sesión para supervisores y otra por la tarde para operadores Sesiones de formación · supervisores y operadores	MIÉRCOLES 14 OCT
2 sesiones para operadores (mañana y tarde), con supervisores Sesiones de formación · operadores	JUEVES 15 OCT
Se suman 2 personas de Expats (una, colaboradora de formación) Asistentes · equipo de Expats	ASISTENTES

PERSONAS · USO REAL

N.º DE PERSONAS

70

4,66 % del colectivo · +0,7 en el mes

AVANCE DEL PROYECTO

% DE AVANCE

—

En replanificación · pendiente de reportar

KPI PERSONAS

—

Semáforo mensual de personas

ABANDONO Y NSS

—

−0,9 en el mes · equipos migrados

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- ! Replanificar de los próximos despliegues por impacto en CRM
- ! 3 vacantes en BI

OBJETIVO DEL PROYECTO

Sustituir la telefonía on-premise de 30 años (Avaya + NICE + Calabrio) por Genesys Cloud, plataforma CXaaS 100% cloud sobre AWS.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO › · IMPACTO EN RV Q3 › · ANEXOS · QUICK WINS ›

IMPACTOS EN FUNCIONES Analítica, Compensación, Formación de negocio, Comunicación, Relación con el empleado y PMO · reforzar preparación previa, soporte en sala y coordinación de los próximos PaP

QUICK WINS EFICIENCIAS 2026 15 min por FTE en gestión operativa · mejor información para Análisis · optimización del presupuesto de call center externo · −5 % de rellamadas · acelerador de CRM e IA Voz

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

REINGENIERÍA SyP

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Arancha Fernández (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Avance de líneas de trabajo del proyecto (hasta validación de modelos) Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	EN CURSO 20%
TO BE: Identificación de iniciativas y ejecución de quick-wins Tarea de proyecto	26 OCT
Rediseño y modelado de procesos Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30 OCT Adelantado 1 mes
TO BE: Definición de métricas objetivo e identificación de impactos Tarea de proyecto	30 OCT
Lanzamiento QuickWins Próximo hito del proyecto (impacto en personas)	30 OCT
Business case y plan de implantación Tarea de proyecto	26 OCT Adelantado 1 mes
Definición de macroiniciativas de reingeniería del proceso Tarea de proyecto	EN CURSO
Definición del KPI objetivo de automatización Tarea de proyecto	EN CURSO
Gestión del cambio, apoyo implantación y consolidación Tarea de proyecto	2027
Coordinación con Comunicación · líneas informativas (adopción)	EN CURSO
Clarificación del funcionamiento del subdominio	EN CURSO
Preparación de encuestas	EN CURSO
Identificación de especialistas de proyectos y colaboradores	EN CURSO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transformar el proceso de siniestros de motor, que da servicio a más de 400.000 clientes al año en un ramo que concentra más de 600 millones de euros de coste técnico anual. (Único proyecto ya completado). El reto es construir un modelo operativo escalable que incorpore la visión de cliente.

AVANCE DE IMPLANTACIÓN (PERSONAS)

— %

Impacto en Personas previsto desde septiembre

LLAMADAS ACUM.

—

Acumulado mes a

ABANDONOS

—

X en el mes

ABSENTISMO

CORPORAL	MATERIAL	REDES
—	—	—
–X en el mes	–X en el mes	–X en el mes

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 6 · Bloqueos: 0

- Volumetría documental por tipología **(02/10)**
- Extracción STP: virtual / semi / manual + tareas **(02/10)**
- Perseo: llamadas y motivos de contacto **(05/10)**
- Detalle de transferencias IVR (detectar causas de derivación incorrecta) **(05/10)**

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS PROYECTO — Análisis, Laboral – Formación y Gestión del Cambio con modelo To-Be, RV Trimestral, Pulsos

QUICKWINS EFICIENCIAS 2026 — Alertas CICOS reclamaciones SDM (<20.000 €) · expedientes no reclamados · listados operativos · clasificación documental · accesos a portales

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

CALIDAD HOGAR

EN CURSO · SEMÁFORO ROJO

Coordinación: Jesús Ortega (backup Belén Ayala)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Rehúses de apertura: comunicaciones por grupo de causa Comunicaciones · por grupo de causa (coberturas generales)	17 SEP	REPLANIFICADO
Fase 2 Rehúses de apertura Comunicaciones · por grupo de causa (continente, contenido, daños por agua, eléctricos y electrodomésticos, hurtos y cristales)	Q4	REPLANIFICADO
Apertura delegada HomeServe Implantación · en curso nueva planificación, pendiente cerrar calendario de entregas y plan de pruebas	22 NOV	REPLANIFICADO Fecha inicial 15/10
Métricas IPAS	30 OCT	SEGÚN PLAN
Emisión refuerzo explicación rehúses (Konecta Portugal)	EN CURSO	SEGÚN PLAN

ABANDONOS HOGAR

- %

10.049 llamadas acumuladas

LLAMADAS HOGAR

—

Sin dato reportado

NSS HOGAR

—

Sin dato reportado

RIESGOS Y BLOQUEOS

Riesgos: 3 · Bloqueos: 0 ·

- ! El equipo todavía no trabaja en modo Agile.
- ✓ Sin bloqueos activos documentados.
- ! **Homeserve:** 6 semanas de retraso, por encima de 30 días, lo que sitúa el proyecto en semáforo rojo; dependencia crítica del proveedor en los desarrollos y en las pruebas pendientes.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Convertir a Línea Directa en la aseguradora de referencia en calidad de servicio de Hogar — el ramo donde hoy tiene sus mayores carencias, con impacto en la percepción de marca.

IMPACTOS PROYECTO — Apertura delegada HomeServe · Rehuses de apertura · impacto en personas: –

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · No reportados

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

NEGOCIO DE SALUD · Cambio de TPA

EN CURSO · RIESGO ALTO

Coordinación: Alicia Gutiérrez (backup María Luisa Criado)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Solicitud de vacante externa - Cubrir Vacantes Impacto en personas · prevista para el 01/09, se desvía al 18/09	EN CURSO· 30 SEP	CON RETRASO 01/09
Vacante externa Especialista Proveedores de Salud – Incorporación Impacto en personas · Incorporación el 19/10	SELECCIONADO 19/10	CON RETRASO 01/09
Desarrollo del plan interno de formación – Aprobado por negocio En curso	EN CURSO· 31 OCT	SEGÚN PLAN
Plan de comunicación a clientes de cartera y nuevos Con nuevo servicio médico; se adelanta a octubre	25 SEP	SEGÚN PLAN
Formación de HNA a Gestión Asistencial Procedimientos de HNA para su gestión · pendiente fecha	PENDIENTE	SEGÚN PLAN
Cambio de TPA a HNA En curso; entrada en vigor del nuevo modelo 01/27	1 FEB 27	CON RETRASO 24/01/2027
Elaboración de procedimientos de para la gestión del cambio a HNA En curso	EN CURSO· 30 SEP	SEGÚN PLAN
Plan de Salida DKV para migración de informes de clientes (autorizaciones) Identificadas primeras mejoras de causa de Eléctricos, elaborando plan de acción con Negocio	EN CURSO	EN RIESGO – CON RETRASO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Relanzar la propuesta de valor de Salud —75.000 asegurados— con HNA como nuevo proveedor de gestión asistencial, condición necesaria para desplegar capacidades avanzadas.

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Recomendación, valoración de usuarios y reclamaciones por el cambio

SATISF. FORMACIÓN	AUTORIZACIONES	NPS
—	—	—
Var. mensual: —	Var. mensual: —	Var. mensual: —

RIESGOS, BLOQUEOS

4 riesgos · 0 bloqueos

- Entrada en vigor del cambio de TPA después de enero para renovaciones de colectivos y la mayoría de las pólizas de salud.
- 2 vacantes externas, iniciado en julio.
- **Contrato de salida DKV:** sigue sin formalizarse; la primera revisión se recibió el 14/09 con desacuerdos relevantes.
- Avisos de renovación previos al cambio: no se comunicará al cliente · riesgo de negocio

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

IMPACTOS EN PERSONAS

Formación, selección externa e interna, organización, comunicación interna y externa y gestión del cambio

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Sin impacto en 2026: el cambio de TPA no se implanta hasta finales de enero de 2027

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA en VOZ

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinador Proyecto: Quique Cid (Backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Caso de uso: Gestión de SyP Motor (como va mi parte)
OK al PaP, preparación de pase a producción.
EN CURSO 07 OCT
REPLANIFICADO 30/09 – 05/10

Comunicación Uso IA a la sala con el despliegue en Gestion Motor SyP
Se acuerda trabajar la comunicación interna antes de la puesta en marcha y coordinar el mensaje con los responsables de la sala.
ANTES del 07 OCT
SEGÚN PLAN

Caso de Uso 1: Precio de renovación - PRIORIZADO
Análisis de alcance, decisión primer filtro de clientes, con despliegue prudente para no impactar en retención ni prima
DIC 2026
SEGÚN PLAN

Caso de Uso 2: Asistencia Grúas
Análisis de la posible automatización de vehículos depositados en base de grúas y traslado a taller.
DIC 2026
SEGÚN PLAN

Caso de uso 3: Apertura partes Motor SyP
Análisis de dependencias para apertura y gestión de partes, Primeros casos de uso para siniestros de daños propios sin contrario
ENE 2027
SEGÚN PLAN

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

TOTAL AUTOGESTIONADAS	ASISTENCIA GRUA AUTOGESTIONADAS	TOTAL LLAMADAS SUSCEPTIBLES
6.525	4.792	117K
Acum. 23 Sep 26	Acum. 23 Sep 26	Sep 26

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

0 Riesgos: no reportados.

0 Bloqueos: sin bloqueos.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS

Reducción del abandono de llamadas y avance de la digitalización (indicadores medidos en expedientes gestionados, no llamadas recibidas)

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · Migración del chat de casos de uso activos, definición de squads y dominios, y coordinación con Reingeniería SyP

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO · SEGUIMIENTO SEMANAL

IA CHAT · Lupe

EN CURSO · SEMÁFORO VERDE

Coordinación: Quique Cid (backup Eduardo Castro)

HITOS Y TAREAS · ORDENADOS POR FECHA

EN RIESGO · PRÓXIMO · EN CURSO · CERRADO

Información de nuevo producto de Mascotas
Incorporado a base de conocimiento la información del producto. Dado el OK al PaP.
EN CURSO · 04 OCT
SEGÚN PLAN

Reentrenamiento GP
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-593469: ofrecimientos del operador con los consentimientos a NO (chat Venta)
EN CURSO
SEGÚN PLAN

Reentrenamiento Generales
Mejora de la eficiencia de la IA · PaP 26-590617 ATC: reentrenamiento en modificación de póliza y recibos
EN CURSO · 18 SEP
SEGÚN PLAN

Actualizar respuesta deeplinks en chat sobre Topic sobre respuestas
Se ha realizado el PaP de Topics sobre respuestas con Deeplink para su medición.
30 SEP
SEGÚN PLAN
CCERRADO

Deeplinks - Pruebas y ajustes en curso
Deeplinks en App, nuevo informe de BI en chat, errores en rebotes de agente App y reorganización del skillset del chat de Retención
EN CURSO
SEGÚN PLAN

Ofrecimientos del operador con IG = NO (Chat Venta)
PaP 26-593469-TRVyC-CHAT · Venta/agente: ofrecimiento cuando los consentimientos están a “NO”.
30 SEP
SEGÚN PLAN
CERRADO

KPIs DE PERSONAS

EN DEFINICIÓN

Quick wins · Eficiencias 2026: en revisión

AVANCE IMPLANTACIÓN	KPI 1	KPI 1
—	—	—
—	—	—

RIESGOS, BLOQUEOS

Riesgos: 0 · Bloqueos: 0

! Base documental – Conocimiento disponible para futura migración de servicio de Chat a Happy Robot.

✓ Sin bloqueos

DOCUMENTACIÓN VINCULADA

VER HISTÓRICO DE TAREAS ›

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desplegar agentes conversacionales de IA (no deterministas) en los dos canales de mayor volumen —voz y chat— bajo un modelo híbrido IA + persona.

IMPACTOS EN PERSONAS — Disminución de la transferencia de llamadas gestionados con Chat IA a Operador del Chat

QUICK WINS · EFICIENCIAS 2026 · En revisión

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

SECCIÓN · PMO PERSCOM EN EVOLUCIÓN

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Seguimiento semanal de lo que la PMO PersCom construye y mejora: gobierno de KPIs, gestión del conocimiento y evolución del propio informe. Mismo formato que el seguimiento de proyectos, con histórico acumulado.

Gobierno de KPIs · Conocimiento · Informe · Histórico



Seguimiento semanal · PMO

PMO PERSCOM · AVANCES DE LA SEMANA

Avances y mejoras de la PMO PersCom

Qué hemos movido esta semana en gobierno de KPIs, conocimiento y modelo de seguimiento.

SEMANA 28 SEP – 02 OCT 2026

PMO PersCom

AVANCES DE LA SEMANA · AGRUPADOS POR BLOQUES

FOCO · EN CURSO · IMPLANTADO · CONTINUO · PROTOTIPO · DESCARTADO

GOBIERNO DE KPIs

Catálogo corporativo de indicadores — FOCO — 04/09/2026

Primera propuesta recibida: 120 KPIs y KRIs en familias de negocio, personas, cliente, operaciones, tecnología y riesgo.

Cuadro de mando global de KPIs — FOCO — 04/09/2026

Trabajo conjunto PMO Compañía + PMO Personas para visualizar de forma integrada los indicadores de negocio y personas.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del conocimiento — CONTINUO — ACTUALIZO. 30/09

Evolución del glosario común y del Agente IA de soporte a la PMO: terminología, metodología, roles y KPIs.

Manual de metodología de gestión de proyectos PersCom — IMPLANTADO — 14/09 – 02/10

Elaboración del documento de metodología PMO PersCom: marco, roles y estándares de seguimiento. Cierre previsto del 14/09 al 02/10.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Mejoras en las fichas de seguimiento de proyectos — IMPLANTADO — 04/09/2026

Incluidos en las fichas si el proyecto se ve Impactado en RV Trimestral y si es así que objetivos tiene, y también generadas las slides de tareas históricas por cada proyecto para no perder la evolución global..

Nuevo diseño de ficha de seguimiento de proyecto — IMPLANTADO — 09/09/2026

Implantado: las fichas de todos los proyectos pasan al nuevo diseño, ya utilizado en la reunión de coordinadores y en el envío del seguimiento de la semana 37.

Nueva sección de avances de la PMO en el informe — IMPLANTADO — 04/09/2026

Este informe incorpora ya la sección semanal de avances de la PMO y su histórico de mejoras implantadas.

AVANCES ACTIVOS · SEMANA EN CURSO

7

tareas en seguimiento en 3 bloques de trabajo

ESTADO DE LOS AVANCES · ACTUALIZACIÓN SEMANAL

FOCO	EN CURSO	CONTINUO	IMPLANTADO	PROTOTIPO
2	0	1	4	0

! FOCO ACTUAL DE LA PMO

Cerrar el catálogo de indicadores y su cuadro de mando global con la PMO de Compañía: es lo que permitirá medir todos los proyectos con el mismo criterio.

Qué necesitamos: que cada coordinador valide sus indicadores antes del cierre de mes.

VER HISTORICO DE AVANCES ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

PMO PERSCOM · HISTÓRICO DE AVANCES

Histórico de avances y mejoras de la PMO

3 AVANCES IMPLANTADOS

Registro acumulado de las mejoras ya implantadas por la PMO, agrupadas por bloque.

AVANCES IMPLANTADOS · AGRUPADOS POR BLOQUES

INFORME DE SEGUIMIENTO

Impacto en RV Trimestral en las fichas de proyecto

Incorporado en las fichas el impacto en RV Trimestral junto con los objetivos del proyecto y su evolución global.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Slides de tareas históricas de proyectos

Creadas las slides de tareas históricas para mantener listadas las tareas ya cerradas de cada proyecto.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Kit de Supervivencia del Coordinador de Proyectos

Entregado a todos los coordinadores y disponible para consulta permanente como material de referencia.

IMPLANTADO

25 – 29 AGO 2026

Próxima entrada

Espacio reservado para el próximo avance de la PMO que pase a implantado.

PENDIENTE

3

avances implantados

IMPLANTADO · ÚNICO ESTADO DEL HISTÓRICO

+ CÓMO SE MANTIENE

Cuando un avance se implanta, pasa de la slide de avances de la semana a este histórico, dentro de su bloque.

VER AVANCES DE LA SEMANA ›

linea directa

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Anexo: NUEVA PLANFIFICACION CONTACT CENTER

< VOLVER

Coordinador Proyecto: **Almudena Castillo**

