

LINEA DIRECTA

2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484

PROPUESTA TÉCNICA – SOLUCION SALESFORCE

06 MARZO 2026

LEGAL DISCLAIMER

Esta Propuesta es confidencial y propiedad de Accenture, S.L. (“Accenture”). Los materiales, ideas y conceptos contenidos en la Propuesta deben ser usados exclusivamente para valorar las capacidades de Accenture en prestar a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. (el “Cliente”) los servicios solicitados por la misma y su contenido no puede ser revelado o comunicado a nadie que no sea un empleado del Cliente directamente implicado en la valoración de la Propuesta y que se haya comprometido a mantener confidenciales los contenidos de la misma y a no divulgarlos a terceros u otros proveedores así como a no reproducirlos sin el consentimiento expreso de Accenture.

Accenture asume que la información, datos etc. que, en su caso, sean facilitados por el Cliente y que hayan servido como base para la elaboración de los Productos, son ciertos y veraces, no entrando a contrastarlos con ninguna otra fuente ni asumiendo responsabilidad alguna sobre los mismos. El Cliente asume la responsabilidad del empleo, o no, de los Productos y de que éstos se adecuen a los requisitos por éste establecidos. Los Productos se entregan para el uso interno por parte del Cliente, cualquier otro uso o exhibición de los mismos deberá ser previamente autorizado por escrito por Accenture. Las decisiones que el Cliente adopte con base en los Productos se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad del Cliente.

Se entiende que todas las aportaciones sugeridas por Accenture en relación con este proyecto son sólo recomendaciones / apoyo desde una perspectiva comercial y/o técnica y no constituyen en modo alguno asesoramientos legales o fiscales. Así se confirma que Accenture no es un bufete de abogados ni un asesor fiscal y no puede emitir opiniones legales ni garantizar el cumplimiento de ninguna normativa. En tal medida, el Cliente es el único responsable del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de su negocio.

Todos los productos, metodologías, assets, inteligencia artificial y/o herramientas preexistentes titularidad de Accenture, utilizadas durante la ejecución de los trabajos objeto de contratación, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Accenture y en ningún caso serán transferidos al Cliente en virtud de la presente Propuesta. El Cliente no tendrá u obtendrá ningún derecho sobre tales Activos Propios (o sobre cualquier modificación o mejora) que no sean de conformidad con la licencia estándar de Accenture para dichos Activos Propios o, en el caso de Activos propiedad de terceros, de conformidad con términos aceptables para el tercero aplicable. Si los Activos Propios fueran puestos a disposición del Cliente, estarán disponibles "AS IS" y sin garantías expresas o implícitas de ningún tipo, y estarán sujetos únicamente a los términos aplicables del contrato de licencia o los términos y condiciones aplicables.

En la medida en que una Parte identifique productos de open source, el receptor podrá utilizarlos únicamente de conformidad con los términos de la licencia aplicables a dichos productos. La puesta a disposición de dichos productos se efectuará "as is" y sin garantía de ningún tipo.

Se hace constar que, si las personas indicadas en la presente Propuesta no pudieran formar parte del equipo por causas ajenas a Accenture (esto es, de modo enunciativo y no limitativo: baja por enfermedad, baja como trabajador de Accenture, etcétera), serán sustituidos por personas de similar categoría profesional.

En la presente Propuesta Accenture utiliza palabras y frases en la forma indicada: "maximizar", "optimizar" y "óptima" significan mejorar con un grado comercialmente razonable; "minimizar" significa reducir con un grado comercialmente razonable; "Mejore/s" se entiende por alto nivel; "Socio" y "asociaciones" no significa una asociación legal, sino más bien una relación de colaboración; "correcto" allí donde se usa como adjetivo correspondiente a un nivel adecuado; y "garantizar" y "permitir" se refieren a la realización de s comerciales razonables para implementar.

Esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

Accenture no acepta condiciones y/o cláusulas respecto de las cuales no ha manifestado expresamente su conformidad. Lo previsto en esta propuesta prevalecerá respecto de lo dispuesto en la RFP . Las partes convienen que en caso de aceptación de la Propuesta emitida por Accenture las Partes negociarán un contrato específico sobre la base del modelo que se adjunta por Accenture con el envío de la propuesta cuyos cambios se han basado en precedentes negociados entre las Partes. El establecimiento por el Cliente en su Pedido de cualesquiera términos y condiciones diferentes a los de la presente Propuesta, se tendrán por no puestos.

El alcance de los servicios de Accenture excluye expresamente los servicios de seguridad, incluidos, entre otros, la gestión de los servicios de seguridad, los servicios de ciberdefensa (como las pruebas de penetración, los servicios de evaluación de vulnerabilidades, la búsqueda de amenazas y los servicios de respuesta a incidentes, o cualquier evaluación de monitorización, escaneo y evaluación. o soluciones para vulnerabilidades de seguridad en los entornos del Cliente. El Cliente proporcionará todo el software necesario para que Accenture pueda prestar los servicios, y será responsable de obtener, sin costo alguno para Accenture, los consentimientos y autorizaciones necesarias para el uso de Accenture de cualquier producto de terceros, incluyendo, pero no limitado a, software, necesario para prestar los servicios

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

Esta propuesta hace referencia a marcas que pueden ser titularidad de terceros. El uso de esas marcas no es una afirmación de propiedad de las dichas marcas por Accenture y no pretende representar o implicar la existencia de una asociación entre Accenture y los legítimos propietarios de esas marcas.

La validez de la Propuesta es de 90 días a partir de su fecha de presentación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Gracias por la invitación dirigida por LDA a Accenture para la presentación de una propuesta bajo el alcance "**Implementación CRM**".

Creemos firmemente que nuestra propuesta cumple con las expectativas depositadas por LDA, aunque estamos a su completa disposición para discutir cualquier cambio que consideren apropiado, así como aclarar cualquier duda que pueda surgir tras la revisión de este documento.

Estamos plenamente comprometidos con la oportunidad de trabajar junto a LDA en este programa transformador, que creemos es un paso clave para evolucionar el modelo de relación con clientes adoptándolo a los nuevos retos que demandan los asegurados y alineándolos con la ambición del negocio.

Queremos mostrar que somos el socio adecuado para que LDA obtenga el máximo beneficio de esta iniciativa estratégica y creemos que estamos preparados para cumplir con sus expectativas:

- Creemos firmemente que somos el socio ideal para apoyar a LDA en esta iniciativa por nuestra **amplia experiencia en proyectos similares**, y porque somos el **Partner líder en implementaciones de soluciones Salesforce**.
- Nos comprometemos a **involucrar a profesionales específicamente cualificados para este proyecto** e **incorporar nuestro conocimiento y experiencia** en proyectos similares.
- Promovemos una **forma de trabajo colaborativa y transparente** entre LDA y Accenture.



Jordi Bessa
Managing Director
Responsable de Salesforce en Iberia



Maria Garcia
Managing Director
Responsable de Song de Experiencia cliente



Laura Ferre
Managing Director
Responsable de la cuenta de LDA en España

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Tabla de contenidos

0 Resumen ejecutivo

1 Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

2 Propuesta técnica

3 Cobertura de requisitos

4 Gestión del cambio y Adopción

5 Plan de trabajo y Equipo

6 Gestión del mantenimiento

7 Metodología y Gobierno

8 Listado de entregables

9 Consideraciones

10 Anexos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

0. Resumen ejecutivo

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONTEXTO

Contexto de negocio

Hoy en día, el sector asegurador se enfrenta a un **contexto de cliente cada vez más exigente**, más digital y menos tolerante a fricciones. Los clientes esperan **interacciones coherentes** independientemente del canal, respuestas **personalizadas**, y una **relación coherente** con la compañía a lo largo de todo su de vida.

En este escenario, la capacidad de gestionar de forma unificada la relación con el cliente se convierte en un factor diferencial para competir, crecer y retener: **el CRM es una palanca estratégica** para la relación con clientes.

Hasta ahora, Línea Directa se apoya en un core asegurador robusto que concentra la lógica transaccional crítica del negocio y garantiza la estabilidad operativa. Este core ha permitido sostener el crecimiento y la eficiencia durante años, pero el modelo actual presenta **limitaciones a la hora de evolucionar la experiencia de cliente**, **ganar agilidad** comercial y ofrecer una **visión 360** de la relación.

Qué busca Línea Directa

En este marco, Línea Directa impulsa este proyecto con una ambición clara: evolucionar hacia un modelo en el que la **relación con el cliente esté centralizada**, gobernada y preparada para crecer apalancándose en un **CRM de mercado**. El objetivo no es únicamente implantar una nueva herramienta, sino **sentar las bases de una plataforma estratégica** que permita mejorar la experiencia del cliente y habilitar nuevos modelos comerciales de forma progresiva. Una plataforma que permita:

- ✓ Una **implantación progresiva**, segura y alineada a negocio
- ✓ La incorporación de capacidades avanzadas como la **automatización** o la **inteligencia artificial**
- ✓ **Adaptarse a la evolución del negocio** sin generar rigideces y minimizando dependencias

Cuáles son los retos

- ✓ Transformación controlada
- ✓ Escalar la solución manteniendo calidad y trazabilidad del dato
- ✓ Disponibilización de los datos en real time
- ✓ Gobierno de integraciones y evolución futura del ecosistema
- ✓ Continuidad del negocio durante la implantación
- ✓ Adopción real por parte de los usuarios

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

POR QUÉ ACCENTURE

Estamos en **disposición de contribuir a los objetivos de Grupo LÍNEA DIRECTA** gracias a un profundo conocimiento del ámbito asegurador, nuestro conocimiento de Línea Directa, y aportando un equipo con amplia experiencia en proyectos similares, además de mantener una robusta relación con el ecosistema de vendors.

01 Conocemos LDA

Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes iniciativas en LDA

LDA y Accenture trabajamos de forma coordinada en varios ámbitos de la transformación de vuestro negocio (plan de eficiencia operativa, definición de la experiencia futura de cliente , Framswork RAI & MVPs Gen AI, entre otros)

02 Conocemos la industria

Somos un colaborador estratégico importante de muchas de las aseguradoras líderes

Y estamos continuamente alimentado nuestra visión del sector sobre las tendencias que moldearán el negocio.

03 Principal socio de Salesforce en el mundo

Accenture es un socio global de Salesforce con los más altos reconocimientos por su experiencia

También tenemos experiencia en proyectos tecnológicos de Salesforce para otras empresas del mismo sector o actividades relacionadas.

04 Hemos realizado grandes transformaciones

Accenture ha participado en grandes transformaciones similares a la de LDA

Este tipo de proyectos suponen un reto debido al entorno complejo que suponen y con un alto nivel de incertidumbre (dependencia de otros sistemas, decomisados,...).
En Accenture estamos familiarizados con entornos de alta complejidad, gestionando dependencias con otros proyectos y con capacidad de adaptación

05 Entendemos las necesidades del negocio

Como One Accenture podemos añadir capacidades más allá de la tecnología para dar soporte a LDA

El haber participado en grandes transformaciones digitales nos ha hecho entender la necesidad de entender bien los negocios. Tenemos la capacidad de comprender no solo la perspectiva tecnológica, sino también la perspectiva de negocios, procesos y Gestión del cambio.

06 Advisory

Implementamos nuestros proyectos aplicando las prácticas recomendadas de la tecnología y del sector

Acompañamiento en todo momento con un advisory de las buenas prácticas del sector en el ámbito de la colaboración.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

QUÉ PROPONEMOS

Salesforce es el CRM líder en el mercado en el que podemos destacar las siguientes ventajas

1

Lider mundial en CRMs

Salesforce es el líder global en CRM desde hace años siendo el CRM de referencia

2

Amplio ecosistema (Appexchange)...

Salesforce dispone de un amplio ecosistema de soluciones que permite complementar la funcionalidad estándar disponible

3

IA...

Salesforce dispone de una IA (Agentforce) profundamente integrada en procesos comerciales y de servicio

4

CRM muy extendido en el sector...

Salesforce es una plataforma muy extendida en en sector asegurador y concretamente en Iberia

5

Verticalización sectorial más madura...

Salesforce dispone de soluciones verticales (Sector seguros) muy maduras lo que facilita una mejor especialización de la herramienta

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

Para el desarrollo de la iniciativa realizaremos una implementación faseada de funcionalidad agrupado **por Releases por producto**.

La implantación faseada por producto nos permite:

Agilidad en las entregas

- **Releases funcionales progresivas** y completas para aportar valor al agente.
- Posibilidad de **ejecutar fases en paralelo** (Incorporación de nuevos ramos en procesos ya completados), mientras se desarrollan nuevos procesos.

Validación de la funcionalidad previa a escalado

- Ajustes de las funcionalidades antes de extender el modelo a nuevos ramos.
- **Mitigación de riesgos** al evitar despliegues masivos iniciales.

Continuidad operativa del agente

- El agente puede **ejecutar su operativa sin interrupciones**.
- **Evita fragmentar procesos** entre fases o procesos.

Gestión del cambio progresiva

- **Incorporación progresiva** de funcionalidades por producto simplificando el esfuerzo en aprendizaje.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


ENFOQUE

El faseado que proponemos es el indicado a continuación:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Core CRM Visión cliente	**Hogar**	**Motor**	**Fidelización Valor cliente**	**Salud**	**Empresas**	**Atención al cliente**
Ficha 360 del cliente	Gestión de la cotización Hogar	Gestión de la cotización Motor	Upselling y Crosselling Hogar y Motor	Gestión de la cotización Salud	Ficha 360 de Empresas	Gestión de casos del CC
Identificación de cliente en llamada	Gestión de suplementos Hogar	Gestión de suplementos Motor	Fidelización de clientes	Gestión de suplementos Salud	Adaptación del CRM al modelo de Empresas	Gestión de quejas y reclamaciones
Alta cliente potenciales	Gestión de la retención Hogar	Gestión de retención Motor	Gestión de documentación pendiente	Procesos de valoración médica	Gestión de cotización Empresas	Siniestros
Gestión de eventos y tareas	Integración de firma digital	Procesos de verificación Motor	Gestión de recibos, pagos y recobros	Upselling de Salud	Gestión de suplementos Empresas	
Dashboard de seguimiento diario	Integración del gestor documental	Recomendación NBO Motor	Ampliación de la Ficha 360			
Experience Cloud para externos	Recomendación NBO Hogar		Inclusión de clientes Expats			

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


PLANIFICACIÓN

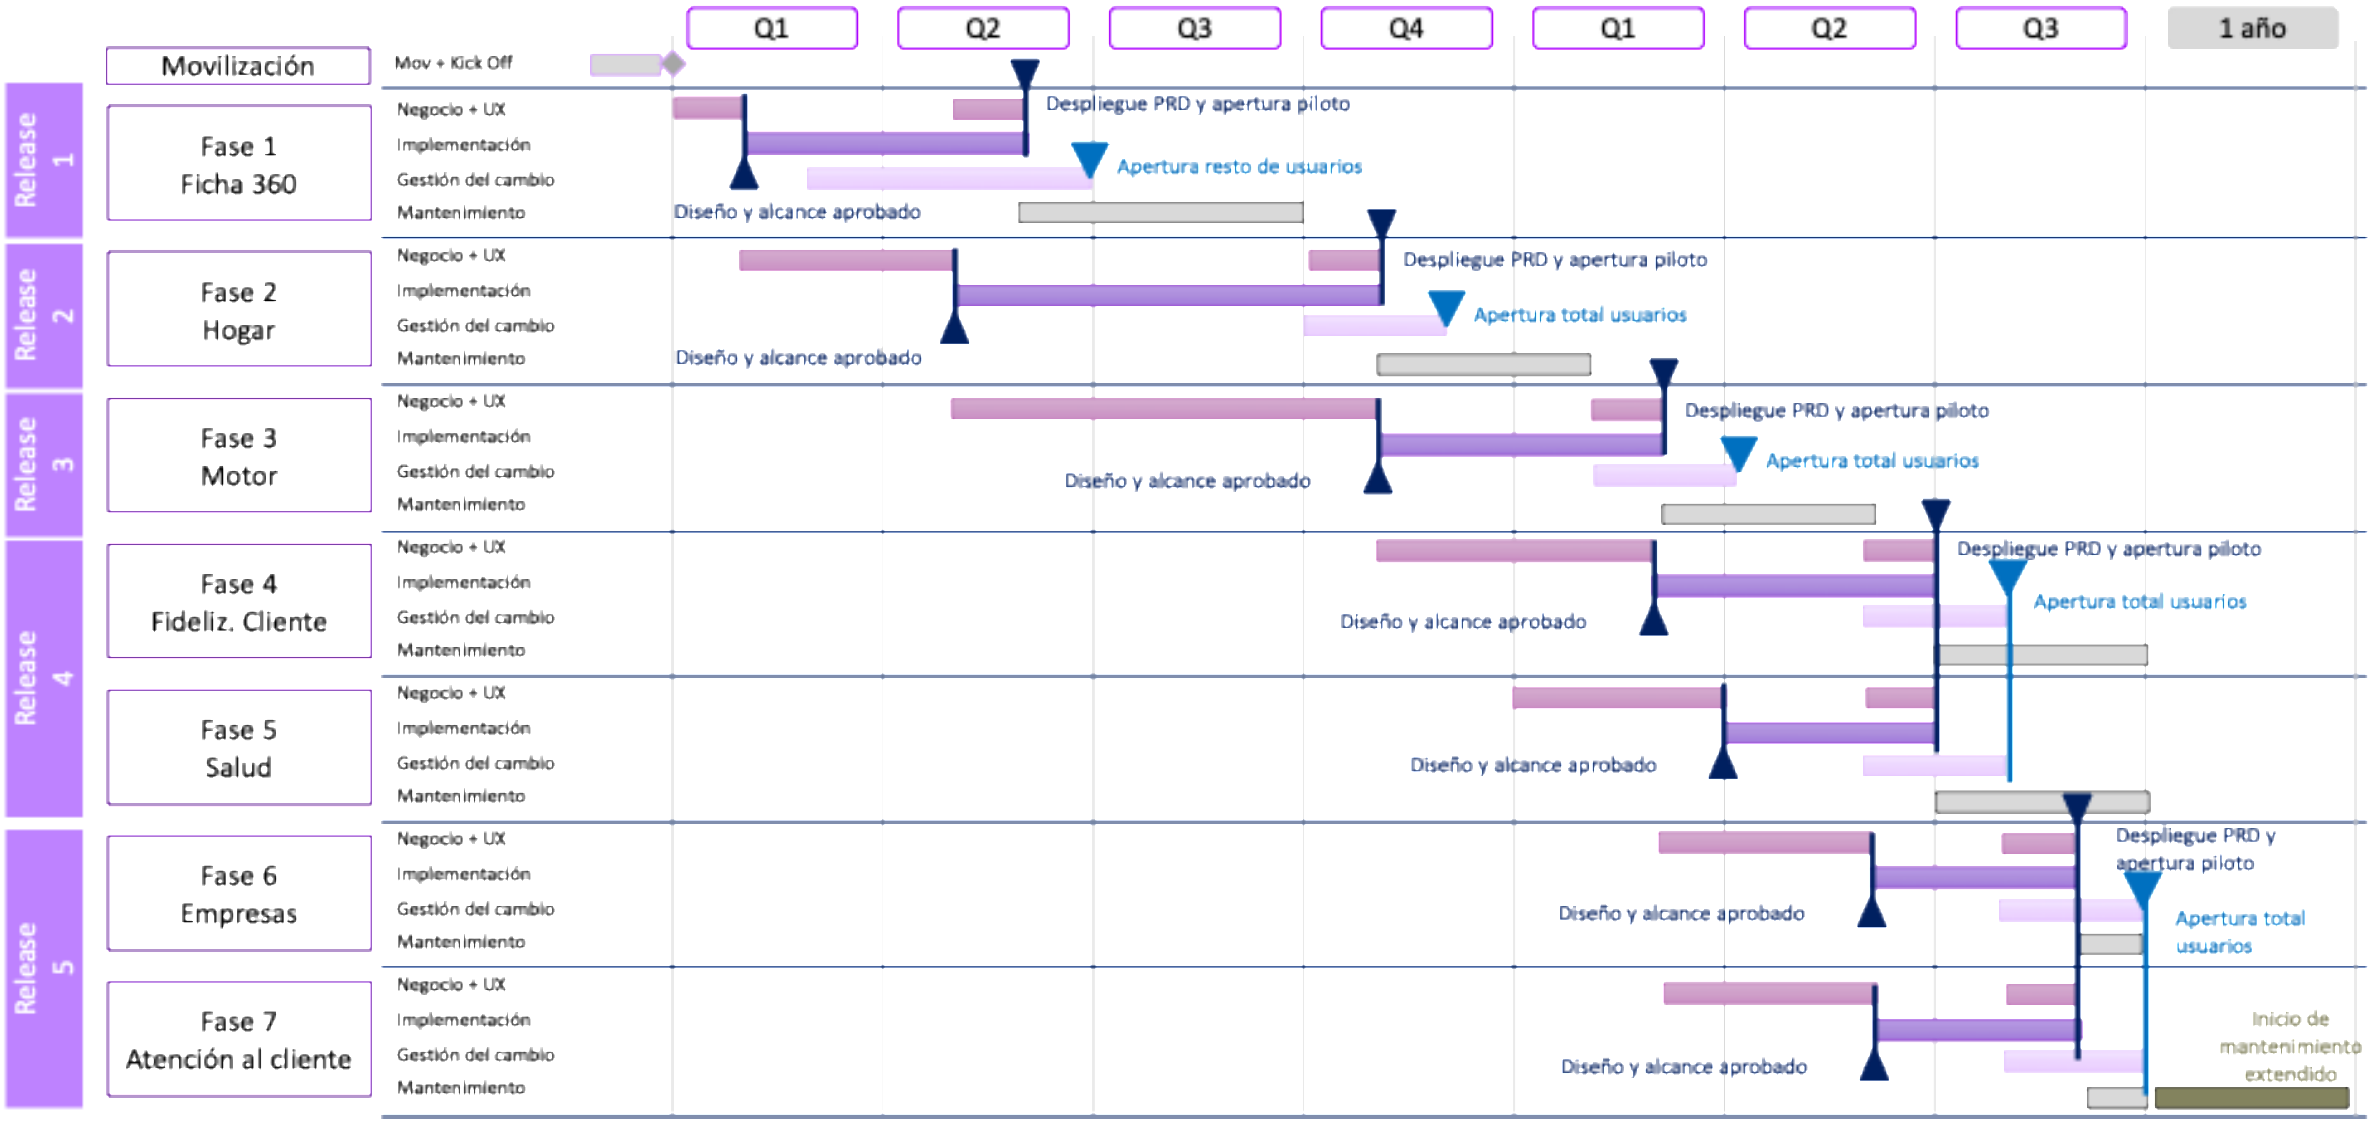

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES - IMPLEMENTACIÓN + MANTENIMIENTO EN CURSO

A continuación, se detalla el equipo propuesto a partir de la primera puesta en PROD:

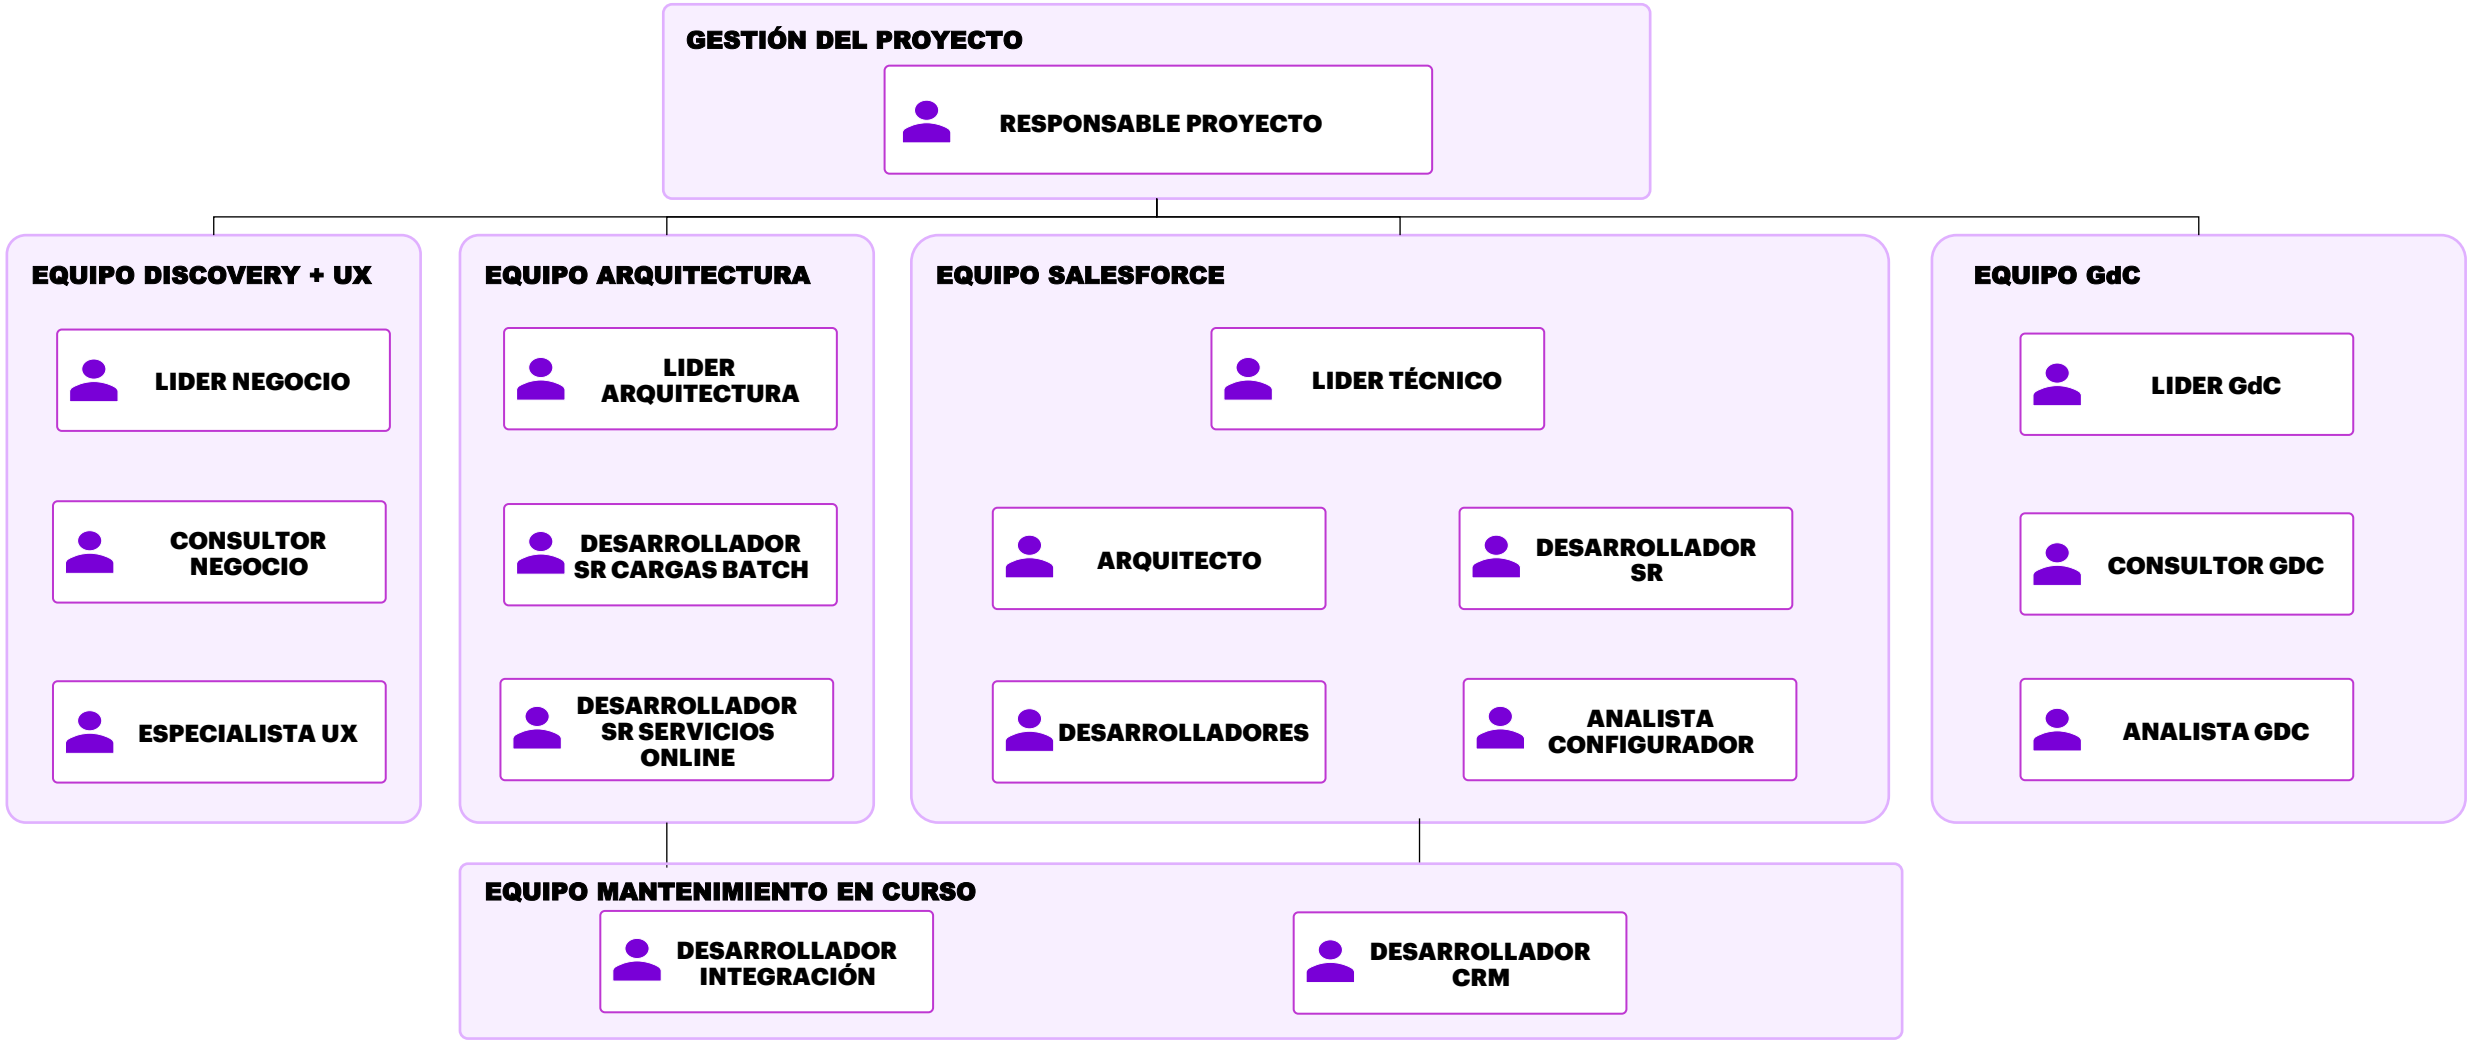

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

1. Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

DIAGNÓSTICO Y ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO ACTUAL

Contexto de negocio

Hoy en día, el sector asegurador se enfrenta a un **contexto de cliente cada vez más exigente**, más digital y menos tolerante a fricciones. Los clientes esperan **interacciones coherentes** independientemente del canal, respuestas **personalizadas**, y una **relación coherente** con la compañía a lo largo de todo su ciclo de vida.

En este escenario, la capacidad de gestionar de forma unificada la relación con el cliente se convierte en un factor diferencial para competir, crecer y retener: **el CRM es una palanca estratégica** para la relación con clientes.


Hasta ahora, Línea Directa se apoya en un core asegurador robusto que concentra la lógica transaccional crítica del negocio y garantiza la estabilidad operativa. Este core ha permitido sostener el crecimiento y la eficiencia durante años, pero el modelo actual presenta **limitaciones a la hora de evolucionar la experiencia de cliente**, **ganar agilidad** comercial y ofrecer una **visión 360** de la relación.

Qué busca Línea Directa

En este marco, Línea Directa impulsa este proyecto con una ambición clara: evolucionar hacia un modelo en el que la **relación con el cliente esté centralizada**, gobernada y preparada para crecer apalancándose en un **CRM de mercado**. El objetivo no es únicamente implantar una nueva herramienta, sino **sentar las bases de una plataforma estratégica** que permita mejorar la experiencia del cliente y habilitar nuevos modelos comerciales de forma progresiva. Una plataforma que permita:

- ✓ Una **implantación progresiva**, segura y alineada a negocio
- ✓ La incorporación de capacidades avanzadas como la **automatización** o la **inteligencia artificial**
- ✓ **Adaptarse a la evolución del negocio** sin generar rigideces y minimizando dependencias

Cuáles son los retos



- ✓ Transformación controlada
- ✓ Escalar la solución manteniendo calidad y trazabilidad del dato
- ✓ Disponibilización de los datos en real time
- ✓ Gobierno de integraciones y evolución futura del ecosistema
- ✓ Continuidad del negocio durante la implantación
- ✓ Adopción real por parte de los usuarios


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es **presentar nuestra propuesta de colaboración de Accenture para proporcionar los servicios solicitados por LDA en el ámbito de su CRM sobre Salesforce**. Actualmente LDA dispone de la herramienta GALGO como portal o herramienta de gestión de sus clientes. El portal Galgo, de desarrollo interno en LDA, cubre gran parte de las operativas o procesos de la compañía como: Cotizaciones, suplementos, retención, cancelaciones, etc

En este contexto, el ámbito de la presente licitación se centra en la implementación de la solución principalmente sobre **Salesforce FSC, Experience cloud y Mulesoft (además de Data Cloud y agentforce para los casos de uso de IA)**, así como los activos tecnológicos adyacentes de integración y otros productos nuevos, que den cobertura a los procesos de atención/ventas.

Nuestra propuesta de solución se basa en una serie de procesos para el servicio de atención de clientes y ventas del negocio asegurador de LDA

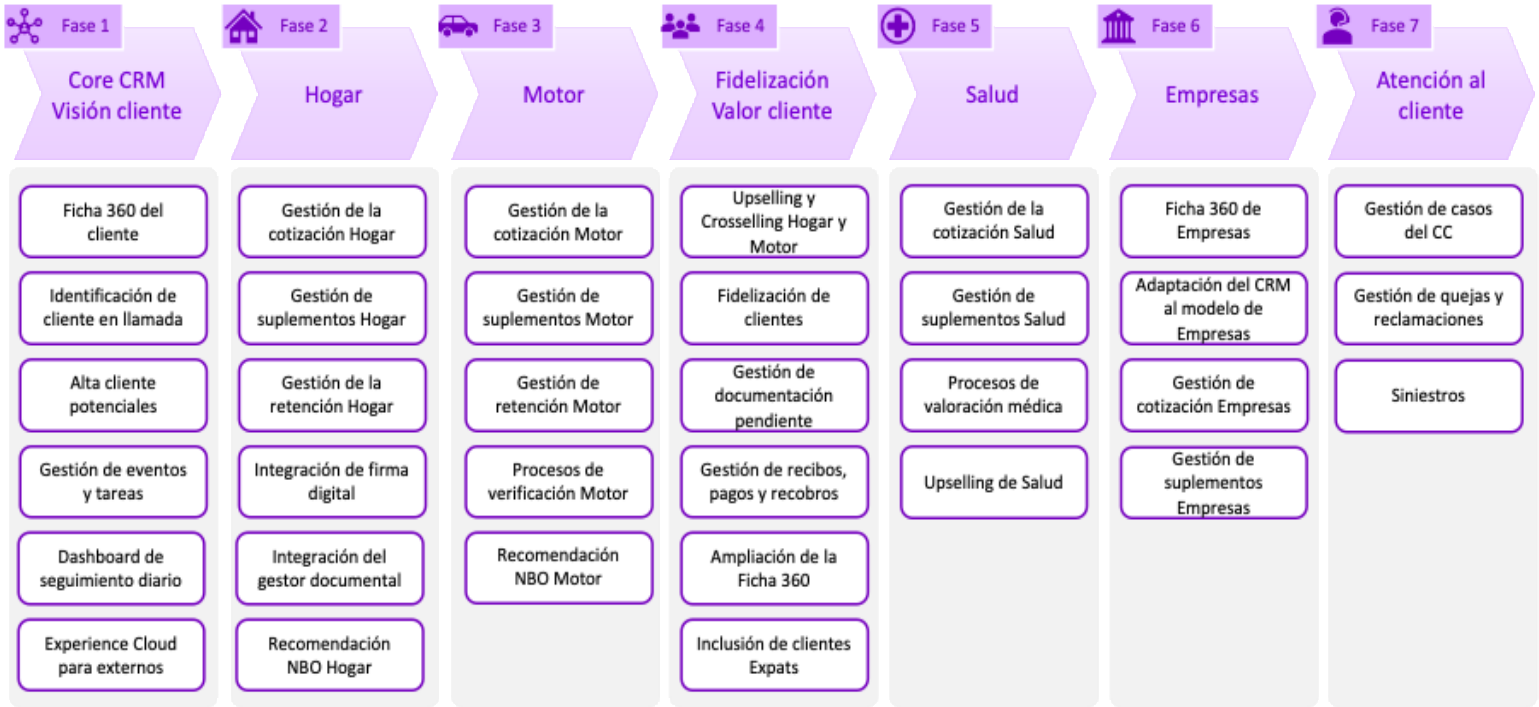

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

OBJETIVOS

Accenture tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios similares en el ámbito de Salesforce

La solución propuesta aprovecha esa experiencia para **proporcionar a LDA una solución basada en un proposito para disponer de un ecosistema más sencillo**, que le permita:

1 Solución rentable y mentalidad de agilidad

Poder mejorar la eficiencia en los procesos de atención y ventas permitiendo tener visión 360 de cliente unificada, mapa de interacciones del cliente gestión ágil de citas en agenda y gestión omnicanal de interacción con el cliente

2 Mejora del time-to-market & foco en la calidad

Aprovechar las capacidades de trabajo colaborativo con visiones 360 de clientes y registro de interacciones

3 Mejora continua y una transición sin impactos

Ser capaz de gestionar la atención al cliente de manera eficiente y tener un seguimiento de todas las interacciones con clientes

4 Maximizar la continuidad del negocio

Permitir la automatización de tareas repetitivas mediante el uso de agentes de IA desarrollados en Salesforce para tareas específicas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

Proponemos un enfoque de trabajo alineado con el propósito final de LDA de tener **un único sistema (Salesforce) para la gestión de negocios asegurador.** Un enfoque que marcará el modelo de colaboración y las reglas del juego.

Visión

Enfoque incremental

Proveyendo las **funcionalidades**, de por fases, con los **desarrollos necesarios**, adaptando el plan de trabajo (Releases/Sprints) a su evolución y aprendiendo en cada paso.

Orientando el resultado

Es fundamental no perder la perspectiva de que **esto es un negocio y se trata de obtener un retorno**. Cada decisión y acción debe tomarse en esta dirección.

Colaboración y alineamiento

Definiendo los **mecanismos necesarios para coordinarse** entre las distintas líneas de trabajo (gobierno del proyecto, ...) y sumarse a las ambiciones de LDA.

Un modelo de coordinación orientado al propósito final.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Copyright © 2023 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

Tal y como se ha comentado anteriormente se propone realizar un faseado de funcionalidad agrupado **por Releases por producto**.

La implantación faseada **por producto** nos permite:

Agilidad en las entregas

- **Releases funcionales progresivas** y completas para aportar valor al agente.
- Posibilidad de **ejecutar fases en paralelo** (Incorporación de nuevos ramos en procesos ya completados), mientras se desarrollan nuevos procesos.

Validación de la funcionalidad previa a escalado

- Ajustes de las funcionalidades antes de extender el modelo a nuevos ramos.
- **Mitigación de riesgos** al evitar despliegues masivos iniciales.

Continuidad operativa del agente

- El agente puede **ejecutar su operativa sin interrupciones**.
- **Evita fragmentar procesos** entre fases o procesos.

Gestión del cambio progresiva

- **Incorporación progresiva** de funcionalidades por producto simplificando el esfuerzo en aprendizaje.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

El faseado que proponemos es el indicado a continuación y que se explica mas adelante en la sección de planificación:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Core CRM Visión cliente	**Hogar**	**Motor**	**Fidelización Valor cliente**	**Salud**	**Empresas**	**Atención al cliente**
Ficha 360 del cliente	Gestión de la cotización Hogar	Gestión de la cotización Motor	Upselling y Crosselling Hogar y Motor	Gestión de la cotización Salud	Ficha 360 de Empresas	Gestión de casos del CC
Identificación de cliente en llamada	Gestión de suplementos Hogar	Gestión de suplementos Motor	Fidelización de clientes	Gestión de suplementos Salud	Adaptación del CRM al modelo de Empresas	Gestión de quejas y reclamaciones
Alta cliente potenciales	Gestión de la retención Hogar	Gestión de retención Motor	Gestión de documentación pendiente	Procesos de valoración médica	Gestión de cotización Empresas	Siniestros
Gestión de eventos y tareas	Integración de firma digital	Procesos de verificación Motor	Gestión de recibos, pagos y recobros	Upselling de Salud	Gestión de suplementos Empresas	
Dashboard de seguimiento diario	Integración del gestor documental	Recomendación NBO Motor	Ampliación de la Ficha 360			
Experience Cloud para externos	Recomendación NBO Hogar		Inclusión de clientes Expats			

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

Se propone abordar este proyecto con diferentes líneas de trabajo que trabajen de forma conjunta y coordinada


Creamos la unión de distintos componentes para alcanzar una transformación significativa

- **Línea de trabajo Negocio (Discovery+ Definición +UX)**: Equipo de consultoría de CRM de seguros, para detallar y traducir los requisitos del RFQ a historias de usuario con sus criterios de aceptación y en pantallas de UX que nos permitan ar la experiencia de usuario antes de implementarlo, aprovechando al máximo las capacidades de caja de las soluciones.

- **Línea de trabajo de Implementación CRM (Salesforce + arquitectura):** Equipo de implementación de CRM que traduzca las historias de usuario a funcionalidades dentro de la solución nueva solución de CRM, y que tenga capacidad de integración con los sistemas del core asegurador de LDA.

- **Línea de trabajo de Gestión de cambio (GdC):** Equipo que prepare y plantee un plan de la gestión del cambio de Galgo al nuevo CRM de LDA, de acuerdo, al calendario de releases y despliegue secuencial de la herramienta.

- **Línea de trabajo de soporte post implantación (AM):** Equipo que garantice el soporte de la implantación (mantenimiento incidencias y pequeños evolutivos)

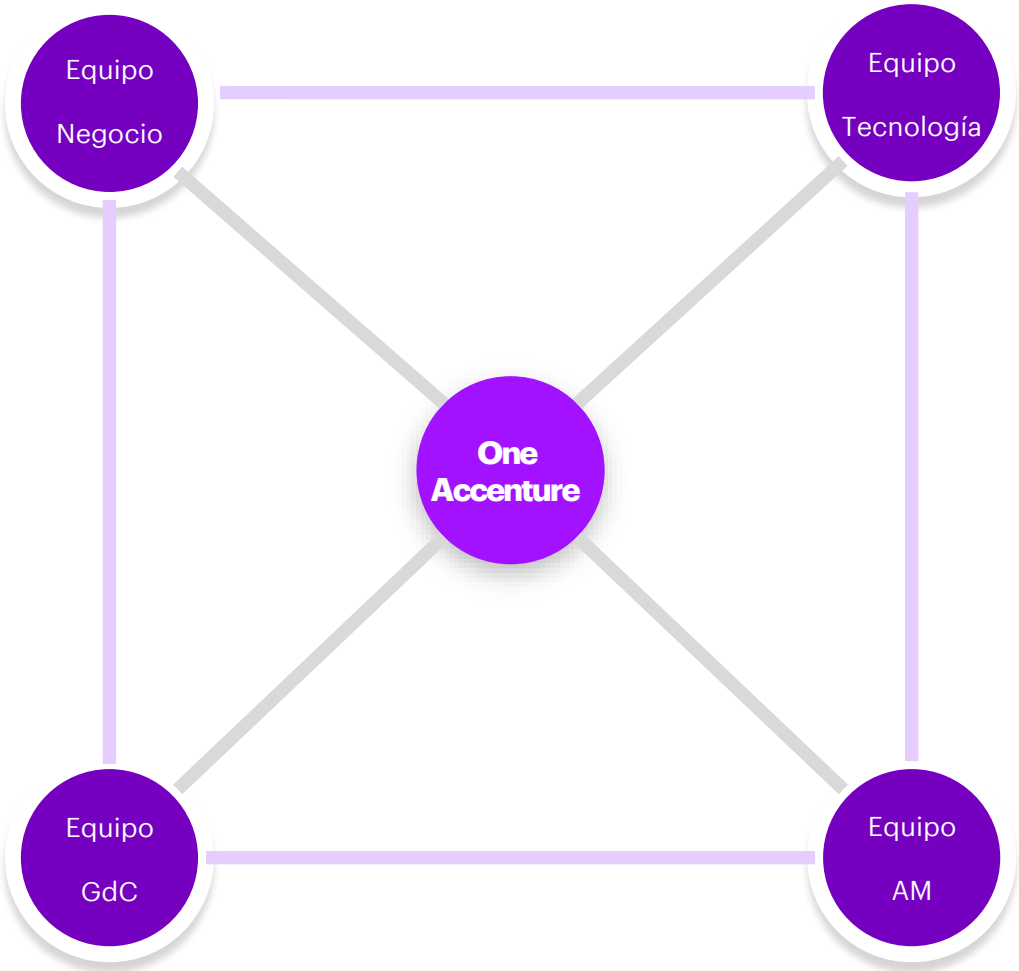

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

2. Propuesta técnica

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. GENERAL

La solución propuesta de Salesforce contiene los siguientes módulos:

FSC

- Gestión de oportunidades, casos y clientes en una única vista 360º.
- Automatización de procesos comerciales y de servicio.
- Gestión y seguimiento de oportunidades. aprobaciones y validaciones operativas.
- Trazabilidad completa del proceso de extremo a extremo.
- Atención al cliente
- Ficha consolidada de cliente.
- Reporting de seguimiento comercial y operativo.

Experience cloud

- Capa de acceso para usuarios externos y colaboradores
- Colaboradores encargados de la gestión y alta de oportunidades.
- Portal con acceso segmentado según perfil.
- Registro y seguimiento de oportunidades.
- Consulta de estado y comunicación con el equipo interno.

Data cloud + agentforce

- Unificación de información procedente de múltiples sistemas para usarse en la definición de los casos de uso de IA propuestos

Mulesoft

- Integración con core y sistemas legacy.
- Sincronización de datos de clientes, pólizas/productos, cotizaciones y estados operativos.
- Exposición y consumo de APIs Arquitectura desacoplada que permite escalabilidad futura.
- Gobernabilidad de procesos.
- Transformación de datos entre sistemas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Definición funcional y diseño UX

ALCANCE

Dentro de este bloque se realizará el diseño funcional de la solución incluyendo el diseño UX de las pantallas que permita al usuario tener una visión de como será el aplicativo futuro.

En esta solución to-be se considerarán todas las capacidades técnicas a tener en cuenta para implementar la solución (arquitectura técnica, informacional, datos, integraciones, etc.)

ENFOQUE


- Se elaborará un documento por cada funcionalidad. Estos documentos deben ser validados por el Cliente.
- Se definirán los aprobadores requeridos (Negocio / Tecnología) en función de la tipología del requerimiento que cubren y se consensuarán con el responsable del proyecto.
- Cuando se estime necesario, se realizarán reuniones de validación de funcionalidades para la explicación a los distintos aprobadores de la solución definida.

Entrega de valor:

- Mapa de la solución final a construir
- Documentación funcional validada

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


PROPUESTA TÉCNICA. Mapa funcional

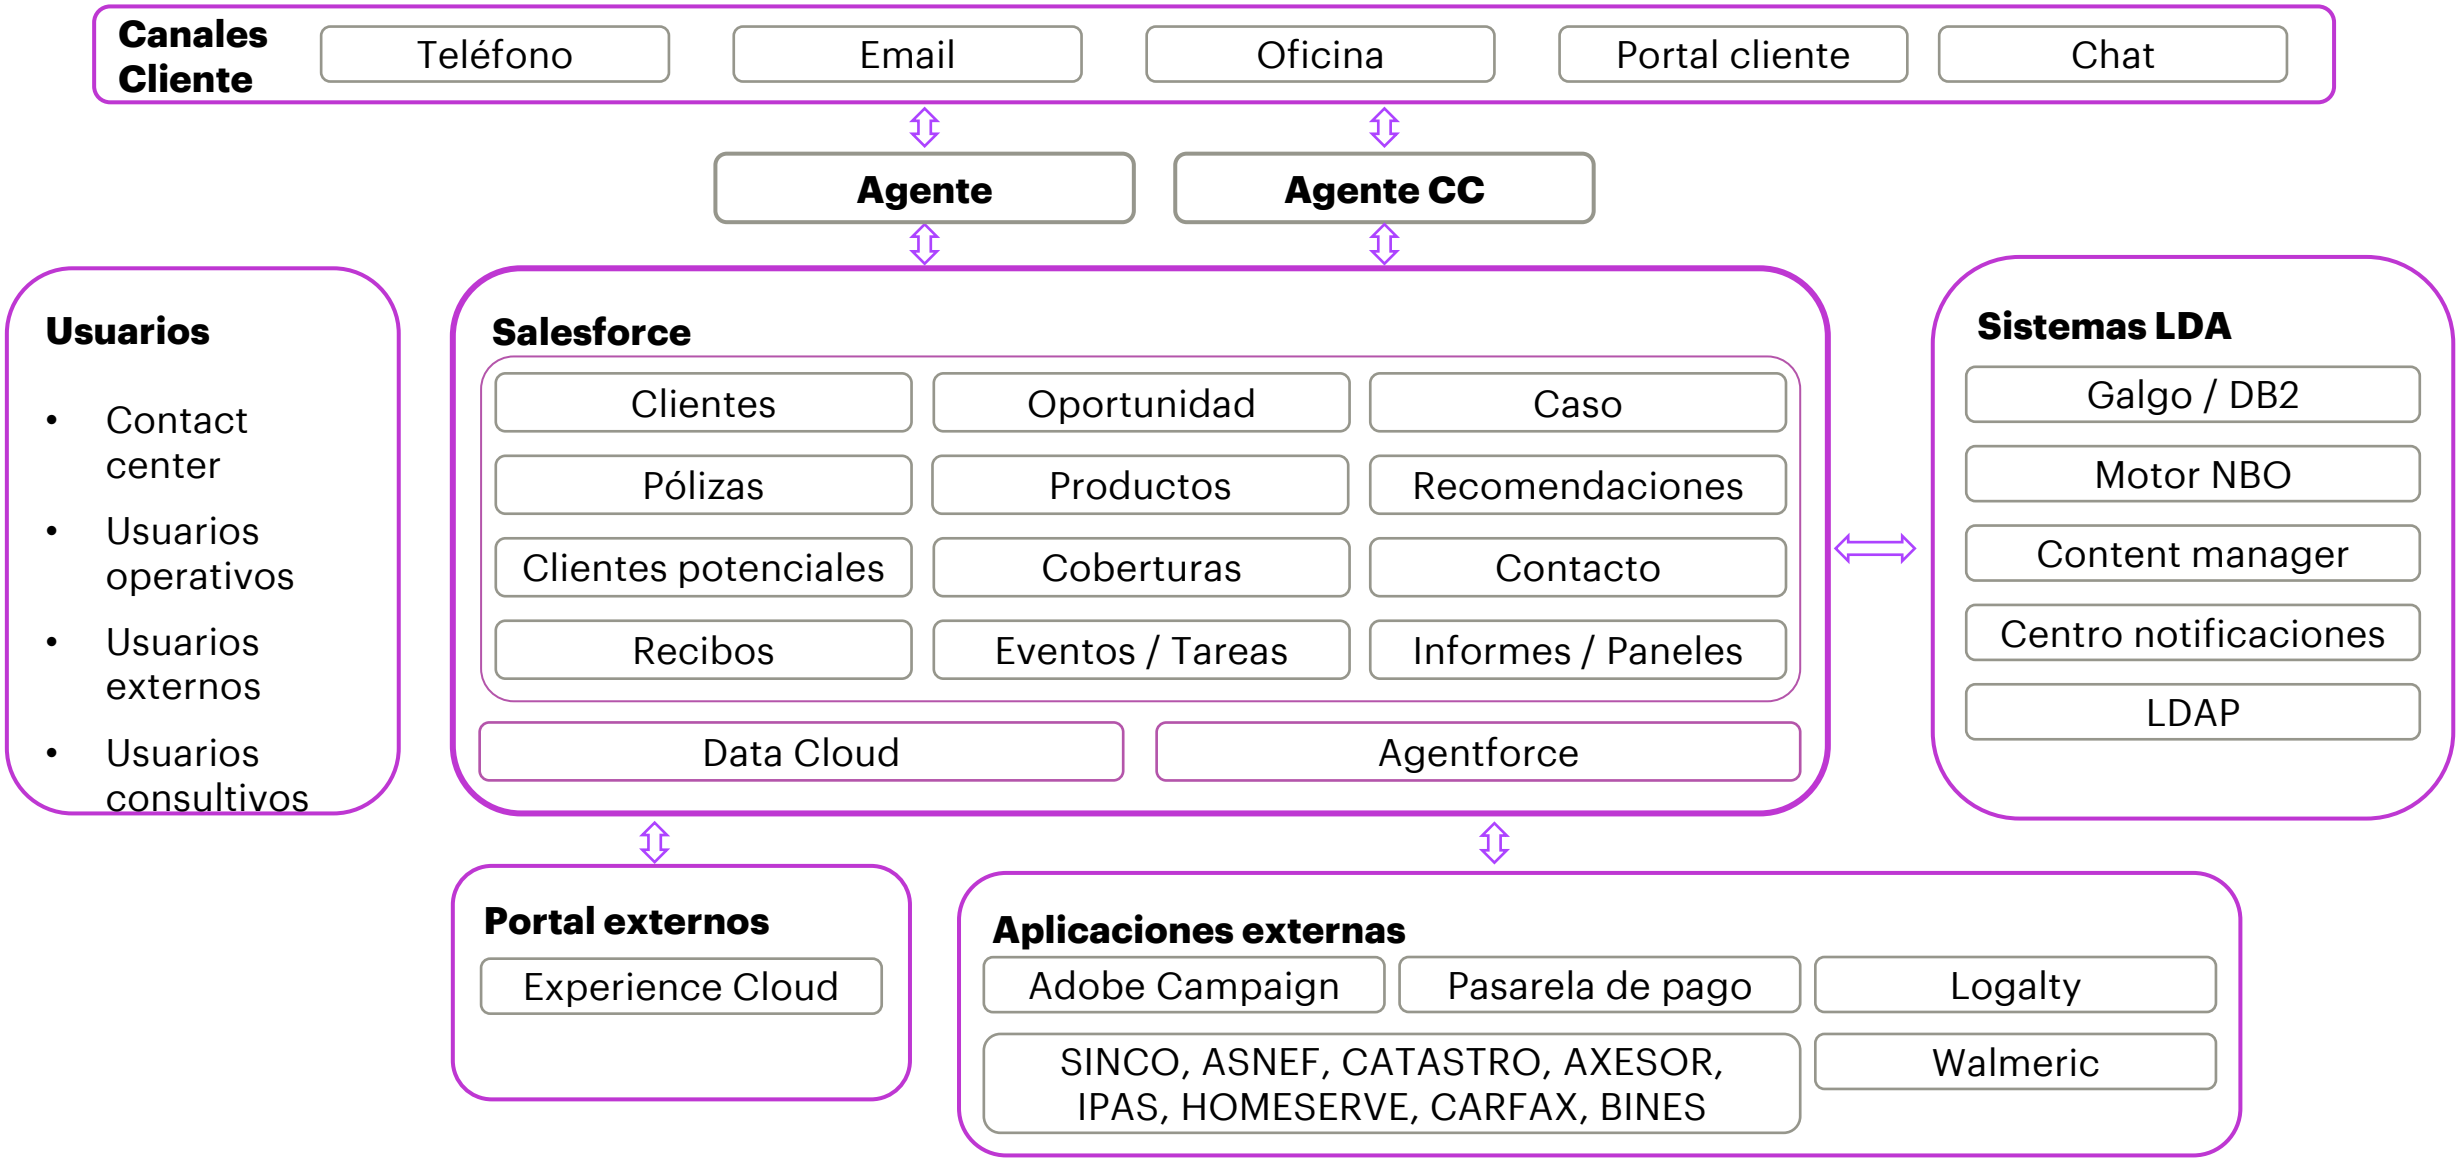

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Objetivo de la Arquitectura de integración

Arquitectura híbrida orientada a eventos que desacopla Salesforce del Core, promoviendo la resiliencia, seguridad y escalabilidad

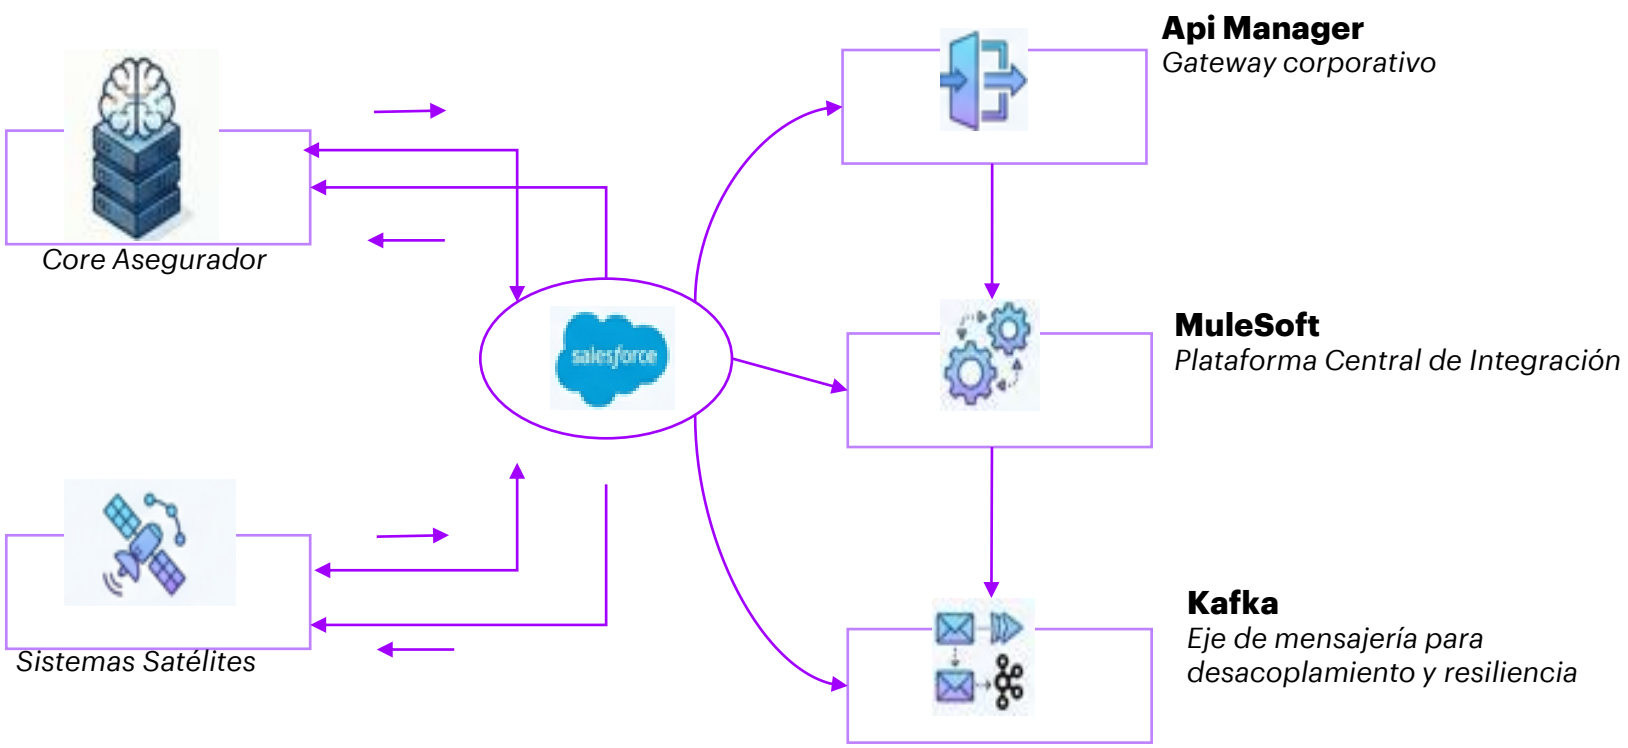

- **Salesforce CRM**: Canal Comercial/experiencia cliente
- **Kafka**: mensajería asíncrona para desacoplamiento.
- **Mulesoft**: Orquestación y composición de procesos
- **Api manager:** Seguridad, control de acceso y gobierno
- **Core Asegurador**: Sistema maestro transaccional.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Mapa de componentes y Principios de la Arquitectura

La solución planteada propone un ecosistema digital robusto y escalable, diseñado para optimizar la interoperabilidad entre Salesforce y los sistemas core de la aseguradora mediante MuleSoft Anypoint Platform. Los components son los especificados a continuación:

Salesforce CRM

Relación cliente, interacción , orquestación comercial y persistencia de actividad

Api Manager

Exposición segura, control de acceso , versionado y políticas de seguridad

Mulesoft

Orquestación, transformación , implementación de Apis system y process y gestión de errores

Kafka


Eje de mensajería para desacoplamiento y resiliencia



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Visión de arquitectura técnica

La arquitectura to be propuesta combina integración síncrona para operaciones críticas y eventos para desacoplamiento y resiliencia.

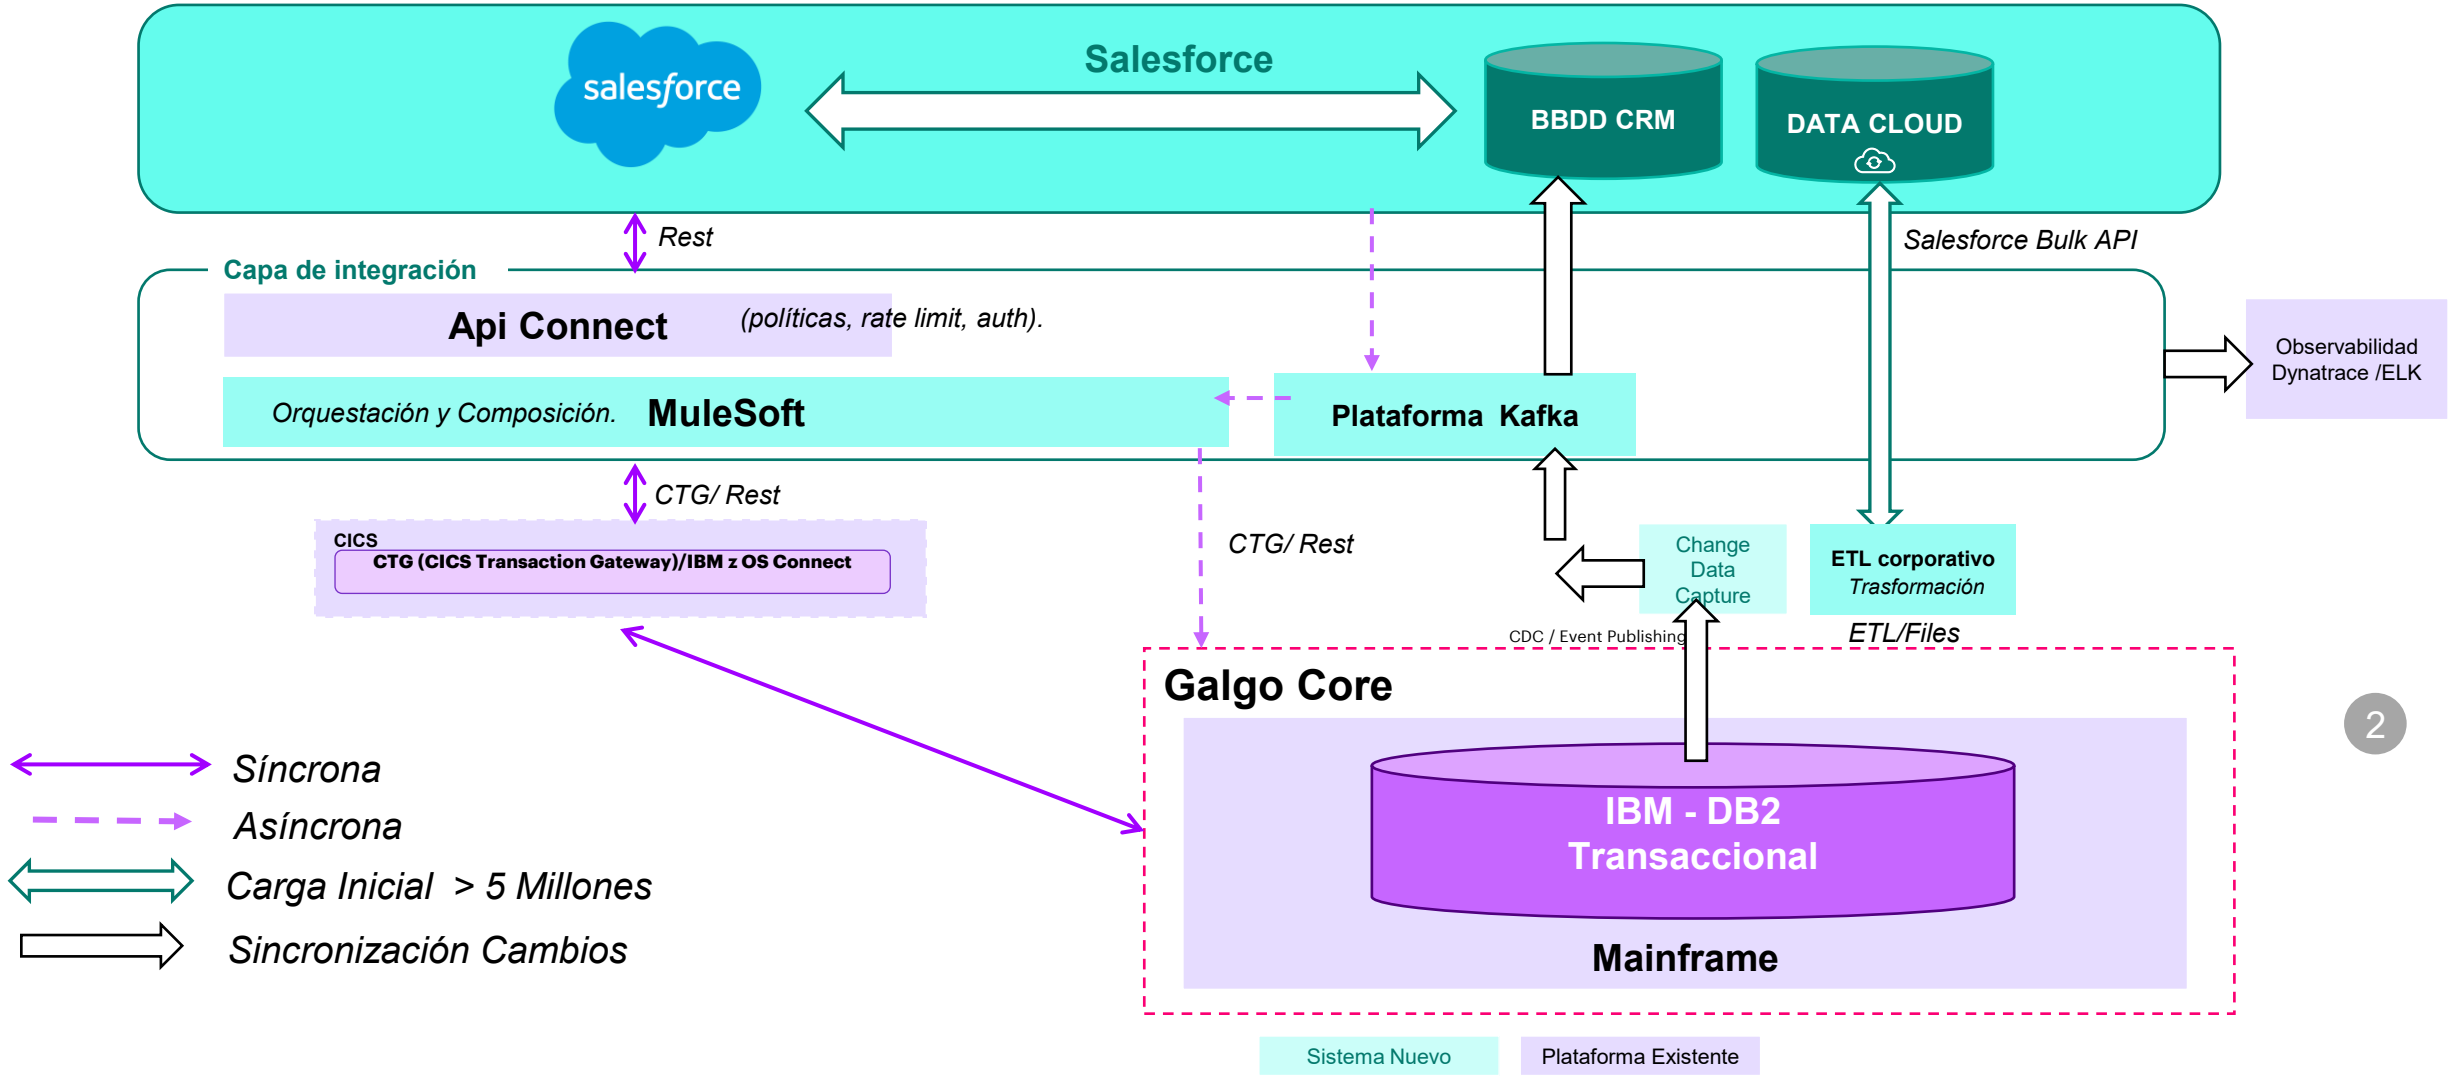

2

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. El Rol de Mulesoft en la Arquitectura

Mulesoft actúa como la capa que permite que la arquitectura hibrida funcione de forma gobernada, resiliente y escalable.



- **Evita acoplamiento**: Sin lógica de integración en el CRM
- **Orquesta la complejidad**: Procesos , eventos, transformación compleja de datos y errores.
- **Gobierna la integración**: Apis versionadas , seguras y reutilizables.

- **Arquitectura híbrida: Mulesoft** funciona de manera gobernada, resiliente y escalable
- **Capacidades de gestión de APIs**: Mulesoft permite establecer reglas claras de gobernanza, garantizar la seguridad de los datos y habilitar una comunicación fluida entre sistemas.
- **Conectores predefinidos y reutilizables:** reduce los tiempos de desarrollo y mejora la eficiencia operativa
- **Resilencia**: capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y adaptarse a cambios en la demanda.

Comparativo:


Criterio	MuleSoft	Alternativas Genéricas
Conectores Salesforce	Nativos y certificados	Adaptadores custom
Modelo API-led	Estándar y probado	No estructurado
Integración Híbrida	REST + Kafka integrado	Requiere múltiples componentes
Time-to-Market	Acelerado por reutilización	Lento, alto desarrollo

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Como diseñamos APIs y eventos

La arquitectura se diseña siguiendo un modelo API-Led y un diseño de eventos estandarizado para promover el desacoplamiento y trazabilidad.

Modelo API-Led

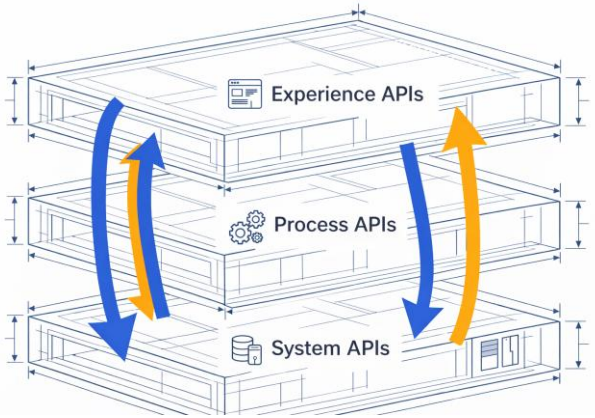


Diseñadas para Salesforce
Optimizan datos para la UI

Orquestación de lógica de negocio.
Combinan datos y aplican reglas.

Desbloqueen Mainframe y Kafka
Ocultan la complejidad del sistema base.

Diseño de eventos

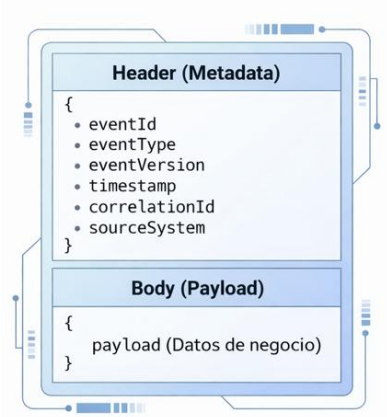

Todos los eventos siguen un estándar común de metadatos y payload para garantizar trazabilidad y desacoplamiento.

Principios Claves

- **Contract-First**: Apis y eventos versionados.
- **Desacoplamiento**: Separación clara entre el productor y el consumidor
- **Reutilización:** Activos gobernados para futuros canales

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Catalogo de Patrones de integración

Cada patrón se elige en función de la criticidad, volumen y necesidad de desacoplamiento.

1.Sincrono(on-line)

Dirección: CRM → Core

Uso: Contratación, Consulta

Tecnología: Request/Reply vía Rest/CTG



2.Asincrono (Event-Driven)

Dirección: Core → CRM

Uso: Contratación, Consulta

Tecnología: Kafka (Pub/Sub)



3.Batch

Uso: Cargas iniciales > 5 millones de registros


Tecnología: ETL/ Bulk API



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Estrategia de Datos: Carga Inicial y Batch

La estrategia de carga de datos se define en función del volumen, la frecuencia y el impacto operativo.

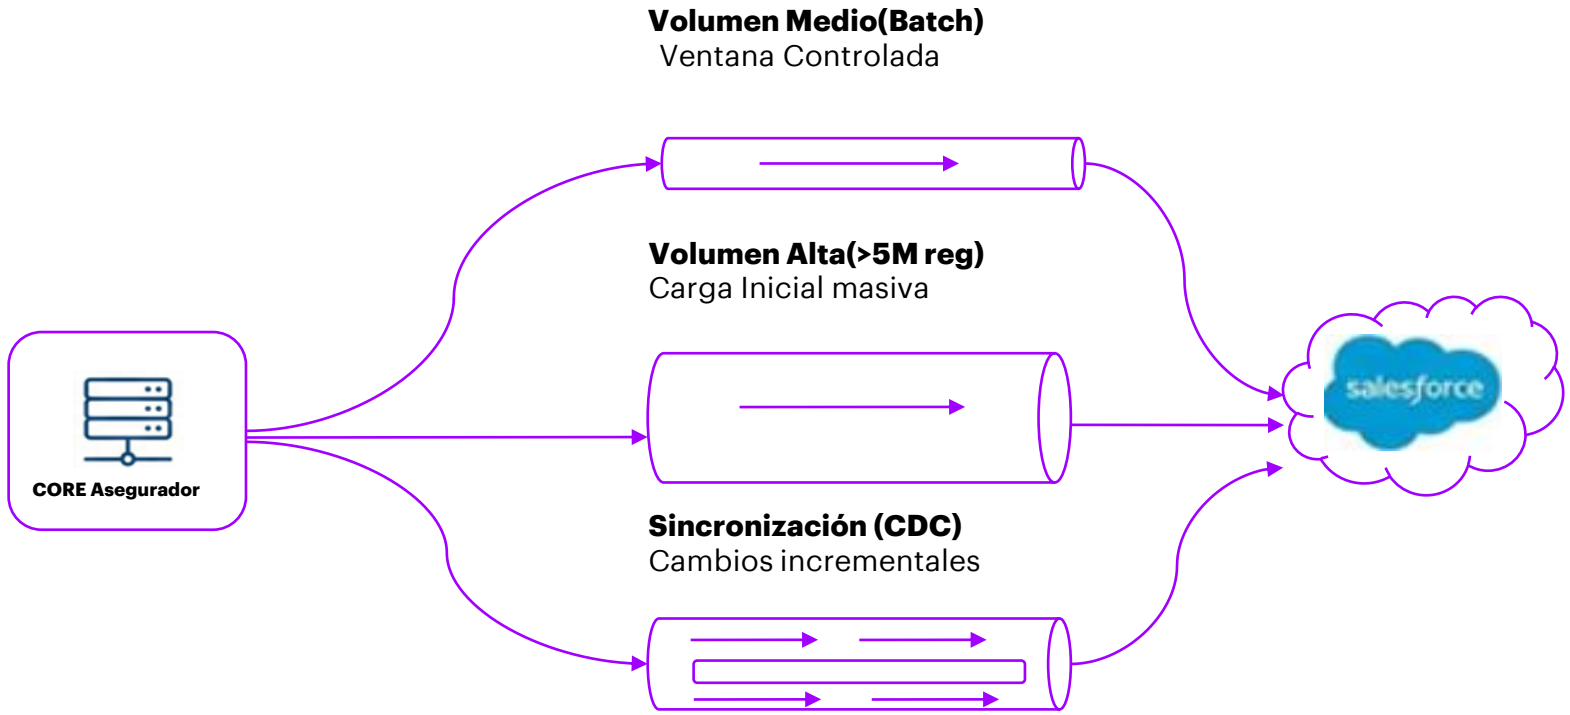


Las cargas iniciales y masivas se ejecutan en ventanas controladas y desacopladas del tráfico online.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


PROPUESTA TÉCNICA. Ejecución de los Patrones

La arquitectura combina patrones síncronos, asíncronos y batch según necesidades de negocio y volumen

Flujo Síncrono

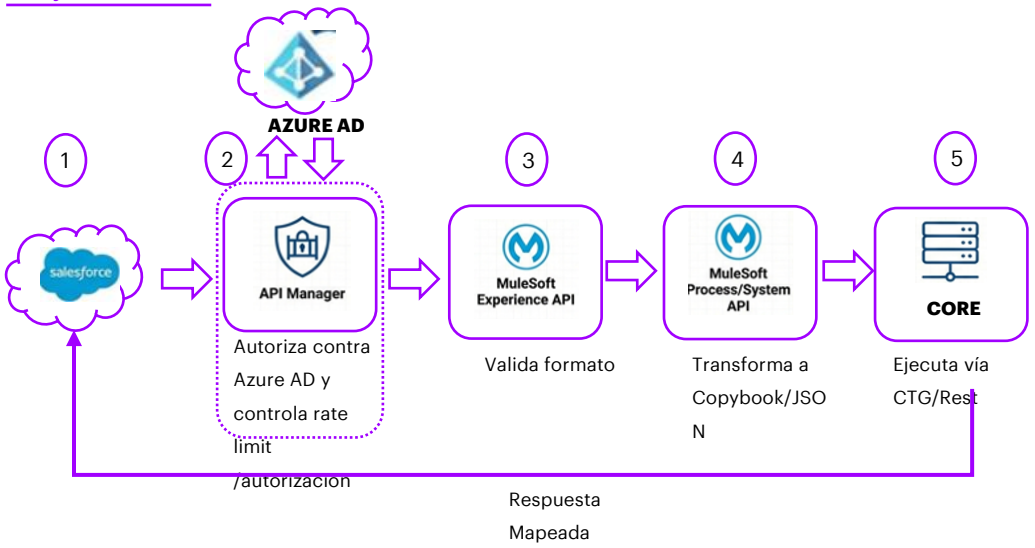

Flujo Asíncrono

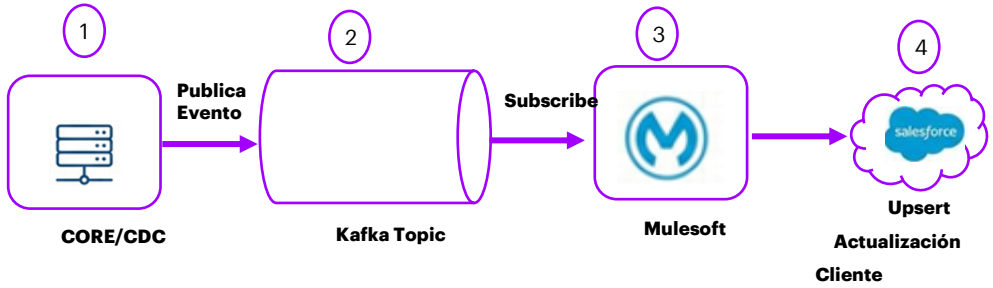

Flujo Batch



1 **Extracción y transformación inicial de ficheros físicos y carga de set de datos**

2 **Salesforce bulk API para la ingesta eficiente de volúmenes masivos de datos sin consumir los limites de las api estándar.**

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Gestión de errores y consistencia

Consistencia eventual controlada por defecto, con consistencia fuerte cuando el proceso lo requiere.


¿ Que es consistencia eventual controlada?

Por defecto, los procesos se diseñan con **consistencia eventual**, priorizando desacoplamiento, resiliencia y escalabilidad.

Esto implica que:

- Los sistemas **no requieren sincronización inmediata** para considerarse consistentes.
- La propagación de cambios se realiza **de forma asíncrona mediante eventos** (Kafka).
- Se garantiza **entrega al menos una vez**, con **idempotencia** en los consumidores.
- El **estado final converge de forma automática** sin intervención manual.
- **Los fallos transitorios no rompen el proceso**, gracias a retry y DLQ.

Gestión de errores

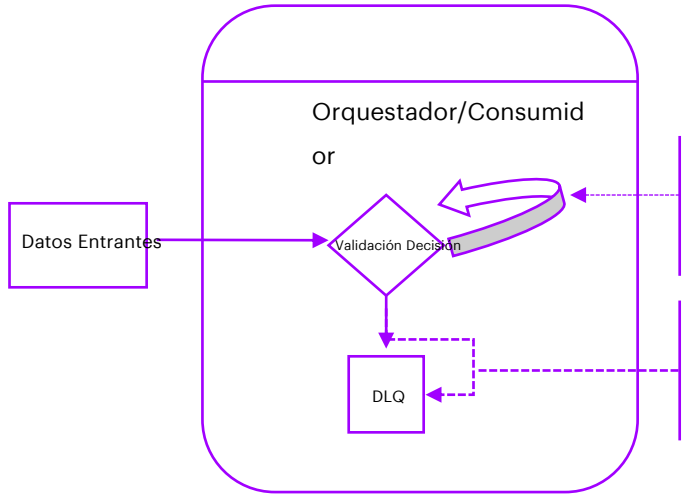

Errores transitorios:
Activación de política de reintentos al fallar escritura en Salesforce

Errores persistentes o de Validación:
Redirección del mensaje a una DLQ.

Almacenamiento en DLQ
Se guardará el payload original junto con el motivo del error para permitir revisión o una reprocesamiento posterior.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Seguridad y Gobierno

La seguridad se aplica de forma transversal en todos los flujos de integración.



Uso de gobierno de APIs para el versionado, políticas y control del ciclo de vida


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Autenticación y Autorización


Identidad corporativa centralizada y control de acceso desacoplado

- **Kafka security:** mTLS + ACL/RBAC por service principal (certificado) para Core y Mulesoft.
- **Salesforce security:** OAuth2 (JWT Bearer o Client Credentials)
- **E2E:** correlationId/eventId para trazabilidad, idempotencia en Mule, DLQ/retry en Kafka/Mulesoft.

Autenticación flujo Síncrono

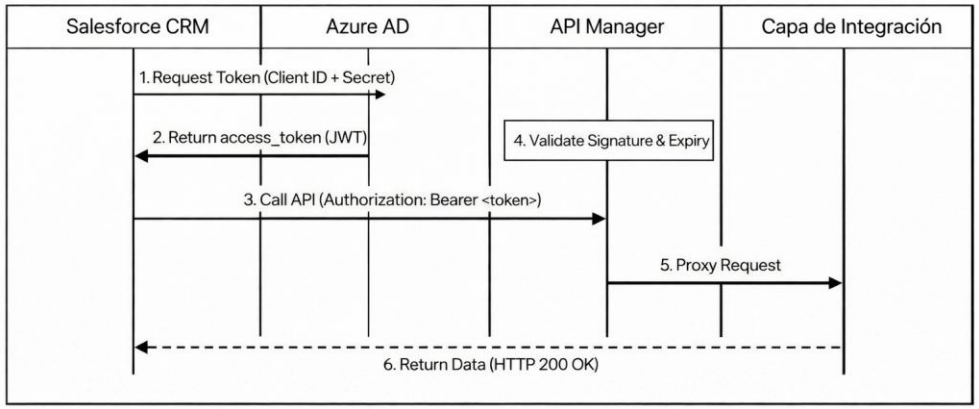

Autenticación flujo Asíncrono

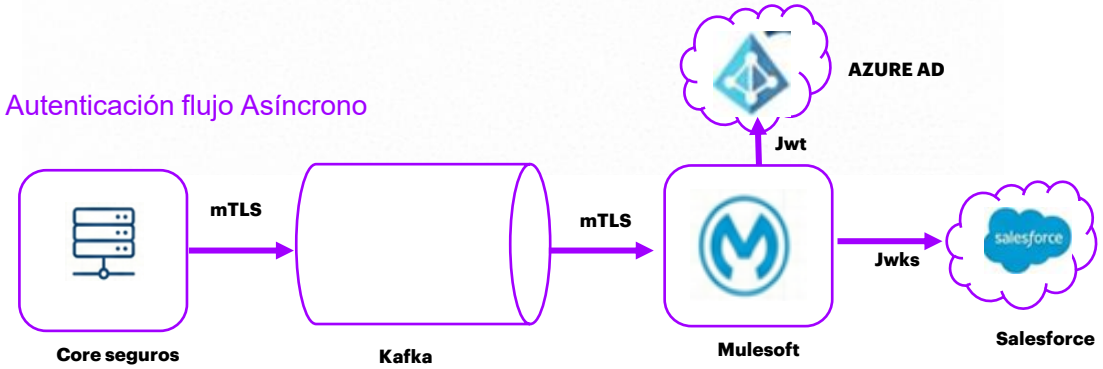

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Arquitectura técnica

Faseado del modelo de arquitectura CORE - CRM

Se plantea llevar a cabo la implantación de la arquitectura TO BE con un enfoque **faseado**, orientado a **poner a disposición de los usuarios las primeras funcionalidades lo antes posible**, facilitando una adopción progresiva y controlada, y manteniendo la convivencia con los sistemas core.
La evolución funcional avanza desde escenarios de consulta hasta una integración bidireccional completa, con una planificación flexible y adaptable a las prioridades de negocio.

Arquitectura Fase 1

- Proceso **Batch**: para carga inicial, procesos de reconciliación, etc.
- Integración **online** vía API

Arquitectura Fase n

- Implantación de **CDC.**
- Integración **online** vía API – Se permitirá consultar y **modificar** datos desde CRM y actualización al CORE.
- La actualización de datos críticos se mantendrá online vía API.

Principales funcionalidades consideradas por fase:

Fase 1

- *Integración telefónica y chat*
- *Identificación de cliente*
- *Ficha de cliente*
- *Dashboards de seguimiento*
- *Agenda y tareas*


Principales funcionalidades consideradas por fase:

Fase 2 – *Ingesta NBO, Cotización Hogar (precio, resumen y cierre)*
Fase 3 – *Cotización Motor (precio, resumen, cierre), verificación, y multicierre (carrito)*
Fase 4 – *Ficha de cliente (suplementos), recibos, pagos y recobros, ficha de cliente (histórico NBO), fidelización*
Fase 5 –*Cotización Salud, valoración (corta, valoración médica), mantenimiento + upselling salud*
Fase 6 – *Ficha cliente empresas, Cotización Empresas, mantenimiento empresas*
Fase 7 – *Atención al cliente*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Arquitectura técnica

La fase 1 con ecosistema Salesforce:

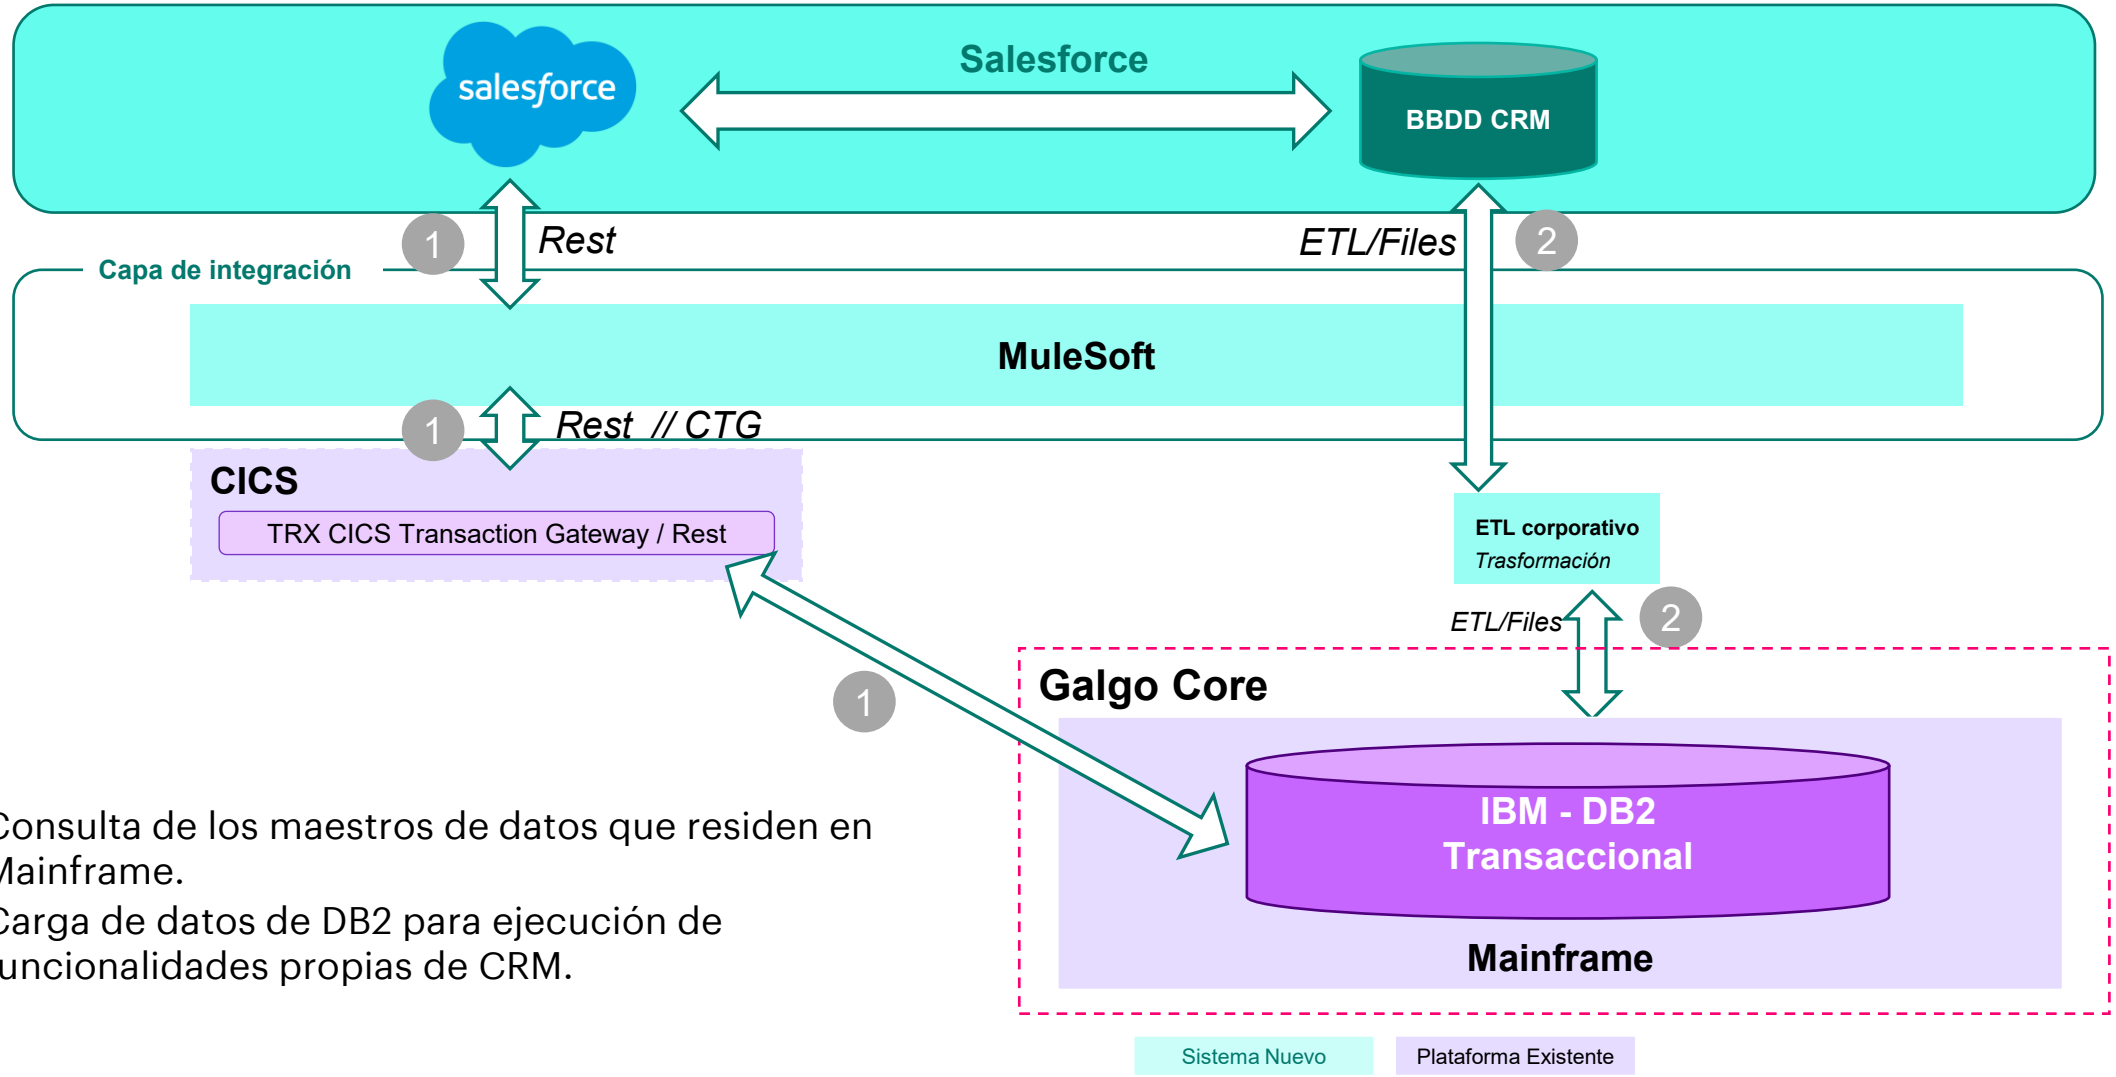

Flujos

1. Consulta de los maestros de datos que residen en Mainframe.
2. Carga de datos de DB2 para ejecución de funcionalidades propias de CRM.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase I (Ficha clientes) – Operativa y Funcionalidad

Fase inicial establece la base del CRM, habilitando una visión 360 del cliente, manteniendo la operativa transaccional en el core asegurador.

Operativa (Ilustrativo)

- **Inicio de jornada:** El agente accede a Salesforce, donde visualiza en su inicio su **Dashboard de Seguimiento** (ventas del mes a partir de las oportunidades, tasa de conversión) y su **Agenda** con las tareas y citas programadas para hoy.
- **Recepción de Llamada (CTI):**
  - **Si el cliente existe:** Se abre automáticamente la **Ficha 360**. El agente saluda al cliente por su nombre: *"Hola Sr. García, veo que nos llama por su póliza de Hogar..."*.
  - **Si no existe:** Se abre un formulario de "Alta Rápida" para capturar los datos básicos.
- **Gestión de la Interacción:** Durante la llamada, el agente usa el componente de **Tareas** para anotar compromisos (ej. "Llamar mañana a las 10:00"). Si el cliente pide una información que aún reside en Galgo, Salesforce mostrará un enlace que abre Galgo directamente en el cliente específico, evitando búsquedas manuales.
- **Cierre de Tarea:** Al colgar, el CTI registra la duración de la llamada y el agente selecciona un "Motivo de consulta".
- **Apertura de portal para externos:** los agentes externos dispondrán de una **Experience Cloud** para la consulta de sus clientes, cuadros de mando, agenda.

Funcionalidad

- **Implementación del modelo de datos en Salesforce** con todas las entidades requeridas para la fase I: clientes, oportunidades, casos, ...
- Configuración del conector de **Salesforce – Genesys** para la identificación del cliente y gestión de llamadas.
- Implementación de las **integraciones necesarias con el core asegurador** para la consulta unificada de **información de la Ficha 360** del cliente (oportunidades, pólizas, coberturas, siniestros, recibos...).
- Implementación del **alta de clientes potenciales**.
- Implementación de los procesos de **alta, gestión y cierre de eventos y tareas** del agente y **la integración con el core asegurador** para su sincronización.
- Disponiblización de **deep links parametrizados para acceder al cliente en Galgo** y realizar la operative necesaria.
- Implementación del acceso de los **usuarios**, que incluye la configuración del **SSO** y las cargas de **empleados**
- **Desarrollo de dashboards de seguimiento** de actividad y productividad inicial de los agentes

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase I (Ficha clientes) – Listado de integraciones (I)

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
1	Clientes	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica de clientes (nuevos y actualizaciones)	
2	Clientes - detalle	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta del detalle del cliente desde Salesforce	
3	Pólizas	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos básicos de las pólizas	
4	Pólizas - detalle	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de detalle de pólizas desde Salesforce	
5	Oportunidades	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos de las oportunidades	
6	Oportunidades – detalle	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de detalle de oportunidades desde Salesforce	
7	Productos	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de los datos de productos	
10	Casos	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos de las incidencias, quejas, casos de retención	
11	Casos - detalle	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de detalle de incidencia, quejas y casos de retención	
12	Recibos	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos de los recibos asociados a las pólizas	
13	Recibos – detalle	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de detalle de recibos desde Salesforce	
14	Cliente potenciales	Nueva	Walmeric	Core / DB2	Online	Sincronización de los clientes potenciales generados en Salesforce	Sincronización tras la creación y actualización del registro
15	Clientes potenciales – modificaciones	Nueva	Core / DB2	Walmeric	Online	Actualización de los clientes potenciales en Salesforce	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase I (Ficha clientes) – Listado de integraciones (I)

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
16	Conexión a galgo	Nueva	Salesforce	Galgo	Link	Link contextualizado al cliente de acceso a galgo para poder operar	Este link estará incluido en la ficha 360 del cliente
17	Conexión con Genesys	Nueva	Genesys	Salesforce	Conector	Conexión con Genesys para poder recibir las llamadas y levantar la ficha del cliente	Se utilizará el conector estándar
18	Click-to-call	Nueva	Salesforce	Genesys	Conector	Click to call desde el CRM para realiza una llamada a un cliente	
19	Eventos - Sincronización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de los eventos generados y actualizados en Salesforce con el core asegurado	Sincronización tras la creación y actualización del registro
20	Tareas – Sincronización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de las tareas generadas y gestionada en Salesforce con el core asegurador relacionadas con la gestión de llamadas	Sincronización tras la creación y actualización del registro
21	Empleados	Nueva	LDAP	Salesforce	Online	Carga de empleados	
22	SSO	Nueva	LDAP	Salesforce	Online	Configuración del acceso por SSO a los usuarios de Salesforce	
23	DataLake	Nueva	Salesforce	Datalake	Batch	Bajada de registros a Datalake	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 2 (Ingesta NBO, Hogar) – Operativa y Funcionalidad

Salesforce evoluciona a herramienta comercial activa, habilitando la gestión integral de Hogar (cotización y ciclo de vida de póliza) e incorporando la ingesta de NBO para impulsar la actividad comercial.

Operativa (Ilustrativo)

- **Inicio (Salesforce):** El agente abre Salesforce en su página inicial e identificará de **"Oportunidades NBO"** (ofertas que el sistema le sugiere llamar hoy). Además de otros eventos y tareas programados par hoy.
- **Identificación (Salesforce + CTI):** Entra una llamada. El CTI abre la Ficha 360 (Fase I) con la información sincronizada.
- **Inicio de Cotización Hogar (Salesforce):** Si el NBO o la conversación lo requieren, el agente inicia una nueva Cotización Hogar desde la **ficha del cliente o desde una Oportunidad NBO**.
  - **Cotización (Online):** Salesforce solicita al core asegurador el precio, modalidades, coberturas aplicables y límites según el cliente y su riesgo a través de la API online.
  - **Cierre y firma (Salesforce):** confirmación del método de pago, envío de la documentación y petición de firma mediante Logalty al cliente, gestión de los recibos y pagos correspondientes.
- **Inicio de retención Hogar (Salesforce):** si la conversación lo requiere se abre **un caso de retención desde el cliente o la póliza** y ofrece las acciones disponibles obtenidas del core asegurador.
- **Inicio de gestión de suplementos de Hogar (Salesforce**): si la conversación lo requiere el agente podrá acceder a una póliza del cliente identificado para **abrir y gestionar un suplemento.**

Funcionalidad

- **Implementación y adaptación del modelo de datos en Salesforce** con las entidades requeridas para la fase 2 según los requisitos definidos: suplementos, recomendaciones, oportunidades NBO, casos retención, …
- **Ingesta y visualización de Oportunidades NBO** vinculadas al cliente y agente asignado
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de la oportunidad de Hogar** que habilita la sistemática de cotización y contratación.
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de casos de retención y suplementos de Hogar** incluyendo proceso de cancelación.
- **Integración online RT con el core asegurador** para la sincronización de la operativa en curso**:**
  - **Sincronización de Oportunidades** creadas en Salesforce para tener visibilidad y trazabilidad.
  - **Emisión de póliza:** gestión del pago, firma digita, monitorización de estado, recibos y pagos, gestión documental.
- **Integración con el motor de cotización/suscripción (core asegurador) para Hogar** para obtener precios, descuentos, restricciones técnicas, acciones de retención… en las diferentes fases de la operativa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 2 (Ingesta NBO, Hogar) – Listado de integraciones (I)

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
1	Clientes – sincronización	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Sincronización de los clientes en Salesforce desde el core asegurador	
2	Cliente – actualización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Actualización de las modificaciones de clientes realizadas en Salesforce	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
3	Pólizas - sincronización	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Sincronización de las pólizas en Salesforce desde el core asegurador	
4	Pólizas – actualización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Actualización de las modificaciones de pólizas realizadas en Salesforce	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
5	Recibos – sincronización	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Sincronización de los recibos en Salesforce desde el core asegurador	
6	Oportunidades – sincronización	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Sincronización de las oportunidades en Salesforce desde el core asegurador	
7	Oportunidades - actualización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Actualización de las oportunidades creadas y gestionadas en Salesforce del ramo Hogar	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
8	Productos	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Modificación de la carga actual para la inclusión de información complementaria de productos de Motor	
9	Casos – actualización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Actualización de los casos creados y gestionados en Salesforce correspondientes al ramo Hogar	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
10	Casos – sincronización	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Sincronización de los casos en Salesforce desde el core asegurador	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 2 (Ingesta NBO, Hogar) – Listado de integraciones (I)

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
11	Recomendación NBO	Nueva	Motor NBO	Salesforce	Batch	Creación de las recomendaciones NBO para cada cliente del ramo Hogar	
12	Gestor documental	Nueva	Salesforce	Gestor documental	Online	Envío de los documentos adjuntos a una oportunidad, suplemento, póliza, caso... al gestor documental del cliente	
13	Gestor documental	Nueva	Gestor documental	Salesforce	Online	Actualización de los documentos asociados a cliente, oportunidad, caso... incluidos en el gestor documental	
14	Suscripción	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de las coberturas, condiciones, precios, descuentos, restricciones técnicas, campañas asociadas al cliente, producto y póliza	Se lanzará durante el proceso de cotización o suplementos
15	Acciones de retención	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de las acciones de retención que pueden ser ofrecidas por póliza y cliente	Se lanzará durante el proceso de retención
16	Validaciones	Nueva	Externo	Salesforce	Online	Validación de datos contra bases de datos externas.	Se identifican al menos 6 sistemas
17	Pasarela de pago	Nueva	Salesforce	Externo	Online	Integración para realizar pagos online	
18	Firma digital	Nueva	Salesforce	Logalty	Online	Generación de documentos y lanzamiento del proceso de firma	
19	Emisión de póliza	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Envío al core asegurador de la orden de emisión tras pago y firma, o tras la confirmación del método de pago.	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención
20	Notificaciones	Nueva	Salesforce	Centro notificaciones	Online	Envío del lanzamiento de una o varias notificaciones al cliente	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 3 (Motor) – Operativa y Funcionalidad

El modelo comercial implantado en Hogar se extiende a Motor, consolidando Salesforce como plataforma multirramo para la gestión de cotización y ciclo de vida de pólizas.

Operativa (Ilustrativo)

- **Inicio (Salesforce):** El agente abre Salesforce e identificará en su inicio las acciones del día, incluyendo oportunidades, evento y tareas (Fase I)
- **Identificación (Salesforce + CTI):** Entra una llamada. El CTI abre la Ficha 360 (Fase I) con la información sincronizada.
- **Inicio de Cotización Motor (Salesforce):** Si el NBO o la conversación lo requieren, el agente inicia una nueva Cotización Motor desde la **ficha del cliente o desde una Oportunidad NBO**.
  - **Cotización (Online):** el agente desde Salesforce solicita al core asegurador el precio, modalidades, coberturas aplicables y límites según el cliente y su riesgo a través de la API online.
  - **Verificación (Online):** desde Salesforce se solicita al core información sobre las verificaciones del producto y su estado.
  - **Cierre y firma (Salesforce):** confirmación del método de pago, envío de la documentación y petición de firma mediante Logalty al cliente, gestión de los recibos y pagos correspondientes.
- **Inicio de retención Motor (Salesforce):** si la conversación lo requiere se abre **un caso de retención desde el cliente o la póliza** y ofrece las acciones disponibles obtenidas del core asegurador.
- **Inicio de gestión de suplementos de Motor (Salesforce**): si la conversación lo requiere el agente podrá acceder a una póliza del cliente identificado para **abrir y gestionar un suplemento.**

Funcionalidad

- **Adaptación del modelo de datos en Salesforce al ramo Motor** de las entidades requeridas para la fase 3 según los requisitos definidos
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de la oportunidad de Motor** que habilita la sistemática de cotización, verificación y contratación.
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de casos de retención de Motor** incluyendo proceso de cancelación.
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de los suplementos de Motor** incluyendo los procesos de verificación correspondientes.
- **Adaptación de la integración online RT con el core asegurador** para la sincronización de la operativa en curso:
  - **Sincronización de Oportunidades** creadas en Salesforce para tener visibilidad y trazabilidad.
  - Monitorización de **verificaciones** aplicables.
  - **Emisión de póliza:** gestión del pago, firma digita, monitorización de estado, recibos y pagos, gestión documental.
- **Adaptación de la integración con el motor de cotización/suscripción (core asegurador) para Hogar** para obtener precios, descuentos, restricciones técnicas, acciones de retención… en las diferentes fases de la operativa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 3 (Motor) – Listado de integraciones (I)

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
1	Oportunidades - Sincronización	Modificación	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Salesforce del ramo Motor	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
2	Productos	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Modificación de la carga actual para la inclusión de información complementaria de productos de Motor	
3	Casos	Modificación	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de los casos creados y gestionados en Salesforce correspondientes al ramo Motor	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
4	Recomendación NBO	Modificación	Motor NBO	Salesforce	Batch	Actualización de las recomendaciones NBO para cada cliente del ramo Motor	
6	Verificación	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de información necesaria para la verificación	
7	Visita perito externo	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Envío de la información de la visita del perito externo	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 4 (Fidelización - Upselling/Crosselling) – Operativa y Funcionalidad

La operativa de las oportunidades de upselling y crosselling se traslada a Salesforce, así como la gestión del programa de fidelización. Se enriquece la Ficha 360 del cliente

Operativa (Ilustrativo)

- **Apertura de ficha de cliente (Salesforce + CTI):** a través de una llamada entrante el CTI abre la Ficha 360 (Fase I); o proactivamente el agente tras la búsqueda de un cliente abre su Ficha 360. Esta ficha será enriquecida desde Salesforce y el core asegurador mediante API online:
  - Información proveniente de las acciones en **Salesforce** y de la información ampliada del **core asegurador** incluyendo **suplementos histórico de NBO, casos de retención…**
  - Información de **recibos, pagos y recobros** del core asegurador.
  - Información de **fidelización** disponible en el core asegurador.

- **Gestión del programa de fidelización (online):** el agente podrá gestionar el programa de fidelización del cliente desde la ficha 360, póliza, cotización, retención… y aplicar sus condiciones, sincronizando estas con el core asegurador.

- **Upselling/Crosselling (Salesforce):** durante una interacción con el cliente el agente dispondrá de las recomendaciones de upselling y crosselling definidas por el core asegurador para iniciar una cotización o un suplemento.

- **Recibos, pagos y recobros (Salesforce):** el agente podrá monitorizar y accionar sobre los recibos, pagos y recobros de un cliente, que será sincronizados con el core asegurador para su ejecución.

Funcionalidad

- **Adaptación del modelo de datos en Salesforce** de las entidades requeridas para la fase 4 según los requisitos definidos, específicamente:
  - **Cliente** para la inclusión de la información complementaria de históricos de NBO, suplementos, acciones de retención, documentación, marcas de fidelización.
  - **Oportunidades, recomendaciones y suplementos** de upselling y crosselling.
  - **Recibos** para la gestión de los mismos

- **Adaptación de los procesos** de cotización, gestión de suplementos, retención, cancelación para la integración de las recomendaciones de **upselling y crosselling**.

- **Integración online RT con el core asegurador** para la sincronización de la operativas como:
  - **Sincronización de oportunidades y suplementos de upselling y crosselling** gestionadas en Salesforce
  - **Sincronización** de las acciones relativas al **programa de fidelización**
  - **Gestión de pagos y recobros de recibos.**
  - **Gestión de documentación pendiente**

- **Integración online con BBDD externas** relacionadas con el **recobro**

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 4 (Fidelización - Upselling/Crosselling) – Operativa y Funcionalidad

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
1	Clientes	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Modificación actual de la carga de clientes para incluir información de: clientes Expats, programa de fidelización	
2	Fidelización	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Envío de las acciones de fidelización al core asegurador para su aplicación	
3	Recomendación	Modificación	Motor NBO	Salesforce	Batch	Actualización de las recomendaciones de upselling y crosselling	
4	Recibos - Acciones	Nueva	Salesforce	Core / DB2	Online	Envío al core asegurador de ordenes de emisión, reemisión, cancelación, recobro, actualización del proceso de pago	Se lanzará durante durante el proceso de gestión de recibos
5	Recobro	Nueva	Salesforce	Adobe	Online	Información de campañas y lanzamiento de notificaciones	
6	Recobro – comprobación	Nueva	Externo	Salesforce	Online	Comprobación del recobro	
7	Gestor documental	Modificación	Gestor documental / MIR	Salesforce	Online	Modificación de la consulta de documentos para incluir el estado de los documentos pendientes	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 5 (Salud) – Operativa y Funcionalidad

Se incorpora la línea de Salud al CRM, habilitando la cotización y gestión de pólizas con procesos específicos de suscripción y valoración de riesgo.

Operativa (Ilustrativo)

- **Inicio (Salesforce):** El agente abre Salesforce e identificará en su inicio las acciones del día, incluyendo oportunidades, evento y tareas (Fase I)
- **Identificación (Salesforce + CTI):** Entra una llamada. El CTI abre la Ficha 360 (Fase I) con la información sincronizada.
- **Inicio de Cotización Salud (Salesforce):** Si el NBO o la conversación lo requieren, el agente inicia una nueva Cotización Salud desde la **ficha del cliente o desde una Oportunidad NBO**.
  - **Cotización (Online):** el agente desde Salesforce solicita al core asegurador el precio, modalidades, coberturas aplicables y límites según el cliente y su riesgo a través de la API online.
  - **Valoración (Online):** desde Salesforce se solicita al core información sobre las valoraciones necesarias y su estado.
  - **Cierre y firma (Salesforce):** confirmación del método de pago, envío de la documentación y petición de firma mediante Logalty al cliente, gestión de los recibos y pagos correspondientes.
- **Inicio de gestión de suplementos de Salud (Salesforce**): si se requiere se podrá acceder a una póliza del cliente para **gestionar un suplemento.**

Funcionalidad

- **Adaptación del modelo de datos en Salesforce al ramo Salud** de las entidades requeridas para la fase 5 según los requisitos definidos
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de la oportunidad de Salud** que habilita la sistemática de cotización, valoración y contratación.
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de los suplementos de Salud** incluyendo los procesos de verificación correspondientes.
- **Adaptación de la integración online RT con el core asegurador** para la sincronización de la operativa en curso:
  - **Sincronización de Oportunidades** creadas en Salesforce para tener visibilidad y trazabilidad.
  - Monitorización de **valoraciones** aplicables.
  - **Emisión de póliza:** gestión del pago, firma digita, monitorización de estado, recibos y pagos, gestión documental.
- **Adaptación de la integración con el motor de cotización/suscripción (core asegurador) para Salud** para obtener precios, descuentos, restricciones técnicas, acciones de retención… en las diferentes fases de la operativa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 5 (Salud) – Operativa y Funcionalidad

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
2	Oportunidades - Sincronización	Modificación	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Salesforce del ramo Salud	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
3	Productos	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Modificación de la carga actual para la inclusión de información complementaria de productos de Salud	
5	Casos	Modificación	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de los casos de retención creados y gestionados en Salesforce correspondientes al ramo Salud	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Salesforce
6	Recomendación NBO	Modificación	Motor NBO	Salesforce	Batch	Actualización de las recomendaciones NBO para cada cliente del ramo Salud	
7	Valoración	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	Consulta de las condiciones y estado de las valoraciones necesarias según póliza y producto de Salud	Se lanzará durante el proceso de cotización y suplementos
8	Valoración – resultado	Nueva	Core / DB2	Salesforce	Online	El core asegurador actualizará el estado de la valoración una vez se haya producido	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 6 (Empresas) – Operativa y Funcionalidad

Salesforce se extiende al segmento Empresas, incorporando gestión específica de cliente corporativo, cotización y ciclo de vida de pólizas adaptadas a este colectivo.

Operativa (Ilustrativo)

- **Identificación (Salesforce + CTI):** Entra una llamada. El CTI abre la Ficha 360 (Fase I) con la información sincronizada correspondiente a una empresa.
- **Inicio de Cotización Empresas (Salesforce):** Si el NBO o la conversación lo requieren, el agente inicia una nueva Cotización para dicha empres desde la **ficha de la empresa o desde una Oportunidad NBO asociada**.
  - **Cotización (Online):** el agente desde Salesforce solicita al core asegurador el precio, modalidades, coberturas aplicables y límites según el cliente y su riesgo a través de la API online.
  - **Cierre y firma (Salesforce):** confirmación del método de pago, envío de la documentación mediante Logalty al cliente, monitorización de la firma del cliente, gestión de los recibos y pagos correspondientes.
- **Inicio de gestión de suplementos de Empresas (Salesforce**): si se requiere se podrá acceder a una póliza del cliente para **gestionar un suplemento.**

Funcionalidad

- **Adaptación del modelo de datos en Salesforce al modelo de empresas** de las entidades requeridas para la fase 6 según los requisitos definidos
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de la oportunidad de empresas** que habilita la sistemática de cotización y contratación.
- **Visualización y gestión del ciclo E2E de los suplementos de empresas**.
- **Adaptación de la integración online RT con el core asegurador** para la sincronización de la operativa en curso:
  - **Sincronización de Oportunidades** creadas en Salesforce para tener visibilidad y trazabilidad.
  - Monitorización de **valoraciones** aplicables.
  - **Emisión de póliza:** gestión del pago, firma digita, monitorización de estado, recibos y pagos, gestión documental.
- **Adaptación de la integración con el motor de cotización/suscripción (core asegurador) para empresas** para obtener precios, descuentos, restricciones técnicas, acciones de retención… en las diferentes fases de la operativa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 6 (Empresas) – Operativa y Funcionalidad

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
1	Clientes	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Inclusión de lsa personas jurídicas en la carga actualizada de cliente con su información específica	
2	Pólizas	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos básicos de las pólizas de empresas	
3	Oportunidades	Modificación	Salesforce	Core / DB2	Online	Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Salesforce de empresas	
4	Productos	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de los datos de productos de empresas	
7	Incidencias / Quejas	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos de las incidencias de empresas	
8	Recibos	Modificación	Core / DB2	Salesforce	Batch	Carga periódica actualizada de datos de los recibos asociados a las pólizas de empresas	
9	Recomendación NBO	Modificación	Motor NBO	Salesforce	Batch	Actualización de las recomendaciones NBO para cada empresa	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 7 (Atención al cliente) – Operativa y Funcionalidad

El CRM consolida su papel como centro de operaciones omnicanal, integrando la atención al cliente, gestión de quejas y seguimiento de siniestros en un entorno unificado.

Operativa (Ilustrativo)

- **Apertura de un caso (Salesforce):** si la interacción con el cliente lo requiere, el agente de CC podrá abrir un caso desde la Ficha 360 del cliente o la póliza para gestionar y monitorizar quejas, reclamaciones y otros procesos.
- **Resolución de casos (Salesforce):** el agente de CC tipificará e incluirá la información correspondiente al caso con el fin de resolverlo.
- **SLAs (Salesforce):** el agente de CC dispondrá de un tiempo de gestión del caso, marcado por el SLA en función de su tipificación. El incumplimiento de estos periodos derivará en un escalado.
- **Consulta de siniestros (online):** el agente dispondrá de los siniestros del cliente tanto actuales como histórico que se obtiene del core asegurador.

Funcionalidad

- **Implementación del proceso de alta, gestion y cierre de casos de atencion al cliente**, incluyendo las tipificaciones especificas de quejas y reclamaciones.
- **Implementación de los entitlements, entitlement process y milestones asociados a los SLA** definidos por tipificación. Además, de los procesos de escalado y las colas necesarias para dicha gestion.
- **Implementación del modelo de datos y visualización en la Ficha 360 de los siniestros** del cliente.
- **Implementación de las integraciones** necesarias para disponer de la información y estado de los **siniestros** de un cliente del core asegurador.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Fase 7 (Atención al cliente) – Operativa y Funcionalidad

No	Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
2	Casos	Modificación	Salesforce	Core / BD2	Online	Sincronización de los casos de atención al cliente creados y gestionados en Salesforce con el core asegurador	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA

Como elemento diferencial de la propuesta, Accenture propone incorporar una **línea de innovación** orientada a la automatización inteligente de procesos de atención al cliente y gestión de siniestros, apoyándose en las capacidades de:

- Salesforce
- Agentforce
- Salesforce Data Cloud

El objetivo de esta iniciativa es generar impacto operativo tangible para LDA desde las primeras fases de adopción, mediante la automatización de tareas recurrentes y el uso de capacidades de inteligencia artificial que permitan mejorar la eficiencia de los equipos operativos.

En este sentido, la automatización no se plantea como una iniciativa futura posterior a la implantación, sino como un **piloto estructurado y acotado que se desarrollará durante el propio proyecto**, con el objetivo de validar de forma temprana el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la operativa del Contact Center y a los procesos de gestión de clientes y siniestros.

Este piloto contemplará hasta un máximo de **dos (2) casos de uso concretos basados en Agentforce**, orientados a automatizaciones que puedan aportar valor inmediato al negocio.

A modo ilustrativo, **algunos ejemplos de casos de uso podrían incluir**:

- Agentes de IA capaces de generar resúmenes inteligentes del cliente, consolidando información relevante y proporcionando contexto a los agentes antes de una interacción.
- Agentes conversacionales de soporte a la operativa, capaces de responder a preguntas frecuentes o ayudar a resolver incidencias sencillas, facilitando el trabajo diario de los agentes.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA

IA para el delivery

Ademas del Agentforce como se ha comentado anteriormente, es importante la aplicación de la IA para el Desarrollo. A partir del **marco completo del ciclo del Proyecto en Accenture** hemos identificado las **áreas más destacadas donde la IA puede impulsar la eficiencia del delivery.** Durante el delivery aplicaremos las herramientas de IA acordadas con LDA que faciliten el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

En base a otras experiencias a continuación se muestra un resumen de la aplicabilidad de distintas herramientas en partes del ciclo de desarrollo

Design	Build	Test	Deploy	Hyper care
• Accelerated drafting of epics and user stories (DoR/DoD)	• Apex/LWC Code Generation	• Generate functional test cases		
• Create Design Document • (FDD & TDD)	• Unit Test Generation for Apex/LWC	• Generate test scripts		
	• Code Analyzer / Quality Code	• Generate test data		
	• Code Explanation			
• Automatic email and meeting summaries, assisted response in Outlook and Teams				
• Quick access to information and recommendations relevant to the project				

Agentforce Vibes

Accenture Pre-built prompts available– Prepare to refine

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


3. Cobertura de requisitos

COBERTURA DE REQUISITOS FUNCIONALES

Con la presente propuesta se adjunta el documento detallado que hemos generado recopilando todos los **requerimientos funcionales de la RFP** en el que proponemos una solución inicial para cada uno de ellos y la forma de implementarlo de acuerdo a las fases identificadas.

- 9 LDA - Requisitos funcionales CRM v2 – Faseado

Dicho documento incluye los requerimientos incluidos en la RFP reordenados en base a las fases definidas.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

COBERTURA DE REQUISITOS TÉCNICOS

Respecto a los **requerimientos técnicos (arquitectura)**, a continuación, mostramos los requerimientos de la RFP en el que proponemos una solución inicial para cada uno de ellos y la forma

Identificador	Funcionalidad	Propuesta Técnica	Justificación y Detalles	Tecnologías o Protocolos	Mecanismo de Ejecución	Medidas de Seguridad o Riesgo
3.1	Enfoque de migración	Estrategia por fases (entidades)	Mitigación del riesgo de saturación del Core dado el volumen superior a 5 millones de registros, priorizando Clientes antes que Pólizas.	Galgo Core, Salesforce	Por fases (Diferida)	Priorización de entidades maestras para evitar saturación del sistema.
3.2	Proceso ETL	Extracción y carga vía capa de mediación	Uso de ETL corporativa para orquestar la carga y asegurar el mapeo de campos, evitando el acoplamiento directo entre sistemas.	Galgo Core, DB2, MuleSoft, Salesforce Bulk API	Batch (Diferida)	Capa de mediación para evitar acoplamiento directo.
3.3	Calidad y Reconciliación	Reconciliación técnica diaria	Detección de desalineaciones entre el CRM y el Core con una ventana de desincronización inferior a 15 minutos.	CRM, Core	Diferida (Diaria)	Control de staleness inferior a 15 minutos.
3.4	Plan de rollback	Persistencia de fallos y puntos de control	Uso de colas para reintentos y backups completos previos a cargas masivas para permitir recuperación parcial.	Dead Letter Queues (DLQ)	Asíncrono	DLQ para replay de datos, backups previos y checkpoints.
3.5	Pruebas de migración	Ciclos de carga en Sandbox	Validación de volúmenes y rendimiento de la API antes del paso a producción.	Sandbox, Salesforce Bulk API	Diferida	Uso de datos anonimizados y validación de integridad post-carga.
3.6	Extracción de Datos	Inversión de flujo para sistema informacional	Alimentación de la plataforma analítica corporativa desde el CRM.	Batch, Change Data Capture (CDC)	Batch o Tiempo real (CDC)	Mecanismos de exportación controlados.
5.1	Arquitectura	Orientada a eventos y APIs	Desacoplamiento de sistemas legacy y centralización de seguridad para sistemas externos como Adobe o Genesys.	Kafka, API Connect	Asíncrono (Eventos) y Síncrono (APIs)	Gateway de seguridad centralizado.
5.2	Conectores custom	Desarrollo de conectores personalizados	Integración de servicios específicos como chats de atención donde no existan estándares.	MuleSoft, mTLS, OAuth2	Síncrono o Asíncrono	Seguridad vía mTLS o OAuth2.
5.3	Mecanismos	Estrategia híbrida de integración	Uso de APIs para consultas críticas, mensajería para consistencia y Batch para grandes volúmenes.	Kafka, Bulk API	Síncrono, Asíncrono y Batch	Consistencia eventual mediante mensajería.
5.5	Sincronización Maestro	Sincronización híbrida de clientes	Cambios puntuales en tiempo real y reconciliación masiva nocturna para asegurar la integridad.	Not in source	Tiempo real, Asíncrono y Batch	Garantía de idempotencia para evitar duplicados.
5.7	Monitorización	Observabilidad avanzada	Alertas proactivas para detectar fallos en colas, saturación de Kafka y tiempos de respuesta.	Dynatrace, ELK	Tiempo real	Alertas configuradas para fallos en DLQ y saturación de particiones.
5.9	Sistemas Externos	Gestión centralizada de comunicaciones	Comunicación con ~45 sistemas externos centralizando autenticación y límites de tráfico.	API Connect, OAuth2	Síncrono o Asíncrono	Autenticación OAuth2 y gestión de cuotas (Rate limiting).

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

4. Gestión del cambio y Adopción

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS TRANSFORMACIONES DE CRM

Nuestra experiencia implementando procesos de **transformación** vinculados a **CRM** ha demostrado que se requieren capacidades adecuadas de Gestión del cambio **para impulsar la adopción.**

Tras analizar proyectos previos, podemos ver cómo los resultados mejoran significativamente cuando **un equipo dedicado** se asigna al diseño e implementación de la estrategia de Gestión del cambio, generando acciones que acompañen a las personas desde la definición de la estrategia hasta su adopción diaria, con el fin de promover la adopción de nuevas formas de trabajar y el uso de CRM de forma sostenida.

	Pre Go live	Go live	Post Go live
Formación	**-60%** tiempo, esfuerzo para preparar los materiales de formación.	**70%** dudas funcionales resueltas consultando los materiales de formación.	**-70%** necesitaban formación adicional en los nuevos empleados.
Uso	**86%** de los usuarios se sienten preparados para la transformación.	**98%** los usuarios acceden al sistema el mismo día de la puesta en marcha.	**+150%** sincronización por usuario, permitiendo un informe actualizado.
Apoyo	**100%** de los usuarios clave se sienten preparados para apoyar a los usuarios finales.	**40%** de las dudas de los usuarios sobre la nueva herramienta se resolvieron con los materiales de formación.	**+80%** autonomía de las unidades de negocio para resolver problemas funcionales.

Fuente: Research interno de Accenture.

Datos analizados durante la implementación de CRM en un proyecto que cuenta con un equipo de Gestión del cambio.

Comparación de la implementación de CRM en dos empresas europeas con / sin un equipo específico de Accenture Change Management.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CLAVES DE ÉXITO

Una transformación de este calado conlleva ir más allá que enseñar a utilizar una herramienta, conlleva un **cambio de forma de trabajar**.

Existiendo 3 pilares para ello:

Habilitar el liderazgo, que posibilita:

- ✓ Alineación con la estrategia de la compañía y los resultados esperados
- ✓ Alineación entre lideres en los argumentos a transmitir a favor del cambio
- ✓ Sponsorización de la iniciativa, asegurando que se producen las acciones pertinentes
- ✓ Recepción feedback de primera mano de los usuarios finales

Cambio y personas, que permite:

- ✓ Personalización: acciones específicas por perfil y momentos del proyecto
- ✓ Monitorización de resultados por perfil y acción y posible mejora continua

Capilaridad en la Comunicación y la Formación que favorece:

- ✓ Gestión de expectativas
- ✓ Monitorización de resultados por perfil y acción y posible mejora continua

EJEMPLOS PRÁCTICOS ILUSTRATIVOS




1. NARRATIVA DEL CAMBIO A TRANSMITIR

Las narrativas sintetizan los **mensajes clave** de una iniciativa que un líder debe transmitir, tanto interna como externamente. Se elaboran de forma colaborativa y se comparten con los líderes para que las **integren de manera natural en su día a día**.



3. PODCAST Y VIDEO

Los **formatos audiovisuales (podcast y vídeo)** facilitan una comunicación clara y atractiva de los mensajes clave y las **funcionalidades de la herramienta**, mediante contenidos breves y accesibles que combinan **voz e imagen** y permiten personalizar con **testimonios**



5. ROADMAP

Nuestra experiencia con Salesforce demuestra que una adecuada Gestión del Cambio es clave para impulsar la adopción. Una estrategia **centrada en el usuario, basada en datos** y con un roadmap claro, asegura el impacto y los resultados.




2. CANALES Y FORMATOS

Lo ideal es generar **múltiples impactos** combinando **las prácticas y canales de comunicación más innovadores con los tradicionales**, para promover que el mensaje correcto se entregue de manera efectiva y eficiente.



4. WALKME*

WalkMe es una plataforma de adopción digital en la nube que guía a los empleados **paso a paso** en el uso de Salesforce, ayudándoles a ejecutar distintos casos de uso **sin salir de la propia herramienta.**



6. MENSAJES EN LA HERRAMIENTA*

Mensajes en la propia plataforma para **comunicar novedades, cambios funcionales y recomendaciones de uso**, asegurando claridad sobre los tiempos de actualización.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

**Activos no cotizados en la presente oferta,. No obstante, recomendamos considerar su utilización para potenciar los niveles de adopción. En caso de no incluirse, las actividades se gestionarán mediante otras herramientas.*

PRINCIPIOS QUE IMPULSAN LA ADOPCIÓN DEL CRM

La transformación comercial de Línea Directa se apoya en un **Plan Integral de Gestión del cambio** basado en **4 principios**, habilitado por **GenAI**.

Un solo equipo, un objetivo común

Alineamos los stakeholders clave a lo largo de la organización bajo un **objetivo común** para promover que el CRM genere eficiencia operativa y valor **desde el primer día.**

Involucración en el núcleo del negocio

Involucramos a los representantes de los cuatro grandes grupos de trabajo desde el análisis del proceso actual y experiencia del usuario para que el CRM se construya desde **la realidad operativa y facilite su adopción.**



Enfoque centrado en empleados y clientes

Diseñamos el cambio poniendo al **empleado en el centro,** adaptando formación y adopción por rol para **mejorar su experiencia diaria**.

Metodología basada en la experiencia

Activamos nuevos hábitos operativos a través de **simulaciones reales**, formaciones prácticas por rol y acompañamiento en campo, en el marco de un **Plan Integral de Gestión del cambio**, promoviendo no solo la capacitación, sino la **adopción efectiva del CRM** en la jornada diaria del empleado.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


ACELERADO POR GEN AI

Incorporamos Gen AI en las actividades que desarrollamos a través de nuestra metodología para **impulsar la adopción de manera más ágil.**

CAPACIDADES HABILITADORAS

Accenture Gen AI Reinvention Console

Reinvention Console es la plataforma interna unificada de Accenture, **impulsada por IA generativa**, que integra **soluciones, activos, conocimiento experto** y **herramientas de IA** para ayudar a los equipos a generar **valor consistente** y de **alto impacto** a lo largo de todo el proceso de reinvención.



ChatGPT Enterprise, Copilot y Agentes

Nuestros equipos cuentan con licencias de **ChatGPT Enterprise** y **M365 Copilot** como asistentes de **análisis y síntesis** dentro del proceso de Gestión del cambio.

A continuación, presentamos **3 agentes de IA** ilustrativos relevantes para este proyecto:

- Agente de análisis de Impactos
- Agente generador de Comunicaciones
- Agente generador de materiales de Gestión del cambio

Synthesia


Con **Synthesia**, creamos **vídeos** basados en avatares para **personalizar** la comunicación y hacerla más **accesible** y **atractiva** para los equipos.



ILUSTRATIVOS

Agente de análisis de Impactos

Agente de análisis de Impactos que analiza la documentación de diseño detallado del CRM y **genera automáticamente una matriz de impactos por área y rol**, con su **nivel de severidad**, proponiendo además las acciones de Gestión del cambio necesarias para **asegurar la adopción**.




Agente generador de Comunicaciones

Agente que crea **correos electrónicos, publicaciones de Teams y scripts personalizados**, adaptando el tono y el estilo, tanto del remitente como del receptor, asegurando la relevancia y la completa **alineación con la narrativa del cambio y el plan de Comunicación**.



Agente generador de materiales de Gestión del cambio

Agente que genera automáticamente borradores de materiales de Gestión del cambio (formación, comunicación, comités, etc.) **a partir de datos del proyecto** como impactos, KPIs, colectivos y nivel de preparación aplica de forma automática la plantilla corporativa, **reduciendo en un 70% el tiempo de elaboración** y asegurando coherencia en todos los materiales.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

** Asumimos la autorización de Línea Directa para la utilización de las herramientas de GenAI y consecuente generación de eficiencias.*


ACELERADO POR ACTIVOS

Accenture cuenta con un conjunto de **activos que maximizan el impacto** de la Gestión del cambio, facilitando el alineamiento organizativo, la medición de la adopción mediante IA y el acceso a una **red de expertos y colaboradores especializados.**



Metodología y comunidad global de Gestión del cambio en CRM

Accenture cuenta con una sólida **metodología** respaldada por **activos predefinidos,** una **red global de expertos comerciales** y una plataforma colaborativa para compartir **experiencias y lecciones aprendidas**.





Transformation GPS*
Monitorización continua

Herramienta que agrega datos para crear un panel interactivo de **visualización que permita el seguimiento de las actividades clave de Gestión del cambio**: Análisis de Stakeholders, Evaluación de Impacto del Cambio y Comunicación & Engagement.



**Activos no incluidos en la presente oferta, ya que requieren un análisis más profundo de las necesidades de Línea Directa. No obstante, recomendamos considerar su utilización para potenciar y medir los niveles de adopción. de no incluirse, las actividades se gestionarán mediante otras herramientas.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

NUESTRO FRAMEWORK | CAMBIO CONTÍNUO


Entrega de Cambio Continuo, nuestro enfoque iterativo centrado en las **personas** e **impulsado por IA y datos**, facilita que, aunque el CRM evolucione por releases, su adopción sea **continua**, **sostenible** y **medible** en toda la operación.

1. Alinear el Cambio

Desarrollar **una estrategia de cambio adaptable y orientada al valor** y un plan que se alineen con las prioridades de negocio de Línea Directa, y que apoyen una estrategia de cambio **personalizada y centrada en las personas internas y externas.**

2. Alinear la Organización

Impulsar el **liderazgo y el compromiso de los equipos** mediante la construcción de una narrativa de cambio sólida y coherente, basada en un **enfoque común**, alineando a líderes y patrocinadores en torno a una estrategia compartida.

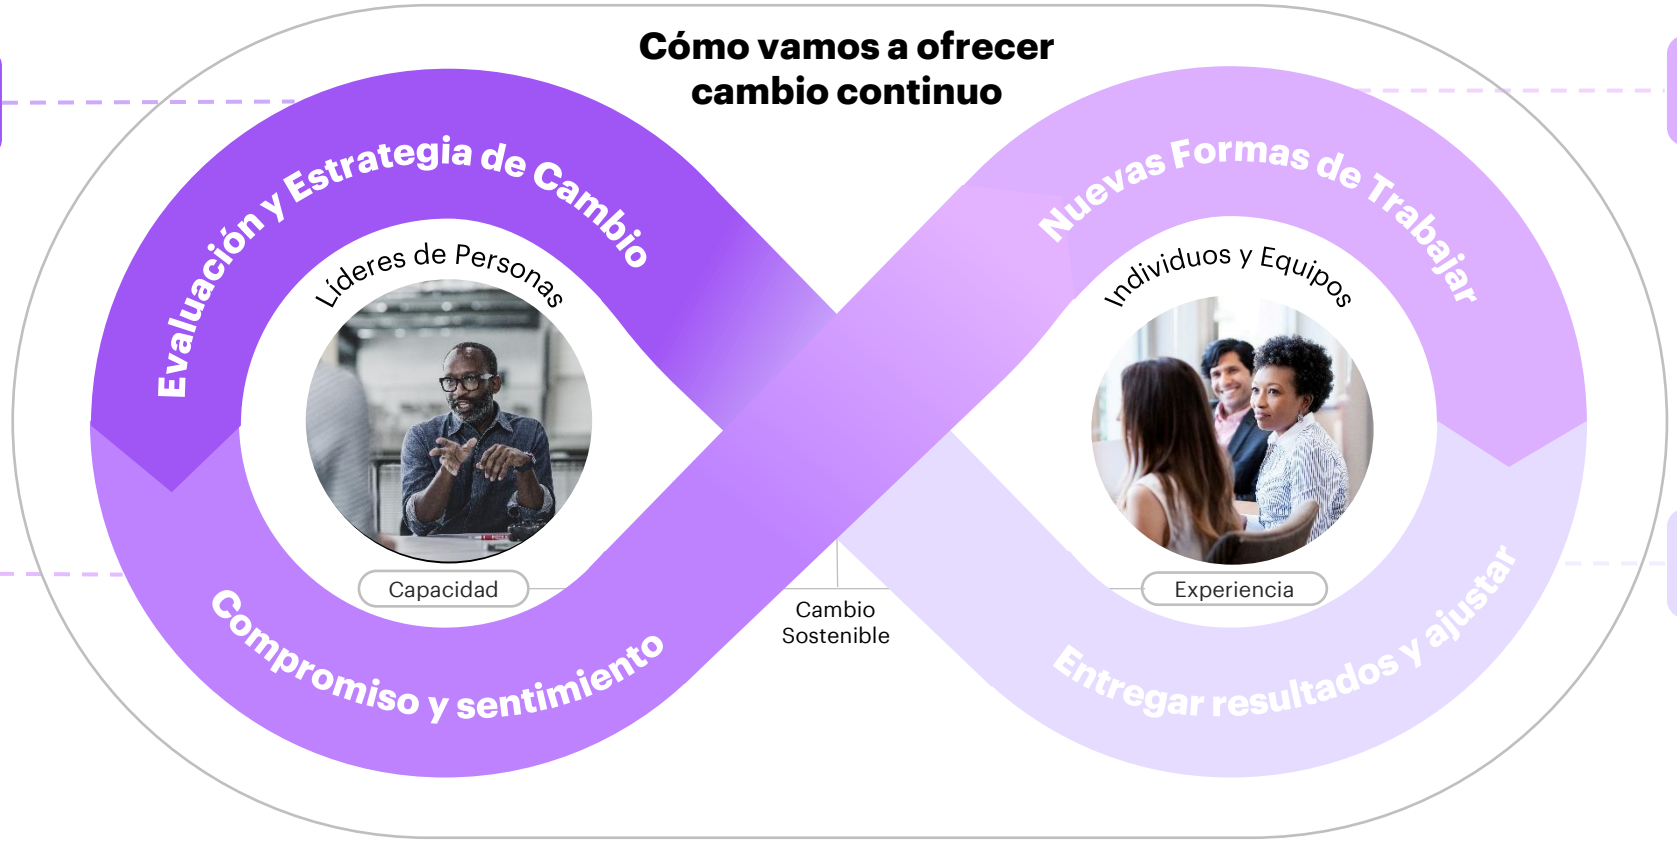

3. Activar el Cambio

Capacitar a los operadores del Contact Center y del resto de los colectivos involucrados para trabajar de con el nuevo sistema y adoptar nuevas mentalidades a través de **experiencias de aprendizaje personalizadas y entornos de práctica inmersivos.**

4. Sostener el Cambio

Supervisar el **progreso del cambio y adaptar continuamente** el enfoque de cambio para reflejar las necesidades cambiantes de los operadores, promoviendo ~~garantizando~~ que el valor se materialice para Línea Directa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CÓMO IMPULSAREMOS EL CAMBIO CONTÍNUO

Aplicamos la **metodología de Gestión del cambio** de Accenture, adaptada al **contexto de Línea Directa**, colocando siempre al **usuario en el centro** del proceso de cambio para promover una **adopción eficaz**, **coordinada** y **sostenible**.

OBJETIVO DEL CAMBIO	**Alinear** la transformación evaluando sus impactos, definiendo una visión clara, desarrollando el roadmap correspondiente y articulándolo con el enfoque de liderazgo para fomentar su compromiso.	**Preparar** para el cambio activando el liderazgo, creando la implicación de los grupos de interés, fomentando la concienciación y desarrollando un enfoque para monitorizar el sentimiento.	**Activar** el cambio implementando actividades y habilitación de cambio, abordando la resistencia y equipando a los equipos con las herramientas y el apoyo necesarios.	**Sostener** el cambio integrando el cambio en la cultura, reforzando comportamientos y promoviendo la mejora continua mediante conocimientos basados en datos.
ACTIVIDADES DE CAMBIO	**Evaluación y Estrategia de Cambio** • **Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos** para entender impactos en procesos, cultura y colectivos. • **Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE)** traduciendo el diseño funcional a comportamientos y capacidades. • **Identificación y priorización gaps,** según el nivel de impacto y riesgo de no adopción. • **Gobernanza y activación temprana de stakeholders** como palanca de liderazgo • **Visión compartida y estrategia de cambio** alineados con los hitos del programa • **Red de embajadores del cambio** para sostener el compromiso.	**Compromiso y Sentimiento** • **Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio** mediante un modelo de relación, gobernanza clara y dinamización continua del liderazgo. • **Plan de comunicación del cambio** con narrativa, mensajes segmentados y campañas adaptadas para acelerar la adopción.	**Nuevas Formas de Trabajar** • **Estrategia de formación y transferencia de conocimiento** Plan formativo por rol con modelo TTT para asegurar adopción y autonomía interna. • **Modelo de formación por oleadas** sesiones por rol y oleadas alineadas al Go-Live para maximizar impacto. • **Coaching operativo y acompañamiento en campo** Soporte intensivo post Go-Live con canales dedicados y agente de ayuda. • **Verificación de la transferencia** Evaluación, certificación e informe de estabilización con mejoras accionables.	**Entregar Resultados y Ajustar** • **Métricas de adopción y reporting** Medimos el uso y desempeño del CRM mediante KPIs y seguimiento continuo. Reportamos resultados para ajustar y optimizar la adopción. • **Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM** transferimos conocimiento, roles y materiales al CoE. Promovemos continuidad operativa y mejora continua post-proyecto.
EXPERIENCIA DE CAMBIO	Soy **consciente**... de los objetivos de la Transformación del CRM.	Estoy **comprometido**... Entiendo lo que esto significa para mí, mi papel en el estado interino y futuro, y los hitos clave.	Me estoy **transformando**... Entiendo las nuevas formas de trabajar y con quién trabajar de ahora en adelante.	Estoy **actuando**... Puedo rendir de forma eficiente en lo "nuevo" y tener nuevos comportamientos y mentalidades.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (1/2)

En la activación inicial del enfoque, evaluamos la **preparación al cambio** e **impacto por colectivos**.

Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos:

- **Análisis de la documentación** existente* (mapas de procesos, estudios, encuestas, ...) relativa a procesos, cultura, competencias digitales, niveles de resistencia, relacionados con los cuatro grandes grupos de trabajo identificados: usuarios Contact Center, operativos, externos y consultivos.
- **Realización de 4 entrevistas** con uno/dos representantes de cada grupo impactado para analizar procesos actuales, cultura, madurez y competencias digitales, así como principales resistencias al cambio de sus principales colectivos.
- **Segmentación de colectivos en roles** (gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones).

Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE):

- **Recopilación del diseño objetivo** del CRM definido por el equipo técnico (procesos futuros, funcionalidades clave, roles y responsabilidades).**
- Traducción de ese diseño técnico a un **modelo objetivo de adopción**, enfocado en personas (comportamientos (cultura), competencias digitales clave requeridas y posibles resistencias).
- **Validación** del modelo objetivo con negocio para asegurar su viabilidad operativa.


Identificación de gaps, colectivos impactados y nivel de impacto

- Contraste estructurado entre el estado actual (AS-IS) y el modelo objetivo de adopción (TO-BE) para cada colectivo identificado para **identificar hasta 5 brechas** en cada una de las siguientes categorías: procesos, comportamientos (cultura), competencias digitales y posibles resistencias.
- Clasificación del **nivel de impacto** por colectivo (alto / medio / bajo).
- **Priorización** de los gaps según su criticidad para el éxito del la implantación del CRM y el riesgo de no adopción.

ENTREGABLES

- Change impact analysis (incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto)

ILUSTRATIVOS

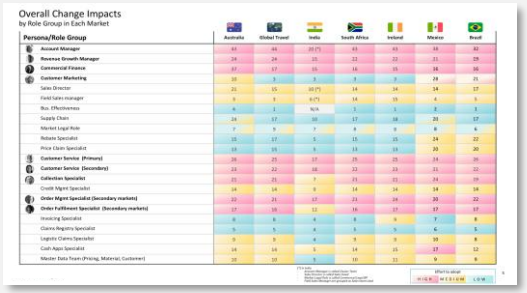

Change Impact Analysis (CIA)

** Línea Directa proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.*

*** Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, ...) quedando su elaboración fuera de alcance.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (2/2)

En base a la evaluación inicial, definimos una **gobernanza** clara, **visión** compartida y una **red activa de embajadores** para impulsar la adopción.

Gobernanza y activación temprana de stakeholders

- **Identificación de los stakeholders clave** mediante **una sesión de trabajo** con los líderes del programa, para identificar los grupos, sus principales responsabilidades y nivel de impacto.
- Definir del **modelo de gobernanza** del cambio con la **involucración temprana** de los stakeholders clave, para asegurar su rol como palanca de adopción durante todo el proyecto.

Visión compartida y estrategia de cambio

- Definición y validación de la **estrategia de Gestión del cambio** y **roadmap** alineado con los hitos del programa y la participación explícita de las áreas de **Personas y Comunicación**.


Red de embajadores del cambio

- **Identificar a los embajadores** seleccionados en una lista de *.
- Definir un **plan de activación** para mantener a los embajadores activos y comprometidos durante todo el proyecto.

ENTREGABLES

- Mapa de stakeholders y sponsors y plan de activación de la red de cambio
- Roadmap de adopción

ILUSTRATIVOS



Mapa de stakeholders



Roadmap de Adopción

*La selección de los embajadores es responsabilidad de LDA.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | COMPROMISO Y SENTIMIENTO (1/1)

Activamos el **liderazgo y una comunicación estructurada** para **alinear a los colectivos clave y acelerar la adopción** del cambio a lo largo del proyecto.

Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio

- Puesta en marcha del **modelo de relación**, incluyendo la cadencia de reuniones, para recoger feedback continuo y asegurar el alineamiento de los mensajes clave.

Plan de comunicación del cambio

- Definición de la **estrategia y el plan de comunicación**, junto con el equipo del programa y las áreas de Personas y Comunicación.
  - Alineamiento sobre **la narrativa del proyecto, los mensajes clave y el branding interno**, asegurando una comunicación segmentada **según el perfil del usuario**, definiendo emisores, calendarios y audiencias, usando los siguientes canales: email/ Iseazy/ Microsoft Teams.
  - Diseño de un **plan de comunicación**, definiendo acciones, formatos, calendario y grupos de trabajo objetivo.
- **Despliegue de campañas de comunicación** adaptadas, orientadas a generar conocimiento y comprensión de los cambios en sistemas, procesos y cultura, mediante un enfoque multicanal.*
- **Adaptación de materiales de comunicación** corporativos a los distintos contextos de cada grupos de trabajo impactado.

ENTREGABLES

- Narrativa del cambio y kit de identidad visual (branding)
- Estrategia, plan y materiales de comunicación

ILUSTRATIVOS



Plan de comunicación



Comunicación

**Quedan fuera de alcance las comunicaciones a externos. Las comunicaciones a internos se realizarán en coordinación con Comunicación y, únicamente, si se habilitan los permisos correspondientes en los canales existentes (canal de email, Iseazy (exclusiva para internos),Teams).*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (1/3)

Profundizamos en cómo **capacitamos y impulsamos la adopción** de Línea Directa.

Dado el número de usuarios implicados, proponemos ofrecer la formación en el modelo Train the Trainers alineada con las necesidades de cada audiencia.

ENFOQUE DE FORMACIÓN:

Involucrar a los usuarios clave desde el principio permitirá a Línea Directa mantener el **conocimiento internamente**, permitiendo operar de forma más autónoma en el futuro. Además, Línea Directa dependerá de **agentes de cambio** internos para facilitar la adopción de **nuevas formas de trabajo** y la **cultura** generada por esta transformación comercial.

AUDIENCIA



01 **Operadores**



02 **Supervisores**



03 **Back office**



04 **Perfiles mixtos**

- **El número de trainers (formadores)** considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 trainers por cada 40-50 usuarios finales.

FOCO

Por Releases de producto por ejemplo: Ficha cliente, Hogar, Coches, Motos, Salud, Empresas, Fidelización….

APPROACH

- Enfoque de formación de **Train The Trainers (TTT)* en oleadas**, con fechas cercanas al Go-Live, para elevar el conocimiento de los formadores.
- **Sesiones TTT** (en español)**:** diseñadas para asegurar una comprensión óptima de la nueva herramienta por producto y colectivo. La formación se organiza por **oleadas**, garantizando que en cada release se imparta como **máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos con necesidades formativas equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
  - ✓ Oleada 1: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleada 2: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleadas 3,4,5,6: hasta 1 sesión TTT por colectivo por (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos) por release.
  - ✓ Cada sesión durará como máximo 3 horas para cubrir actividades generales con ejercicios prácticos y presentaciones de apoyo.
  - ✓ Actividades de simulaciones con gamificación como juegos de rol y concursos se incluirán en las sesiones.

MATERIALES

- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol y vídeos** (en español) sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
  - Máximo 2 vídeos por herramienta realizados con grabación de pantalla y PPT.
  - Los manuales desarrollados en PPT.

** Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc.)*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (2/3)

Capacitamos a los usuarios por **rol y oleadas** para asegurar una **adopción efectiva** del nuevo CRM.

Estrategia de formación y transferencia de conocimiento

- **Diseño del plan de formación y transferencia** orientado a garantizar la adopción efectiva del nuevo CRM por rol y alineado a cada release.
- **Identificación de itinerarios formativos** y su diseño a alto nivel para los roles de operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos.
    - **Audiencia**: El número de superusuarios (formadores) considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 superusuario por cada 40 usuarios finales.

Modelo de formación por oleadas

- **Sesiones TTT (en español):** diseñadas para asegurar una comprensión óptima de la nueva herramienta por **producto y colectivo**. La formación se organiza **por oleadas**, garantizando que en cada release se imparta **como máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos** con necesidades formativas **equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
    - **Oleada 1:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
    - **Oleada 2:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
    - **Oleadas 3,4,5,6:** hasta 1 sesión TTT por colectivo por (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos) por release.
- Las sesiones se impartirán de forma **presencial** en Madrid y, cuando sea necesario, en formato híbrido.
- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol** y **vídeos (en español)** sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
    - Máximo 2 vídeos por herramienta y se harán con grabación de pantalla y PPT.
    - Los manuales se harán en PPT.


ENTREGABLES

- Estrategia y plan de formación
- Presentaciones, sesiones Train the Trainers, videos por herramienta y manuales formativos

ILUSTRATIVOS



Plan y sesiones de formación

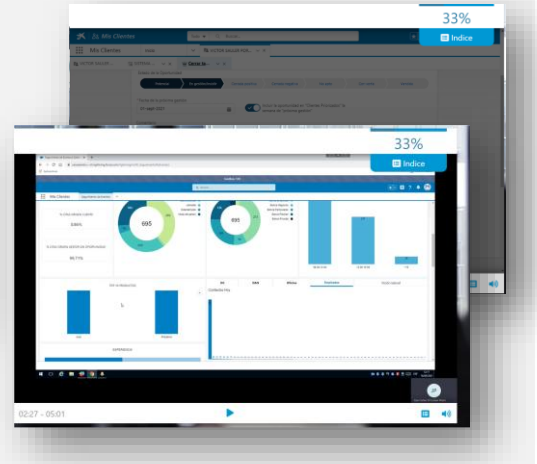

Demo Vídeos

**Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (3/3)

Cómo **acompañamos** a los usuarios para promover la **estabilidad operativa** en el Go-Live.

Coaching operativo y acompañamiento en campo

- **Acompañamiento** intensivo durante el primer mes uso real tras cada release, con la creación de canales en Teams que aborden los distintos pilares de adopción, por ejemplo:
  - **Canal de coaching**: segmentado por los 4 roles (operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos). Incluye toda la documentación relacionada con la formación, gamificación y retos para las sesiones de formación.
  - **Canal de apoyo:** canal de preguntas frecuentes para formadores.
  - **Canal de feedback:** envío de encuestas para entender cómo los empleados se sienten durante el programa respecto a la comunicación, la formación y las formas de trabajar, permitiéndonos entender sus necesidades y ajustar la estrategia de adopción cuando sea necesario.
- Desarrollo de un **agente* de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini** para resolver las preguntas de los usuarios. Para facilitar respuestas precisas, el agente deberá alimentarse con materiales relacionados con el proyecto (como los manuales operativos).


Mecanismos formales de verificación de la transferencia

- **Evaluación /certificación** teórico-práctica obligatoria al finalizar la formación.

ENTREGABLES

- Canales de acompañamiento (MS Teams)
- Agente de IA para soporte y adopción del CRM
- Informe de estabilización post Go-Live

ILUSTRATIVOS

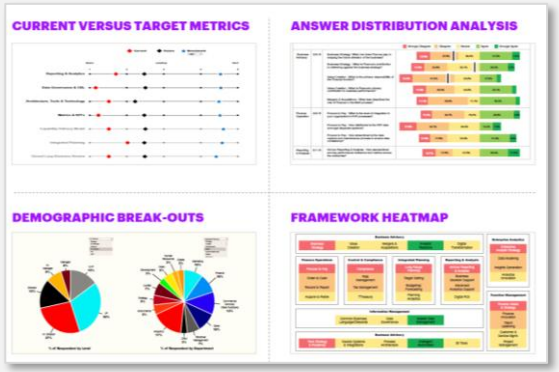

Informe de estabilización

**Para el caso de este agente, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | ENTREGAR RESULTADOS Y AJUSTAR (1/1)

Medimos la adopción, aseguramos la **sostenibilidad y transferimos capacidades** para una operación CRM **estable y autónoma**.

Métricas de adopción y reporting

- Las siguientes métricas se obtendrán a partir de **encuestas** y de la información proporcionada por la **herramienta CRM**.
- **Definición de métricas de adopción y uso** por colectivo para medir nivel de uso del CRM por rol, grado de utilización de funcionalidades clave y comparativa entre colectivos.
- **Definición y seguimiento de KPIs de eficiencia operativa**, utilizando como baseline los KPIs actuales, definidos en base a la eficiencia y la gestión comercial, para medir reducción de tiempos operativos y mejora en rendimiento tras la implantación.
- **Seguimiento de curva de aprendizaje** para analizar evolución del desempeño durante las primeras semanas y detectar necesidades de refuerzo.
- **Medición de satisfacción del usuario** para evaluar percepción de utilidad, facilidad de uso y nivel de adopción mediante encuestas breves.
- **Análisis de incidencias funcionales repetitivas** para identificar fricciones en procesos o gaps formativos y **activar acciones correctivas.**
- **Reporte periódico de adopción** (semanal durante el primer mes de la release y mensual a continuación) para promover el seguimiento continuo y toma de decisiones basada en datos.
- **Informe de estabilización** al cierre del primer mes, con análisis de feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora.


Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM

- 1 sesión **final de transferencia de conocimiento** con los stakeholders clave identificados.
- **Definición de roles y responsabilidades** para la operación futura con una **matriz RACI** incluida en la sesión final.*
- **Entrega de materiales finales** como parte de la sesión final para garantizar que el CoE dispone de la información necesaria para operar y dar soporte al CRM.
- **Recomendaciones de mejora continua** documentadas como parte de la sesión final para facilitar una adopción sostenible al largo plazo.

ENTREGABLES

- Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint
- Documento de sesión de transferencia final

ILUSTRATIVOS

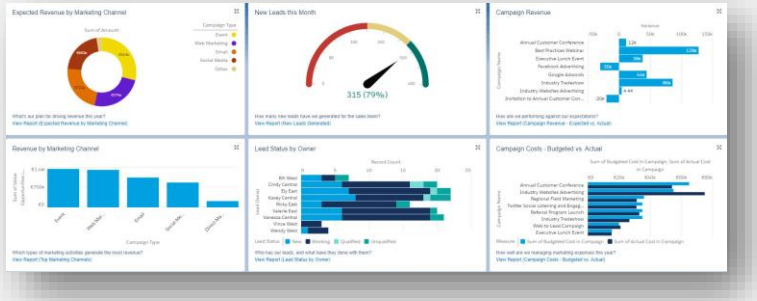


Reporte de métricas de adopción

**Modelo Operativo definido por LDA.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

5. Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

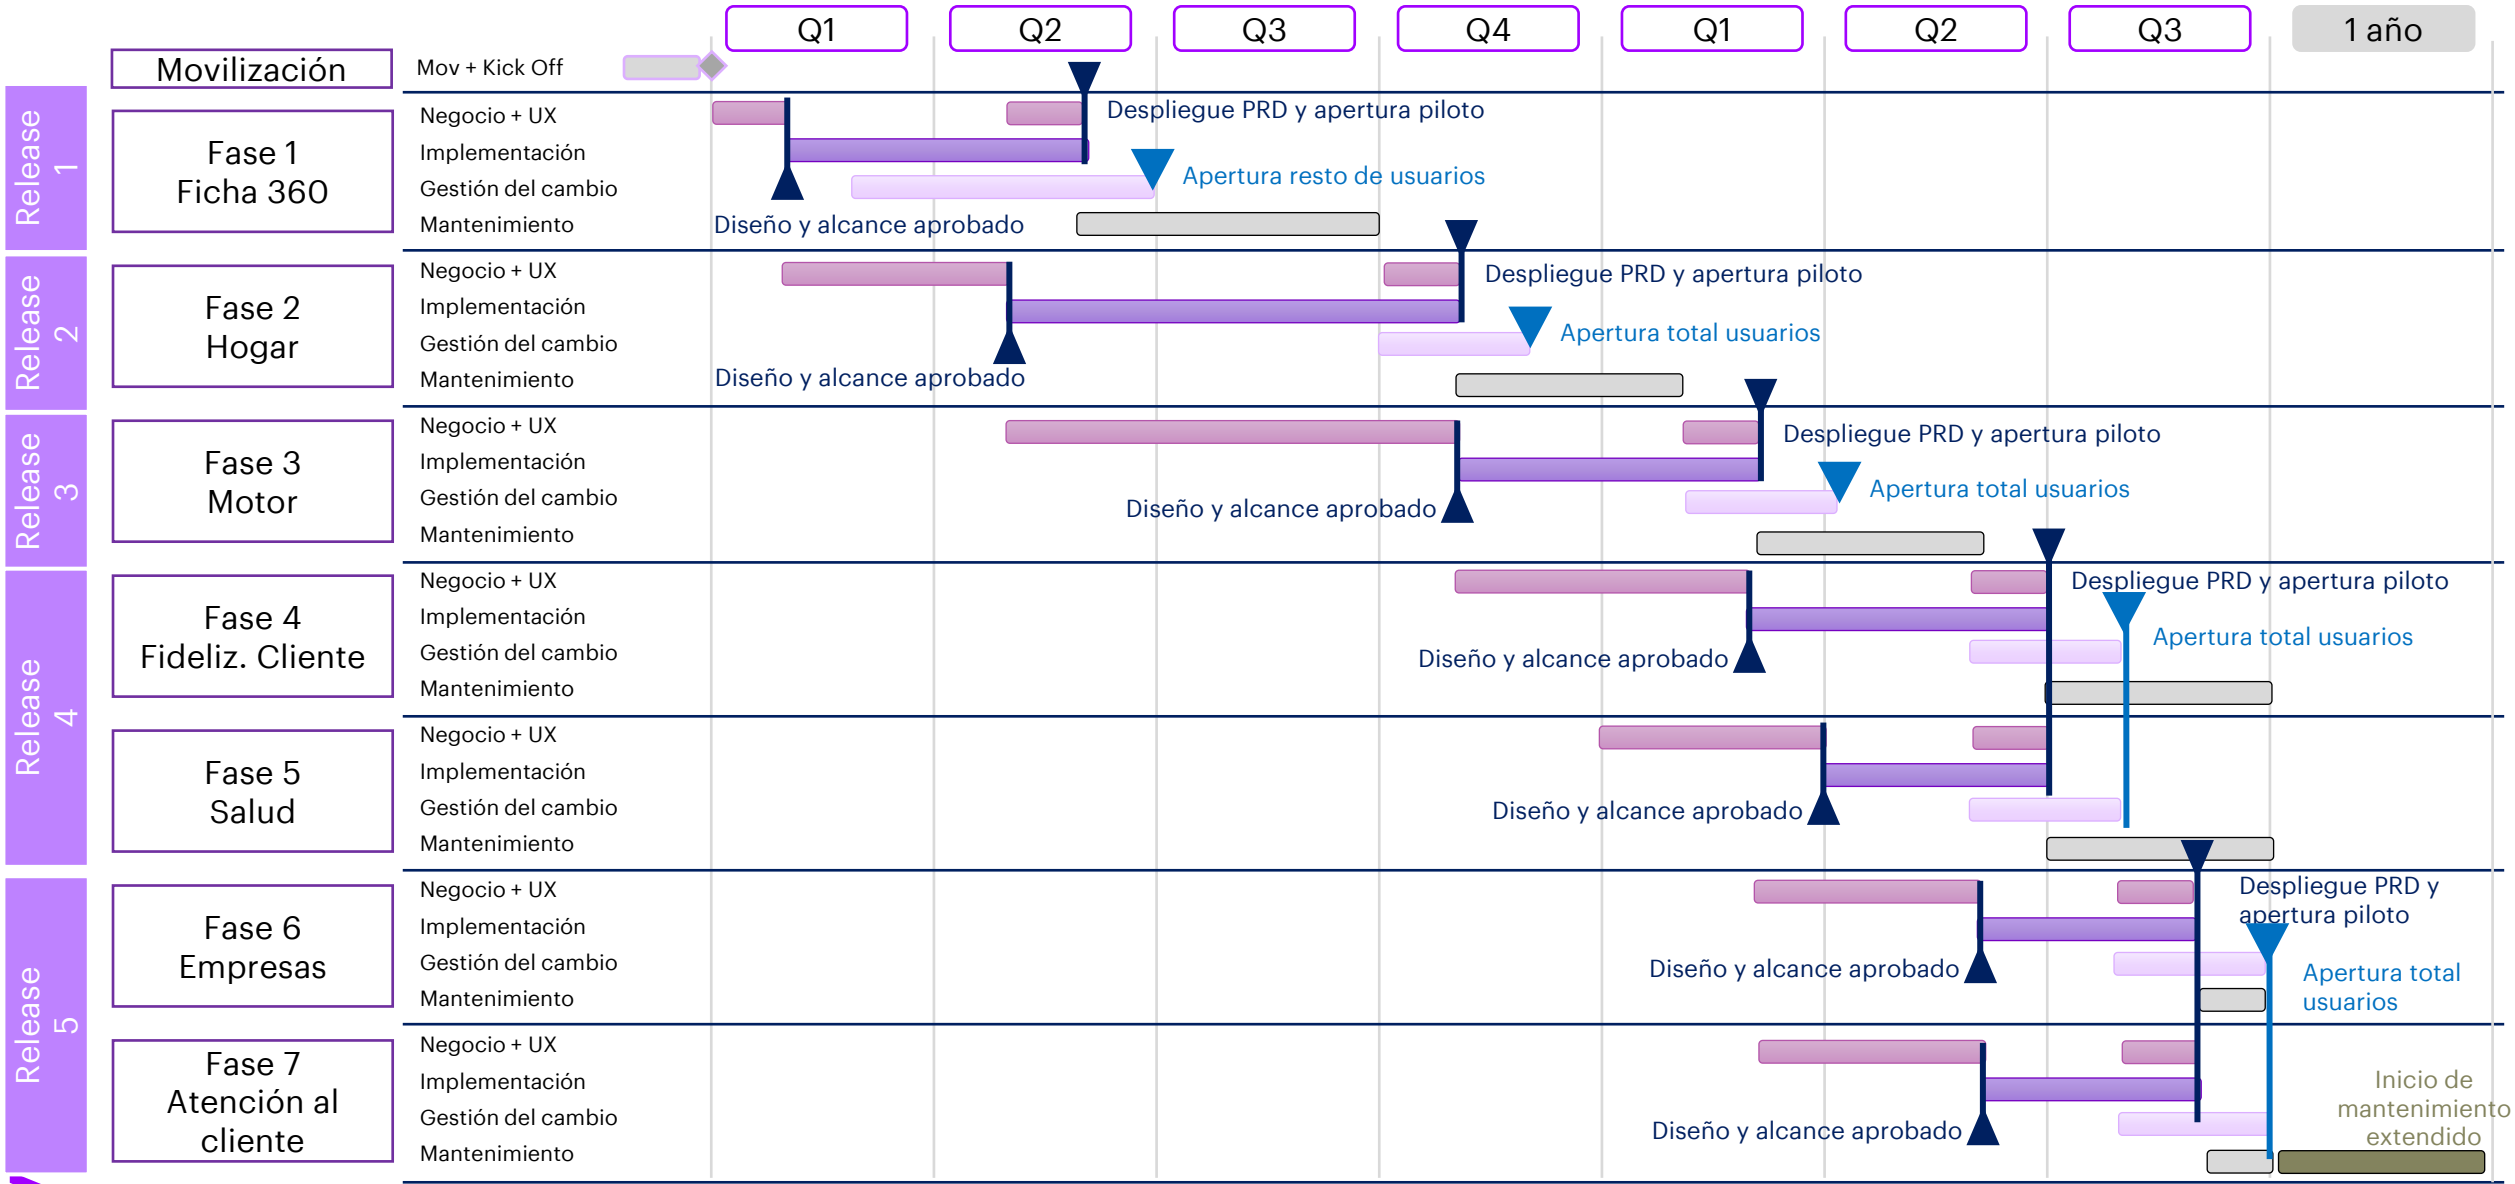

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

A continuación, se detalla el plan propuesto estructurado y controlado por releases.

Modelo de despliegue

- El programa se estructurará en **Releases que agrupan distintas fases funcionales**, permitiendo una evolución progresiva y controlada.
- Cada release culminará con una **puesta en producción planificada** y validada.
- La **apertura** a usuarios será **escalonada** por fase

Organización del equipo

- El equipo se organizará por **líneas de trabajo** especializadas:
  - Línea de Negocio & UX
  - Línea de Implementación (Aplicación e Integraciones)
  - Línea de GdC
- Esta estructura promueve el **alineamiento funcional y solidez técnica.**

Enfoque faseado

- **El diseño funcional y UX** de cada fase se desarrollará en **paralelo** a la implementación de **la fase anterior**.
- La definición irá una fase por delante, promoviendo la continuidad y reducción de riesgos en la construcción.

Transición y mantenimiento

- Tras cada puesta en producción se realizará el **traspaso** estructurado al equipo de **mantenimiento**.
- Al finalizar cada reléase se realizará el **soporte de 6 semanas** con las distintas líneas de trabajo
- Finalizada la última puesta en producción de cada release, se iniciará un **periodo de mantenimiento de 12 meses**.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Kick Off

Reunión inicial previa al Kick Off

Se realizará una semana antes del inicio del proyecto se realizará el kick off con una reunión inicial con los responsables del proyecto por parte de LDA para confirmar las personas del área de IT y Negocios que participarán en el proyecto, y definir el calendario de reuniones iniciales para la definición y UX y necesidades de participación en el proyecto

Actividades

- Lanzamiento del proyecto
- Generación del calendario de reuniones necesarias para las sesiones de la definición inicial de la Fase I (Ficha de clientes)

Recomendaciones

- Disponibilidad del equipo tanto de Accenture como de LDA y equipos que participaran por ambas partes

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables



Kick Off

Reunión inicial previa al Kick Off

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Documento de Kick Off	Plan de trabajo, calendario inicial y presentación de los equipos de trabajo	Accenture/LDA	Negocio + UX Implementación GdC	No
Calendario tentativo de reuniones	Calendario tentativo de reuniones (a validar durante la semana de lanzamiento) para las semanas del periodo de discovery	Accenture	Negocio + UX Implementación GdC	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Línea de Negocio y UX

Definición y diseño

Existirá una línea de trabajo donde se definirán las Historias de usuario y el diseño. Las fases de negocio y UX irán con una fase de antelación respecto a la implementación (Ejemplo: Durante la implementación de la fase I, se estará definiendo y diseñando la fase II)

Actividades

- Recolección de requerimientos en detalle mediante sesiones con usuarios clave, product owner y scrum master
- Creación de las HU detalladas para cada Release/Fase y criterios de aceptación
- Definir enfoques técnicos con los arquitectos técnicos Salesforce
- Priorización de requerimientos junto con Negocio
- Definición de los casos de prueba para las UATs junto con Negocio
- Acompañamiento al Negocio durante las UATs
- Soporte funcional después de cada despliegue
- Prototipado UX de la solución

Outputs y recomendaciones

- Historias de usuario acordadas y cerradas
- Priorizar las historias de usuario en base a la criticidad para Negocio
- Orientar la solución hacia funcionalidades estándar de la plataforma
- Visionar el futuro CRM e identificar riesgos de definición.
- Flexibilidad de adaptación de los requerimientos al estándar de Salesforce.
- Funcionamiento en modo One-team asumiendo responsabilidad conjunta sobre los objetivos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables



Línea de Negocio y UX

Reunión inicial previa al Kick Off

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Escritura de las Historias de usuario	Descripción de las Historias de usuario para cada fase	Accenture	Negocio y UX	Si
Criterios de aceptación	Criterios de aceptación para la aprobación funcional durante la fase de pruebas	Accenture	Negocio y UX	Si
Casos de prueba UAT	Casos de prueba para las UAT de Negocio	Accenture	Negocio y UX	Si
Diseño visual de las pantallas	Diseño de las pantallas en tiempo de definición (UX)	Accenture	Negocio y UX	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Línea de Implementación - Aplicación

El desarrollo se realizará en base a Releases y a Sprints. En cada Release se realizarán las tareas necesarias para la evolución del desarrollo (sesiones con Negocio para ir viendo el avance en cada Sprint,...). El último Sprint antes de las UATs de la release se enfocará a la realización de las pruebas e2e de la funcionalidad de la release



Actividades

- Sesión de revisión con el equipo de Negocio de las HU al inicio de la release y distribución de las HU por Sprint
- Desarrollo de las HU en los entornos de Dev
- Despliegue a los entornos superiores a Dev, y soporte al Release manager de LDA para despliegue a entornos superiores (Prod)
- Preparar los planes de pruebas unitarios a nivel de historia de usuario (en base a los criterios de aceptación) y ejecutarlos en cada sprint
- Coordinación con los IT leads de LDA
- Sesión de formación técnica a IT de la solución implementada en Prod a la finalización de la Release

Outputs y Recomendaciones

- Historias de usuario acordadas y cerradas al inicio de esta fase
- Priorizar las historias de usuario en base a la criticidad para Negocio
- Orientar la solución hacia funcionalidades estándar de la plataforma
- Visionar el futuro CRM e identificar riesgos de definición.
- Flexibilidad de adaptación de los requerimientos al estándar de Salesforce.
- Funcionamiento en modo One-team asumiendo responsabilidad conjunta sobre los objetivos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Línea de Implementación - Integración

El desarrollo se realizará en base a Releases y a Sprints. En cada Release se realizarán las tareas necesarias para la evolución del desarrollo (sesiones con Negocio para ir viendo el avance en cada Sprint,...). El último Sprint antes de las UATs de la release se enfocará a la realización de las pruebas e2e de la funcionalidad de la release



Actividades

- Sesión de revisión con el equipo de IT de las HU al inicio de la release y distribución de las HU de integraciones por Sprint
- Desarrollo de las integraciones de Dev
- Preparar los planes de pruebas a nivel de historia de usuario y cada integración (pruebas unitarias con los sistemas impactados)
- Coordinación con los responsables de IT para alineamiento con el resto de sistemas impactados de LDA
- Sesión de formación técnica a IT de la solución implementada en Prod

Recomendaciones

- Revisión de las Historias de usuario acordadas y cerradas Priorizar las historias de usuario en base a la criticidad de las funcionalidades para Negocio
- Funcionamiento en modo One-team asumiendo responsabilidad conjunta sobre los objetivos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Línea de Implementación - Entregables

El desarrollo se realizará en base a Releases y a Sprints. En cada Release se realizarán las tareas necesarias para la evolución del desarrollo (sesiones con Negocio para ir viendo el avance en cada Sprint,...). El último Sprint antes de las UATs de la release se enfocará a la realización de las pruebas e2e de la funcionalidad de la release

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Diseño técnico	Diseño técnico que se pueda utilizar para las sesiones de revisión con IT	Accenture	Implementación	Si
Modelo de datos	Diseño del modelo con los campos incorporados en la herramienta de Salesforce	Accenture	Implementación	Si
Documento integraciones	Documentación E2E de los interfaces implementados entre sistemas requeridos para el proyecto	Accenture	Implementación	Si
Manual de explotación	Manuel para la administración de la herramienta	Accenture	Implementación	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

Línea de GdC

La GdC se realizará en base a la metodología de Releases comentada anteriormente. En cada Release antes de la puesta en PROD el mes posterior se procederá a la realización de la formación, gestión del cambio a los usuarios y soporte post despliegue



Actividades

- Definición del modelo de adopción por rol, alineando a las nuevas formas de trabajo del nuevo CRM.
- Comunicación segmentada por fases y colectivos para anticipar resistencias.
- Formación práctica por oleadas, alineada al despliegue funcional.
- Soporte cercano en go-live y fase de estabilización.
- Activación de embajadores del cambio como refuerzo operativo.
- Seguimiento continuo de adopción mediante KPIs de uso y feedback.

Recomendaciones

- Activar un liderazgo visible y alineado que impulse el cambio, refuerce los mensajes clave y canalice el feedback.
- Diseñar la gestión del cambio centrada en las personas, con acciones por rol y release y seguimiento de la adopción.
- Asegurar capilaridad en comunicación y formación, combinando canales tradicionales y digitales.
- Involucrar a los colectivos clave desde el inicio, creando un equipo único con un objetivo común y anclado en la operativa.
- Poner al empleado en el centro, adaptando el acompañamiento para facilitar hábitos y una adopción sostenida del CRM.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

Línea de GdC - Entregables

La GdC se realizará en base a la metodología de Releases comentada anteriormente. En cada Release antes de la puesta en PROD el mes posterior se procederá a la realización de la formación, gestión del cambio a los usuarios y soporte post despliegue

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Change impact analysis	Incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto por grupo de trabajo en .	Accenture	Gestión del cambio	Si
Mapa de stakeholders y sponsors	Incluye un mapeo de stakeholders clave en PPT, análisis de influencia de impacto, definición de sponsors y estrategia de involucración.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Roadmap de adopción	Incluye una hoja de ruta de Gestión del cambio alineada al programa, hitos clave, palancas de adopción y plan de seguimiento en formato PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

Línea de GdC - Entregables

La GdC se realizará en base a la metodología de Releases comentada anteriormente. En cada Release antes de la puesta en PROD el mes posterior se procederá a la realización de la formación, gestión del cambio a los usuarios y soporte post despliegue

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Narrativa del cambio	Narrativa del cambio con mensajes claros, propuesta de valor del cambio y kit de identidad visual (branding) en formato PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Estrategia, plan y materiales de comunicación	Incluye estrategia segmentada por colectivos, plan editorial y calendario en formato PPT, definición de canales y desarrollo de materiales de comunicación.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Estrategia y plan de formación	Plan formativo por rol y releases con modelo Train the Trainers (TTT) que define itinerarios formativos, oleadas alineadas al Go-Live, criterios de agrupación de colectivos con necesidades equiparables y mecanismos de transferencia de conocimiento para asegurar la adopción y autonomía interna en formato PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

Línea de GdC - Entregables

La GdC se realizará en base a la metodología de Releases comentada anteriormente. En cada Release antes de la puesta en PROD el mes posterior se procederá a la realización de la formación, gestión del cambio a los usuarios y soporte post despliegue

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Train the Trainers y vídeos	Presentaciones y sesiones TTT en español por rol y oleadas, con un máximo de sesión por tipo de colectivo y release. Incluye la creación de manuales operativos por rol y vídeos formativos desarrollados en PPT y grabación de pantalla, alineados a las funcionalidades del CRM.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Canales de acompañamiento	Canales en MS Teams segmentados por rol para coaching, soporte continuo y gestión de feedback materiales de formación durante el post Go-Live en PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Agente de IA para soporte y adopción CRM	Agente conversacional de IA para soporte al usuario, integrado en el entorno de trabajo, entrenado con materiales del proyecto (manuales, FAQs, guías operativas) para resolver dudas funcionales y apoyar la adopción del CRM durante el uso diario.	Accenture	Gestión del cambio	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

Línea de GdC - Entregables

La GdC se realizará en base a la metodología de Releases comentada anteriormente. En cada Release antes de la puesta en PROD el mes posterior se procederá a la realización de la formación, gestión del cambio a los usuarios y soporte post despliegue

Documento	Contenido del documento	Responsable	Línea de trabajo	Aprobación de LDA
Informe de estabilización	Informe post Go-Live con análisis de adopción, feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora en PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Informe de métricas y Reporte	Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint periódico para seguimiento y toma de decisiones en formato PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si
Documento final de transferencia	Documento de sesión final con transferencia al CoE, RACI definido y recomendaciones de mejora continua en formato PPT.	Accenture	Gestión del cambio	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se detalla el equipo que consideramos debería participar en el proyecto por parte de LDA:

GESTIÓN DEL PROYECTO

- SPONSOR DEL PROYECTO (CDO)

EQUIPO NEGOCIO

- RESPONSABLE
- PRODUCT OWNER
- KEY USERS

EQUIPO IT

- RESPONSABLE IT
- JEFE PROYECTO
- RELEASE MANAGER
- RESPONSABLE SISTEMAS LEGACIES

EQUIPO ARQUITECTURA

- RESPONSABLE ARQ-
- SEGURIDAD

EQUIPO ARQUITECTURA

- RESPONSABLE IT
- JEFE PROYECTO

EQUIPO CALL CENTER

- RESPONSABLE
- KEY USERS

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Siendo este un proyecto relevante para LDA y por tanto también para Accenture, consideramos que recursos altamente cualificados en base a los requerimientos han liderar este proyecto

Nuestros profesionales y especialistas cubren:


- Conocimiento de los procesos de negocio de Seguros y con experiencia en UX durante los periodos de definición y diseño visual de análisis (Discovery).
- Recursos de integraciones que han participado previamente en la implantación de proyectos de seguros y, por lo tanto, con conocimiento de arquitecturas similares.
- Expertos en Gestión del cambio con amplia experiencia en grandes transformaciones como esta
- Especialistas en FSC, Sales Cloud y Service Cloud y Experience cloud.
- Equipo experto en Gestión de mantenimiento

Además, se ha activado la **red de Subject Matter Experts** tanto nacionales como internacionales de Accenture, los cuales tendrán una dedicación parcial en el proyecto y orientada a consensuar las decisiones técnicas más relevantes basándose en su experiencia y conocimiento, así como para realizar peer reviews o QAs.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES - IMPLEMENTACIÓN


A continuación, se detalla el equipo de proyecto propuesto:

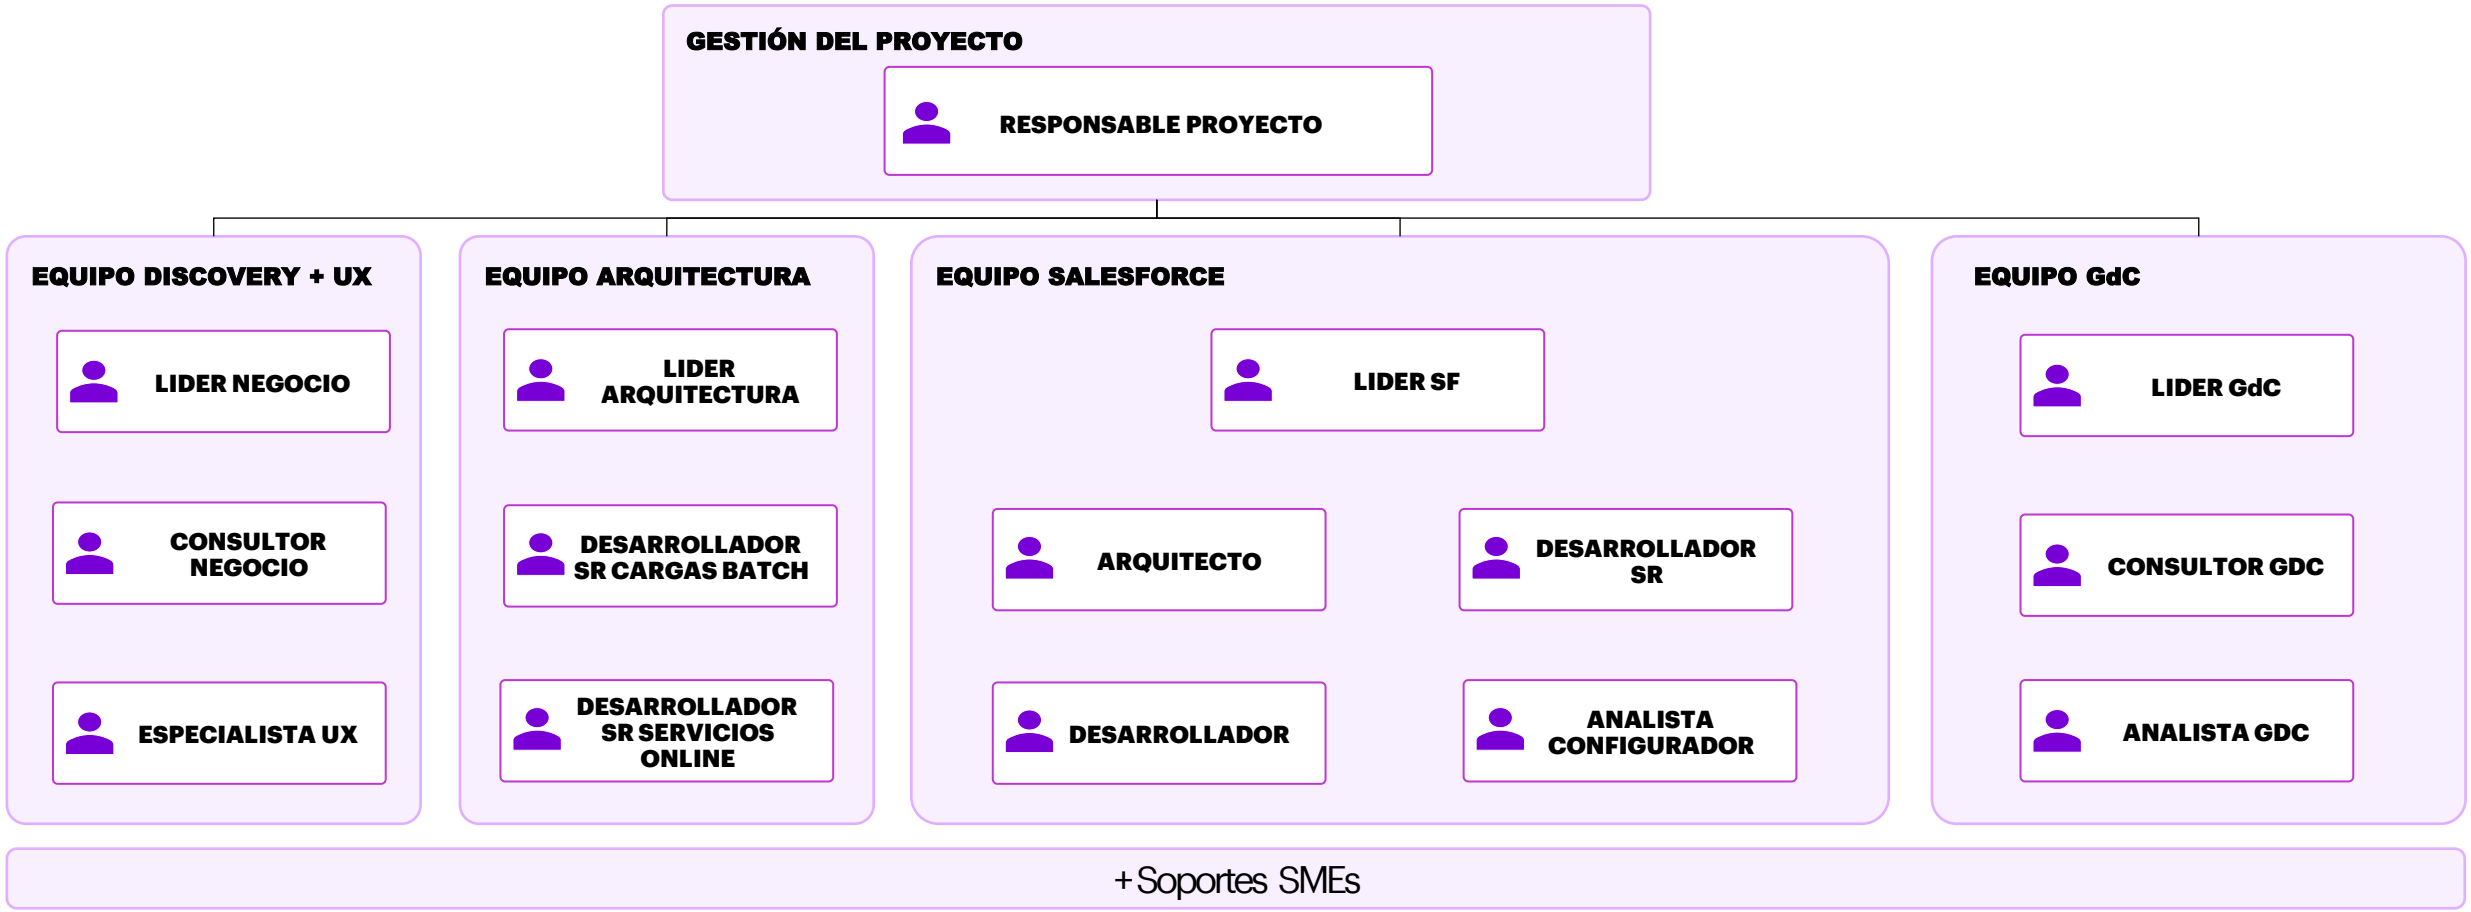

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES – IMPLEMENTACIÓN + MANTENIMIENTO EN CURSO


A continuación, se detalla el equipo propuesto a partir de la primera puesta en PROD:

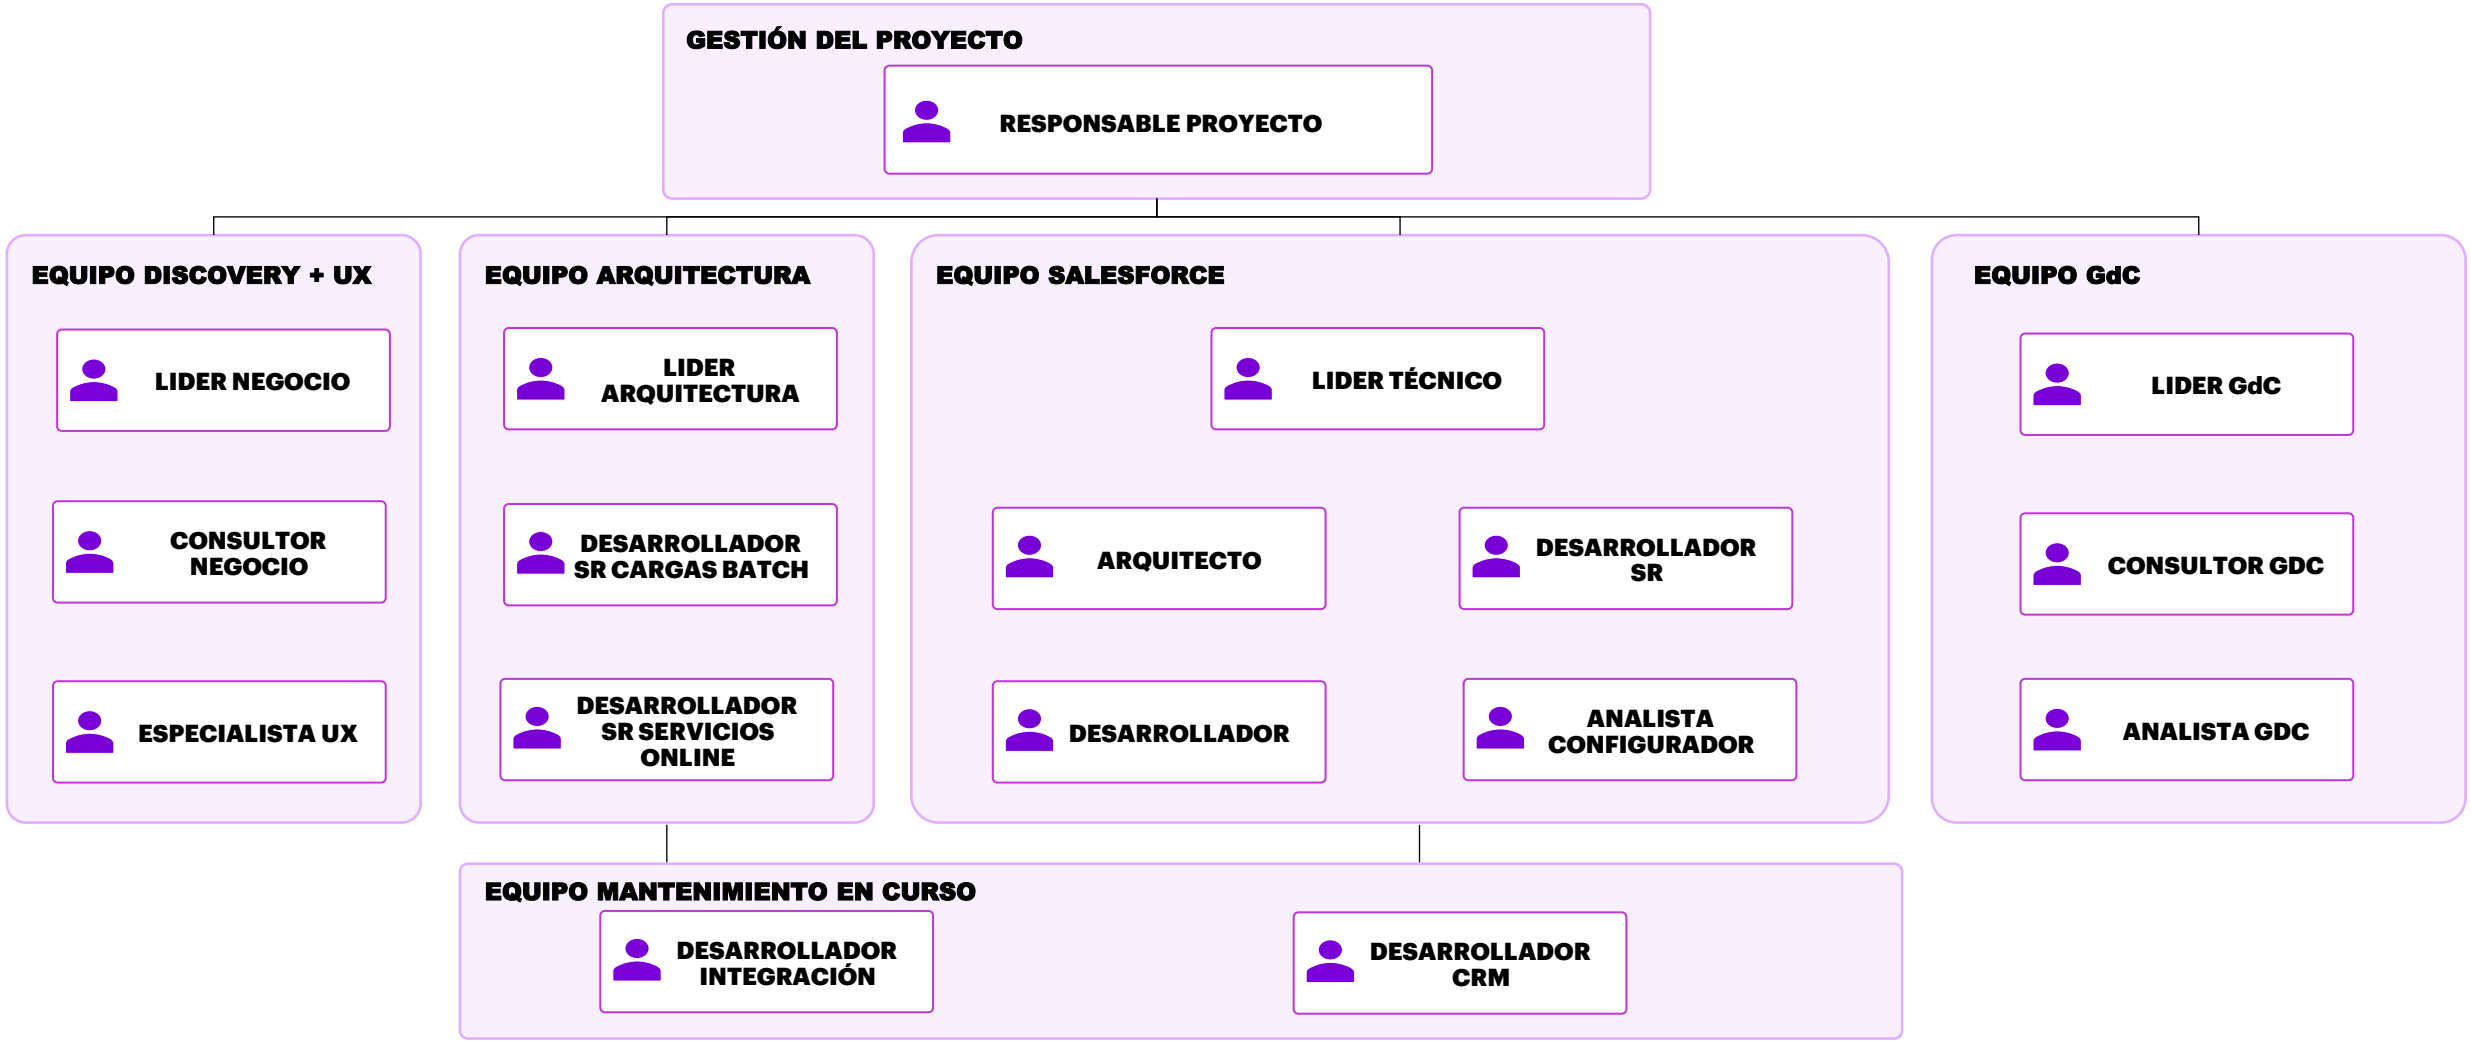

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES – MANTENIMIENTO EXTENDIDO

A continuación, se detalla el equipo propuesto para los 12 meses de mantenimiento extendido:

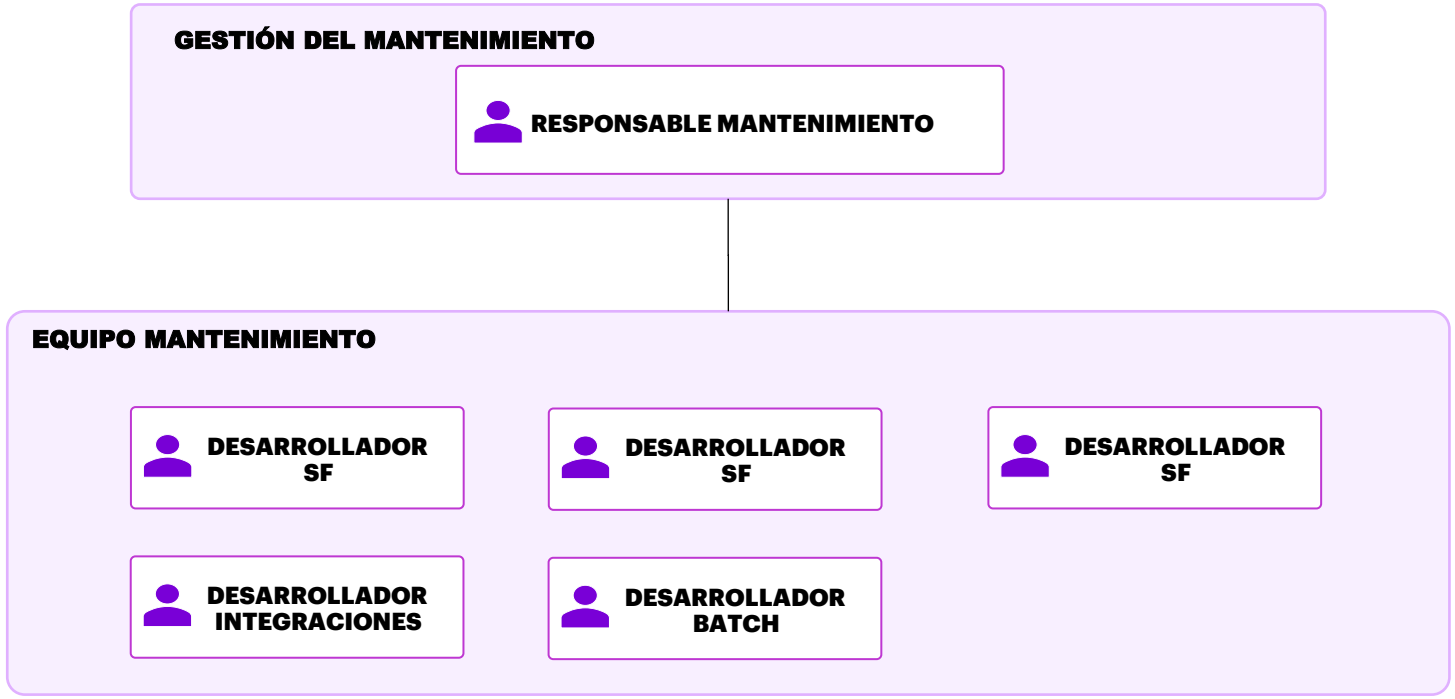

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Responsable

Perfil	Descripción
Responsable del proyecto	• Definir governance del proyecto y modelo de reporting • Coordinar sesiones con LDA • Validar alcance funcional vs lo acordado inicialmente • Aprobar backlog funcional previo a implementación • Gestionar riesgos • Planificación de releases según calendario • Gestión del presupuesto y recursos • Apoyo a LDA de dependencias externas (core asegurador) • Comité de seguimiento con LDA

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Línea Negocio

Perfil	Descripción
Responsable línea de Negocio	• Definir la metodología de trabajo con Negocio • Coordinar sesiones con LDA • Validar alcance funcional vs lo acordado inicialmente • Revisar que se dispone del backlog funcional previo a implementación • Gestionar riesgos en la definición y UX
Consultor de Seguros	• Análisis detallado de la documentación LDA • Conducción de workshops para la definición funcional • Identificación de procesos AS-IS y definición TO-BE • Traducción de requisitos en: Historias de usuario, Criterios de aceptación claros y medibles • Priorización inicial del backlog junto a LDA • Identificación de gaps vs capacidades estándar del CRM • Acompañamiento al usuario para la realización de las pruebas de UAT • Definición de los casos de prueba e2e • Generar la documentación (entregables) funcionales de la línea de Negocio
Especialista UX	• Diseño de las pantallas de visualizacion • Diseño de wireframes y prototipos navegables con la herramienta facilitada por • Test de experiencia con usuarios clave de LDA • Revisión con Negocio en todo lo relacionado con Usabilidad de la herramienta • Definición de guidelines UX para la línea • Generar la documentación (entregables) de UX de la línea de Negocio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Línea implem.

Perfil	Descripción
Responsable de Salesforce	• Traducción técnica de historias de usuario • Elabora el Diseño técnico • Supervisión de desarrolladores • Revisión de código • Gestión de backlog técnico y replanificación ante bloqueos • Coordinación con arquitectura los desarrollos y las pruebas integradas • Soporte a pruebas durante las UATs
Arquitecto/RM	• Revisión de código • Alineamiento a las Best practices de Desarrollo • Despliegues a entornos previos a PROD
Desarrolladores SF	• Configuración de objetos, flujos y reglas • Desarrollo de automatizaciones • Implementación de funcionalidades • Construcción de pantallas según UX validada • Realización de pruebas unitarias en entornos de desarrollo • Documentación técnica
Analista configurador	• Parametrización funcional de Salesforce (Confuguración) • Configuración de permisos y perfiles • Configuración de procesos estándar • Pruebas funcionales en entornos de desarrollo

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Línea arquitectura

Perfil	Descripción
Líder de arquitectura	• Definición del modelo de integración híbrido (Event-Driven y Request/Reply). • Selección y justificación del patrón de integración aplicable a cada entidad y flujo operativo. • Diseño del modelo de seguridad, incluyendo: • Definición del modelo de resiliencia (reintentos, Dead Letter Queue, idempotencia). • Diseño del modelo de observabilidad (ELK, Dynatrace, trazabilidad end-to-end mediante correlation ID). • Definición de la estrategia de reconciliación y control de consistencia. • Validación técnica de la estrategia de migración y cargas masivas. • Coordinación técnica con los equipos Core, CRM y Seguridad.
Desarrollador Batch	• Diseño técnico de procesos ETL o utilización de Salesforce Bulk API para cargas masivas. • Implementación de procesos de carga mediante operaciones de insert, update o upsert, utilizando External IDs para promover idempotencia. • Desarrollo de mecanismos de gestión de errores por lote y reproceso de registros fallidos. • Optimización del rendimiento en escenarios de alto volumen. • Implementación técnica de procesos de reconciliación periódica, incluyendo comparadores de entidades y reporting de divergencias. • Soporte a pruebas de integración masiva
Desarrollador online	• Desarrollo y publicación de APIs REST a través de API Manager. • Implementación de orquestaciones y transformaciones en MuleSoft. • Desarrollo de consumidores y productores Kafka. • Transformación de eventos canónicos hacia el modelo de datos del CRM. • Implementación de mecanismos de autenticación y autorización en cada capa de integración. • Desarrollo de mecanismos de resiliencia (reintentos, DLQ, idempotencia). • Implementación de logging técnico, auditoría y trazabilidad end-to-end. • Soporte a pruebas de integración en tiempo real.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – GdC

Perfil	Descripción
Manager	• Define y valida la estrategia global de Gestión del Cambio y Adopción. • Lidera la planificación, priorización y seguimiento de los entregables de GdC. • Actúa como interlocutor principal con el cliente en temas de adopción, estabilización y evolución post Go-Live. • Supervisa riesgos de adopción y define acciones correctoras. • Promueve la calidad, coherencia y consistencia de todos los entregables de Gestión del Cambio. • Coordina la alineación con otras líneas (Negocio, Tecnología, CRM). • Aprueba y valida Plan y enfoque de Train the Trainers, la estrategia de canales de acompañamiento, el enfoque del Agente de IA para adopción, los informes de estabilización, métricas y reporte, el documento final de transferencia y hace recomendaciones de mejora continua.
Consultor	• Diseña y ejecuta el plan de Gestión del Cambio por oleadas y releases. • Lidera la definición y ejecución de: (Formación por rol, nuevas formas de trabajar y acompañamiento post Go-Live). • Coordina la preparación de materiales y sesiones con los distintos colectivos. • Analiza feedback de usuarios y propone acciones de mejora de adopción. • Promueve la correcta integración de la Gestión del Cambio en la operativa diaria del CRM. • Coordina y guía al analista en la producción de entregables.
Analista	• Elabora y mantiene los materiales de formación, soporte y comunicación. • Apoya la ejecución de sesiones formativas y TTT. • Recoge, estructura y analiza feedback de usuarios. Consolida métricas de adopción y datos de seguimiento. • Garantiza la trazabilidad entre actividades, entregables y releases. • Da soporte continuo al consultor y al manager en el seguimiento operativo.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Mantenimiento

Perfil	Descripción
Responsable del mantenimiento	• Perfil responsable de la coordinación global del servicio y punto de contacto principal con LDA • Supervisión y coordinación del equipo de mantenimiento. • Seguimiento de incidencias y cumplimiento de niveles de servicio (SLA), en su caso. • Validación de la correcta priorización conforme al modelo acordado. • Gestión de la planificación operativa y asignación de recursos. • Interlocución con LDA para el seguimiento del servicio. • Escalado interno de incidencias críticas cuando proceda. • Reporting periódico del estado del servicio.
Desarrolladores Salesforce	• Perfil técnico especializado en la plataforma Salesforce responsable del análisis y resolución de incidencias dentro del alcance del servicio. • Análisis técnico de incidencias correctivas. • Resolución de defectos en desarrollos realizados en el marco del proyecto. • Ajustes de configuración y código dentro del alcance contratado. • Soporte técnico en despliegues correctivos. • Documentación técnica asociada a las intervenciones realizadas. • Identificación de causas raíz en incidencias imputables al desarrollo.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles del proyecto – Mantenimiento

Perfil	Descripción
Desarrolladores integraciones	• Perfil técnico especializado en integraciones responsable del análisis y corrección de incidencias relacionadas con desarrollos de integración incluidos en el alcance. • Análisis y resolución de incidencias en interfaces desarrolladas en el proyecto. • Validación de logs y trazabilidad técnica de integraciones. • Corrección de defectos en componentes de integración desarrollados por Accenture. • Coordinación técnica con terceros cuando la incidencia afecte a sistemas externos (sin asumir responsabilidad sobre dichos sistemas). • Documentación técnica de las actuaciones realizadas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Pre-Work y Kick-Off		
Incorporar las actividades de todas las partes interesadas en un plan general de ejecución siguiendo el calendario de esta propuesta	A	R
Informar a todas las partes interesadas sobre el calendario de entrega y el alcance (kick-off)	I	R, A
Obtención, seguimiento sobre las entregas del alcance de las terceras partes de acuerdo con los plazos de la propuesta	R, A	I
Preparación de los entornos (Dev, INT, UAT, PROD)	R, A	I
Negocio y UX		
Planificación, programación y ejecución de workshops para el alcance		R, A
Priorización de requerimientos con Negocio	R, A	C
Creación de un diseño funcional y técnico para el alcance		R, A
Prototipado UX de la solución	A, C	R
Mejoras del alcance transferidas a las solicitudes de cambio	A, R	A,R (*)

* Ambas partes podrás proponer cambios de alcance y deberán acordar el contenido de éstas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Implementación		
Completar el ciclo de desarrollo y pruebas (SIT(INT), Regression (UAT)) sobre la base del diseño funcional y técnico aprobado para el alcance de los servicios contratados con Accenture		R, A
Ejecución de las pruebas en sistemas terceros de LDA que afecten a la solución implementada por Accenture	R	I
Creación de matriz de pruebas de UAT	R	C
Preparación de set de datos para la UAT para la solución implementada por Accenture	I	R
Ofuscación o anonimización de datos para el testing	R	I
Realización de las pruebas UAT y ok al entorno de UAT	R,A	I
Definición de entidades y datos a migrar	R,A	C
Diseño técnico de migración	A,C	R
Extracción de datos del sistema origen	R,A	C,I
Ejecución de la migración	C,A	R
Validación funcional de datos migrados	R	I
Despliegue		
Despliegue desde Dev hasta UAT de la funcionalidad desarrollada por Accenture	I	R, A
Despliegue de UAT a Prod de la funcionalidad desarrollada por Accenture	A,R	C
Desarrollo del ciclo de pruebas Smoke Test y Regresión	A,T	I
Actualización de versión en los entornos de Salesforce/actualizaciones de versión	R,A	I
Creación de usuarios en entonos no productivos	A	R
Creación de usuarios en entonos productivos	R,A	C,I

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Gestión del cambio y adopción		
Entrega documentación AS-IS del CRM actual y TO-BE de sistemática comercial. Selección de embajadores. Definición del modelo operativo	R	I
Entrega documento de análisis de impactos	C	R
Mapa de stakeholders y sponsors y Roadmap de adopción	I	R
Planificación y definición estrategia de comunicación	A	R
Comunicación a externos	R	I
Definición de los usuarios a formar (modelo formación a formadores) y su disponibilidad	R,A	I
Calendarización de los workshops de formación	A	R
Ejecución de los workshops de formación	I	R,A
Acompañamiento en la fase de adopción de la herramienta – Informe de métricas y reporte de adopción	A	R
Metodología y Gobierno		
Gestión de riesgos	A	R
Gestión de dependencias	R	I
Seguimiento de hitos y entregables		R,A
Gestión del plan maestro y reporting ejecutivo	A	R
Gestión de decisiones y escalados	A	R


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

6. Gestión del mantenimiento

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live

A partir de la subida a Producción de la **Fase I**, se activará un **equipo adicional de Mantenimiento y Evolución** que acompañará el resto del programa hasta su finalización. Este equipo operará en paralelo a las siguientes fases de implementación. Al finalizar la implementación comenzará el mantenimiento extendido de 12 meses como se indicaba en la planificación

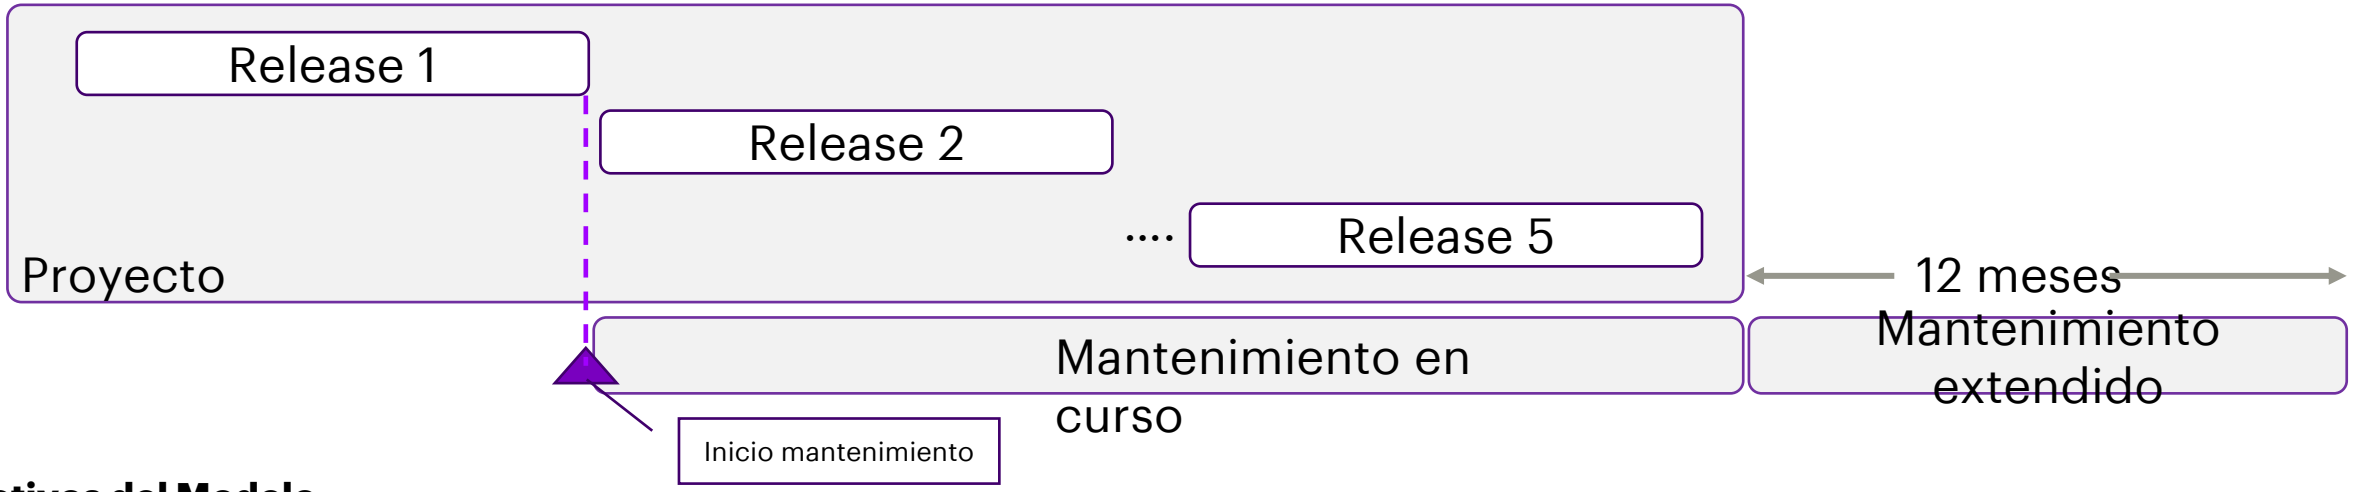

Objetivos del Modelo

- ✓ Promover la estabilidad tras cada Go-Live
- ✓ Gestionar incidencias funcionales y técnicas
- ✓ Promover la continuidad operativa del negocio
- ✓ Incorporar pequeños evolutivos de bajo impacto
- ✓ Preparar el sistema para siguientes releases

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live. Traspaso

A partir del despliegue de la primera fase se propone hacer el traspaso al equipo de mantenimiento o bien al equipo de LDA en caso de que no se contrate el mantenimiento

Cada una de las **reuniones tendrá una duración aproximada de 2 horas** donde participarán todas las áreas implicadas en referencia al módulo o módulos a tratar durante la sesión.

Se proponen las siguientes **reuniones para la cobertura del traspaso** de todas las funcionalidades impactadas:

- Sesión para explicar la documentación generada para el proyecto
- Sesión de funcionalidad implementada (Historias de usuario y diseños visuales)
- Sesión de integraciones y arquitectura global (pruebas de carga de datos,...)
- Sesión de Gestión del cambio para explicar documentación y procedimientos implantados
- Sesión de administración de la herramienta e incidencias en curso
- Una sesión adicional de aclaración de dudas

Se propone realizar una transferencia de servicio las dos últimas semanas previas a cada despliegue, la transferencia del servicio donde debe asegurar el traspaso efectivo del conocimiento al equipo de mantenimiento

PLANIFICACIÓN



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Documentación generada		Funcionalidad		aplicación
Arquitectura	GdC		Administración e incidencias en curso	Aclaración de dudas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El alcance para la solución CRM de Salesforce de LDA se basa en un modelo de servicio que contempla las siguientes tareas de:

- **Correctivos**
- **Soporte de Mantenimiento**
- **Evolutivos y Tareas**
- **Release Management a entornos previos a Producción**

El servicio a LDA dará soporte a:

- **Plataforma Salesforce: FSC**
- **Experience cloud**
- **Agentforce**

Integraciones:

- **Mulesoft**

1 CORRECTIVO

- Resolución de incidencias de la solución Salesforce de LDA
- Análisis, de forma coordinada con el resto de los equipos, de la solución más adecuada según la tipología de la incidencia y su afectación al negocio.

2 SOPORTE

- Monitorización diaria del sistema, en conjunción con los arquitectos de Salesforce del equipo.
- Revisión de los indicadores en el proyecto para el mantenimiento. (Data Storage, Objeto Histórico, Audit Log, Revisión de Licencias de Salesforce Disponibles)
- Seguimiento de Incidencias y Tareas.
- Confección de la documentación técnica necesaria y almacenamiento en los repositorios correspondientes de las herramientas
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados

3 EVOLUTIVOS

- Implementar nuevas iniciativas o funcionalidades o adaptación/modificación de las ya existentes para la **evolución de la solución de LDA** conforme a los requerimientos acordados con negocio.

- Ejecución de pequeños evolutivos y tareas de hasta 40 horas el ciclo completo de ejecución (desde el desarrollo hasta la subida a PROD).

4 RELEASE MANAGEMENT

- Responsable de promociones entre entornos previos a PROD.
- Mantenimiento de ramas.
- Realización de informes de calidad del código y deuda técnica.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tareas y entregables



Objetivo

- Resolución de incidencias detectadas en producción de la plataforma Salesforce, incluyendo errores de código o configuraciones de la aplicación.
- El servicio cubrirá las actividades para solventar la incidencia y restaurar tan pronto como sea posible la normalidad del servicio y operación, desde el análisis inicial y diagnostico hasta la resolución en los sistemas dentro del alcance que estén impactados.
- Soporte a los procesos de la plataforma



Tareas Accenture

- Análisis y resolución de las incidencias detectadas en el funcionamiento del CRM Salesforce, con sus evidencias asociadas
- Escalado de las incidencias producidas en los procesos de integración con terceros sistemas al grupo responsable.
- Actualización estado incidencia en ServiceNow en tiempo y forma.



Tareas LDA

- Registro de tickets con detalles del incidente en la Servicenow aportando los datos de prueba y pasos necesarios para reproducir la incidencia y las condiciones en las que se ha producido.
- Tipificación y priorización de tickets.
- Nivel 1 de servicio de mantenimiento.
- Pruebas de usuario.
- Soporte al escalado de incidencias críticas.
- Actualización estado incidencia en Servicenow en tiempo y forma.



Entregables

- Actualización de la documentación técnica de la aplicación.
- Documentación de la resolución de incidencia en la Servicenow tanto de soluciones como de workaround lo que contribuirá a tener un repositorio de conocimiento que ayude a mejorar la resolución de futuras incidencias.
- Actualización en repositorio de los elementos modificados.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tipificación de incidencias

La tipificación de incidencias que proponemos es la detallada a continuación:

Tipología	Prioridad	Descripción
Incidencias Correctivo	1.- Crítica	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Impide totalmente la ejecución de un Proceso Crítico de Negocio* definido en el Documento de Alcance. ➢ Afecta a más del 50% de los usuarios activos del sistema o a la totalidad de un colectivo operativo esencial. ➢ No existe workaround técnico ni operativo razonable. ➢ Genera al menos uno de los siguientes impactos: • Incumplimiento contractual frente a clientes finales. • Incumplimiento regulatorio o riesgo sancionador. • Imposibilidad de facturación o ejecución económica de operaciones. • Caída total del servicio.
	2.- Alta	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Afecta de forma severa a un Proceso Crítico de Negocio o a más del 25% de usuarios activos. ➢ Permite la continuidad operativa mediante workaround temporal. ➢ No implica caída total del sistema. ➢ Puede generar impacto financiero o operativo relevante, pero no paraliza completamente la actividad.
	3.- Media	➢ No impide la ejecución de Procesos Críticos de Negocio. ➢ Afecta a menos del 25% de los usuarios activos. ➢ Existe workaround razonable. ➢ No genera incumplimiento contractual ni regulatorio. ➢ No impide la facturación ni la ejecución económica de operaciones.
	4.- Baja	➢ No impacta en procesos de negocio. ➢ No afecta a datos transaccionales. ➢ No genera impacto financiero ni regulatorio. ➢ Se limita a aspectos visuals o parametrizaciones menores

* Las partes deberán acordar los procesos críticos de negocio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: ANSs de incidencias

Los ANSs que proponemos a aplicar durante el mantenimiento son los siguientes:

Tipología	Prioridad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias Correctivo	1. Crítica	30 min	5 horas labor.	Mensual	≥90%
	2. Alta	30 min	8 horas labor.	Mensual	>90%
	3. Media	6 horas	3 días labor.	Mensual	>90%
	4. Baja	12 horas	10 días labor.	Mensual	>90%

Definición	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias repetitivas	Mensual	≤5%
Tickets reabiertos tres o más veces	Mensual	≤2% (12 meses)
Retrasos en la entrega de AD	Puntual	0 semanas

Consideraciones:

- Los tiempos deben medirse con la herramienta para la gestión de incidencias (ServiceNow) proporcionada por LDA, y estos deben computarse conforme las ventanas de servicio descritas en la presente propuesta. Cuando un ticket está bajo la responsabilidad de algún equipo NO Accenture, los tiempos no se considerarán.
- Si como consecuencia de un despliegue, se produce un aumento de las incidencias por problemas en la calidad de los desarrollos no realizados por Accenture, el no cumplimiento de los ANSs no será de aplicación para los desarrollos que lo provocan, asumiendo que dichas desviaciones serán cubiertas por la garantía de las empresas responsables de realizar dichos desarrollos
- La asignación de prioridades se realizará por parte de Accenture conforme un patrón normal a acordar de buena fe.
- Solo se podrán computar ANS si se recibe una muestra de valores que permita hacer el cálculo de forma representativa. Accenture y LDA acordarán de buena fe los vectores de determinación de la naturaleza representativa de cada muestra.
- Se contempla la posibilidad de revisar y modificar los ANSs de mutuo acuerdo, cuando las circunstancias lo aconsejen

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Soporte: Tareas y entregables

Objetivo

- Seguir realizando acciones de carácter perfectivo y gestión de tareas administrativas que surjan de forma proactiva desde el propio Servicio, o bien a demanda a través de peticiones de los usuarios.
- Comprobaciones manuales y desarrollo de procesos enfocados a mejorar la operación y disponibilidad de Salesforce.

Tareas Accenture

- Chequeo periódico del estado de la aplicación para la identificación proactiva de posibles incidencias o degradación del sistema.
- Revisión de movimientos diarios en las integraciones con terceros, relanzamiento de los procesos automáticos en casos de ser necesario o creación de tickets de soporte en caso de errores/incidentes.
- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en Servicenow
- Actualización estado de las solicitudes de servicio en ServiceNow en tiempo y forma.
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados, que permitan potenciar la operación de la aplicación y la reducción progresiva de incidencias.
- Monitorización de volumetrías y rendimiento.

Tareas LDA

- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en Servicenow.
- Tipificación y priorización de la solicitud de servicio en base al criterio especificado mas adelante.

Entregables

- Informes de posibles riesgos y problemas junto con propuestas de mejora.
- Documentación de las tareas de soporte realizadas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

LDA

Negocio

Requerimientos
- Identificación evolutivos

Product Owner

Seguimiento y gestión del servicio de evolutivos
- Toma de requisitos
- Anticipación de necesidad de capacidad
- Seguimiento y gestión del backlog
- Priorización y confección de las historias de usuario
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación de evolutivos
- Información a usuarios

ServiceNow

SERVICIO ACCENTURE

Project Manager

Gestión del servicio
- Gestión y planificación de la capacidad del equipo

Equipo Evolutivos

Desarrollo y pruebas de nuevos requerimientos
- Realización de estimaciones en base a requerimientos recibidos.
- Desarrollo y pruebas acorde al backlog definido.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.
- Soporte a la validación de los desarrollos e implementación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

Objetivo

- Evolución con pequeños evolutivos de la plataforma Salesforce conforme a las necesidades de negocio de LDA .

Tareas Accenture

- Coordinación del equipo e iniciativas a desarrollar.
- Estimación y planificación del desarrollo.
- Análisis funcional y técnico.
- Realización de estimaciones en base a requerimientos.
- Desarrollo.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de regresión.
- Soporte a pruebas de integración de sistemas.
- Resolución de defectos detectados en las pruebas.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.

Tareas LDA

- Aprobación estimación y planificación del desarrollo.
- Comunicación con negocio y otros equipos / sistemas para la toma de requisitos.
- Definición detallada de las historias de usuario describiendo el *definition of ready* y *done* (cubriendo según aplique flujo del caso de uso, lógica de negocio, respuestas, pruebas integradas o rendimiento, etc.).
- Gestión del backlog priorizado teniendo en cuenta la planificación y estrategia interna de LDA .
- Participación en los workshops de descripción funcional de las historias de usuario.
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación del entregable del sprint review.
- Pruebas de usuario.

Entregables

- Código fuente en repositorio de cliente.
- Pruebas unitarias creadas/actualizadas.
- Pruebas funcionales creadas/actualizadas.
- Pruebas regresión creadas/actualizadas.
- Documentación técnica correspondiente a cada evolutivo.
- Informe mensual de seguimiento del servicio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Release manager: Tareas y entregables

LDA

Proveedores LDA

Nuevos desarrollos e integraciones
- Creación de petición de despliegue.

Product Owner

Seguimiento y gestión del servicio de evolutivos
- Aprobación de los nuevos desarrollos y evolutivos para su despliegue a los entornos.

Responsable servicio de Mantenimiento

Seguimiento servicio
- Priorización del backlog de despliegues.
- Aprobación de despliegues.

ServiceNow

SERVICIO ACCENTURE

Release Manager

Mantenimiento de entornos
- Refresco y mantenimiento de los entornos sandbox de desarrollo y UAT.
- Realización y validación de despliegues.
- Mantenimiento de ramas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Release manager: Tareas y entregables

Objetivo

- Mantenimiento de entorno.

Tareas Accenture

- Refresco y mantenimiento de los entornos sandbox de desarrollo y UAT.
- Revisión y aprobación de pull requests. La revisión se realizará usando las herramientas proporcionadas por LDA así como una checklist definida junto con LDA.
- Ejecución de validaciones de la subida al entorno.
- Realización de despliegues a los entornos de INTEGRACIÓN, UAT,
- Ejecución de test en los entornos de desplegados para asegurar que la subida ha sido correcta.
- Alineación de entornos, refresco de entornos tras las subidas a producción programadas (correctivos y/o evolutivos) y nuevas releases.

Tareas LDA

- Definición junto con Accenture de checklist de revisión de pull request
- Definición del backlog de despliegues.

Entregables


- Informes de despliegues.
- Actualización del estado de los despliegues en el dashboard de despliegues.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

7. Metodología y Gobierno

METODOLOGÍA

Se propone la ejecución del Desarrollo mediante un **modelo de desarrollo incremental** basado en las características del modelo que consideramos que mejor aplica a este tipo de proyectos en base al faseado propuesto

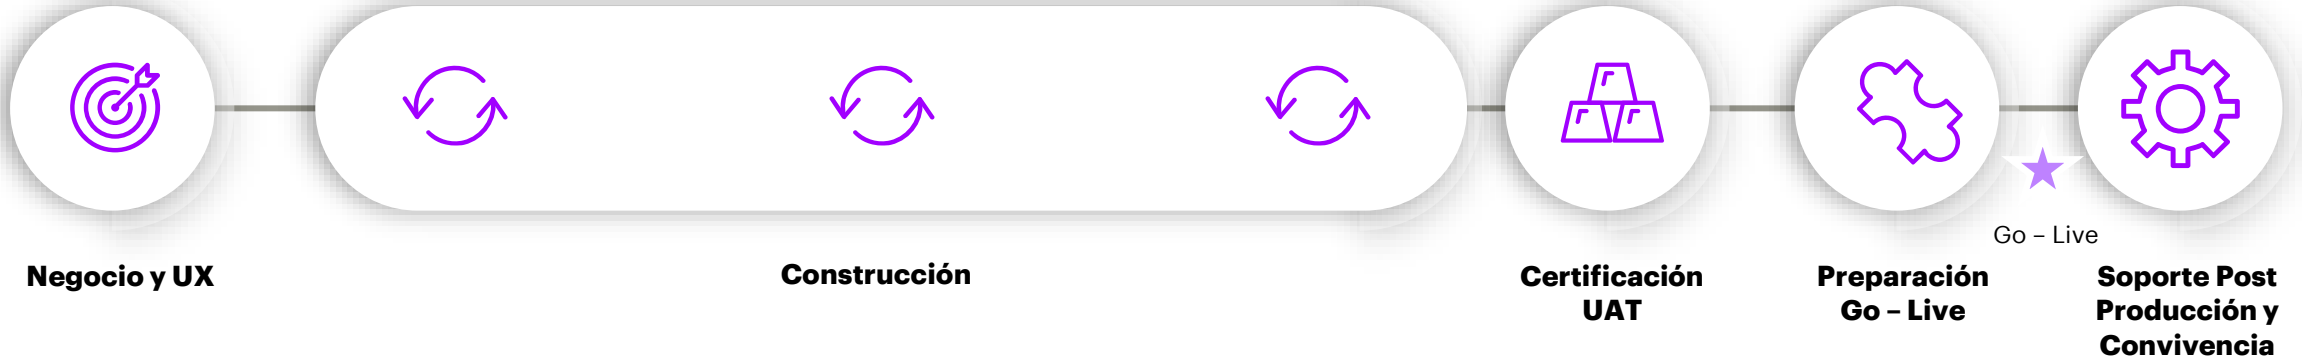


Para ello se propone una metodología basada en los siguientes pasos:

- Confirmar y cerrar el alcance de los trabajos durante las sesiones de refinamiento (revisión y estimación) de la Fase de Negocio y UX
- Ejecutar en un modelo de trabajo orientado a la entrega mediante Sprints
- Certificación previa al despliegue, con una fase inicial de pruebas de producto anterior a las pruebas de usuario
- Preparación del Go – Live y despliegue en base al calendario y periodicidad acordada para desplegar a PROD en MM (Releases)
- Garantía post producción

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Características sprints de Desarrollo: La fase de desarrollo se realizará en base a Sprint por cada Release

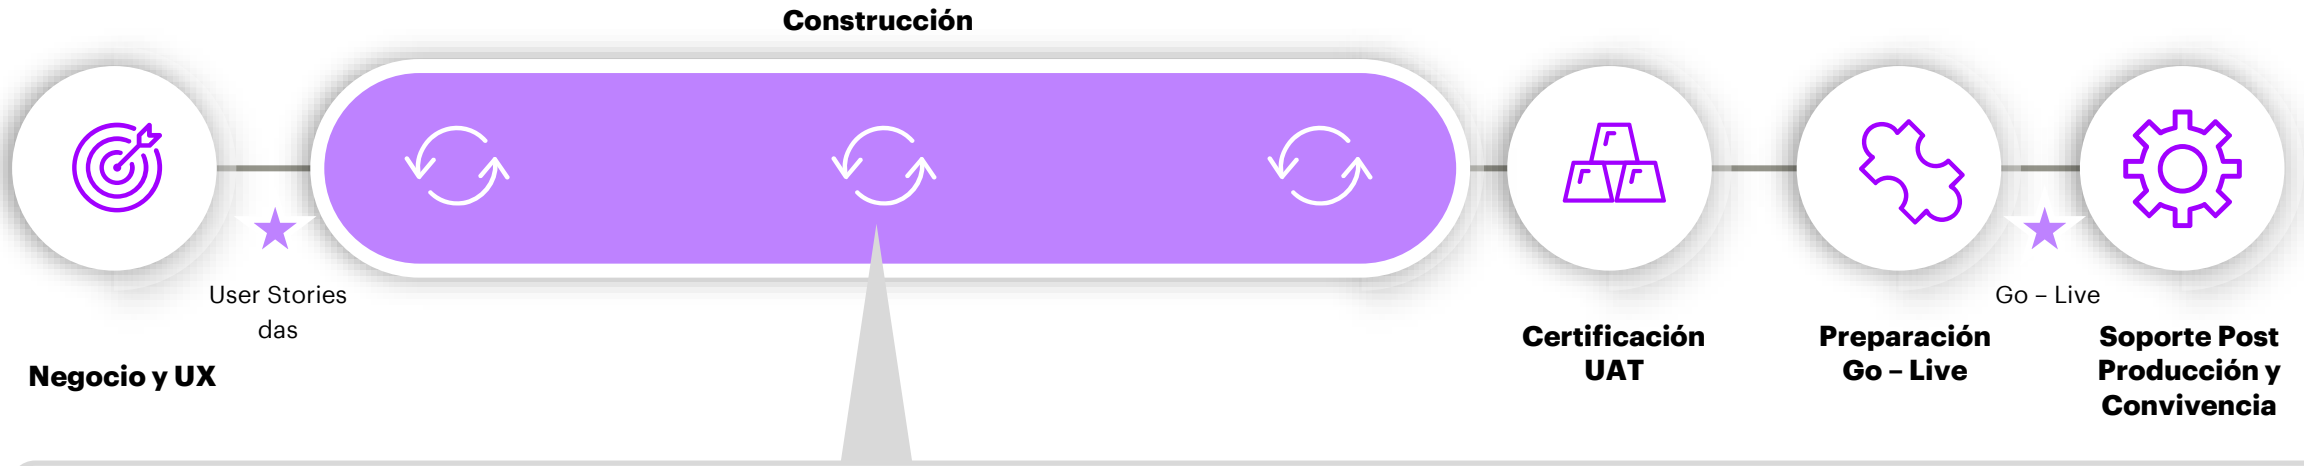

Desarrollo incremental

- Fomentar la colaboración, comunicación y transparencia en todo momento
- Dedicación por parte de los stakeholders (key users) de LDA para resolver las dudas que el equipo pueda tener.
- Respetar la planificación y alcance acordada por todos los equipos en la fase previa
- No descuidar la documentación de cada User Story que vaya a ser necesaria para fases posteriores.

Sesiones de revisión continuas (Sprints)

- La interacción conjunta e intensa permite focalizarse en el valor de negocio y visualizar cualquier posible riesgo o desviación.
- El permitir ir viendo la evolución de la herramienta permite una mejor adaptación para los usuarios finales

Consolidación del producto

- Este enfoque facilitará los sprints de fases posteriores permitiendo desplegar el producto rápidamente en orgs de test, certificación producción.
- Se dispondrá de la solución devOps de LDA permitiendo automatismos (integración continua, tests (unitarios, integrados, regresión), análisis de calidad del código, despliegue de componentes) y gestión colaborativa de los metadatos del producto (datos que componen la configuración de una org).

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

A continuación, se propone la siguiente configuración de entornos:


Entorno	Tipo de Sandbox	Descripción y uso
DEV	Developer	Entorno donde los desarrolladores desarrollan y prueban sus desarrollos y pasan los tests unitarios.
DEV CONSOLIDADO	Developer	*Opcional*. Entorno donde los desarrolladores prueban sus desarrollos y pasan los tests unitarios sin modificaciones de código, siendo este un entorno más estable. Puede no usarse utilizando el entorno de consolidación el de INT
INT	Developer	Entorno de integraciones para para pruebas integradas
UAT	Partial Copy	Entorno para las pruebas funcionales y de aceptación
STG	Full copy	Entorno de staging clon de producción. Será el último paso antes de llegar a producción. Será el entorno donde se probarán los hotfixes.
PRO	Producción	Entorno productivo

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Se propone la siguiente metodología para la gestión de los despliegues. En base al escenario mono-org de LDA. Es por ello por lo que se requiere aplicar una metodología coordinada (líneas de desarrollo y mantenimiento) y que sirva como base para poder escalarlo a LDA

El modelo de trabajo para los despliegues se centralizará en equipo interno de LDA asumirá la función de Release Management de Producto para promover la consistencia y calidad de los despliegues de los distintos proyectos en curso

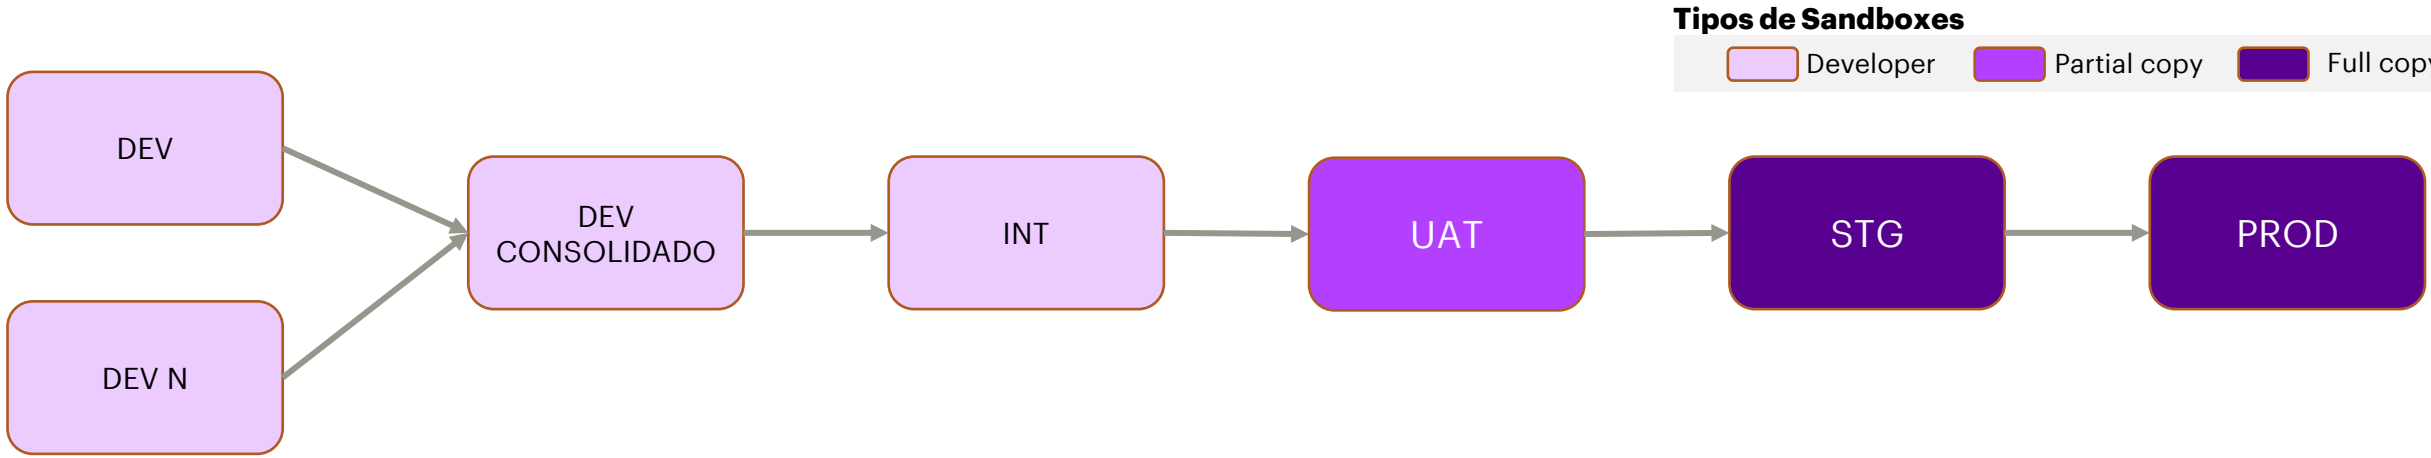

ACCENTURE

Accenture será responsable de realizar las subidas desde los entornos de Desarrollo hasta el entorno de UATs

COE de LDA

A partir de los entornos de consolidación por proyecto, será el Release manager de producto de MM el responsable de realizar las subidas a los siguientes entornos.

Se asume que actualmente solo existirá este proyecto en Salesforce. Si a futuro se incluyesen nuevos proyectos y proveedores en paralelo habría que revisar la metodología de despliegue para que los despliegues del CoE de LDA fuesen desde entornos comunes desde INT en adelante

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Se propone la siguiente metodología para la ejecución de pruebas:

Pruebas	Fase	Enfoque	Objetivo	Datos usados en las pruebas	Liderado por	Núm. ciclos
Pruebas unitarias	Construcción	Probar la funcionalidad de los componentes	Confirmar el cumplimiento de los componentes mediante la funcionalidad definida	Datos demo	Accenture	N/A se valida por componente
Pruebas de integración de la solución (SIT)	Construcción	Probar extensiones, interfaces, flujos de trabajo personalizados e informes personalizados	Confirmar el cumplimiento de los requisitos de GAPs dentro del alcance mediante la solución personalizada	Datos de ejemplo del cliente	Accenture	1 Ciclo de 1 semana por fase
Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Pruebas de usuario	Pruebas de la solución con roles de seguridad de usuario asignados	Confirmar que se cumplen los requisitos aprobados	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 Ciclo de 2 semanas por fase
Test de migración de datos (DMT)	Construcción	Probar herramientas y procesos de migración de datos	Validaciones de datos numéricas a alto nivel, orientadas a comprobar la coherencia global de la migración (volúmenes, totales y ratios relevantes) adicionalmente una cata aleatoria de registros con el objetivo de verificar la correcta migración de datos representativos.	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 Ciclo
Regresion Test	N/A	Se realizará una prueba de regresión después de cada despliegue de una nueva fase, es decir Fase 2 y Fase 3	Confirmar el impacto de la actualización del sistema en los requisitos “Probados”.	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 por fase de 1 semana

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Accenture proporcionará un modelo de gobierno integrado con el objetivo de promover una gestión eficaz de las relaciones y una presentación de informes transparente centrada en aportar una profunda visibilidad en la ejecución del proyecto.

Nivel Estratégico

Nivel de gestión ejecutiva que permite mantener y desarrollar la colaboración, resolver problemas importantes, establecer la dirección y aprobar cambios estratégicos, lo cual concierne a la función del gobierno y el liderazgo. La participación consistirá en niveles elevados de sponsorship ejecutivo pertinente. Para esta reunión se contará con la colaboración y soporte de la Oficina de Transformación de TI de LDA

Nivel Táctico

Nivel de relación clave que se caracteriza por frecuentes reuniones de revisión para la confirmación de progresos, de acuerdo con los objetivos globales del acuerdo. Este equipo también se centra en la gestión de escalado, la gestión de la demanda (disponibilidad de recursos) y proporciona el marco para la comunicación, sin interferencias.
Los interlocutores serán el coordinador del proyecto del proveedor y el responsable de Oficina de Transformación de LDA

Nivel Operativo


Nivel de trabajo diario orientado a la prestación de un servicio y a la respuesta de peticiones, problemas y consultas, conforme al acuerdo/prestación establecida. Las funciones de prestación las gestiona el equipo formado en el nivel operativo. Este equipo se centra en las actividades operativas diarias y se esfuerza por mejorar las métricas.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Procesos del modelo de gobierno

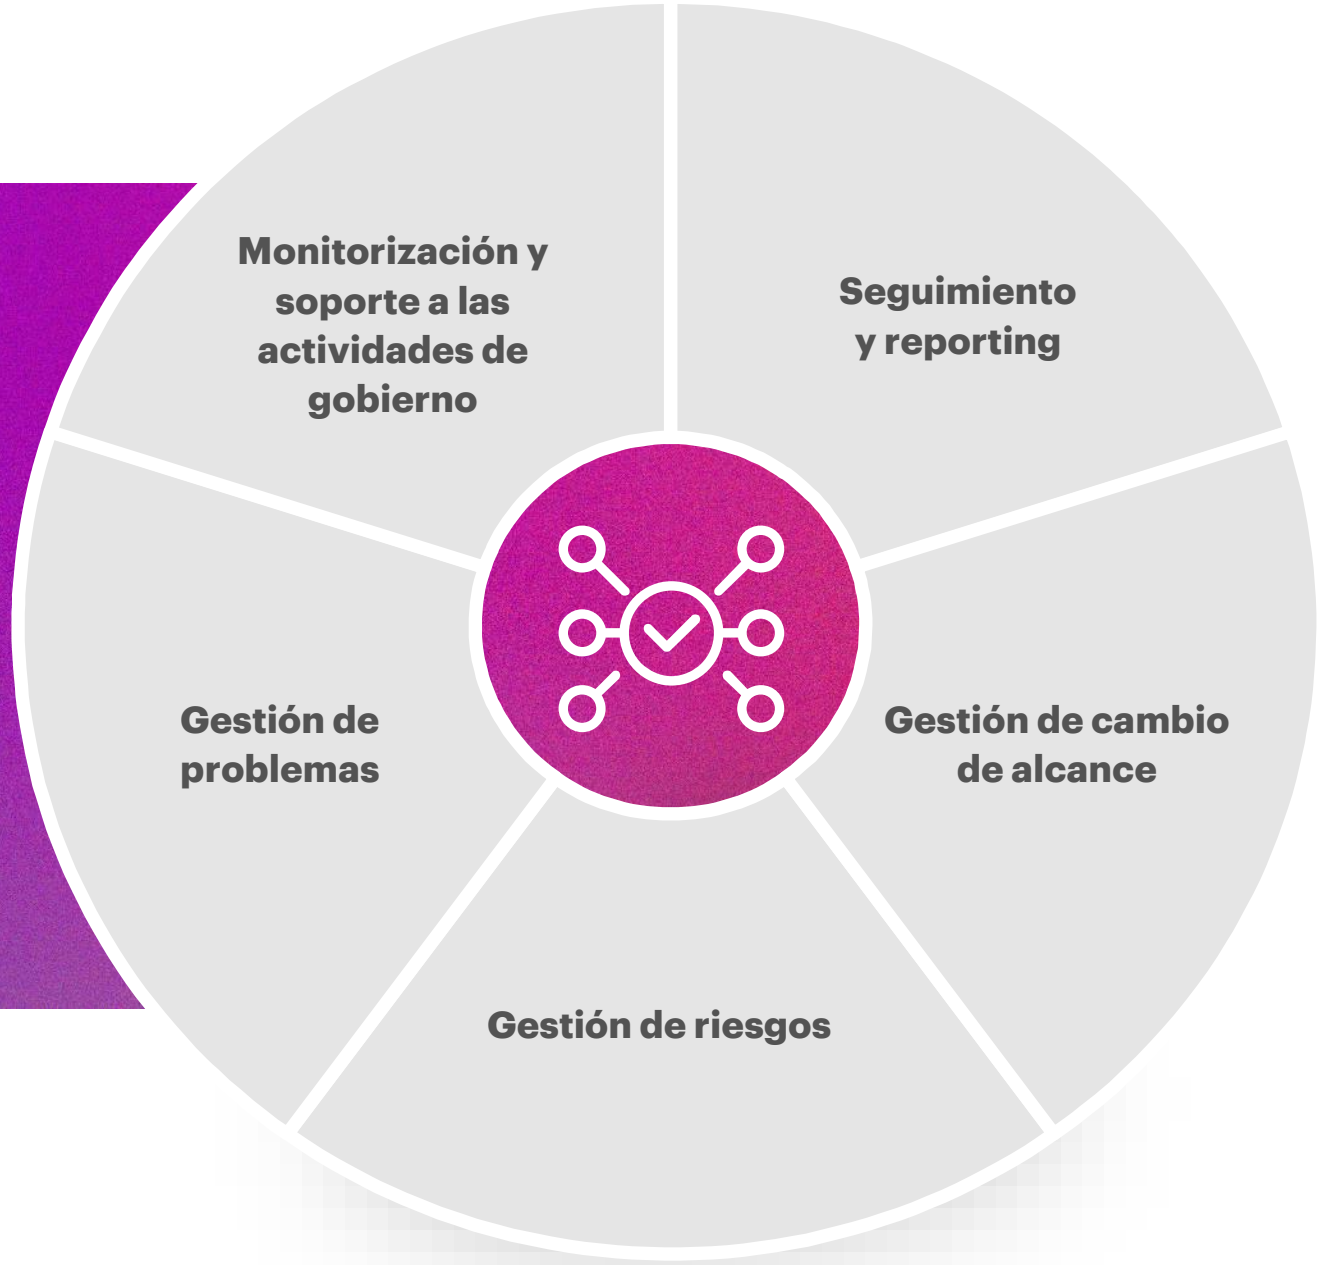

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



La función de monitorización y soporte controlará y proporcionará soporte a las actividades de gobierno.


- Mantener los calendarios de las reuniones.
- Optimizar y programar las reuniones.
- Garantizar el facilitador experto para facilitar las reuniones del equipo de gobierno.
- Revisar el orden del día, asegurarse de que se presenta el tema adecuado y que el orden del día dará lugar a la toma de decisiones y los siguientes pasos concretos.
- Revisar los materiales para garantizar que los participantes cuentan con la cantidad y el nivel de información apropiado de soporte con antelación.
- Controlar el nivel de participación de los miembros del equipo de gobierno.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



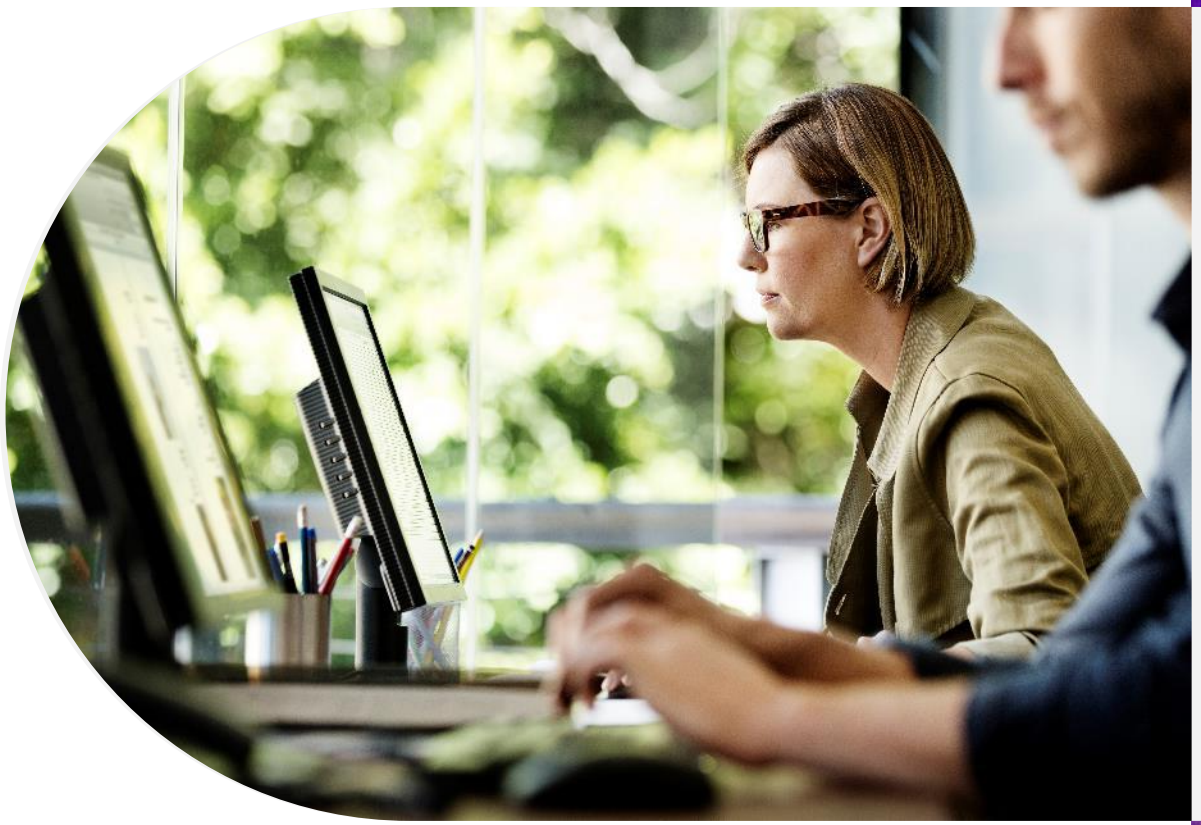

La dirección del proyecto celebrará una reunión de situación cada cuatro semanas que convocará a los líderes de los equipos del proyecto y revisarán el progreso basándose en los informes de situación del equipo. Al final de la reunión la dirección del proyecto entregará un informe de progreso basado en un balance scorecard para los miembros del comité de dirección del proyecto.

- Aprobación de los resultados del proyecto y de las propuestas del Comité de Seguimiento.
- Toma de decisiones estratégicas. Análisis de la progresión de los trabajos.
- Gestión de problemas / incidencias / retrasos.
- Seguimiento de indicadores de servicio.
- Gestión del cambio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



Informe quincenal del proyecto

Los gestores del proyecto se reunirán quincenalmente y abordarán los principales problemas del proyecto, tomando las decisiones que consideren, así como decidiendo que es necesario escalar al nivel de gestión superior. Se hará seguimiento y coordinación de la implantación y despliegue cuando llegue el momento , así como de la planificación (análisis de desviaciones).

- Seguimiento y coordinación de la implantación y despliegue.
- Seguimiento de planificación, análisis de desviaciones.
- Resolución de problemas operativos.
- Escalado de información al Comité Ejecutivo.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



Informe quincenal del proyecto

Los gestores del proyecto se reunirán quincenalmente y abordarán los principales problemas del proyecto, tomando las decisiones que consideren, así como decidiendo que es necesario escalar al nivel de gestión superior. Se hará seguimiento y coordinación de la implantación y despliegue cuando llegue el momento , así como de la planificación (análisis de desviaciones).

- Seguimiento y coordinación de la implantación y despliegue.
- Seguimiento de planificación, análisis de desviaciones.
- Resolución de problemas operativos.
- Escalado de información al Comité Ejecutivo.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO





Documentación ad-hoc para la documentación de los problemas

Los equipos operativos de trabajo trabajarán y documentarán las historias de usuario. Se hará la identificación y el escalado de riesgos al comité de seguimiento semanal. Este equipo hará seguimiento semanal donde se recogerán todos los problemas del proyecto, así como las acciones asociadas.

- Toma de requerimientos funcionales y técnicos.
- Desarrollo del set-up y la implantación.
- Operación del Servicio en modo recurrente. Identificación y escalado de riesgos al Comité de Seguimiento.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Comités

A continuación, se indican un resumen de los principales comités y las características propuestas para cada uno de ellos:

Comité	Frecuencia	Asistentes Accenture	Asistentes LDA
Comité de dirección	Mensual	Responsable del proyecto	Si
Comité de seguimiento	Quincenal	Responsables de cada línea	Si
Reuniones de trabajo	Semanal	Responsables de cada línea y resto del equipo requerido en función de la temática	Si

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



Cambios de alcance



Cambio de alcance es aquel esfuerzo adicional, que implica un potencial incremento de la carga de trabajo del equipo fuera del alcance establecido en esta propuesta y en la fase de Negocio y UX de cada Release

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Copyright © 2023 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Cambios de alcance



Cambio de alcance

Identificar cambio de alcance	El equipo de trabajo, con la participación del Product Owner, documentará el cambio, realizando una evaluación inicial de la solicitud de cambio de alcance y establecerá su prioridad, así como el impacto en el programa en relación con el alcance, planificación, el riesgo etc.
Documentar el cambio	Accenture realizará una evaluación del impacto en esfuerzo, que será revisada por LD.
Analizar el cambio de alcance	LD y Accenture revisarán cada una de estas solicitudes en las reuniones de seguimiento del nivel operativo y una vez revisadas serán escaladas, si procede, al comité de dirección (nivel táctico) para su revisión/aprobación. En caso de no ser escalado a dicho comité, podrán ser congelado o rechazado.
Documentar el cambio	Una vez en el comité de dirección se decidirá si es necesario llevarse a cabo un análisis detallado del mismo. Una vez realizado el análisis detallado, el comité de dirección aceptará o rechazará la solicitud.
Implementación del cambio de alcance	Si se acepta el cambio de alcance, se incluirá en el backlog del proyecto, estableciendo el impacto en los recursos, el horario, esfuerzo y la actualización del plan de proyecto en consecuencia para su implementación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Gestión de riesgos

- Como parte del proceso de implementación y de nuestra gestión del proyecto con un enfoque estándar, la evaluación y gestión de riesgos se caracterizará en gran medida por la forma en que ofrecemos la solución global del proyecto.
- Un paso significativo es la identificación del tipo de riesgo, su probabilidad y el tipo de impacto potencial sobre el proceso de implementación en caso de no resolverse.
- Las medidas correctoras y los responsables serán especificas conforme cada riesgo.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



Gestión de riesgos

Categoría de riesgos	Descripción
Coste	Los riesgos de coste representan el incumplimiento a la hora de lograr los beneficios financieros del proyecto. Los riesgos de coste típicos incluyen el gasto excesivo en contratistas externos, costes adicionales para el cambio/resolución del diseño, problemas de ejecución u operativos.
Programación	Los riesgos de programación se centran en el incumplimiento de hitos del proyecto dentro del plazo especificado. Los riesgos de programación habituales derivan de las ampliaciones de los cambios del alcance, la no disponibilidad de recursos y las ampliaciones adicionales del programa causado por la resolución de los riesgos descritos anteriormente en 'coste'.
Tecnología	Los riesgos tecnológicos contemplan el incumplimiento de las especificaciones de la solución y los beneficios previstos. Los riesgos típicos incluyen la tecnología de plataforma nueva/no estándar, problemas de integración con las aplicaciones/sistemas TI existentes, incumplimiento de las expectativas de rendimiento, incumplimiento de la funcionalidad, deficiencias en la infraestructura de comunicaciones, y operabilidad del sistema global.
Operativo	Los riesgos operativos se centran en los cambios del proceso de negocios y de la organización derivados de la implantación. El riesgo operativo tiende a manifestarse en prácticas laborables por debajo de lo óptimo que dan lugar a la consecución de beneficios inferiores a los previstos. Los riesgos habituales contemplan la comunicación y la formación del personal principal en lo que respecta a los nuevos procesos y aplicaciones del negocio, el cambio de conducta y los índices de adopción de nuevas herramientas y procesos.
Externo	Los riesgos externos incluyen los factores 'medioambientales' que están, en gran medida, fuera del control de la gestión del proyecto y/o los participantes, que pueden afectar directa/indirectamente a la aportación satisfactoria de soluciones y beneficios. Normalmente, los riesgos externos surgen a partir de las regulaciones legislativas, los requisitos legales, la (in)satisfacción del cliente y la comunicación al mercado.


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO



Gestión de riesgos

A continuación, se indican los riesgos que puede presentar el proyecto, ofreciéndonos a revisar los mismos con los responsables del proyecto al comienzo de los trabajos para preparar las acciones de mitigación necesarias que colaboren con la iniciativa:

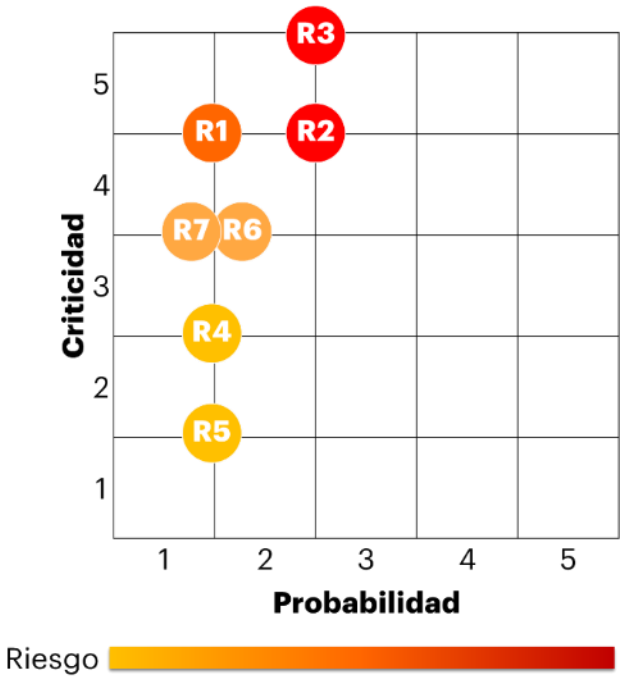

ID	Riesgo	C	P	R	Acciones de Mitigación	Responsable Acción
R1	No involucración o baja participación del área de sistemas	4	1	4	Se propone revisar la planificación durante la primera semana y confirmar la asistencia de todas las reuniones y los responsables	LDA
R2	Retraso en la aprobación de la documentación y toma de decisiones pueden provocar re-work	4	2	8	Involucración desde el inicio del equipo Negocio/Sistemas de LDA, en las distintas tareas de cara a poder ejecutar una rápida aprobación de los entregables	LDA/ Accenture
R3	Modificaciones o cambios de alcance	5	2	10	Consenso entre Accenture y Línea Directa para ampliar la colaboración conforme a un plan, alcance y coste consensuado	LDA/ Accenture
R4	Retrasos en el arranque de proyecto por retrasos administrativos/ logísticos.	2	1	2	Seguimiento de tareas necesarias e involucración responsables de las áreas afectadas en caso necesario	LDA/ Accenture
R5	Cambios en el entorno del proyecto: disponibilidad de entornos, accesos a sistemas, disponibilidad de licencias (Salesforce, otros sistemas,...)	2	1	2	Anticipar en la medida de lo posible análisis de impacto y toma de decisiones por parte del Comité de Dirección	LDA/ Accenture
R6	Incorrecta gestión de los entornos de Salesforce y problemas en los pases de peticiones entre entornos	3	1	3	Aplicación de una correcta metodología de DevOps	LDA (Oficina técnica)
R7	Retrasos en algún desarrollo en los sistemas actuales de LDA que suponga un retraso para el resto de desarrollos del proyecto	3	1	3	Anticipar en la medida de lo posible análisis de impacto y toma de decisiones por parte del Comité de Dirección	Accenture

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Gestión de Problemas



- Accenture es consciente de que a lo largo de un proyecto pueden producirse sucesos imprevistos que requieren tomar decisiones importantes.
- La gravedad y la importancia de estos problemas con frecuencia dependen del impacto que tendrán sobre el proyecto. **Es importante contar con un proceso claro** para **documentar** todos los problemas del proyecto, el escalado de los problemas y la **resolución** de los mismos.


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Gestión de Problemas


Dado que la resolución de los problemas podría exigir la atención del nivel estratégico, se desarrollará un proceso de escalado detallado y dichos problemas se remitirán al correspondiente comité del proyecto conforme a su nivel de importancia e impacto. Se prestará especial atención a los problemas que cumplan los siguientes criterios:

- Problemas decisivos para la misión.
- Problemas pasados (decisivos para la misión, altos, medios, bajos).
- Problemas de importancia alta, media y baja con fecha de vencimiento en el mes siguiente.
- Nuestro enfoque habitual de progresión de los problemas para nuestros clientes se detalla en la imagen siguiente.

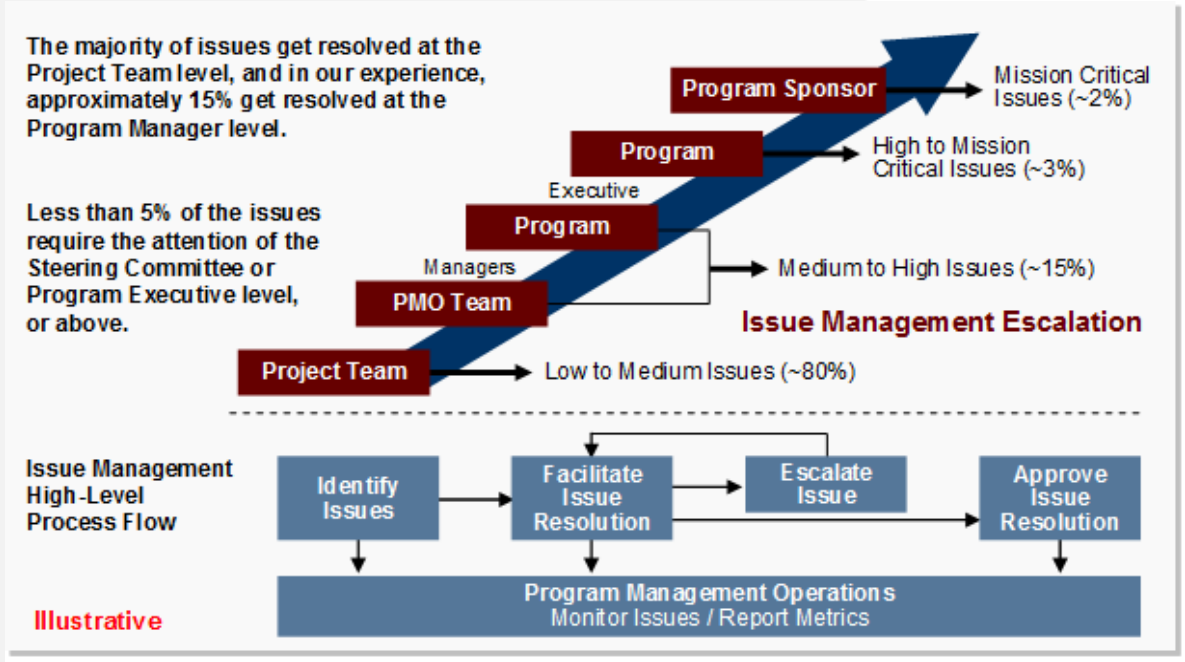

MODELO DE GOBIERNO

KPIs

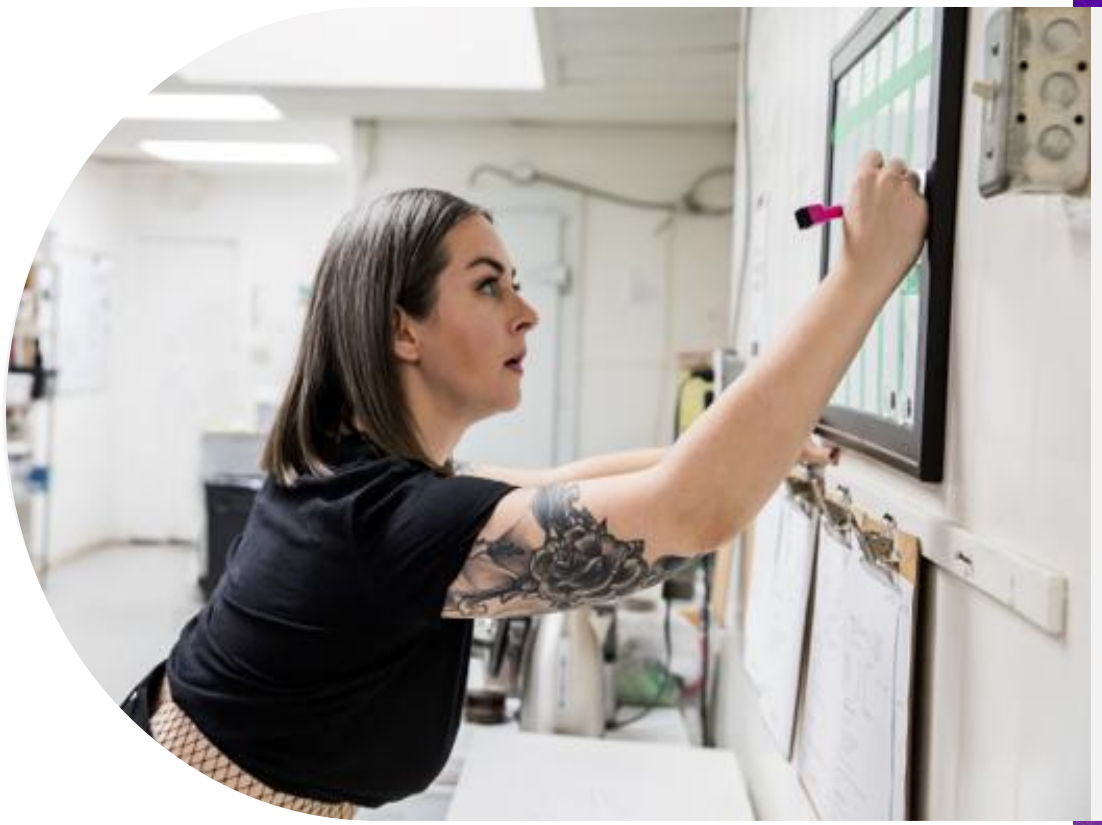

- Como se ha comentado anteriormente **el ciclo de vida de una HU pasa por diferentes fases y equipos** involucrados (Negocio, desarrollo, equipo legacies, Global Release manager, …) durante la ejecución del proyecto:

- En base en nuestra **experiencia en proyectos similares**, los criterios habituales para medir la calidad están basados en los procedimientos estándar según el ciclo de vida e una Historia de Usuario **(PMD, DevOps, aprobaciones de casos de uso, criterios de aceptación de las HU, aprobación de la funcionalidad en UAT…)**

- No obstante, en caso de que fuese necesario incluir KPI adicional, en **la fase de Discovery se acordarán conjuntamente** con Línea Directa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

8. Listado de entregables

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (1/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Planificación	Movilización	Plan detallado de proyecto de entregables técnicos por lote o iteración que sirva de planificación general durante el proyecto	Gestión
Kick-Off	Movilización	Define el alcance inicial, stakeholders, cronograma preliminar	Gestión
Diseño funcional + UX	Análisis y diseño	Documentos donde se tendrá el detalle necesario para que el equipo encargado del desarrollo pueda realizar sus tareas dando respuesta a los requisitos identificados formulados como user stories por negocio y diseños realizados por parte del equipo de UX.	Definición + UX
Planificación de sprints	Análisis y diseño	Planificación de las HU por sprint.	Implementación
Diseño técnico aplicación	Análisis y diseño / Desarrollo	Documento dirigido al equipo técnico con arquitectura, integraciones, estructuras de datos, interfaces, etc. Que contiene los componentes técnicos necesarios para el desarrollo del requisito. Se realizará por HU y se realizará con antelación al inicio del sprint de desarrollo de dicha HU	Implementación
Modelo de datos	Análisis y diseño / Desarrollo	Documento describe de forma estructurada las entidades, atributos y relaciones de la información de un sistema, definiendo cómo se organiza, almacena y conecta el dato.	Arquitectura

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (2/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Seguimientos periódicos	Gestión del cambio	Documento de seguimiento para las sesiones de los comités donde se evaluarán las distintas líneas de trabajo	Gestión
Arquitectura de Solución	Análisis y diseño	Documento de definición a alto nivel de arquitectura end-to-end (CRM, MuleSoft, API Connect, Kafka, CORE), flujos síncronos y asíncronos, principios de diseño.	Arq.Integración
Diseño de las Integraciónes	Análisis y diseño	Documento de diseño detallado de las integraciones	Arq.Integración
Catálogo de Integraciones	Análisis	Inventario consolidado de APIs, eventos, batch, modificaciones, clasificación por tipo y criticidad	Arq.Integración
Documento de Mapeos y Transformaciones	Análisis y diseño	Definición de Mapeos, reglas de negocio aplicadas, gestión de extrernals ID y dependencias	Arq.Integración
Modelo de Gestión de Errores	Diseño técnico	Estrategia de reintentos, DLQ, idempotencia, orden por entidad, consistencia eventual	Arq.Integración
Modelo de Observabilidad	Diseño técnico	Integración ELK, Dynatrace, correlation ID, métricas técnicas, trazabilidad end-to-end	Arq.Integración

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (3/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Diseño de Reconciliación	Diseño técnico	Definición de entidades críticas (máx. 2), periodicidad, batch técnico, reporting divergencias, remediación	Arq.Integración
Estrategia de Migración y Carga Inicial	Estrategia de Migración y Carga Inicial	Modelo ETL, alto volumen (>5M), ventanas de ejecución, validaciones post-carga	Arq.Integración + Datos
Testing	Testing	Unit test, integración, performance de integraciónes, soporte UAT	Integración + QA
Paso a Producción	Planificación técnica	Secuencia de despliegue, dependencias y validaciones	Integración + Gestión

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (4/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Change impact analysis	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto por grupo de trabajo en .	Gestión del cambio
Mapa de stakeholders y sponsors	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye un mapeo de stakeholders clave en PPT, análisis de influencia de impacto, definición de sponsors y estrategia de involucración.	Gestión del cambio
Roadmap de adopción	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye una hoja de ruta de Gestión del cambio alineada al programa, hitos clave, palancas de adopción y plan de seguimiento en formato PPT.	Gestión del cambio
Narrativa del cambio	Compromiso y sentimiento	Narrativa del cambio con mensajes claros, propuesta de valor del cambio y kit de identidad visual (branding) en formato PPT.	Gestión del cambio
Estrategia, plan y materiales de comunicación	Compromiso y sentimiento	Incluye estrategia segmentada por colectivos, plan editorial y calendario en formato PPT, definición de canales y desarrollo de materiales de comunicación.	Gestión del cambio
Estrategia y plan de formación	Nuevas Formas de Trabajar	Plan formativo por rol y releases con modelo Train the Trainers (TTT) que define itinerarios formativos, oleadas alineadas al Go-Live, criterios de agrupación de colectivos con necesidades equiparables y mecanismos de transferencia de conocimiento para asegurar la adopción y autonomía interna en formato PPT.	Gestión del cambio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (5/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Train the Trainers y vídeos	Nuevas Formas de Trabajar	Presentaciones y sesiones TTT en español por rol y oleadas, con un máximo de sesión por tipo de colectivo y release. Incluye la creación de manuales operativos por rol y vídeos formativos desarrollados en PPT y grabación de pantalla, alineados a las funcionalidades del CRM.	Gestión del cambio
Canales de acompañamiento	Nuevas Formas de Trabajar	Canales en MS Teams segmentados por rol para coaching, soporte continuo y gestión de feedback y acceso a materiales de formación durante el post Go-Live en PPT.	Gestión del cambio
Agente de IA para soporte y adopción CRM	Nuevas Formas de Trabajar	Agente conversacional de IA para soporte al usuario, integrado en el entorno de trabajo, entrenado con materiales del proyecto (manuales, FAQs, guías operativas) para resolver dudas funcionales y apoyar la adopción del CRM durante el uso diario.	Gestión del cambio
Informe de estabilización	Nuevas Formas de Trabajar	Informe post Go-Live con análisis de adopción, feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora en PPT.	Gestión del cambio
Informe de métricas y Reporte	Entregar Resultados y Ajustar	Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint periódico para seguimiento y toma de decisiones en formato PPT.	Gestión del cambio
Documento final de transferencia	Entregar Resultados y Ajustar	Documento de sesión final con transferencia al CoE, RACI definido y recomendaciones de mejora continua en formato PPT.	Gestión del cambio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

9. Consideraciones

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES:

- **Reunión de Inicio (Kick-Off):** Celebración de una reunión de inicio del proyecto (Kick-Off) con una antelación mínima de dos semanas respecto a la fecha prevista de arranque:
  - En dicha sesión participarán los responsables designados por LDA y por Accenture, y tendrá como objetivo:
  - Confirmar los interlocutores del área de IT y de Negocio que participarán en el proyecto.
  - Definir el calendario de trabajo. Establecer las necesidades de dedicación y participación de los distintos equipos.
- **Modelo de Gobierno y Toma de Decisiones:** LDA centralizará la toma de decisiones y validaciones en una o dos personas designadas como responsables del proyecto, con el fin de agilizar los procesos de aprobación y el cierre de fases.
- **Idioma de la Documentación:** Toda la documentación generada durante el proyecto se elaborará en castellano.
- **Disponibilidad de Recursos Clave:** LDA garantizará la participación activa y disponibilidad de las personas clave del área de Negocio y de los equipos del área de Sistemas que resulten necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.
- **Ubicación de los Trabajos** La ejecución del proyecto se realizará principalmente en las oficinas de Accenture. En caso necesario, se contemplarán desplazamientos puntuales a las oficinas de LDA en Madrid.
- **Sistemas Externos a Salesforce:** Todos aquellos desarrollos, adaptaciones o configuraciones requeridas en sistemas distintos de la plataforma Salesforce (incluyendo, entre otros, Galgo y otros sistemas legacy) serán gestionados y ejecutados por LDA. Asimismo, LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas correspondientes en dichos sistemas, en coordinación con las pruebas de integración definidas en el marco de este proyecto.
- **Seguridad y Protección de Datos:** LDA deberá comunicar a Accenture sus políticas de seguridad y protección de datos aplicables al proyecto.
  En particular, deberá identificar los datos considerados sensibles y definir los criterios de ofuscación, disociación o anonimización que deberán aplicarse en los entornos de prueba.
- **Proceso de Validación de Entregables:** LDA dispondrá de un plazo máximo de una semana desde la entrega formal de cada entregable para comunicar observaciones o solicitudes de modificación. En ausencia de comunicación dentro de dicho plazo, el entregable se considerará tácitamente aprobado.
- **Licencias y Herramientas del Proyecto:** El coste y la gestión comercial de las licencias necesarias para la ejecución del proyecto (incluyendo, entre otras, Salesforce, Jira, servicenow, herramientas de gestión documental o UX, herramienta de IA entre otras) serán responsabilidad de LDA.
- **Asignación de Equipo Accenture:** La intención de Accenture es asignar al proyecto los perfiles profesionales o similares previamente detallados (según CVs aportados). No obstante, la asignación definitiva estará sujeta a la fecha efectiva de inicio del proyecto y a la disponibilidad de los recursos en dicho momento.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **La aceptación del software** se realizará exclusivamente con referencia a la última especificación aprobada formalmente por las Partes al finalizar la fase de UAT (User Acceptance Testing). Cualquier especificación más detallada y aprobada reemplazará por completo el alcance base definido por especificaciones y requerimientos anteriores. Si no existe diseño (p. ej., funcionalidad estándar del producto), se realizarán pruebas, pero quedarán excluidas del procedimiento de aceptación del trabajo de Accenture.
- **Estándares de Desarrollo y Calidad del Código:** La codificación se llevará a cabo siguiendo las prácticas y recomendaciones establecidas por Salesforce. Asimismo, se garantizará un *code coverage* mínimo del 85% en los desarrollos realizados, conforme a los estándares de calidad exigidos por la plataforma.
- **Accesos y Documentación Inicial:** Durante la semana de movilización del proyecto, LDA proporcionará al equipo de Accenture todos los accesos necesarios a los sistemas implicados, así como la documentación técnica y funcional requerida para el correcto inicio de los trabajos.
- **Modelo de Integración Continua y DevOps:** Se asume que el modelo actual de integración continua, basado en prácticas DevOps e implantado por LDA, se encuentra operativo y funcionando de manera estable al inicio del proyecto para poder realizar los despliegues de los desarrollos
  El proyecto se apoyará en dicho modelo para la gestión de despliegues y control de versiones.
- **Dependencias de Infraestructura y Accesos:** Cualquier retraso en la provisión de infraestructura, accesos o información necesaria podrá impactar en los plazos comprometidos del proyecto.
- **Pruebas de Usuario (UAT)**: Será responsabilidad de LDA garantizar la participación y disponibilidad de los usuarios clave en las sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT), necesarias para la validación funcional y aprobación del paso a Producción.
- **Aprobación de Casos de Uso para UAT:** La aprobación de los casos de uso y escenarios de prueba correspondientes a la fase de UAT será responsabilidad de LDA.
- **Datos para Pruebas Integradas:** Para la correcta ejecución de pruebas integradas y pruebas de usuario en escenarios de integración entre sistemas, LDA garantizará la disponibilidad de juegos de datos adecuados y suficientes en todos los sistemas involucrados.
- **Pruebas de Regresión en Sistemas Externos:** LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas de regresión en aquellos sistemas que puedan verse afectados por modificaciones o con Salesforce.
  Asimismo, será responsable de la gestión del esfuerzo e incidencias derivadas de dichas pruebas cuando afecten a procesos o desarrollos no incluidos en el alcance de la presente propuesta.
- **Uso de Funcionalidad Estándar:** En línea con las prácticas recomendadas por Salesforce, se priorizará el uso de funcionalidad estándar proporcionada por la plataforma frente a desarrollos a medida, con el objetivo de promover mantenibilidad, escalabilidad y alineación con futuras evoluciones del producto.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **Modelo de trabajo**:
  - Al ser un Precio Fijo basado en resultados no será aplicable el uso de metodologías ágiles o iterativas, dada la naturaleza evolutiva y adaptativa de dichos enfoques
  - Las especificaciones más detalladas que sean posteriormente definidas y aprobadas formalmente por las Partes sustituirán en su totalidad al alcance base previamente establecido en las especificaciones o requisitos iniciales.

- **Gobernanza de cambios**: El alcance base, la planificación y las hipótesis contractuales del proyecto estarán sujetos al proceso formal de gestión de cambios (Change Control) con el fin de analizar, acordar y aprobar los posibles impactos en alcance, calendario y precio. Las actividades de análisis y estimación asociadas a una solicitud de cambio (CR – Change Request) se considerarán igualmente parte de dicha solicitud y serán facturables.

- **Validación al inicio del desarrollo**: Cada Release incluirá una fase inicial de análisis y diseño visual de pantallas (UX) cuyo objetivo será detallar los requisitos, validar dependencias y confirmar la viabilidad de la solución planteada. A la finalización de dicha fase de definición en cada release, Accenture elaborará una revisión de alcance detallado y una estimación revisada de esfuerzo.
- En caso de que, como resultado del análisis realizado, se identifique que el alcance funcional difiere del inicialmente considerado en la presente propuesta, existen nuevas dependencias técnicas o integraciones no contempladas, o la complejidad técnica implique un esfuerzo superior al estimado inicialmente con base en las consideraciones de este documento, las Partes analizarán y acordarán conjuntamente el impacto en planificación y presupuesto y/o los siguientes pasos respecto a la Release afectada antes del inicio de la fase de construcción.

- No se consideran en el presente alcance **integraciones con el portal (web)** de LDA
- Se considera que la operativa de los usuarios que van a gestionar a los clientes desde Salesforce es la misma independientemente del canal por el que sean tratados (Chat, Teléfono, presencial) y no hay diferencias funcionalidades
- Se asume que es **Logalty** el que envía el documento a los clientes. Es el que almacena también el documento
- **Gestor documental**: Se asume que existe un gestor documental “Content manager” y que toda la documentación necesaria será subida a dicho gestor documental
- **Estandaridación de procesos**: Se asume que los procesos que forman parte de la operativa de gestión entre los diferentes ramos presentan un alto grado de similitud, siendo necesarias únicamente adaptaciones puntuales para su adecuación a cada ramo, sin que ello suponga un rediseño completo de los mismos.
- **Modelo de datos**: La definición final del modelo de datos se realizará durante la fase de diseño asociada a cada requisito, pudiendo verse modificados los objetos necesarios para cada fase en función de las conclusiones alcanzadas para cada uno de ellos.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **Dependencias**: Todas las adaptaciones, desarrollos, configuraciones o modificaciones necesarias en sistemas propios de LDA distintos de la plataforma Salesforce — incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, Galgo, Genesys, gestores documentales u otros sistemas legacy — serán responsabilidad exclusiva de LDA. LDA asumirá la planificación, ejecución, pruebas y puesta a disposición en plazo de dichas adaptaciones, garantizando su alineación con el calendario general del proyecto. El cumplimiento de los hitos y plazos del proyecto estará condicionado a que dichas adaptaciones en sistemas propios del cliente se encuentren disponibles en tiempo y forma conforme al plan acordado. Cualquier retraso en su ejecución podrá implicar un impacto en el cronograma, hitos y/o costes del proyecto, que deberá ser analizado y gestionado a través de los mecanismos de gobierno establecidos. Las Partes deberán acordar al inicio de cada Fase las fechas en que deberán cumplirse las dependencias del Cliente.
- **Aceptación de las pruebas**: La aceptación de las pruebas no requerirá que todas las funcionalidades estén completadas al 100%. Se permitirá un número limitado de defectos (incidencias de criticidad media y baja) y transacciones que no cumplan totalmente los objetivos. Un error solo se considerará como tal si contradice la última especificación aprobada y es reproducible por Accenture en el entorno de pruebas.
- **Puesta en Producción del software**: La puesta en producción del software se considera como aceptado
- Durante la fase de implementación del proyecto, **no se aplicarán niveles de servicio (SLA) ni penalizaciones**, ya que el objetivo principal es garantizar la correcta entrega y despliegue de la solución. Los niveles de servicio y cualquier penalización se definirán y acordarán por ambas partes **al inicio de la fase de mantenimiento extendido**, una vez finalizada la implementación y el Proyecto esté operativo y en condiciones de soporte, considerando el alcance y la calibración necesarios para esta etapa.
- **Casos de uso de agentforce:** Los casos de uso se seleccionarán conjuntamente entre las partes durante el proyecto y deberán cumplir las siguientes características:
    - Estar limitados en alcance y complejidad, orientados a automatizaciones de apoyo a la operativa de los agentes.
    - Basarse principalmente en capacidades estándar de Salesforce, Agentforce y Data Cloud, evitando desarrollos complejos o integraciones adicionales no contempladas en el alcance del proyecto.
    - Utilizar información disponible en los sistemas actuales de LDA, sin requerir transformaciones estructurales de datos o desarrollos de integración adicionales.

  Cualquier caso de uso que requiera desarrollos adicionales significativos, nuevas integraciones, ampliaciones de alcance o capacidades no contempladas en la presente propuesta deberá ser evaluado y gestionado mediante el proceso de gestión de cambios del proyecto.
- **Horario**: El horario estándar del servicio será el establecido por Accenture: De 08:00 a 18:00 horas de lunes a jueves, De 08:00 a 14:30 horas los viernes y De 08:00 a 15:00 horas desde el 1 de julio al 15 de septiembre.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES:

- Las **integraciones síncronas** se estiman hasta la respuesta del CORE; las asíncronas desde la lectura del mensaje en cola/tópico.
- Las **modificaciones son evolutivos** sobre APIs existentes, no rediseños completos.
- **Arquitectura híbrida**: REST/CTG (síncrono) y Kafka (asíncrono), con MuleSoft como orquestador y API Connect como gateway de seguridad.
- Las **cargas iniciales** se realizarán vía batch/ETL; se considera alto volumen >5M registros por entidad y se ejecutarán en ventanas controladas. La migración de datos al CRM se realizará mediante procesos batch/ETL sobre las entidades identificadas, considerando los volúmenes facilitados (clientes, pólizas, leads y oportunidades). No se incluyen transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos, asumiéndose que la información proveniente de los sistemas origen está previamente validada y preparada para su carga.
- Las **estimaciones de carga de datos** se han realizado considerando las volumetrías indicadas por LDA. Variaciones significativas en volumen de datos, número de entidades o número de interacciones podrán requerir revisión de arquitectura y reestimación de esfuerzo según la siguiente tabla:

Entidad	Volumen
Clientes	**3.6M**
Pólizas	**6M**
Leads	**1.7M**
Oportunidades	**7M**

- La **captura CDC no está incluida**; se asume publicación previa de eventos en cola/tópico.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES (Continuación):

- **Seguridad** gestionada mediante API Connect y cifrado TLS extremo a extremo.
- Se contemplan tres entornos: INT / PRE / PROD, que deberán estar disponibles y operativos antes del inicio del desarrollo.
- La **configuración de redes, accesos, firewall y certificados** será responsabilidad del cliente.
- **API Manager, MuleSoft, Kafka y la herramienta de ETL** deberán estar previamente aprovisionados, instalados y configurados, incluyendo conectores y accesos necesarios.
- No se incluye la implantación base ni la **configuración inicial de estas plataformas**.
- Se asume **disponibilidad de accesos técnicos, certificados, usuarios de servicio y definición previa de colas/tópicos**.
- La **planificación, estimación y secuenciación por fases** se han realizado tomando como base el volumen de integraciones actualmente identificado, compuesto por 67 nuevas integraciones online/asincronas, 9 procesos batch y 33 modificaciones asociadas.
- A efectos de estimación se ha considerado una distribución de **complejidad de integraciones** del 35% baja, 45% media y 20% alta, basada en patrones habituales de integración en proyectos CRM con middleware y sistemas core.
- A efectos de **estimación, los procesos batch** se han distribuido en 20% de baja complejidad, 50% de complejidad media y 30% de complejidad alta, considerando el volumen de datos y la lógica de transformación habitual en procesos ETL y cargas masivas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES (Continuación):

- Para calcular la **complejidad de los procesos** se ha tenido en cuenta la siguiente tabla:

Complejidad	Número de Campos	Número de Sistemas a Orquestar	Transaccionalidad	Seguridad	Tipos de Sistemas de Backend
Simple	6-15	1-2	Baja	Media	JDBC, REST (autenticación básica), SOAP (simple)
Media	16-30	3-4	Media	Alta	JDBC, REST (OAuth2/JWT), SOAP, Kfka
Alta	31-50	5-6	Alta	Muy alta	JDBC, REST, SOAP, Kafka, FTP/SFTP

- La compañía proporcionará **estándares de logging, convenciones de naming y plantillas corporativas** de dashboards.
- Las **pruebas funcionales y UAT** serán responsabilidad compartida con Línea Directa.
- No se incluyen **pruebas de carga** sobre sistemas legacy salvo especificación expresa en alcance.
- El **proceso de reconciliación** se limita a un máximo de dos entidades críticas previamente acordadas y no incluye transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos (duplicados, inconsistencias o errores de formato), así como tampoco la corrección de calidad de datos en origen. Cualquier entidad adicional requerirá estimación y planificación independiente.
- **La gestión documental** permanecerá en el repositorio corporativo existente (Content Manager). El CRM se integrará mediante APIs para consultar y referenciar la documentación asociada a clientes y pólizas, limitándose a la gestión de metadatos y enlaces, sin contemplar la migración ni el almacenamiento de documentos dentro del CRM.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GdC:

- Walkme y Mensajes en la herramienta son activos no cotizados en la presente oferta,. No obstante, recomendamos considerar su utilización para potenciar los niveles de adopción. En caso de no incluirse, las actividades se gestionarán mediante otras herramientas.
- Asumimos la autorización de Línea Directa para la utilización de las herramientas de GenAI y consecuente generación de eficiencias.
- Línea Directa proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.
- Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, …) quedando su elaboración fuera de alcance.
- La selección de los embajadores es responsabilidad de LDA.
- Quedan fuera de alcance las comunicaciones a externos. Las comunicaciones a internos se realizarán en coordinación con Comunicación y, únicamente, si se habilitan los permisos correspondientes en los canales existentes (canal de email, Iseazy (exclusiva para internos), Teams).
- Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc.)
- Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.
- Para el caso del agente de acompañamiento, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.
- El modelo operativo será definido por LDA.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GARANTIA:

- Accenture garantiza durante un **período de seis (6) meses** desde la fecha de puesta en producción que los desarrollos realizados en el marco del presente proyecto funcionarán sustancialmente de acuerdo con las especificaciones funcionales y técnicas expresamente aprobadas por las Partes tras la superación de las pruebas de aceptación de usuario (UAT).
- Durante dicho período, Accenture se compromete a corregir, sin coste adicional, aquellos **defectos tipificados como Prioridad Crítica o Alta** que:
  - Sean reproducibles en entorno productivo,
  - Supongan una desviación respecto a las especificaciones aprobadas en UAT, y
  - Sean directamente imputables a defectos en el desarrollo realizado por Accenture.
- La aceptación de los desarrollos tras la superación de las UAT implicará la conformidad de LDA con el funcionamiento de la solución respecto de los requisitos validados, no pudiendo considerarse como defectos en garantía aquellas incidencias que hubieran sido detectables razonablemente durante dicha fase y no hubieran sido reportadas antes de la puesta en producción.
- Quedan expresamente excluidos:
  - Incidencias derivadas de cambios realizados por LDA o por terceros sobre el código o configuración entregada.
  - Incidencias derivadas de sistemas externos, integraciones o plataformas de terceros.
  - Cambios normativos o regulatorios posteriores a la puesta en producción.
  - Evolutivos, mejoras funcionales o cambios de alcance no contemplados en las especificaciones aprobadas.
  - Incidencias derivadas de uso inadecuado o distinto al definido en la documentación funcional.
  - Incidencias clasificadas como Media o Baja en base al criterio de tipificación anteriormente expuesto.
  - Necesidad de rediseño sustancial o reconstrucción de funcionalidades aceptadas en UAT.
- La validez de la garantía queda condicionada a que las modificaciones del software se realicen exclusivamente por Accenture. Cualquier modificación efectuada por LDA o por terceros supondrá la no aplicación de la garantía.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

MANTENIMIENTO:

- **Accesos y prerrequisitos:** Con carácter previo al inicio de la línea de Mantenimiento, LDA facilitará a Accenture todos los accesos, credenciales, licencias, entornos, documentación técnica y funcional, así como cualquier otra información necesaria para la correcta prestación del servicio. Cualquier retraso en la provisión de dichos elementos podrá implicar la replanificación de los servicios y el correspondiente ajuste en los plazos y precio comprometidos, sin que ello genere responsabilidad alguna para Accenture.
- **Dependencias y demoras imputables a LDA durante el mantenimiento**: Accenture no asumirá responsabilidad por retrasos, ineficiencias o incumplimientos derivados de:
  - Actuaciones u omisiones de LDA.
  - Retrasos de terceros proveedores de LDA.
  - Falta de disponibilidad de información, accesos o validaciones necesarias.
  - Incidencias en infraestructuras o sistemas fuera del alcance del servicio.

  Esto podría afectar al calendario de entregas
- **Licencias y herramientas del mantenimiento**:
  - LDA proporcionará, sin coste para Accenture, las licencias, accesos y herramientas necesarias para la prestación del servicio descrito en este documento. En ningún caso LDA repercutirá a Accenture costes asociados a herramientas, infraestructura o medios necesarios para la correcta ejecución del servicio. Los aceleradores, metodologías, frameworks y herramientas propias utilizadas por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad, no implicando su uso la cesión de derechos de propiedad intelectual ni la concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.
  - Los aceleradores, metodologías, frameworks, herramientas, componentes reutilizables y know-how propios utilizados por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad. Su utilización en el marco del proyecto no implica cesión de derechos de propiedad intelectual ni concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

MANTENIMIENTO (Continuación):

- **Organización del equipo:**
  - Accenture mantendrá plena autonomía organizativa en la asignación, dirección, coordinación y gestión de los recursos destinados a la prestación del servicio, sin perjuicio del cumplimiento de los niveles de servicio y compromisos contractualmente asumidos.
  - Accenture será responsable de la prestación de los servicios de soporte de Nivel 2 y Nivel 3, incluyendo la resolución técnica especializada y la coordinación con el proveedor de la tecnología para la gestión de incidencias complejas.
  - El servicio se prestará en modalidad remota desde cualquiera de las localizaciones de Accenture en España, utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos.
- **Tipificación de incidencias:** La clasificación y priorización de las incidencias reportadas será realizada por Accenture conforme a los criterios objetivos de tipificación previamente acordados entre las Partes y recogidos en el presente documento. LDA podrá proponer una prioridad inicial al registrar la incidencia; no obstante, la asignación definitiva de la tipología corresponderá a Accenture tras el análisis técnico correspondiente y de acuerdo con los criterios establecidos. En caso de discrepancia sobre la clasificación asignada, las Partes analizarán conjuntamente el impacto objetivo de la incidencia conforme a los criterios definidos, manteniéndose la clasificación asignada por Accenture hasta la resolución de dicha revisión.
- **Exclusiones del alcance**: Queda expresamente excluido del alcance del servicio de Mantenimiento y soporte:
  - La configuración, instalación, operación o mantenimiento de la infraestructura tecnológica del LDA.
  - La configuración o mantenimiento de sistemas no expresamente incluidos en la presente propuesta.
  - La resolución de incidencias imputables a productos o soluciones de terceros, cuya gestión corresponderá al LDA frente a sus respectivos proveedores.
  - Cualquier responsabilidad derivada del funcionamiento, actualización o soporte de productos de terceros.
- **Modelo de trabajo**: La prestación del servicio de Mantenimiento se realizará en modalidad remota, desde las instalaciones de Accenture utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos en el marco del presente proyecto.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

MANTENIMIENTO (Continuación):

- **Validación de entregables del Mantenimiento**: La documentación o entregables que requieran validación por parte de LDA deberán ser revisados en un plazo máximo de tres (3) días laborables desde su entrega. En ausencia de respuesta expresa dentro del plazo indicado, se considerarán tácitamente aprobados a todos los efectos. Cualquier retraso en la validación podrá implicar ajustes en la planificación sin responsabilidad para Accenture.
- **Cambios de alcance**:
  - Cualquier actividad fuera del alcance del proyecto que requiera capacidades adicionales a las ofertadas será considerada un cambio de alcance y deberá gestionarse conforme al procedimiento formal de gestión de cambios.
  - Asimismo, cualquier modificación significativa en herramientas, medios materiales, entornos o condiciones necesarias para la prestación del servicio será objeto del correspondiente análisis de impacto y ajuste contractual, en su caso.
- **Horario**: El horario estándar del servicio de Mantenimiento será el establecido por Accenture:
  - De 08:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves.
  - De 08:00 a 14:30 horas, los viernes.
  - De 08:00 a 15:00 horas desde el 1 de julio al 15 de septiembre.

  Cualquier necesidad de cobertura fuera del horario indicado deberá tratarse como servicio de guardia, conforme a las condiciones que se acuerden entre las Partes.

  Para la prestación de servicios en modalidad de guardia 24x7, LDA facilitará a Accenture el dispositivo móvil o medio de contacto necesario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

10. Anexos



Anexo 1. ¿Por qué Accenture?

¿POR QUÉ ACCENTURE?

Estamos en **disposición de contribuir a los objetivos de Grupo LÍNEA DIRECTA** gracias a un profundo conocimiento del ámbito asegurador, nuestro conocimiento de Línea Directa, y aportando un equipo con amplia experiencia en proyectos similares, además de mantener una robusta relación con el ecosistema de vendors:

SOMOS EXPERTOS EN EL SECTOR ASEGURADOR

- Conocemos profundamente la industria y contamos con capacidades específicas que ponemos a disposición de nuestros clientes
- Somos un colaborador estratégico importante de muchas de las aseguradoras líderes nacionales e internacionales en diversas partes de la cadena de valor además de estar continuamente alimentado nuestra visión del sector sobre las tendencias que moldearán el negocio.

CONOCEMOS LÍNEA DIRECTA

- Conocemos los procesos, la organización, los sistemas y metodologías de trabajo de LÍNEA DIRECTA, lo que nos permitirá ser operativos desde el inicio y trabajar de forma integrada en la cultura de trabajo del Grupo.
- LINEA DIRECTA ha confiado en nosotros para ayudar a dar respuesta a algunos de sus retos recientes en diferentes áreas.

TENEMOS AMPLIA EXPERIENCIA TANTO EN SALESFORCE

- Lideres en Salesforce IBERIA: Accenture ha creado el mayor grupo de España y Portugal dedicado íntegramente al ecosistema SFDC. Somos el socio de integración de sistemas más estratégico y experimentado de Salesforce.com: socio nº 1 por número de profesionales, por ingresos, por escala de compromisos.

DISPONEMOS DE ACELERADORES Y TENEMOS UNA RELACIÓN CLAVE CON VENDORS

- Ponemos a disposición de nuestros clientes activos y aceleradores que permiten acelerar los proyectos y ofrecer perspectivas innovadores y deferenciales.
- Y contamos con partnerships con los principales players del mercado, que habilitan un conocimiento y relación muy valorados en el mercado.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EN ACCENTURE SOMOS EXPERTOS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS...

Conocemos la industria y contamos con capacidades específicas que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes para lograr sus **retos de negocio en el camino hacia la REINVENCIÓN:**

Experiencia

De las compañías de seguros del Fortune 500, trabajamos con:

- 9 de las 10 principales aseguradoras
- 27 de las 30 principales aseguradoras de P&C
- 26 de las 30 principales aseguradoras de vida

En España, trabajamos con 9 de los 10 principales grupos aseguradores por volumen de primas (ranking ICEA).

Talento

+600 profesionales trabajando en España en la industria aseguradora.

150 especialistas en la industria en España (70 especialistas en tecnología y 80 en estrategia y consultoría).

+6.500 especialistas en la industria trabajando en 39 países.

+13.000 personas trabajando en operaciones (BPOs de seguros).

Servicios

Accenture ofrece una gama completa de servicios, desde la consultoría estratégica pura hasta la implementación de sistemas, así como servicios de mantenimiento y operaciones.

25% cuota de mercado en servicios de Aplicaciones en España (20% a nivel global).

Nuestra experiencia continua nos permite desarrollar una visión propia sobre los retos y las tendencias del sector



VISIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SEGUROS

Encuesta a ~ 600 ejecutivos de compañías de seguros de +25 países



EL SEGURO COMO NEGOCIO VIVO

Crecimiento exponencial mediante la hiperrelevancia y la agilidad




ESTUDIO DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS 2021

Estudio bianual sobre la evolución de los hábitos de consumo en el sector



EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

Nuevos modelos para los clientes digitales



INNOVACIÓN INTRÉPIDA

¿Qué empresas están aprovechando las oportunidades de los ecosistemas?



PIEZA FUNDAMENTAL DEL CRECIMIENTO FUTURO

¿Cuál es el mejor enfoque para aprovechar las oportunidades insurtech?



BIENESTAR CONECTADO

¿Cómo pueden las aseguradoras sanitarias sumarse a los wearables para generar ingresos en segmentos desatendidos?



COVID-19 ESTUDIO DE CONSUMO DE SEGUROS

¿Cómo afecta la COVID-19 a los consumidores del sector?



EVOLUCIONAR PARA TRIUNFAR EN EL ECOSISTEMA DE SEGUROS

¿Cómo están redefiniendo las plataformas la experiencia del cliente y las expectativas de las aseguradoras?



AGENTE DEL FUTURO

¿Cómo será el canal de las agencias dentro de 10 años y en qué deben trabajar las aseguradoras seguir siendo relevantes?

Copyright © 2024 Accenture. All rights reserved.

...Y CONOCEMOS LÍNEA DIRECTA

Poseemos una **amplia comprensión de LINEA DIRECTA** y, en particular, de su **estrategia en el ámbito de sistemas**.

LINEA DIRECTA ha confiado en Accenture para ayudar a dar respuesta a algunos de sus retos recientes en diferentes áreas: nuestra experiencia incluye, entre otros:

- ✓ Ejecución de un plan de eficiencia operativa, en el que se revisó la estructura organizativa de las áreas de backoffice de las principales empresas del Grupo con el objetivo de identificar eficiencias e impulsar el crecimiento rentable.
- ✓ Definición de la experiencia futura de cliente para modificaciones de póliza, siniestros y retención, centrado en visión cliente para los productos de Hogar, Auto y Salud
- ✓ Acompañamiento a la dirección de Tecnología en la formulación de su estrategia, y la posterior monitorización y seguimiento del plan de IT.
- ✓ Definición del marco de gobierno de la IA Responsable y realización de tres MVPs basados en Gen AI, con foco en las transcripciones de grabaciones del Contact Center.

Estas colaboraciones nos han permitido conocer vuestra organización y establecer la relación base para una buena comunicación, comprensión y ejecución del proyecto:

✓VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Disponemos de una comprensión profunda de la transformación tecnológica en curso en la compañía, lo que nos permitirá alinear la solución propuesta para este proyecto con la visión su estratégica, abordando los desafíos asociados a la nueva arquitectura y nuevas tecnologías de manera integral, e identificar sinergias y oportunidades de mejora en el ámbito tecnológico.

✓RELACIÓN PERSONAL CON LOS EQUIPOS

Tenemos relación con los responsables de las diferentes áreas de la función de IT, lo que nos permite comprender, alinearnos y agilizar los proyectos en los que colaboramos.

✓CONTEXTO Y SITUACIÓN DEL CLIENTE

Contamos con una visión cross de las principales áreas y procesos de la organización.

Disponemos también de un entendimiento del contexto operativo y estratégico de la compañía, esto nos posiciona de manera relevante al entender las necesidades y los desafíos a los que se enfrenta en términos de eficiencia y crecimiento.

ESTAMOS LISTOS PARA ABORDAR CON VOSOTROS ESTA NUEVA TRANSFORMACIÓN

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Experiencia local: Certificaciones Salesforce en Accenture España

Lideres en Salesforce IBERIA: Accenture ha creado el mayor grupo de España y Portugal dedicado íntegramente al ecosistema SFDC. Somos el socio de integración de sistemas más estratégico y experimentado de Salesforce.com: socio n° 1 por número de profesionales, por ingresos, por escala de compromisos.

+660
Profesionales de Salesforce en Iberia

+320
Profesionales con certificaciones

+1.550
Certificaciones de Salesforce

+465
Credenciales de negocio en todas las industrias.

Desde 2002
Trabajando con Salesforce en Proyectos

#1 Salesforce partner en Iberia



10 **oficinas entre España y Portugal**

#1
Socio de alianza cualificado de Salesforce entre Personas, ACV influido, Cobertura de mercado

#1
El único socio que trabaja junto con la **oficina de innovación**

+40
Soluciones industriales y funcionales,
Múltiple, **herramientas inteligentes y aceleradores**

+15
Aceleradores de industria

+500
Credenciales comerciales en todas las industrias

Ecosistema Salesforce Business Group
MuleSoft · heroku · APTTUS · Veeva · salesforce · CloudSense · Vlocity · zuora

Equipo senior multi disciplinarios, con capacidades end-to-end

Metodología en innovación con aceleradores y assets

Conocimiento de la industria, sus sectores y áreas funcionales

Primer partner de Salesforce en España con mayor experiencia que ningún otro partner

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector seguros.

Sector: Seguros

Objetivo:

Compañía líder en el mercado de seguros de salud tiene como objetivo final mejorar tanto la experiencia del cliente, así como los procesos CRM internos de la compañía.

Leading country: Spain

Transformación de función de CRM

El proyecto supone la primera fase dentro de un ambicioso plan de transformación de función de CRM. Tiene como objetivo final mejorar tanto la experiencia del cliente, así como los procesos CRM internos de la compañía.
La solución planteada cubre las áreas de marketing, ventas y servicio y un prototipo de reporting y seguimiento basado en Einstein analytics.

La solución de Ventas es un piloto de sistema de gestión de leads y oportunidades multirramo para los vendedores exclusivos de la compañía.
La solución de Servicio cubre el proceso de atención en canales digitales incluyendo canales sociales (FB y Twitter) y chat.

Asimismo, se ha puesto en marcha la plataforma de marketing activando varios "journeys" de cliente.

Adicionalmente, la solución ha incluido una línea de trabajo específica de Datos para integrar la información del maestro de clientes y pólizas de la compañía en el CRM así como otras informaciones relevantes (Simulaciones, Campañas ...) con el operacional.
Una vez puesta en marcha la plataforma se ha activado un servicio de mantenimiento de la plataforma.

A demás, como parte del alcance se realizaron las siguientes integraciones con Informatica MDM, Firma electrónica, Gestor Documental, Siebel, Salesforce Maps, Otros sistemas legacy de la compañía (core asegurador, portal comercial, Data Warehouse).

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca

Objetivo:

Digitalización de la función comercial para evolucionar su modelo de relación con el cliente

- **4º banco de España**
- **Banca minorista, comercial y gestión de patrimonios**

Leading country: Spain

Definición Modelo Función Comercial

Reto:
La entidad quería digitalizar su gestión comercial para generar mayor relevancia en las interacciones con sus clientes, buscando un aumento del número de nuevos clientes y ventas, con mayor eficiencia.

Cómo se realizó

- Análisis de la madurez de la situación actual (capacidades funcionales y tecnológicas) gracias al modelo de referencia.
- Posicionamiento de la entidad en el mercado a partir de los resultados del Observatorio de la Gestión Comercial.
- Diseño de las iniciativas a desarrollar con sus proyectos e iniciativas asociadas, definidas y priorizadas a partir del trabajo colaborativo con la entidad.
- Elaboración del blueprint de arquitectura para soportar el modelo aspiracional definido en el proyecto.
- Generación de un catálogo de roles que la entidad debe considerar en su organización para la ejecución del plan.

Resultados de la solución

- Generación de un plan de transformación para evolucionar la gestión comercial del banco, desarrollado a través de un catálogo de iniciativas identificadas y priorizadas en función de los objetos del banco, las tendencias del mercado y el nivel de madurez de sus capacidades actuales.
- Las iniciativas están orientadas a mejorar la visión 360º del cliente, mejorar las capacidades de distribución de la oferta comercial tanto en los canales internos como externos del Banco, mejorar las capacidades de atención al cliente y gestión comercial en los canales presenciales y digitales (incluyendo la figura del asistente virtual) y potenciar los cuadros de mando.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca

La compañía:

Accenture ha implementado Financial Service cloud para banca retail en 2 importantes entidades financieras de España cuya funcionalidad es muy similar en ambas

Leading country: Spain

Implementación de solución de ventas

Reto:
Ofrecer una solución plataformas principales del mercado que permita a los gestores una mejora de eficiencia comercial y una mejora de la experiencia de cliente y empleado de gestión comercial sobre una de las

Cómo se realizó:

Se ha desarrollado la solución tanto para personas físicas como para personas jurídicas con las siguientes capacidades

- Ficha de cliente con integraciones a sistemas legados para una visión 360º del cliente
- Un histórico de la actividad del gestor (gestiones y contactos)
- "Visión Gestor" donde el gestor puede hacer seguimiento de todas sus gestiones y contactos pendientes
- Gestión de oportunidades e iniciativas comerciales
- Gestión de contactos (interacciones) con el cliente a través de diferentes canales (visitas, llamadas, muro, correo electrónico)
- Informes y cuadros de mando diseñados en función del nivel jerárquico del usuario (gestor, director de oficina, director territorial). Tableau CRM

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca

La compañía:

Accenture ha implementado Salesforce para Banco Líder Nacional Empresas

Leading country: Spain

Implementación de solución de ventas

Reto:
El objetivo del proyecto era proporcionar a los gerentes de ventas de Banca Empresarial, Corporativa e Institucional una herramienta única con una visión del cliente 360, una solución de gestión de oportunidades de extremo a extremo (que incluye sanciones de precio y riesgo y renovaciones de contratos) e informes de actividades y proyectos en un entorno colaborativo con precio analistas, analistas de riesgos y especialistas en productos.
Se ha definido y desarrollado en base a tres principios fundamentales: movilidad, eficiencia y colaboración.
Implementado en Salesforce Sales y conectado con Marketing Cloud y Service Cloud

Cómo se ha realizado
Accenture ha sido el socio principal de la entidad para este programa desde sus inicios.
Conceptualización: Definición de plataforma / procesos / capacidades y personalización de herramientas.

- Vista de cliente 360: datos empresariales básicos, clasificación de riesgos, saldo contable, miembros del equipo de cuentas, contactos del cliente
- Oportunidades: Gestión de más de 100 productos. Flujo de trabajo cooperativo con muchos actores (especialistas en precios, gerentes de relaciones, especialistas en riesgos, abogados, corredores)
- Gestión de visitas comerciales: conectado con gmail y google calendar

Implementación: Definición y ejecución de los desarrollos end-to-end, desde el origen de los datos hasta su visualización en el front-end (tech: Host / Cobol, MongoDB, PowerCenter, Salesforce).
Gestión de cambio: documentación, formaciones, gestión de redes como G +.
Ayuda / Soporte al usuario final: Gestión de incidencias, resolución de consultas, soporte del sistema.

Resultados de la solución

- Nuevo modelo centralizado y colaborativo a través de una única herramienta
- Gestión centralizada de alertas y acciones comerciales
- Fácil control de la canalización agregada y disociada según los beneficios de Salesforce
- Cuadros de mando e informes
- Unificación de la metodología de trabajo de la RM independientemente del área bancaria, territorio, etc.
- Vista de cliente 360º (herramientas interconectadas, etc.)
- Maximización de la productividad de RM
- Ahorro de costes basado en la optimización de los procesos de aprovisionamiento
- Aumento del compromiso de clientes y empleados

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca

La compañía:

Entidad financiera andorrana situada entre las líderes del mercado

Leading country: Spain

Definición Modelo Gestión Comercial

Reto:
El cliente decidió evolucionar su actual modelo de gestión comercial, con la inclusión de nuevas herramientas de generación de ofertas comerciales y gestión de clientes (CRM).

Cómo se ha realizado
- Generación, a través de entrevistas con las diferentes áreas de negocio y stakeholders, de un listado de más de 80 pain points en el ámbito del CRM.
- Más de 40 requisitos analizados y ponderados, divididos en 7 áreas de análisis siguiendo el marco de Accenture.
- Análisis en profundidad de las soluciones del mercado que mejor se adaptan al modelo de futuro propuesto al cliente.
- Hoja de ruta global, basada en la consolidación de las iniciativas de las diferentes líneas de trabajo (67 en total), priorizándolas en función de las necesidades de negocio.

Resultados de la solución
- Análisis enfocado a sentar las bases para el despliegue y ejecución del nuevo modelo propuesto, tras un estudio y comparativa de las diferentes soluciones de mercado que mejor se adaptaban a los requerimientos del cliente.
- Visión unificada de todas las iniciativas necesarias en la primera fase para implementar la transformación digital de la empresa: modelo de arquitectura cloud, transformación digital de la experiencia de cliente, evolución del sistema de gestión comercial, transformación de los medios de pago, automatización de procesos...

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES NEGOCIO Y UX

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca

La compañía:

Entidad financiera española top 10 con más de 3 M de clientes

Leading country: Spain

Implementación de sistemática comercial

Reto:

- Un banco español ha requerido potenciar su segmento de empresas para ir transformando la entidad hacia una cultura B2B, solicitando:
- La creación de un modelo de gestión comercial para empresas adaptado a los rasgos distintivos del Banco que permita seguir la actividad en todo momento con el cliente, tanto de esfuerzos como de resultados.
- La definición de los skills, procesos y datos necesarios a utilizar en el modelo comercial
- El mapa de protocolos a aplicar
- La definición de soluciones y su adaptación al modelo para eficientar la ejecución del mismo

Cómo se ha realizado

Accenture llevó a cabo un análisis personalizado en colaboración con el cliente para adaptar y facilitar la ejecución del modelo de gestión comercial para empresas, aprovechando los conocimientos y experiencia empresarial de ambos. Tareas:

- Proyecto conjunto con el actual partner tecnológico del CRM para empresas del Banco
- Entrevistas con stakeholders involucrados en el modelo actual
- Workshops de trabajo con los stakeholders para transformar y adaptar conjuntamente a la realidad del Banco cada uno de los procesos involucrados
- Creación del modelo de gestión comercial para empresas y del mapa de protocolos
- Definición de herramientas/información de apoyo necesarias integradas en el CRM dePPJJ
- Workshops de co-creación y validación con los stakeholders
- Revisiones periódicas para asegurar que los productos entregados cumplen las expectativas del Banco

Resultados de la solución

Modelo eficaz soportado por soluciones que facilitan la ejecución del mismo

- Documento con las principales conclusiones del proyecto
- Modelo de sistemática comercial para empresas
- Mapa de protocolos con la descripción de los protocolos de actuación
- Diagrama de arquitectura técnico con los principales sistemas involucrados y adaptados al modelo de gestión comercial
- Documento con las principales fuentes de datos externas a utilizar en el modelo de gestión comercial de Banca Empresas
- Roadmap de implantación del modelo de gestión comercial para empresas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES SALESFORCE

Empresa española que opera en el sector financiero.

Sector: Banca


Leading country: España

FSC

Analytics

Implementación del CRM para todas sus líneas de negocio

El cliente necesita una herramienta única que proporcionara a los gestores de todas las líneas de negocio una comprensión completa del cliente. Esta herramienta ofrecería una visión integral de cada cliente, permitiendo a los gestores gestionar eficazmente sus relaciones.

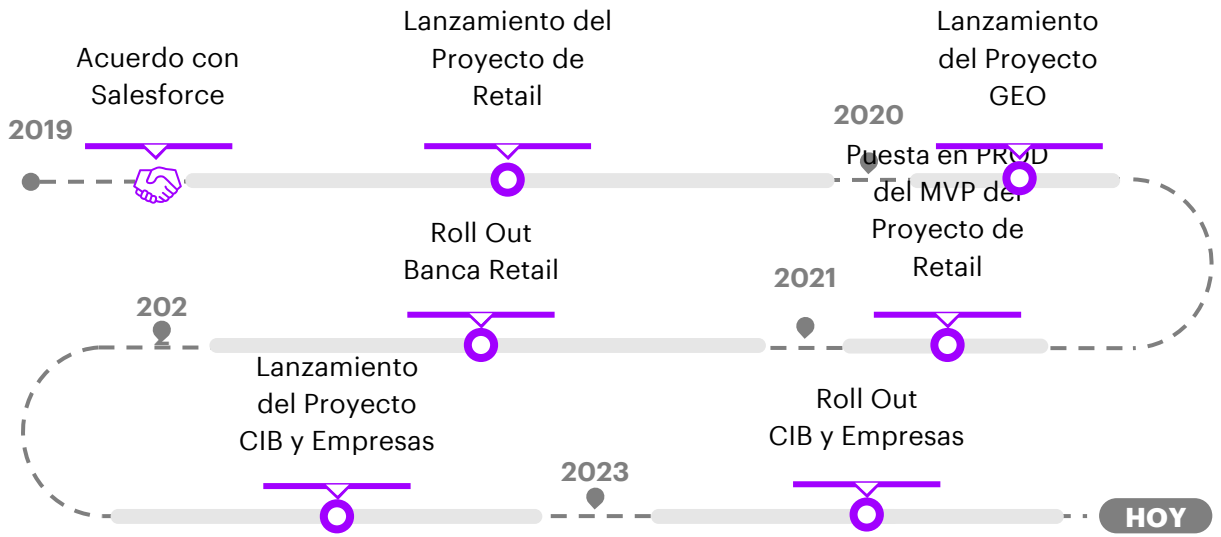

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES SALESFORCE

Empresa española que opera en el sector de seguros.


Sector: Seguros

Leading country: Francia y España

SERVICE CLOUD

Implementación del CRM para M&H y CLP

El cliente deseaba contar con un socio que le ayudara a alcanzar sus objetivos estratégicos en las áreas de “Service and Assistance (M&H) ” y “Credit and Life protection (CLP)”. Durante el proyecto se colaboro con el cliente en la puesta en marcha de un nuevo modelo operativo en las diferentes geografías.

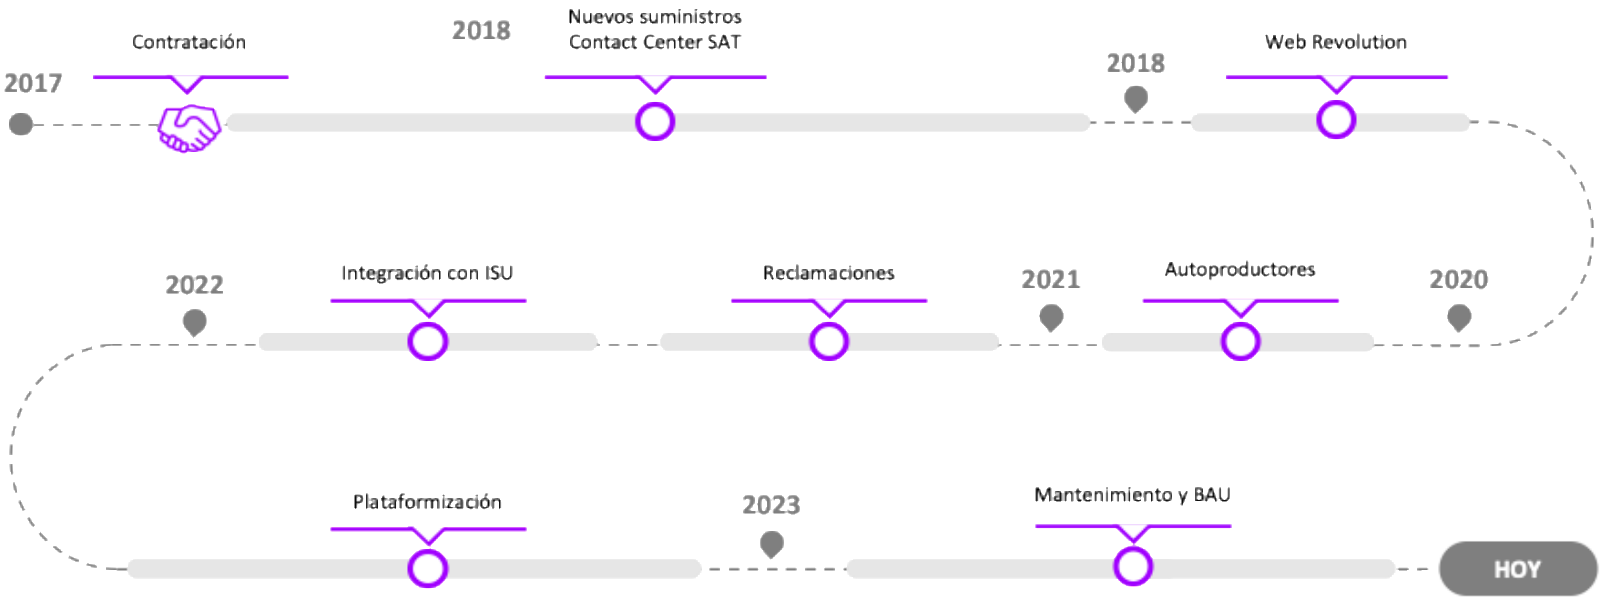

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES SALESFORCE


Sector: Energía

Leading country: España

SERVICE CLOUD

Implementación del CRM Empresa de Energía

Gestión E2E de solicitudes de suministro y generación: gestión comercial, elaboración de presupuestos y ofertas, facturación y gestión documental
70+ integraciones con 12 sistemas diferentes. 1.200+ usuarios internos. 1.500+ usuarios externos (contratistas, canales presenciales, ...)

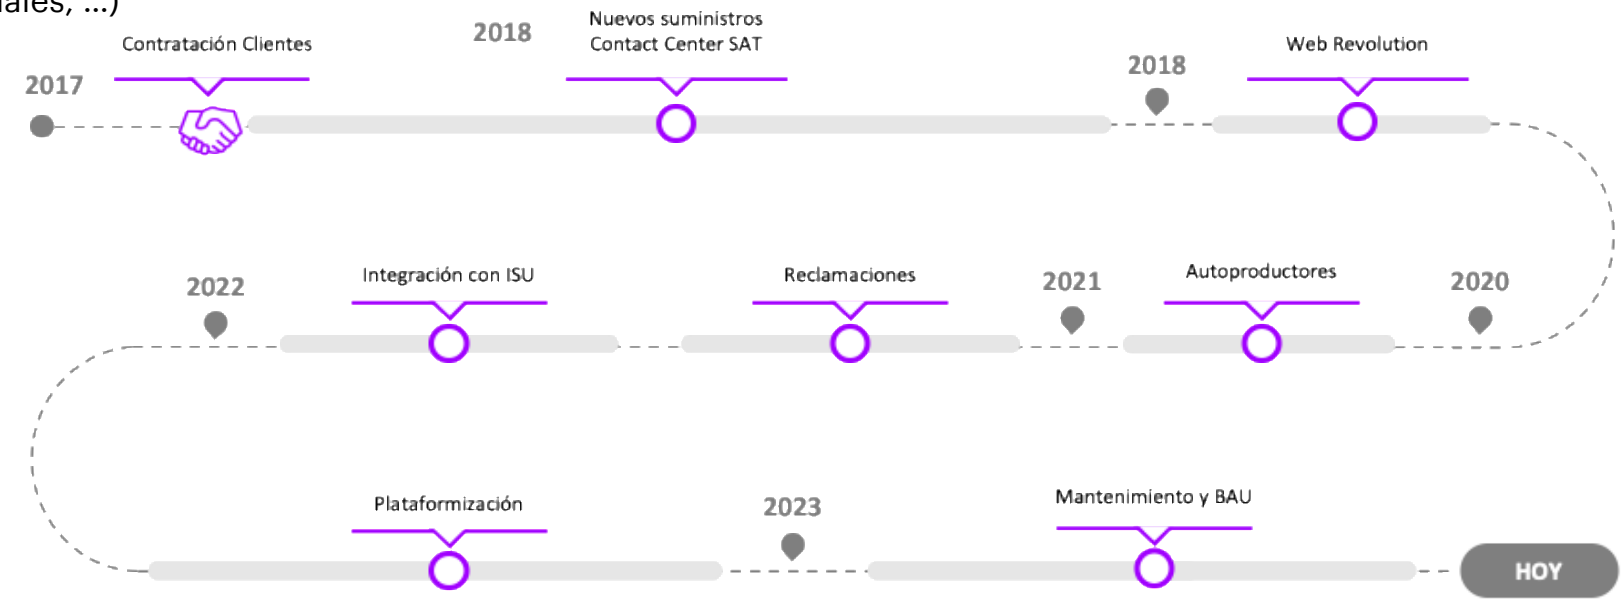

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa de telefonía

Sector: CMT (Empresa de telefonía)

Leading country: Spain

Modernización plataforma de integración.

El cliente buscaba modernizar su sistema comercial. MuleSoft se implementó como la plataforma central de integración, diseñada para conectar los sistemas existentes y facilitar la migración progresiva del middleware. Este enfoque permite un ecosistema de integración unificado, con mayor visibilidad, gobernanza y agilidad ante cambios de negocio, siendo un sistema clave para integrar el CRM y la vertical de Telco con los legacy

Beneficios clave:

- Centralización de la integración: MuleSoft actúa como columna vertebral, reduciendo silos y duplicidades.
- Continuidad operativa: migración gradual del middleware minimiza riesgos y garantiza servicios ininterrumpidos.
- Mayor agilidad: despliegues más rápidos de nuevas integraciones y adaptaciones ante cambios de alcance.
- Gobernanza y seguridad: controles estandarizados, trazabilidad y cumplimiento reforzado.
- Escalabilidad: plataforma preparada para futuras expansiones y migraciones adicionales.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa líder en el sector de la producción y comercialización de acero inoxidable

Sector: Products (Empresa de fabricación de acero)

Leading country: Spain

Modernización de plataforma de integración y E-commerce.

Contexto & Solución

En el marco del diseño de un portal de commerce y un e-shop, MuleSoft se implementó como la plataforma central para conectar productos, inventario, pagos, pedidos y CRM.

Esta solución garantiza una vista unificada del ecosistema digital en todos los canales.

Impacto & Beneficios

- Integración centralizada: Orquestación fluida entre ERP, OMS, pasarelas de pago, CRM y plataformas de marketing.
- Experiencia coherente: Sincronización total de catálogos, precios e inventario para el usuario final.
- Agilidad operativa: Despliegues rápidos de funcionalidades (checkout, promociones) sin rupturas.
- Gobernanza y seguridad: Controles estandarizados, auditoría y cumplimiento en la cadena online.
- Escalabilidad: Arquitectura resiliente, preparada para picos de demanda y crecimiento multicanal.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa de telefonía

Sector: CMT (Empresa de telefonía)

Leading country: Spain

Modernización a gran escala del middleware comercial.

Contexto & Solución.

Como respuesta a la necesidad de modernizar el sistema comercial, MuleSoft se desplegó para conectar los sistemas existentes e integrar el CRM y la vertical de Telco con los legacy.

Impacto & Beneficios.

- Centralización: MuleSoft actúa como columna vertebral unificada, eliminando silos y duplicidades.
- Continuidad operativa: La migración gradual minimizó riesgos, garantizando servicios ininterrumpidos.
- Mayor agilidad: Despliegues más rápidos y adaptación inmediata ante cambios de alcance.
- Gobernanza: Controles de seguridad estandarizados, cumplimiento reforzado y trazabilidad total.
- Alta escalabilidad: Plataforma preparada para absorber futuras expansiones y migraciones.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector energético.

Sector: Utilities (Empresa española que opera en el sector energético)

Leading country: Spain

Sincronización Core entre Salesforce y SAP.

Contexto & Solución

El proyecto garantiza el mantenimiento y evolución de las integraciones entre Salesforce y SAP a través de MuleSoft.

La plataforma unificada soporta la gestión integral de las distribuidoras, orquestando las conexiones entre ventas, pedidos, inventario y finanzas.

Impacto & Beneficios

- Visibilidad end-to-end: Control total y seguimiento transparente de las operaciones de distribución.
- Coherencia de datos: Sincronización perfecta y en tiempo real entre los entornos Salesforce y SAP.
- Agilidad de negocio: Capacidad de respuesta acelerada para adaptar los flujos a nuevos cambios del mercad

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector de movilidad.

Sector: Automotive (Empresa global que opera en el sector de la movilidad)

Leading country: Spain

API-Led Connectivity para Nuevos Modelos de Negocio

Contexto & Solución

Para habilitar un modelo de negocio totalmente nuevo basado en el alquiler de vehículos (Move, Move-Sharing, Store, Webstore), se diseñó desde cero una arquitectura API-Led.

El objetivo principal fue asegurar la máxima agilidad y la reutilización de código ante la incorporación de nuevos sistemas.

Impacto & Beneficios

- Interoperabilidad compleja: Integración nativa con Salesforce, SAP, Stripe, Astara Connect, Experian, Mobius y backend de App Web.
- Reutilización de activos: Arquitectura API-Led que acelera el desarrollo de nuevas interfaces.
- Time-to-Market: Rápida adaptación tecnológica para lanzar el modelo de renting de manera competitiva.
- Si quieres, también puedo pasarlo a Word, Markdown, JSON o formato editable de presentación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector energético.

Sector: Utilities (Eempresa multinacional que opera en el sector energético)

Leading country: Spain

Lanzamiento de Comercializadora y Arquitectura Avanzada

Contexto & Solución

La creación de una nueva comercializadora exigió interconectar todos los procesos operativos.

MuleSoft asumió el control total, gestionando desde la sincronización de canales hasta los complejos procesos de switching (cambio de comercializadora) directamente dentro de la plataforma.

Impacto & Beneficios

- Sincronización avanzada: Flujos de datos en tiempo real desarrollados con AWS Kinesis, S3 buckets y REST APIs.
- Interconexión total: Integración absoluta entre Salesforce, App Web/Móvil, SAP y sistemas legacy.
- Gestión de Switching: Centralización de la lógica de negocio para los cambios de comercializadora, asegurando fiabilidad regulatoria y operativa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. ARQUITECTURA

Empresa líder en el sector de la producción y comercialización de acero inoxidable

Sector: Products (Empresa de fabricación de acero)

Leading country: Spain

Modernización plataforma de integración mediante Mulesoft para la conexión con el resto sistemas.

En el marco del diseño de un portal de commerce y un eshop, MuleSoft se propone como la plataforma central de integración para conectar sistemas de producto, inventario, pagos, pedidos y CRM. La implementación facilita una vista unificada del ecosistema digital, acelera la entrega de funcionalidades y garantiza una experiencia de cliente consistente en todos los canales.
Beneficios clave:

- Integración centralizada: MuleSoft orquesta conexiones entre ERP, OMS, pasarelas de pago, CRM y plataformas de marketing.
- Experiencia del usuario coherente: datos y procesos sincronizados aseguran catálogos, precios y inventario consistentes.
- Agilidad operativa: despliegues rápidos de nuevas funcionalidades (checkout, promociones, recomendaciones) sin rupturas.
- Gobernanza y seguridad: controles estandarizados, auditoría y cumplimiento en toda la cadena de venta online.
- Escalabilidad y resiliencia: arquitectura preparada para picos de demanda y crecimiento multicanal.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector energético.

Sector: Utilities (Empresa española que opera en el sector energético)

Leading country: Spain

Modernización plataforma de integración.

El mantenimiento de integraciones entre Salesforce y SAP, gestionado a través de MuleSoft, soporta la gestión integral de distribuidoras al conectar ventas, pedidos, inventario y finanzas. MuleSoft actúa como la plataforma unificada de integración, garantizando visibilidad end-to-end, coherencia de datos y agilidad para adaptarse a cambios del negocio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector de movilidad.

Sector: Automotive (Empresa global que opera en el sector de la movilidad)

Leading country: Spain

Integración de nuevos modelos de negocio en la compañía para el renting de vehículos

Adaptación de su modelo de negocio a uno totalmente nuevo con la capacidad de alquiler de vehículos. Desde su inicio se planteo una arquitectura para la reutilización de código con nuevos sistemas que surgieran, creando un API-Led connectivity acorde a las necesidades. Se realizaron integraciones con diferentes sistemas: Salesforce, SAP, Stripe, app web (backend), Astara Connect, Experian, Mobius,...

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. ARQUITECTURA

Empresa española que opera en el sector energético

Sector: Utilities (Eempresa multinacional que opera en el sector energético)

Leading country: Spain

Proceso completo para una nueva comercializadora e interconexión entre Salesforce, SAP y otros sistemas legacy

El cliente creó una nueva comercializadora lo que implicó la necesidad de crear integraciones en su plataforma de Mulesoft para todos los procesos de Salesforce, App Web/Móvil y SAP. Los procesos de switching se realizaron con MuleSoft por lo que cualquier cambio de comercializadora era gestionado dentro de la plataforma.
La sincronización de datos entre SAP, Salesforce y App web se ha desarrollado con MuleSoft a través con AWS Kinesis + S3 bucket's + Rest APIs.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES GESTIÓN DEL CAMBIO

Empresa española que opera en el sector de financiero.

Sector: Bancario

Leading country: Spain

Gestión del Cambio implantación de CRM

Accenture ha ayudado a gestionar el cambio de una entidad financiera durante la implantación de CRM.

Durante la implantación de la solución, Accenture ha dado soporte aportando una experiencia de transformación cuidada facilitando de esta manera la transición para lograr la mejor experiencia de usuario y eficiencia en la interacción con los clientes.

A través del diseño y desarrollo de una estrategia de Gestión del cambio con diversos componentes y especial foco en el programa formativo: contenidos on-line, guías rápidas, formación a formadores, casos prácticos, manuales de uso, etc.



Ilustrativo: Manual de participante



Ilustrativo: Guías rápidas



Ilustrativo: Casos prácticos



Ilustrativo: Plan de formación y píldoras formativas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

¿POR QUÉ ACCENTURE?. CREDENCIALES GESTIÓN DEL CAMBIO

Empresa española que opera en el sector de financiero.

Sector: Bancario


Leading country: Spain

Gestión del Cambio implantación de CRM

Accenture ha ayudado a gestionar el cambio del CRM con más de 15 años de antigüedad por la nueva solución de Salesforce para toda la red comercial, CIB y Empresas.

Durante la implantación de la solución, Accenture ha dado soporte aportando su amplia experiencia en formación para lograr la mejor experiencia de usuario y eficiencia en la interacción con los clientes.

A través del diseño y desarrollo de una estrategia de Gestión del cambio con especial foco en el programa formativo: formación a formadores, formación online, sesiones informativas masivas, materiales de autoestudio(simuladores, vídeos demos, guías interactivas, quiz simuladores...)




Ilustrativo: Vídeos demo



Ilustrativo: Curso interactivo




Ilustrativo: Comunicaciones



Ilustrativo: Simuladores

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Anexo 2. Detalle de CVs

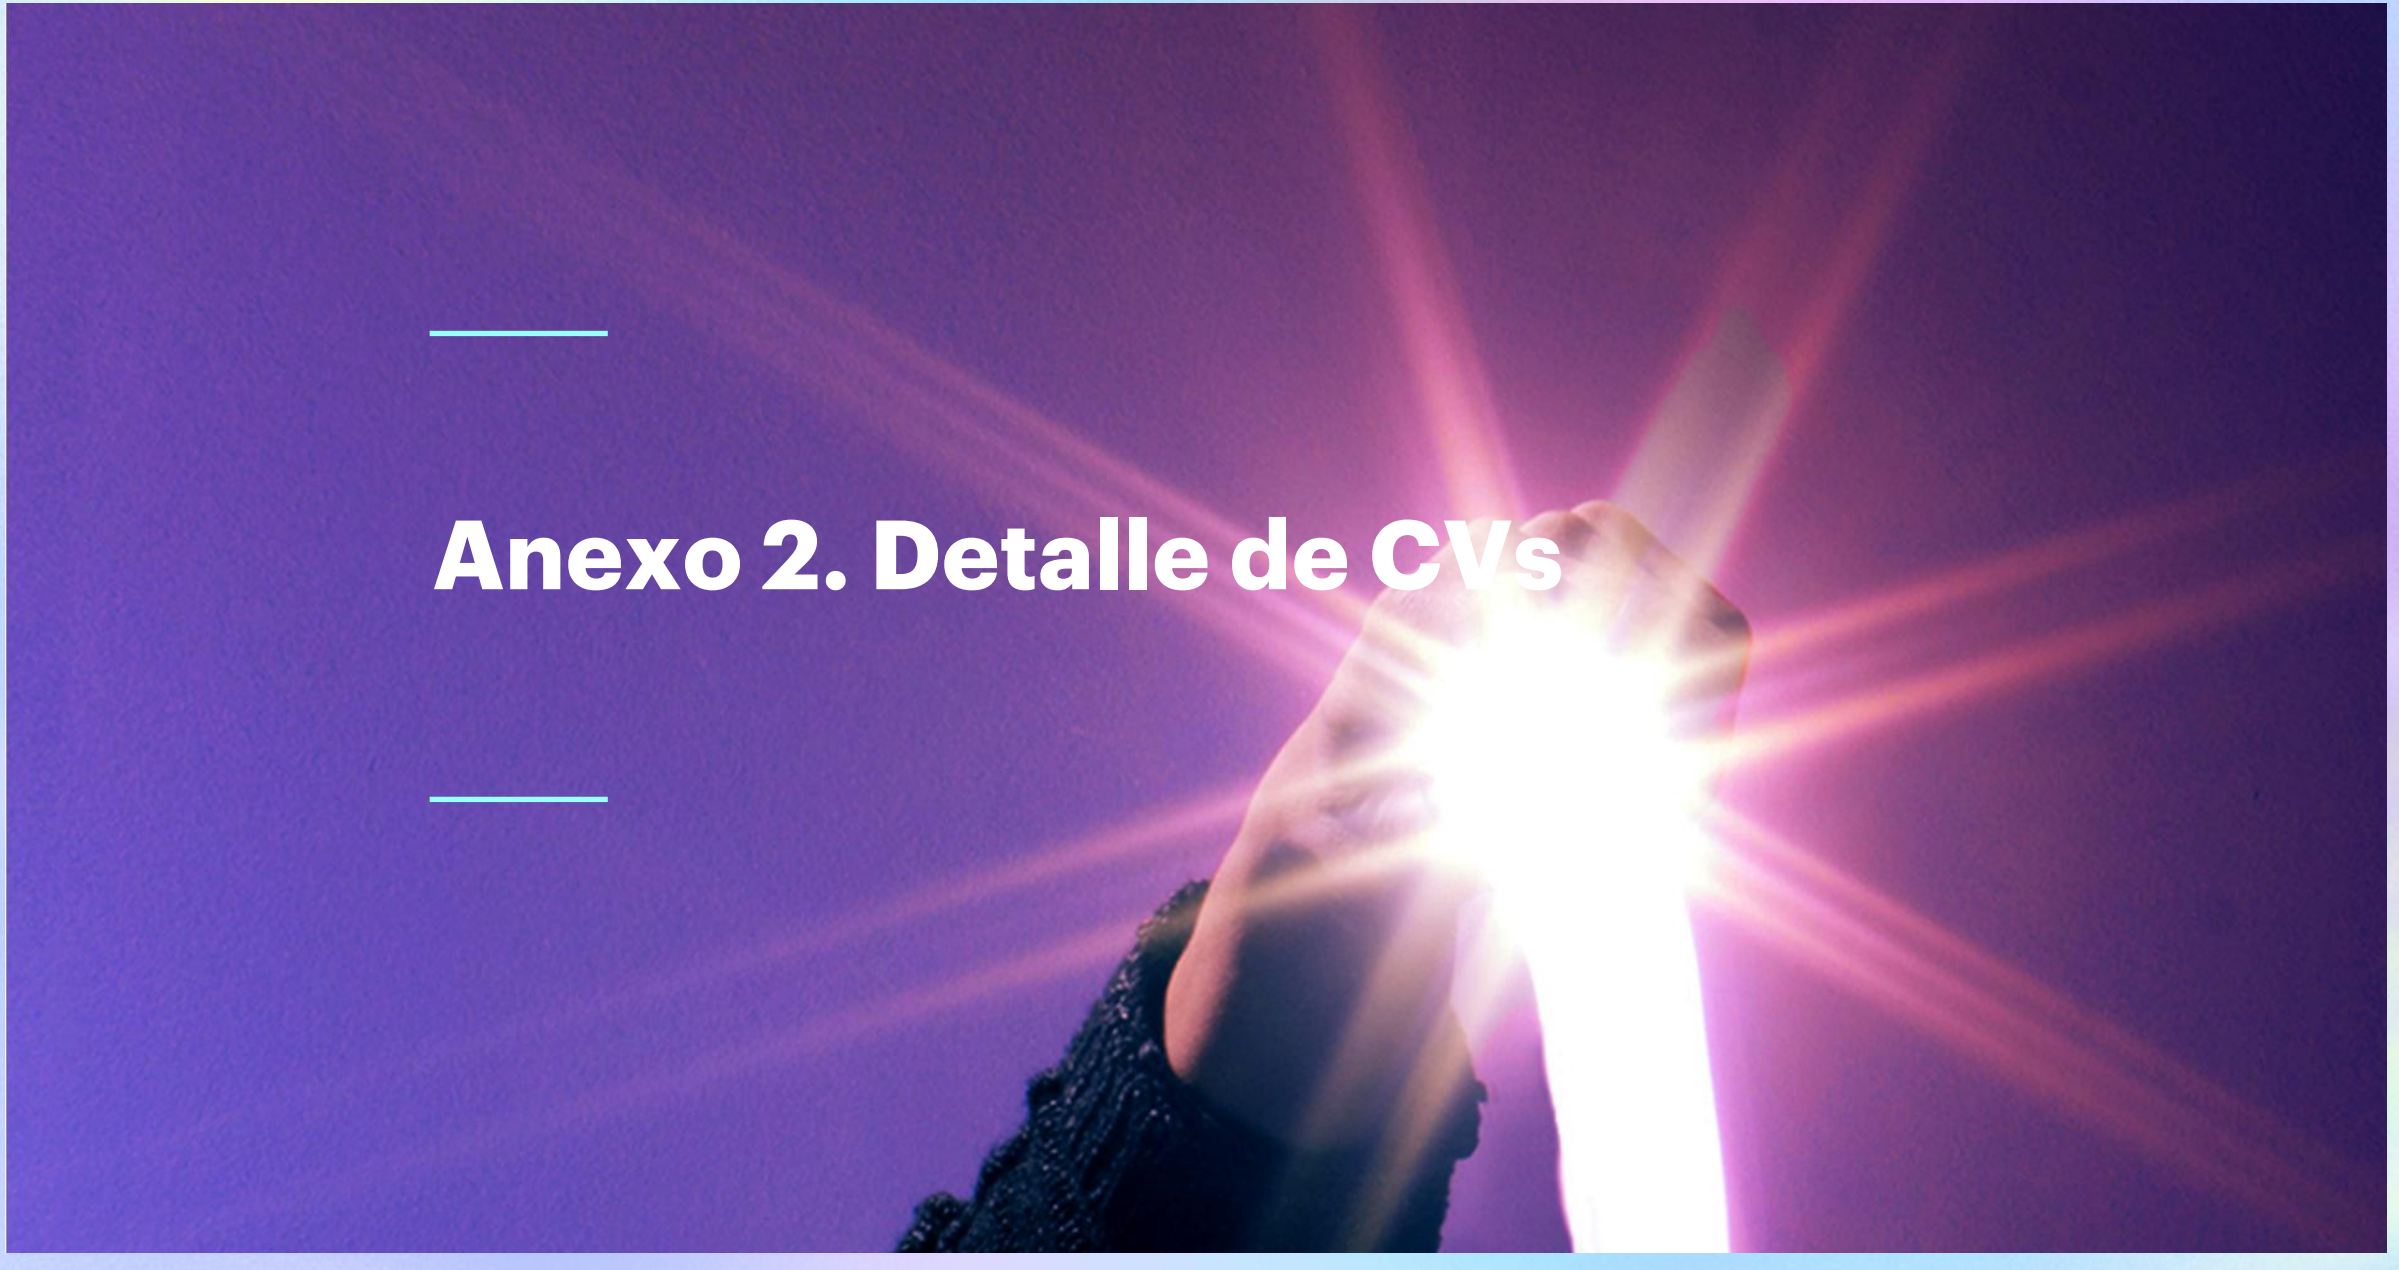

Propuesta de CVs

A continuación, se muestra el historial profesional de los miembros o tipos de perfiles que se proponen para el equipo de trabajo.

Por razones de confidencialidad, los historiales profesionales mostrados no incluyen información detallada que permita identificar a los clientes en los que ha trabajado cada uno de los candidatos ni el nombre de los proyectos. No obstante, Accenture se pone a disposición de LDA para aclarar o ampliar cualquier información que sea requerida.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Negocio y UX

DIRECTOR
Song Service – Advisory Lead

Perfil:

Director en el ámbito de Servicios Financieros y transformación de TI

Más de 20 años de experiencia en proyectos de tecnología

Cualificación académica:

- Ingeniero en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca
- Instituto de Empresa. PDEM. Programa de Desarrollo Ejecutivo en Management
- PDL. Programa Despliegue Liderazgo. ISDI. Universidad Francisco Vitoria

Experiencia relevante

- **Banco Español.** Definición nueva arquitectura digital (API management, big data, backend digital, customer engagement services, front-end)
- **Banco Español.** Definición nuevo sistema de business intelligence tanto en su componente funcional como tecnológica. Definición del nuevo modelo funcional y tecnológico para el incremento del ratio de mejora en la actividad comercial a través de un sistema de distribución basado en los paradigmas de big-data y Real Time
- **Banco Español.** Definición Datamart comercial
- **Banco Español.** Desarrollo de Sistema de Gestión Comercial Multicanal
- **Banco Español.** Segmentación de clientes y seguimiento de carteras.
- **Grupo Financiero Español.** Responsable de la mesa de Tecnología para el PDP de la integración
- **Grupo Financiero Español.** Responsable de la mesa de Tecnología en el estudio comparativo de la función de TI previo a la integración de las entidades
- **Caja de Ahorros. Estrategia IT.** Evolución de la plataforma de distribución multicanal hacia un enfoque de orientación a procesos
- **Caja de ahorros.** Desarrollo de plataforma de distribución, de propósito general, orientada al servicio (SOA)

Industrias

- Servicios financieros

Áreas de conocimiento

- Definición estrategias multicanal
- Arquitectura digital
- Entornos técnicos de sistemas bancarios
- Banca comercial multicanal: CRM

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Negocio y UX

MANAGER
Song Service

Habilidades:

- Financial Services
- Sstemas informacionales: DWH
- Gestión de equipos
- Demand management
- Transformación digital

Certificaciones

- Gen AI Agent Creation
- Uso seguro de IA Generativa

Experiencia en industrias: Seguros y Banca

Experiencia relevante

Entidad financiera - Data Solutions (Octubre 2022- actualidad)

- Gestión de la demanda informacional de las áreas de Banca comercial y Operaciones (DAC) para dar respuesta a las necesidades de Negocio:
  - Gestión y coordinación del equipo de Data Solutions
  - Recopilación de los requerimientos de usuario relativos a inteligencia de cliente, segmentación y campañas
  - Participación en el análisis y definición de KPIs e indicadores para el seguimiento de los objetivos de programas, proyectos, desarrollo de negocio, etc.
  - Gestión de la planificación y del presupuesto de los equipos de desarrollo
  - Seguimiento de las distintas fases del proyecto hasta su cierre

Entidad financiera - Implantación CRM Banca Comercial, Gestión Activa, Oficina Directa (Enero 2018 – Julio 2023)

- Participación en el análisis e implantación de la nueva herramienta de gestión comercial. Integración de la herramienta en el ecosistema tecnológico del banco:
  - Análisis de procesos de negocio para la mejora de gestión comercial
  - Identificación de requerimientos y definición funcional de la solución acorde con las necesidades presentadas
  - Supervisión y gestión de las distintas fases de implementación de la herramienta:
- Definición de la gestión del cambio para la adaptación de los usuarios a las nuevas funcionalidades de CRM:
  - Diseño y ejecución de los materiales formativos para el lanzamiento de la nueva herramienta digital
  - Plan de comunicación digital y actividades
- Definición del modelo de datos de las herramientas comerciales implantadas
- Gestión y coordinación de los distintos equipos internos
- Control de los incurridos y forecast del equipo, realización de seguimiento de las distintas iniciativas, etc.
- Realización de workshops con negocio para la detección de pain points en las herramientas comerciales y definición de propuestas de mejora.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Negocio y UX

GERENTE CONSULTORÍA
Song Service

Cualificación académica:

- Licenciado en Admón. y Dirección de empresas por la UAM.

Salesforce Certified Associate



Perfil:

Gerente con más de 11 años de experiencia, especializado en el diseño y evaluación de soluciones, con experiencia tanto en la parte técnica como funcional para proveer estrategias digitales con foco en el cliente y apoyadas en el dato.

Experiencia relevante

OBSERVATORIO CANALES DIGITAL BANCA EMPRESAS | Sector banca |

Liderando el observatorio de canales digitales para banca empresas

IT LEAD VISIÓN 360 DEL CLIENTE | Sector asegurador |

Gestión de la vertiente técnica del proyecto de implantación de la visión 360 del cliente en la compañía
- Coordinación de los diferentes equipos de desarrollo involucrados.
- Gestión de dependencias con otras iniciativas e identificación de riesgos.
- Control del calendario del proyecto y principales hitos.
- Reporte a dirección del estado del proyecto.

DEFINICIÓN DE NUEVO MODELO CRM | Sector banca |

Diseño funcional y de experiencia para las fichas de cliente particular y empresas, así como la visión gestor del CRM usado por todas las entidades del grupo, arquitecturización visión 360 cliente y selección herramienta marketing automation
- Gestión de 3 líneas de proyecto y relación con el cliente.
- Diseño visual y funcional de fichas de cliente, particulares y empresas, y vista gestor.
- Definición modelo gestión comercial y comparativa de soluciones.
- Apoyo a la definición conceptual y tecnológica de la arquitectura de visión cliente 360.

Industrias

- Servicios financieros
- Asegurador

Áreas de conocimiento

- CRM
- Bechmarking
- Adobe Campaign / SFMC
- Marketing automation
- Omnicanalidad
- Estrategia del dato
- Metodologías ágiles
- PFM/BFM

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Negocio y UX

CONSULTOR CRM
Song Service

Habilidades:

- Experiencia en alineación global de CRM.
- Participación en proyectos de transformación digital de plataformas bancarias.
- Experiencia trabajando con metodologías Agile, garantizando flexibilidad y adaptabilidad en la ejecución de proyectos.

Certificaciones

- Gen AI Agent Creation
- Uso seguro de IA Generativa

Experiencia en industrias: Seguros y Banca

Experiencia relevante

Análisis Funcional – Consultor CRM – Aseguradora (01/26 – 03/26)

Evaluación estratégica para la selección de proveedor de CRM adecuado para la migración tecnológica desde un sistema desarrollado a medida hacia un CRM de terceros. Tareas desempeñadas:

- Análisis AS-IS de la plataforma CRM actual y elaboración de un mapa funcional de procesos de las operaciones del negocio.
- Definición de requisitos funcionales para el modelo TO-BE.
- Realización de workshops semanales de iteración con el cliente.

Análisis Funcional – Consultor CRM – Banco Global (07/25 - 12/25)

Fase de discovery para la estandarización global del modelo de gestión y gobernanza, así como de la herramienta CRM utilizada como plataforma base de soporte. Tareas desempeñadas:

- Liderazgo de la fase de discovery del proyecto, documentando los procesos AS-IS del modelo de gestión y gobernanza y todos los módulos de la herramienta CRM.
- Ejecución de análisis transversales entre geografías objetivo y geografías benchmark para identificar brechas y proponer soluciones.

Análisis Funcional – Consultor de Negocio para desarrollo de producto financiero – Banco Global (09/24 - 07/25)

Definición e implementación de un producto financiero multifinalidad de corto plazo para PYMES, incluyendo el establecimiento de criterios de elegibilidad y validación, controles internos y requisitos, así como procesos end-to-end. Tareas desempeñadas:

- Definición de los criterios de negocio para la creación del producto financiero.
- Contribución en la definición del front-end de la plataforma y de la lógica de negocio, así como del proceso de contratación del producto.

Análisis Funcional – Transformación digital– Banco Global (05/24 - 09/25)

Transformación digital de la zona de avales del banco. Tareas desempeñadas:

- Análisis y levantamiento de AS IS del estado actual de la zona de avales.
- Ejecución de pruebas funcionales de calidad sobre el entregable final.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Negocio y UX

CONSULTOR CRM
Song Service

Cualificación académica:

- Grado en Administración y Dirección de Empresas UC3M
- Grado en Ingeniería Informática UC3M
- Formación en CRM Dynamics
- Conocimiento en CSS, HTML5 y Javascript
- Conocimiento en Java, C# y SQL

Perfil:

Consultor del área de Financial Services, con más de 2 años de experiencia en arquitectura funcional e implantación de proyectos de tecnología (Área CRM)

Experiencia relevante

BANCO DIGITAL. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES EN CANALES ASISTIDOS

Análisis de demandas de negocio y definición funcional y técnica de requisitos para los equipos de tecnología.
Supervisión y validación de la implantación de los evolutivos definidos con distintos proveedores. Formación y desarrollo de material informativo para los gestores.
Soporte y validación en la definición de procesos operativos en canales asistidos.

COMPAÑÍA ASEGURADORA. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DYNAMICS CRM

Desarrollo de plugins y funcionalidades empleando C# y Javascript.
Resolución de incidencias.
Configuración del CRM y creación de entidades necesarias.

BANCO DIGITAL. ARQUITECTURA Y APLICACIONES BACKEND

Implantación de herramienta de integración continua para el desarrollo de aplicaciones de backend.
Resolución de incidencias y redefinición de aplicaciones.
Desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones.

Industrias

- Servicios financieros
- Asegurador

Áreas de conocimiento

- CRM
- Bechmarking
- Dynamics365
- Metodologías ágiles

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Gestión

Responsable programa
Technology Consulting Principal Director

Habilidades:

- Más de diecinueve años de experiencia en Gestión de proyectos tecnológicos.
- Experiencia de más de doce años en proyectos de Salesforce. Amplia experiencia funcional en el ecosistema Salesforce
- Implementación de Sales Cloud / Service Cloud, Finanacial Service Cloud, CRM Analytics
- Experiencia en metodología Agile
- Certificaciones
    - Salesforce Certified Administrator
- Experiencia en industrias: Servicios financieros, Banca, Seguros, Farmacéutica

Experiencia relevante

Responsables de grandes proyectos de transformación en el sector financiero y asegurador (2024-Actualidad)
Responsable de Programa de Transformación del área comercial

Responsable de proyecto. Sector Banca (2022-2024)
Responsable de Programa de Transformación del área comercial para Pymes
Implantación de una solución Salesforce basada en Financial service cloud

SME. Sector asegurador (2022-2023)
Participación en proyectos Salesforce como SME para la implantación de las mejores soluciones en Salesforce
Proyectos Salesforce basada en Sales cloud, Service cloud y CRM analytics

Delivery lead. Sector Banca (2022-2023)
Responsable de Programa de Transformación del área comercial para Pymes

Delivery lead. Sector Banca (2019-2022)
Responsable de Programa de Transformación del área comercial de Banca Retail, Empresas y CIB
Coordinación tecnológica de proyectos para la fusión de entidades financieras
Coordinación de equipo involucrados en el proyecto (Salesforce, integración,...). Usuarios involucrados: 32.000

Project Manager Sector Banca (2018).
Desarrollo y evolución del proyecto de Banca Retail. Usuarios involucrados: 15.000
Implantación de una solución Salesforce basada en Financial service cloud

Project Manager Sector Energía (2017).
Desarrollo y evolución de proyectos para las áreas de atención al cliente y gestión de campo.
Responsable de la implantación de Service Cloud dentro de un programa global de experiencia de Cliente incluyendo el diseño y despliegue de una solución multicanal (chat, formulario web,...)

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Implementación

Responsable técnico

Custom Software Engineering Assoc Mgr

Habilidades:

- Implementación de Sales Cloud / Service Cloud, Finanacial Service Cloud, CSAT Surveys
- Experiencia en el uso de sistemas de gestión de proyectos como JIRA y Rally
- Experiencia en el uso de herramienta de gestión de versiones como Copado o GIT
- Certificaciones
  - Salesforce Certified Administrator
  - Salesforce Certified Platform App Builder
  - Salesforce Certified Data Cloud Consultant
- Experiencia en industrias: Banca, Seguros, Farmacéutica

Experiencia relevante

Seguros (04/2025-06/2025) – Diseño Funcional proceso de retención - service cloud *(Salesforce functional consultant)*

Análisis y definición de requisitos a alto nivel del proceso de retención, definición del modelo de solución en Salesforce para la herramienta de retención de acuerdo a los requerimientos

Definición de roadmap y estimaciones para la implementación de la solución.

Banca (03/2022-03/2025) - Financial service cloud *(functional team lead)*

Análisis de requisitos y diseño de soluciones, gestión del equipo técnico de desarrollo de pocs durante el análisis y de las HU durante la implementación.

Revisión y pruebas complementarias de funcionalidades durante el proceso de desarrollo y despliegue

Soporte en la implementación de requerimientos de seguridad y acceso a registros en Salesforce

Gestión del equipo técnico y del equipo de IT durante los periodos de prueba (SIT, UAT, regresión)

Soporte de IT y soporte al cliente durante todo el ciclo de vida un requerimiento

Instalación, soporte y evolución de paquetes manejados con sus proveedores para acoplarlo a la funcionalidad

H&ps (11/2021-3/2022) - sales cloud *(senior functional developer)*

Análisis de requisitos y diseño de soluciones, desarrollo e implementación de configuraciones de sales cloud y definiciones de seguridad. Gestión de los periodos de test durante la implementación de funcionalidades. Responsable del release management

Banca (11/2017-03/2021) - Service cloud + Email service *(senior functional developer)*

Análisis de requisitos y diseño de soluciones, gestión del equipo técnico encargado de desarrollar las historias de usuario.

Desarrollo e implementación de configuraciones de service cloud y definiciones de seguridad en Salesforce

Revisión del UAT con los usuarios finales. Análisis, prueba y generación de mejoras y procedimientos para crear y desarrollar el proceso release management. Soporte al cliente durante la fase posterior al despliegue.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs – Implementación

Arquitecto Salesforce

Custom Software Engineering Assoc Mgr

Habilidades:

- Implementación de Sales Cloud / Service Cloud y Marketing Cloud
- Experiencia transversal de arquitectura de software en materia de:
    - Integraciones y flujos de seguridad.
    - Modelado de datos, seguridad comunicaciones y dominios (DNS) y herramientas: DevOps, Agile, GIT, SFDX CLI y otros.
- Certificaciones
    - Salesforce Certified Administrator
    - Salesforce Certified Platform App Builder
    - Salesforce Certified AI Associate
    - Salesforce Certified Agentforce Specialist
- Experiencia en industrias: CMT, Aeronáutica, Seguros, Banca

Experiencia relevante

Diseño Funcional – Salesforce Technical Architect – Aseguradora (04/25 – 05/25)

Participación en el diseño funcional del proceso de retención de clientes/pólizas en Salesforce. Análisis del modelo actual (Oportunidades y Casos) y definición de una solución centralizada para la gestión de retención, argumentarios y palancas comerciales. Evaluación técnica de alternativas para el motor de reglas (Salesforce, Heroku, plataforma externa) y mapeo de interacciones entre sistemas (Salesforce, Data Lake en Azure, ...). Interlocución con negocio e IT para alinear requerimientos funcionales con la solución tecnológica propuesta.

Soporte y Proyecto de migración – Technical Lead - Entidad financiera (06/24 – 03/25)

Liderazgo técnico en el segmento de Eventos sobre Salesforce, con foco en mantenimiento correctivo/evolutivo y en la migración a Adobe Experience Platform (CDP). Responsable del análisis funcional, diseño técnico y gestión del pipeline de APIs (alta y despliegue) según el marco corporativo. Interlocutor clave con áreas de negocio, IT, terceros y el Centro de encia (CoE) de Salesforce, facilitando la validación de soluciones, definición de acuerdos de integración y seguimiento continuo con stakeholders estratégicos. Apoyo adicional en la resolución de incidencias en el entorno Salesforce Retail.

Plataforma comercial CIB - Soporte a Gestión del Servicio - Banca (10/22 – 11/23)

Responsable del soporte y supervisión del ecosistema Salesforce en un entorno bancario CIB. Coordinación de servicios en una arquitectura multiplataforma (Salesforce, MuleSoft, Heroku, Marketing Cloud). Participación en proyectos clave como la integración SSO con Azure, securización de canales de email y automatización DevOps con GitHub. Colaboración estrecha con equipos CISO y CTO para validar soluciones de seguridad y arquitectura.

Tecnologías: Salesforce Sales Cloud, Marketing Cloud, Eventogy, JIRA/Confluence

Proyecto de Retenciones – Technical Lead - Aseguradora (04/22 – 09/22)

Coordinación y asesoramiento tanto del equipo local como ATC en materia de revisión del diseño de la solución y Release Management (DevOps).

Front directo con el cliente para estratégica técnica y consultoría funcional.

Participó activamente en la transición de despliegues pseudo-manuales vía SFDX hacia el modelo DevOps de Azure del cliente para el equipo.

Tecnologías: Salesforce Service Cloud, GIT, SFDX, Postman

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - Arquitectura

Custom Software Engineering Assoc Mgr

Arquitectura

Habilidades:

- Amplia experiencia en arquitectura TIBCO.
- Experiencia en arquitecturas basadas en API de MuleSoft.
- Amplia experiencia en la implementación de integraciones SOA.
- Experiencia con plataformas de gestión de API y MuleSoft API Management.
- Experiencia en el diseño de arquitecturas orientadas a eventos: JMS, MQ, Kafka.

Experiencia relevante

Multinacional agroalimentaria (Arquitecto de Integración de API): (Inicio: octubre de 2022 - actualidad)
Diseño, desarrollo e implementación de iniciativas de integración para integrar diversos sistemas de Cliente (Salesforce, SAP, Adobe e innumerables sistemas heredados). La implementación de la solución se basa en el diseño de APIS para cada país, con el fin de integrar la información de sus propios sistemas heredados, generalmente con Salesforce.
La integración se realiza a través de la API de Mulesoft, garantizando siempre la reutilización, el uso de las mejores prácticas y la integración continua.

Compañía global de salud y farmacéutica (Arquitecto de Integración de API en Accenture): (Inicio: octubre de 2019 - enero de 2022)
Diseño e implementación de una solución centralizada global para la cadena de suministro del cliente. La implementación de la solución se basa en el diseño de APIS para cada país, con el fin de integrar la información de sus propios sistemas heredados hacia y desde Kinaxis.
Integración con el núcleo heredado y el proceso BPM. Soluciones orientadas al rendimiento e implementación con Jenkins/Llama/Bison para automatizar las implementaciones en entornos de desarrollo, preproducción y producción.

Banco Español (Arquitecto de Integración de APIs en Accenture): (Inicio: septiembre de 2018 – septiembre de 2019)
Diseño e implementación de una solución global centralizada para toda la organización de RR. HH. del cliente. La implementación de la solución se basa en el diseño de APIS para cada país, que pueden procesar en sus propios sistemas la información que proviene de Workday.
Cada API debía estar alineada con la información que proviene de la organización central, por lo que el diseño de las APIs y su gobernanza fue una parte esencial del proyecto..

Compañía española de telecomunicaciones (Arquitecto de Integración de APIs en Accenture): (Inicio: enero de 2013 – septiembre de 2018)
Definición de la arquitectura base de Tibco, tanto lógica como conceptual. Diseño y construcción de APIs en Tibco Business Works, integración con el núcleo heredado y el proceso BPM. Implementación con Jenkins para automatizar las implementaciones en entornos de desarrollo, preproducción y producción.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - Arquitectura

Manager
Arquitectura

Habilidades:

- Gerente con experiencia en tecnologías de integración de arquitectura SOA de Accenture.
- Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos tecnológicos, 13 de ellos en proyectos SOA y BPM.
- Amplia experiencia práctica en el diseño y desarrollo de soluciones de middleware con Mulesoft, TIBCO, WSO2 y Java.
- Experiencia en diversas tecnologías como J2EE, Spring, Hibernate, SQL y Maven.
- Utiliza herramientas ETS para proyectos de TI como Slack, Teams, Zoom, Jira, Trello, Github, Gitlab, Bitbucker, Azure Devops, Confluence, Remedy, ServiceNow, Prometheus, Grafana, Kibana y Splunk.

Experiencia relevante

Productos: Gerente (2024, actualmente)
Mulesoft, Mulesoft API Manager,
Lideré la implementación de Mulesoft como plataforma de integración clave para conectar diversos sistemas empresariales, incluyendo Salesforce, SAP y sistemas heredados. Este proyecto se centró en la integración basada en eventos mediante tecnologías avanzadas como Solace, RabbitMQ y Kafka, garantizando una comunicación fluida y eficiente entre sistemas. Mi función incluyó la planificación estratégica, la ejecución técnica y la supervisión de todo el proceso de integración, garantizando que cada componente funcionara de forma cohesionada para mejorar la operatividad y la eficiencia de la organización.

Utilidades: Arquitecto/Arquitecto Técnico Líder de Equipo (2021, actualmente)
Mulesoft, Mulesoft API Manager, Mulesoft Runtime Fabric
Desarrollo de componentes de integración en el modelo de API de Led para una importante empresa nacional de comercialización de energía..

Servicios públicos: Líder del equipo de arquitectos/arquitectos técnicos (2019, 2021)
WSO2 EI, WSO2 API Manager
Gestión del equipo de desarrollo de API Manager y ESB para una empresa de servicios públicos de comercialización de energía en la Península Ibérica.

Banco: Líder del equipo de arquitectos técnicos (2018, 2019)
TIBCO BWCE6, Jenkins, Maven, OpenShift, SFTP

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - Arquitectura

System Developer Analyst
Arquitectura

Habilidades:

- Anypoint Studio, Anypoint Platform, DataWeave Kibana, KubeProxy, DynaTrace, Confluence, BitBucket, Bamboo, SourceTree, Postman, Amazon S3, Maven, Git, SVN, SQL, Workbench, DBeaver y Microsoft Office.
- TIBCO MFT, TIBCO EMS, TIBCO BusinessWorks 6, XML/XPATH, servicios web basados en SOAP, Rest y JMS, SOAP/Rest, SoapUI, Gems, Safeguard,
- Java 8, Primefaces, Richfaces, Hibernate, Maven, JSF, Junit, JSP, JavaFX,
- Spring MVC, SVN, Eclipse, Apache Tomcat, JDBC y Android. Experiencia en tecnología web:
- Javascript, PHP, AngularJS, JQuery, JSON, Ajax, HTML5, CSS3, Bootstrap

Experiencia relevante

Desarrollador de Mulesoft. Desde diciembre de 2020
Diversas responsabilidades relacionadas con el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de integraciones mediante la plataforma MuleSoft. Facilita la conectividad y la automatización de procesos, garantizando la comunicación eficaz y eficiente entre diferentes sistemas y aplicaciones.

Desarrollador de Tibco MFT. Marzo de 2018 – Marzo de 2020
Especialización en el uso de herramientas y tecnologías TIBCO para la integración de sistemas, el desarrollo de servicios y API, la gestión de procesos, el análisis de servicios y la monitorización de datos en tiempo real.

Desarrollador de Java. Marzo de 2017 – Junio de 2017
Desempeño diversas funciones, principalmente tareas de mantenimiento. Desarrollo y mantenimiento, adquiriendo experiencia práctica para aplicar mis conocimientos en el equipo de desarrollo.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - Arquitectura

System Developer Analyst
Arquitectura

Habilidades:

- Plataforma de integración SAP PI/PO
- Plataforma Mule ESB (Cloudhub + local)
- Desarrollo de especificaciones de API (RAML; Swagger, YAML, etc.)
- Mejores prácticas de integración y patrones de diseño relacionados. Experiencia en metodologías ágiles.
- Experiencia con Anypoint Studio, Design Center, Anypoint Exchange, Dataweave, Anypoint Platform, Munit, Runtime Fabric.
- API de desarrollo con SFTP, Rest, SOAP y elementos de AWS..

Experiencia relevante

Compañia Aeroespacial – Desarrollador MuleSoft 01/03/2024
Diseño, desarrollo y configuración de aplicaciones para cumplir con los requisitos de los procesos de negocio y las aplicaciones con la plataforma de integración Mulesoft (local).
Anypoint Studio, Git, Munit, Datawave, Cloudhub, Portal de API personalizado, Flujos asíncronos..

Compañia Energenita – Desarrollador MuleSoft 01/10/2022 – 27/02/2024.
Diseño, desarrollo y configuración de aplicaciones para cumplir con los requisitos de los procesos de negocio y las aplicaciones con la plataforma de integración Mulesoft.
Anypoint Studio, Design Center, Runtime Manager, Kibana, Dynatrace, Sourcetree.

Compañia Energenita – Analista de Tibco 01/03/2023 – 01/06/2023
Análisis funcional de la API desarrollada para su transformación a la tecnología Mulesoft.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - Arquitectura

System Developer Specialist
Arquitectura

Habilidades:

- Arquitecto de integración de API en varias implementaciones de MuleSoft durante los últimos 8 años:
- Creación de un ecosistema API completo desde cero.
- Creación de métodos personalizados y nuevos adaptadores para incorporar nuevas funcionalidades a la plataforma.
- Implementación de un nuevo sistema personalizado de registro y mantenimiento de ID de cliente y registro de tokens compartidos entre MuleSoft y Gigya, que no son compatibles con las funcionalidades OOTB.
- Más de 1500 integraciones utilizando diferentes patrones de integración (REST, SOAP, Eventos de Plataforma, Bulk, etc.).
- Experiencia en Ensemble – Intersystem de más de 3 años.

Experiencia relevante

Servicio Nacional de Salud Pública.
Diseña, desarrolla y configura sistemas de software para satisfacer las necesidades del mercado y/o del cliente, de principio a fin: análisis, diseño, implementación, control de calidad (incluidas las pruebas), entrega y mantenimiento del producto o sistema de software, o para una fase específica de su ciclo de vida. Aplica conocimientos de tecnologías, aplicaciones, metodologías, procesos y herramientas para dar soporte a un cliente, proyecto o entidad. Gestión documental, creación de contratos atómicos y compuestos. Diseño y desarrollo de orquestaciones complejas mediante servicios web, motores de reglas y compuestos BPEL en varios ESB (Intersystems Cache Ensemble, Oracle OSB y Microsoft Biztalk). Desarrollo de soluciones de gestión de errores funcionales con un portal web. Desarrollo de transformaciones de mensajes mediante herramientas XPath y XSLT.
Seguimiento de estándares de integración mediante SOAP, REST, HL7, FHIR, FTP, SFTP, etc.

Energía
Integración entre diversos sistemas para la gestión de órdenes de trabajo. Utilización de Oracle SOA Suite (BPEL y OSB). Generación de informes diarios con las transacciones realizadas durante el día.

Sanidad Privada
Definición/implementación funcional y técnica de soluciones SW MuleSoft 4. Comprensión, análisis de requisitos y transformación de estos en especificaciones para desarrollo, diseños técnicos y código, considerando la documentación y las pruebas. Gestión y supervisión de los diferentes ciclos de pruebas, puesta en marcha y gestión de cambios. Gestión de problemas y riesgos, resolución de conflictos.
Seguimiento de los estándares de integración mediante REST, FHIR, websockets, etc. Conocimiento de procesos internos como el proceso de implementación, la aprobación de versiones y la firma de documentos.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - GdC

MANAGER
Talento y Organización

Habilidades:

- Gestión del Cambio Estratégica
- Transformación Cloud y Digital
- Gestión de Stakeholders y Gobierno Ejecutivo
- Comunicación y Engagement Organizacional
- Formación y Medición de Adopción

Experiencia relevante

Responsable de Gestión del Cambio – Migración a Amazon Web Services
Estrategia de Gestión del Cambio para una transformación cloud multinacional en España y Latinoamérica Asegurar la alineación entre las estructuras de gobierno global y el despliegue local en las distintas regiones.
Gestionar la relación con stakeholders ejecutivos y la elaboración de informes para el Comité de Dirección.
Evaluar el impacto en el negocio y seguimiento de la adopción para monitorizar la efectividad del cambio, coordinando equipos locales de change para impulsar la preparación del negocio y una adopción sostenible.

Responsable de Gestión del Cambio– Transformación Cultural
Definir y ejecutar del programa de Gestión del Cambio para apoyar una transformación cultural en 5 países.
Reportar el nivel de adopción a la alta dirección a través de foros y Comités de Dirección trimestrales.
Desarrollar de la narrativa del cambio para impulsar la alineación y un entendimiento compartido.
Diseñar del programa de líderes del cambio y el modelo de involucración de sponsors para reforzar el cambio de comportamientos.
Definir métricas de cambio para hacer seguimiento y asegurar la sostenibilidad de la transformación a largo plazo

Responsable de Gestión del Cambio – Journey to Cloud
Diseñar y ejecutar la estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la transformación cloud de la compañía.
Asegurar la preparación del negocio para el primer lanzamiento.
Liderar el despliegue de iniciativas clave de cambio con impacto en empleados, clientes y socios externos.
Impulsar la alineación de stakeholders, la comunicación y la adopción en todos los colectivos impactados.

Gestión del Cambio y Experiencia Digital del Empleado – Transformación Cultural
Definir la experiencia digital del usuario para una plataforma a medida desarrollada por Accenture.
Liderar las actividades de Gestión del Cambio para impulsar la adopción de la plataforma.y definir los customer journeys end-to-end y el enfoque de content marketing.
Desarrollar el plan de formación y realizar el análisis de stakeholders y definir el plan de comunicación para apoyar el engagement y la adopción.
Apoyo en el desarrollo del branding de la plataforma.

Gestión del Cambio– Salesforce CRM
Analizar insights de usuarios finales para comprender necesidades, nivel de preparación e impactos del cambio durante la implantación de Salesforce CRM para la Red Comercial, Corporate y CIB.
Liderar las iniciativas de formación y habilitación, diseñando, impartiendo y evaluando itinerarios formativos basados en roles y monitorizar la adopción y la efectividad del cambio mediante el seguimiento de métricas de éxito, la recogida de feedback, la identificación de resistencias, la implementación de acciones de mitigación, el reporte de avances y lecciones aprendidas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - GdC

CONSULTOR
Talento y Organización

Habilidades:

- Adopción de IA y Data
- Gobierno y Modelo Operativo
- Change Management en Transformaciones Tecnológicas
- Comunicación y Activación de Stakeholders
- Medición de Adopción y KPIs

Experiencia relevante

Entidad aseguradora | Plan de Data e IA y Sistemas
Diseñar el enfoque de adopción del Plan, combinando visión estratégica y ejecución práctica para asegurar su incorporación los proyectos y equipos, acompañando el diseño y despliegue de las nuevas formas de trabajar.
Definir el modelo de gobierno y adopción, clarificando responsabilidades, mecanismos de coordinación y seguimiento transversal del avance del cambio.
Construir framework de medición de adopción, centrado en el uso real y la utilidad percibida de las nuevas formas de trabajo.
Acompañar iniciativas estratégicas, integrando planes de comunicación, formación y activación para facilitar una adopción progresiva y sostenible del cambio.

Empresa Global de Retail | Adopción de la Generación IA
Definición de la estructura de gobernanza de la IA, incorporación y activación de los stakeholders del IA CoE, definición de la metodología de identificación y gestión de casos de uso y desarrollo de un Programa de Concienciación sobre Gen AI.
Monitorización de adopción mediante implementación de dashboards, incluyendo la exploración de la cultura de la IA.

Empresa Global Industrial | Adopción de Microsoft Copilot
Diseño una estrategia de adopción escalable, asegurando un impacto positivo y sostenible en la organización.
Gestión de la comunicación y formación de los empleados para garantizar una integración fluida y eficaz.
Coordinación de equipos multidisciplinares para asegurar una implementación exitosa, trabajando estrechamente con los equipos de help desk y operaciones y supervisión y analisis de la adopción de M365 Copilot.

Empresa Global de Bienes de Consumo | Adopción del nuevo modelo operativo de Datos & Analítica
Liderar la adopción del modelo operativo de Data, alineando organización, procesos y tecnología para asegurar su implantación efectiva en un contexto global.
Acompañar el despliegue de la plataforma de Data, facilitando la transición organizativa y el uso consistente por parte de negocio y equipos, definir el enfoque de change management y adopción, incluyendo comunicación, capacitación y activación de roles clave.
Gestión de stakeholders, escalabilidad y sostenibilidad en la adopción del modelo. Todo esto impulsando la activación de capacidades internas, reforzando nuevas formas de trabajo data-driven y el encaje del modelo en el día a día de los equipos.

Compañía bancaria | Gestión del cambio para el Cloud Journey
Definición del North Star y mensajes clave, identificación de stakeholders, Change Network y materiales para talleres, análisis de impacto del Cambio, plan de Gestión del Cambio, definición de Readiness y adopción de KPIs y toolkit de métricas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

DETALLE CVs - GdC

ANALISTA
Talento y Organización

Habilidades:

- Soporte a Gestión del Cambio
- Comunicación y Formación
- Análisis de Adopción
- Coordinación de Proyectos
- Implantación de Sistemas (ERP, Salesforce, AWS)

Experiencia relevante

Entidad Financiera, Madrid
Gestión del cambio para acompañar y acelerar la adopción de la nueva plataforma de datos del banco a nivel global (AWS). Responsable del análisis de adopción en los primeros países y despliegue de las acciones para seguir impulsando la nueva herramienta. Coordinación con equipos internos para la preparación, diseño y lanzamiento de los comunicados planificados.

Empresa Energética, Madrid
Apoyar en la organización y coordinación de las formaciones necesarias para la comprensión y utilización eficaz de la herramienta. Desarrollo y despliegue de un plan de trabajo para usuarios de referencia con el objeto de dar soporte a los usuarios finales en la transición y adopción del nuevo sistema. Definición del modelo de gobierno de los canales de comunicación del proyecto y seguimiento de las diferentes actividades.

Institución Sin Ánimo De Lucro, Madrid
Gestión del cambio para acelerar la adopción del nuevo sistema ERP (ORACLE), la nueva operativa y sus formas de trabajar. Simplificación, estandarización y consolidación de los procesos críticos afectados por la implementación. Participación en el desarrollo e implementación de la estrategia, plan y modelo de gobierno de comunicación y formación. Responsable de lanzar comunicados con diseño atractivo para asegurar la transferencia de la información alineada con el propósito de la transformación.

Entidad Financiera, Barcelona
Gestión del cambio para la adopción del nuevo Salesforce. Responsable de llevar a cabo +20 sesiones de formación a formadores.

Grupo Financiero, Latam
Acompañamiento a toda la red de bancos en un proyecto de apertura cultural hacia el cambio y la mejora continua, a través de una estrategia ad hoc de gestión del cambio, en la que definimos la visión y propósito, alineamos a los líderes del grupo a través de un programa formativo y acciones de comunicación, y aceleramos el cambio por medio de acciones de viralización.

Entidad Financiera, Andorra
Apoyo en la gestión del cambio en la fusión de dos entidades financieras, generando guías operativas relacionadas con las actividades más críticas del negocio para dar soporte a la integración y transición de los empleados frente a las nuevas formas de trabajar.

Empresa De Servicios De Tecnología, Latam (Pre-accenture)
Gestión de más de +10 proyectos de implantación de soluciones de software. Liderazgo, monitorización y seguimiento a las actividades planificadas de cada proyecto, recursos asignados, y coordinación con los diferentes clientes internos y externos a nivel nacional e internacional para garantizar el cumplimiento de cada hito. Evaluación y alineamiento de planes de acción para la mitigación de riesgos dentro del proyecto.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.



Anexo 3. Consultoría Responsable

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contribución de Accenture a los ODS prioritarios FY24



- A nivel global, hemos sido reconocidos como **una de las empresas más diversas e inclusivas del mundo** por FTSE Index (anteriormente Refinitiv)
- Queremos alcanzar la **paridad en nuestra plantilla en 2025** (43,3% de mujeres en plantilla y 29,5% en equipo directivo en 2024)
- **47% de nuevas incorporaciones de mujeres**
- **45% de mujeres** entre nuestros **alumnos universitarios en prácticas**



- Estamos **entre las mejores empresas para trabajar en el mundo** (Fortune 2024)
- **99,9%** de nuestros profesionales tienen un **contrato indefinido**
- **Certificación Bequal Plus:** Integramos a personas con discapacidad y les ayudamos, a ellos y a sus familias, con nuestro **programa FlexAbility**
- La **salud física y mental, la seguridad y el bienestar de nuestros profesionales** son nuestra prioridad **(certificados ISO 45001 y Empresa Saludable)**
- **2.491** personas se han beneficiado del **empleo indirecto generado.**



- **95%** de nuestras **compras** a **proveedores nacionales**
- **2,75M€** invertidos en proveedores certificados como **Centro Especial de Empleo**
- **Reutilizamos y/o reciclamos** el 100% de nuestros **ordenadores y móviles**
- Promovemos la **sostenibilidad** diseñando experiencias digitales responsables que son éticas, inclusivas, accesibles, transparentes y respetuosas con el medio ambiente.

A nivel global respecto a la IA:

- **3.000 M$ de inversión hasta 2026 en Inteligencia Artificial y Datos** para acelerar su utilización en nuestros clientes



- **Impulsamos la transformación y digitalización de la sociedad disminuyendo la brecha digital**
- **+78.000 horas de consultoría gratuita** anuales realizadas por 112 profesionales, destinadas a proyectos sociales para mejorar **la empleabilidad** de las personas más vulnerables.
- **+173.000€ donados a través de Fundación Accenture y +200.000€ donados por nuestros profesionales** a diferentes organizaciones sociales para proyectos que mejoren la empleabilidad de las personas más vulnerables
- **+6.000 horas de voluntariado** donadas por **+2.827 profesionales**



- Hemos **reducido un 55% las emisiones absolutas** y un **94% las emisiones de alcance 1 y 2** respecto al año 2019
- Huella de Carbono verificada en base a la **ISO 14064-1:2019** por una entidad acreditada por la ENAC.
- **100% del consumo de electricidad** que realizamos en nuestras oficinas procede de fuentes renovables
- **Casi 400 profesionales** pertenecen al programa de **Embajadores del Medioambiente**
- Contamos con las certificaciones **ISO 14001** e **ISO 50001**

A nivel global:

- Firmamos el acuerdo sobre la **Ambición Climática del Pacto Mundial de Naciones Unidas** para el compromiso 1,5 °C.
- Establecemos objetivos **Net Zero para 2030 y 2040** aprobados por **Science Based Targets (SBTi).**



- Somos una de las **compañías más éticas del mundo** gracias a nuestro Código de Ética Empresarial (17º año consecutivo estamos en lista Ethisphere)
- Disponemos de un programa global de **Protección de Datos del Cliente y estamos certificados en ISO 27001 e ISO 27701 .**
- Contamos con el **certificado del Esquema Nacional de Seguridad** nivel alto para trabajar con las administraciones y el sector público español.
- Abogamos por una **inteligencia artificial responsable** a través de una política y un modelo de gobernanza que gestionan los riesgos de todas las oportunidades de negocio con **IA** desde la ideación hasta la implementación.
- Gestionamos de manera responsable la **identidad digital**, equilibrando riesgos y beneficios y fortaleciendo los **procesos de gobernanza.**



- Por nuestro **ADN de colaboración,** participamos en múltiples alianzas públicas y privadas por el desarrollo sostenible: **Pacto Mundial de la ONU España, Forética, SERES, DIRSE, AEF. Multinacionales por Marca España,** entre otras

Consultoría Responsable

Conoce más sobre Negocio Responsable

CONTRIBUCIÓN DE LA PROPUESTA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Con esta propuesta contribuimos a...



1 FIN DE LA POBREZA — Reducir la pobreza en el mundo

2 HAMBRE CERO — Reducir el hambre en el mundo. Promover la **agricultura sostenible**

3 SALUD Y BIENESTAR — Mejorar la sanidad y la **salud de las personas**, y garantizando una vida sana

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD — Apostar por la **educación**, la **formación** y las **competencias** de las personas

5 IGUALDAD DE GÉNERO — Avanzar en la **igualdad de género**

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO — Garantizar el **acceso al agua** para todos

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE — Generar **energía asequible, fiable y sostenible** para todos

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO — Promover **el crecimiento económico**, el **empleo** y la **inclusión**

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA — Generar **infraestructuras sostenibles** y fomentando la **innovación**

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES — **Reducir** las **desigualdades** en la compañía

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES — Construir **ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles**

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES — Reducir la **contaminación**. **Consumir** de forma **responsable**

13 ACCIÓN POR EL CLIMA — Combatir el **cambio climático** y sus efectos

14 VIDA SUBMARINA — Proteger los **océanos** y su biodiversidad

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES — Proteger y restableciendo los **ecosistemas terrestres**

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS — Luchar contra la corrupción. Impulsar la **ética**. Garantizar la **seguridad** y la **privacidad de la información**

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS — Construir **alianzas** para contribuir al desarrollo sostenible

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Excelencia ÉTICA en Accenture



El 98,2% de nuestros profesionales se formaron en Ética y Cumplimiento invirtiendo más de +37.000 h

Nuestros Valores

01 Creación de valor para el cliente **02** Una red global **03** Respeto por el individuo **04** Las mejores personas **05** Integridad **06** Stewardship

Código de Ética Empresarial

01 Haz que tu conducta cuente

- Decir lo que pensamos y tolerancia cero a las represalias
- Respetar a las personas
- Comportarse con *profesionalidad*
- Gestionar a las personas con criterios de meritocracia y no discriminación
- Evitar los conflictos de interés personal

02 Cumplir con las leyes

- Anticorrupción
- Antilavado de dinero
- Lucha contra la competencia desleal
- Privacidad de datos
- Cumplimiento de las normas gubernamentales
- Cumplimiento de las normas comerciales
- Operación con información privilegiada

3 Atender a nuestros clientes

Proporcionando soluciones innovadoras y de valor
Cumpliendo con la encia en la entrega.
Generando resultados

4 Dirigir nuestra empresa responsablemente, así como la tecnología, los datos y la aplicación de la Inteligencia Artificial

05 Ser buenos ciudadanos corporativos

Apoyamos y respetamos los derechos humanos, fomentamos la responsabilidad ambiental y motivamos a nuestros profesionales para que se involucren y participen en las comunidades donde vivimos y trabajamos

06 Proteger a nuestras personas, la información y nuestro negocio

Trabajamos para construir una empresa mejor, más sólida y más duradera para las futuras generaciones, protegiendo la marca Accenture, cumpliendo con nuestros compromisos de proteger la información y propiedad intelectual, actuando con mentalidad de propietario y protegiendo y desarrollando a nuestros profesionales.

Sostenibilidad de nuestro negocio

- *Nivel Oro en ECOVADIS (solo el 5% de las empresas evaluadas lo consiguen)*
- *Nivel Platinum en REPRO ACHILLES*
- *encia en GOSUPPLY*

Seguridad y Privacidad de la información

- *Disponemos de políticas de privacidad de datos internas y un programa global de **Protección de Datos del Cliente (CDP).** Contamos con las certificaciones ISO 27001 de **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información** e ISO 27701 de **Sistema de Gestión de la Privacidad de la Información**.*
- *Esquema Nacional de Seguridad (categoría ALTA).*
- *Comprometidos con los requisitos globales de protección de datos y privacidad, incluido el **GDPR de la UE***
- ***Programa "Client Data Protection"** para cada proyecto proporcionando una gestión de riesgos de seguridad*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Políticas ESG

Examina la lista de políticas de Accenture para servicios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Todas las políticas y los complementos están sujetos a las leyes locales donde opera Accenture. Estas políticas y complementos están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información sobre cómo compartir políticas fuera de Accenture, visita la herramienta de solicitud de uso compartido externo de políticas de Accenture.

Environmental

- Environmental Responsibility (Policy No. 1168 - Sponsor: Business Operations). This policy is available externally on accenture.com/environment
- Carbon Offset (Policy No. 1585 - Sponsor: Business Operations)
- Global Hardware Disposal (e-waste) (Policy No. 1434 - Sponsor: CIO)
- Renewable Electricity Purchasing (Policy No: 1590 - Sponsor: Business Operations)
- Travel Arrangements (Policy No: 1396 - Sponsor: Global Management Committee)
- Managing Waste (Policy No. 1591 - Sponsor: Accenture Workplace Solutions)

Social

- Behaving Professionally (English) (Policy No. 1002 - Sponsor: Human Resources)
- Ensuring Meritocracy and Non-Discrimination (English) (Policy No. 1003 - Sponsor: Human Resources)
- Prohibition on Human Trafficking, Forced Labor and Child Labor (Policy No. 1006 - Sponsor: Legal)
- Speaking Up and Zero Tolerance for Retaliation (English) (Policy No. 1000 - Sponsor: Legal)
- Respecting the Individual (English) (Policy No. 1001 - Sponsor: Human Resources)
- Workplace Health and Safety (Policy No. 1565;- Sponsor: Accenture Workplace Solutions)
- Flexible Work Arrangements (Policy No. 0047 - Sponsor: Human Resources)
- Procurement of Goods and Services (Policy No. 0931- Sponsor: Procurement)
- Requirements for Subcontractors and Other Supplier Personnel (Policy No. 1420 - Sponsor: Human Resources)
- Sick Leave (Policy No. 1082 - Sponsor: Human Resources)
- Health Care Benefits (Policy No. 0065 - Sponsor: Human Resources)
- Vacations (Policy No. 0066 - Sponsor: Human Resources)
- Accenture Leadership Responsibilities (Policy No. 0814 - Sponsor: Human Resources)

Governance

- Addressing Personal Conflicts of Interest (Policy No. 1004 - Sponsor: Legal)
- Contacts with Public Officials (Policy No. 1221 - Sponsor: Legal)
- Gifts, Meals, Entertainment and Travel (Policy No. 0150 - Sponsor: Legal)
- Confidentiality (Policy No. 0069 - Sponsor: Legal)
- Data Management (Policy No. 1431 - Sponsor: Information Security)
- Data Privacy (English) (Policy No. 0090 - Sponsor: Legal)
- Accenture Responsible Disclosure (Policy No. 0060 - Sponsor: Information Security)
- Acceptable Use of Information, Devices, and Technology (Policy No. 0057 - Sponsor: Information Security)
- External Personnel Access to Accenture Systems (Policy No. 0053 - Sponsor: Information Security)
- Global Hardware Disposal (Policy No. 1434 - Sponsor: CIO)
- Information Security Management (Policy No. 1457 - Sponsor: Information Security)
- System Security (Policy No. 0056 - Sponsor: Information Security)
- Non-Financial Reporting and Disclosure (Policy No. 0005 - Sponsor: Business Operations) **NEW**

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


Gracias.
