IMPLANTACIÓN CRM SALESFORCE

SALES & SERVICE

DOCUMENTO: OFERTA TÉCNICA

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA

FECHA: 06/03/2026

MAKING IT
HAPPEN

TECHNOLOGY
AND ENGINEERING
NO LIMITS

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Datos de la oferta y contactos

CLIENTE

LINEA DIRECTA ASEGURADORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO RFQ

2026-039 CRM_IMPLANTACIÓN REQ0028484

PERSONA DE CONTACTO

Hugo Paván Leal

Senior Account Manager – Insurance

P.º de la Castellana, 259, D, planta 47
28046 Fuencarral-El Pardo. Madrid, España
M +34 649 96 8841
T +34 914 11 96 50

hpavan@ayesa.com

AVISO LEGAL / Protección de datos

http://legal.ayesa.com

CONFIDENCIALIDAD

No se autoriza la copia, revelación, divulgación ni el uso de la Información Confidencial, o fragmentos de ésta, para fines distintos a los de la valoración de la presente oferta por parte del organismo responsable a estos efectos denominado el receptor de la Información Confidencial (el 'Receptor'), sin la autorización por escrito de Ayesa.

El Receptor se asegurará del cumplimiento del deber de confidencialidad y uso adecuado por parte de sus empleados, administradores y asesores y se obliga a guardar y conservar la información recibida en un lugar que reúna las suficientes garantías de conservación y confidencialidad necesarias para cumplir las obligaciones contenidas en el párrafo anterior. Ayesa tendrá derecho a pedir cualquier medida o remedio que legalmente le asista para velar por el respeto de estos compromisos.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Contenido

[0] Carta de presentación y compromiso 4

[0.1] Información general de la compañía 4
[0.2] Fortaleza y conocimiento en sector seguros 5
[0.3] Nuestra línea de servicio Salesforce 7
[0.4] Declaración de compromiso con los requerimientos del cliente 8

[1] Resumen ejecutivo 9

[1.1] Objetivos de LDA 9
[1.2] Contexto LDA 9
[1.3] Solución propuesta 10
[1.3.1] Justificación Salesforce Sales & Service 12
[1.4] Plan de transformación 12
[1.5] Plan de proyecto 14
[1.6] Retos de proyecto 15
[1.7] Valor añadido Ayesa 15

[2] Diagnóstico y entendimiento del entorno actual 18

[2.1] Contexto y nuestro entendimiento 18
[2.2] Situación actual: ecosistema operativo y canales 18
[2.2.1] Galgo como frontal operativo del core asegurador 18
[2.2.2] Limitaciones actuales respecto a un CRM de mercado 19
[2.2.3] Canales e interacción con el cliente (Contact Center) 19
[2.3] Arquitectura actual y patrón objetivo de integración 19
[2.3.1] Principio rector: coexistencia Galgo - CRM y sincronización near-real-time 19
[2.3.2] Flujo Galgo a CRM (event - driven) 19
[2.3.3] Flujo CRM a Galgo (request / reply) 20
[2.3.4] Observabilidad y trazabilidad 20
[2.4] Datos, maestros y volumetría 20
[2.4.1] Sistemas maestros (source of truth) 20
[2.4.2] Volúmenes y concurrencia 20
[2.4.3] Migración y persistencia en CRM 21
[2.5] Retos principales identificados (AS-IS / TO-BE) 21
[2.5.1] Experiencia del agente: eficiencia operativa y “single pane of glass” 21
[2.5.2] Procesos core complejos: multi-producto, verificación, suplementos, recibos 21
[2.5.3] Gobierno de reglas (suscripción, retención, campañas) y dependencia de sistemas satélite 22
[2.5.4] Cumplimiento (RGPD/DORA) y datos sensibles 22
[2.5.5] Gestión del cambio y adopción (escala Contact Center) 22
[2.6] Necesidades derivadas del diagnóstico que debemos resolver 22
[2.6.1] A nivel funcional/operativo 22
[2.6.2] A nivel técnico y de arquitectura 23
[2.6.3] A nivel de cambio y modelo operativo 23
[2.7] Conclusión del diagnóstico 23

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[3] Propuesta técnica 24

[3.1] Alineamiento de la solución 24
[3.1.1] Especialización y garantía sectorial (seguros) 24
[3.1.2] Integración nativa frente a arquitectura fragmentada 24
[3.1.3] Impacto directo en P&L y ROI 24
[3.1.4] Visión de socio estratégico a largo plazo 25
[3.1.5] Encaje con el modelo objetivo del proyecto 25
[3.2] Alcance de la solución 25
[3.2.1] Mapa tecnológico conceptual 25
[3.2.2] Arquitectura técnica 28
[3.2.3] Aspectos de seguridad 35
[3.2.4] Licenciamiento propuesto 37

[4] Cobertura de requisitos 39

[4.1] Grado cobertura necesidades del usuario 39
[4.1.1] Cobertura por módulo 39
[4.1.2] Clasificación por módulo 40
[4.1.3] Análisis de solución 41
[4.1.4] Cobertura general 41
[4.1.5] Urgencia de las Solicitudes 42
[4.2] Grado de cobertura requerimientos 42
[4.2.1] Cobertura por proceso 42
[4.2.2] Casos de uso 51

[5] Plan de Transformación 61

[5.1] Enfoque de convivencia 61
[5.1.1] Periodo Fase 1 62
[5.1.2] Periodo Fase 2 63
[5.1.3] Periodo Fase 3 64
[5.1.4] Periodo Fase 4 – Fase 6 65
[5.1.5] Periodo Fase 6 – Fase 9 66

[6] Plan de trabajo 68

[6.1] Enfoque de solución 68
[6.2] Fases y Actividades 68
[6.2.1] Fase de constitución 69
[6.2.2] Análisis y Diseño 70
[6.2.3] Planificación 70
[6.2.4] Implementación y puesta en marcha 71
[6.2.5] Soporte post – implantación 71
[6.2.6] Fase de devolución 72
[6.3] Enfoque metodológico 72
[6.4] Gestión de Riesgos 75
[6.4.1] Análisis Cualitativo de Riesgos 76
[6.4.2] Riesgos identificados y contingencias 77
[6.5] Modelo de control y seguimiento 80
[6.5.1] Comité de Dirección del Contrato (CD) 81
[6.5.2] Comité de Seguimiento Servicio (CS) 81
[6.5.3] Weekly (WK) 82
[6.5.4] Diario (Day to Day) 83

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.5.5] Seguimiento, Supervisión y Control de la Actividad 83
[6.5.6] Seguimiento del feedback 84
[6.6] Planificación temporal 84
[6.6.1] Cronograma detallado 87
[6.6.2] Cronograma global 93
[6.7] Claves operativas y estratégicas 94
[6.8] Release Management 96
[6.8.1] Mapa de entornos 96
[6.9] Equipo de proyecto 97
[6.9.1] Equipo Ayesa 97
[6.9.2] Equipo LDA 100
[6.10] Mantenimiento y operación 102
[6.10.1] Soporte funcional y técnico 102
[6.10.2] Mantenimiento correctivo 104
[6.10.3] Mantenimiento preventivo 107
[6.10.4] Acuerdos a nivel de servicio (ANS) 107
[6.11] Modelo de trabajo 108
[6.12] Claves de éxito y lecciones aprendidas 108

[7] Gestión de calidad, seguridad y gobierno del dato 109

[7.1] Estrategia de migración 109
[7.2] Plan de calidad y aseguramiento 111
[7.2.1] Principios Clave 111
[7.2.2] Cumplimiento de buenas prácticas de Salesforce 112
[7.2.3] Pruebas y validaciones 113

[8] Gestión del cambio y Adopción 115

[8.1] Metodología 115
[8.2] Plan de Comunicación 115
[8.3] Plan de Formación 116
[8.4] Soporte Operativo 117
[8.5] Planificación temporal 118
[8.6] Descripción del equipo 120

[9] Optimización de costes y sostenibilidad 121

[10] Lista de entregables 122


[11] Consideraciones al alcance 124

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.


[0] Carta de presentación y compromiso

[0.1] Información general de la compañía

Ayesa es una compañía con **más de cinco décadas de trayectoria**, evolucionada de forma continua para liderar proyectos de transformación digital. A lo largo de nuestra historia hemos acompañado a organizaciones públicas y privadas en distintos hitos tecnológicos —desde la automatización industrial y el telecontrol, hasta la internacionalización, la consolidación de capacidades TI y, en los últimos años, la innovación basada en datos e inteligencia artificial—. Esta evolución se ha realizado combinando crecimiento orgánico y una estrategia de adquisiciones que refuerza nuestras capacidades y nos posiciona como un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería.




Contamos con una presencia internacional consolidada, con actividad en múltiples regiones y una estructura que nos permite ejecutar proyectos complejos con equipos distribuidos y coordinados. Nuestra dimensión —**más de 14.000 profesionales**, presencia en 24 sedes y una cifra de negocio superior a 800 M€— se traduce en capacidad real de ejecución, escalabilidad y continuidad operativa. Esta combinación de alcance global y cercanía local nos permite adaptarnos a contextos organizativos diversos, manteniendo estándares homogéneos de calidad y gobierno.

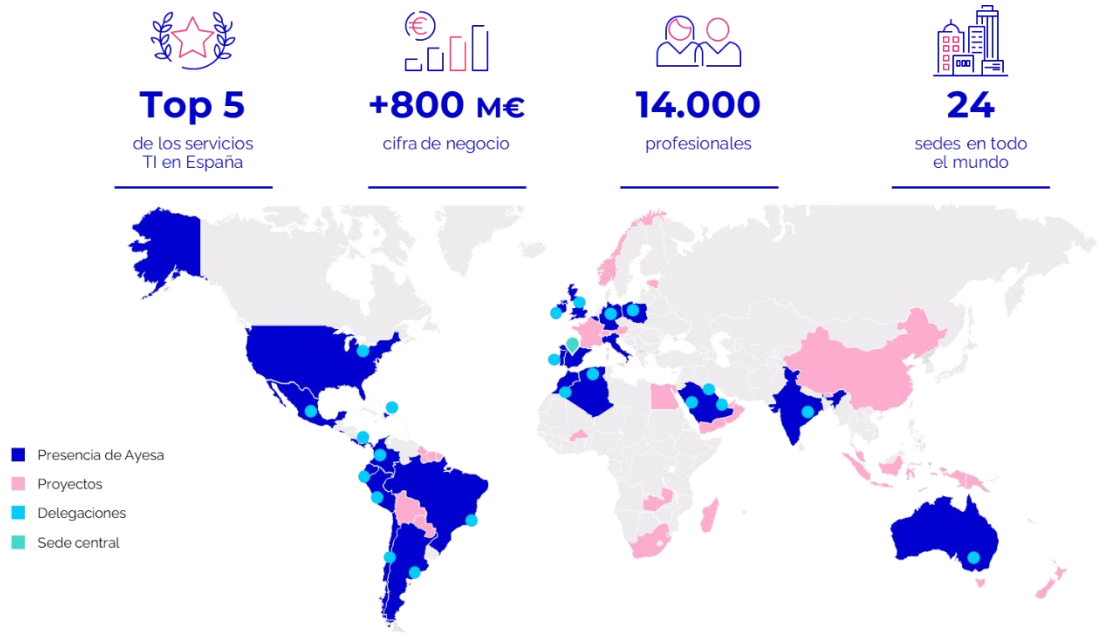

Nuestra propuesta se apoya en una **cobertura tecnológica integral**, organizada en grandes ámbitos que abarcan de extremo a extremo las necesidades de transformación: servicios de aplicaciones e impacto digital, soluciones de datos e IA, infraestructura cloud y ciberseguridad, plataformas empresariales y modern workplace. Esta estructura permite construir soluciones completas (funcional, técnica y operativamente) y, al mismo tiempo, aportar especialización en sectores donde contamos con referencias relevantes, como servicios financieros, salud, utilities/energía, telecomunicaciones y entornos industriales. El objetivo es claro: aportar un servicio

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

coherente, con visión de negocio, y con la capacidad de materializarlo en soluciones robustas y mantenibles.

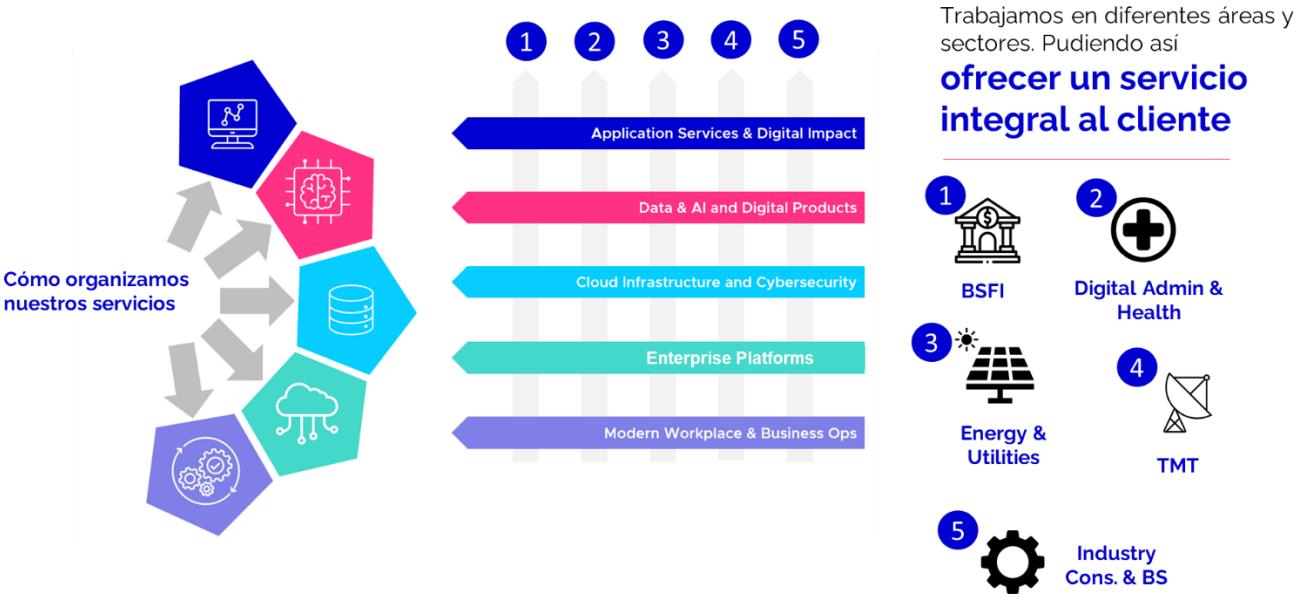

Nuestro posicionamiento se sustenta en un enfoque exigente de calidad, entrega y orientación al servicio. **La satisfacción de nuestros clientes** se apoya en una forma de trabajar basada en el cumplimiento de compromisos, la transparencia en la gestión y la mejora continua. Esta consistencia nos ha permitido mantener un liderazgo recurrente en estudios de satisfacción del sector, reforzando cuatro atributos que consideramos diferenciales: calidad, capacidad de entrega, orientación al servicio y competitividad.



[0.2] Fortaleza y conocimiento en sector seguros

Generamos soluciones tecnológicas desde la experiencia. Con nuestro conocimiento del sector asegurador aportamos un valor diferencial en nuestras soluciones haciéndolas ágiles, competitivas y personalizadas.

Contamos con altas capacidades tecnológicas en la creación de soluciones ágiles de toma y análisis de datos basadas en IA, Implantación de CRMs, soluciones digitales, asistentes conversacionales, campañas inteligentes de marketing digital personalizadas, algoritmos predictivos para la detección de fraude y análisis de riesgo, así como desarrollo de aplicaciones software a medida e integración de sistemas, etc., para el Sector Asegurador.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

El expertise de nuestros profesionales nos hace diferentes, aportando un valor añadido a nuestros servicios enfocados a la obtención, almacenamiento, procesamiento, análisis y algoritmia de datos.

Hemos acompañado a las principales aseguradoras en sus procesos de digitalización, tanto en España como en sus filiales internacionales.

Especializados en soluciones de negocio y tecnología para el sector asegurador.

Desde 2004
En el sector

+35
Trabajamos con más de 35 aseguradoras en España

8 CoE
Contamos con 8 centros de excelencia especializados

i3B
Instituto de Ibermática de Innovación



CLIENTES

Amplio conocimiento de los procesos clave del negocio. Entendemos la operativa de las aseguradoras, con sus retos y dificultades

SOLUCIONES

Soluciones y servicios para el sector asegurador, que integran las más avanzadas y disruptivas tecnologías, propias y de terceros

PROFESIONALES

+350 Profesionales con experiencia y conocimiento especializado en proyectos, servicios e implantación de soluciones para el sector, que garantizan el éxito y la calidad

TECNOLOGÍA


Estrecha relación con compañías líderes en desarrollo software empresarial. Investigación de las novedades del mercado tecnológico

Implantamos y mantenemos Cores aseguradores en compañías del sector, lo que nos permite aportar valor desde el inicio de los proyectos de integración de soluciones, como el CRM con el Core, entendiendo las demandas y necesidades de las áreas de negocio, así como aportando soluciones de experiencias y de casos de éxito.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Nuestra línea de servicio Salesforce

En el ámbito Salesforce, Ayesa cuenta con un equipo amplio, estable y certificado, con **más de 250 profesionales, más de 750 certificaciones** y más de 10 años de alianza con Salesforce. **En España, disponemos de más de 200 especialistas** y capacidad multi-idioma para operar en entornos internacionales. Esta base de talento, unida a una valoración media elevada, nos permite asegurar solidez en el delivery, continuidad del conocimiento y capacidad de escalar el equipo según necesidades del proyecto (funcional, técnica, integración, datos/IA, analítica y cambio).

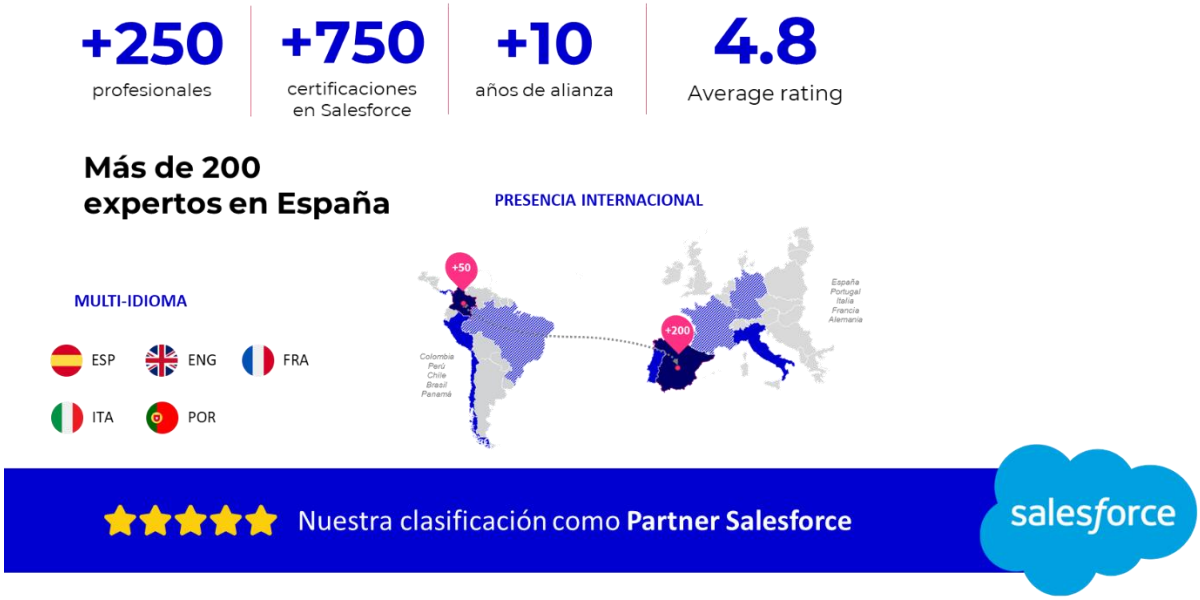

Ayesa dispone de un **portfolio Salesforce integral**, organizado para cubrir de extremo a extremo el ciclo de vida de cualquier iniciativa: desde la definición de la estrategia y el diseño funcional, hasta la implementación, el despliegue y la mejora continua en explotación. Nuestra propuesta combina capacidades **Core CRM** (Service, Sales, Platform, Experience e Industries), **Marketing** (Marketing Cloud y automatización de comunicaciones), **Data & IA** (Data Cloud, Agentforce y analítica avanzada) e **Integración** (Mulesoft y arquitecturas híbridas), permitiendo construir soluciones completas y alineadas con los objetivos de negocio.

Además de la capacidad tecnológica, aportamos un **catálogo de servicios que cubre todo el espectro de necesidades habituales en ecosistemas Salesforce**, desde iniciativas nuevas hasta evoluciones complejas sobre entornos existentes. Esto incluye la consultoría inicial y definición de hoja de ruta, diseño de arquitectura y gobierno, implantación y migraciones, integraciones con ecosistemas corporativos, pruebas y aseguramiento de calidad, gestión del cambio y adopción, así





Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

como servicios de continuidad como soporte, evolución y revisiones de salud de la plataforma (health checks) orientadas a rendimiento, seguridad, buenas prácticas y optimización del uso de licencias y capacidades estándar. Con este enfoque, garantizamos coherencia y continuidad entre lo que se diseña, lo que se construye y lo que finalmente se opera y evoluciona.

[0.3] Declaración de compromiso con los requerimientos del cliente

Ayesa manifiesta su firme y expreso compromiso con el cumplimiento íntegro de todos los requisitos establecidos en el Pliego para la implantación de un sistema CRM en LDA Nuestra propuesta ha sido elaborada considerando de forma exhaustiva las especificaciones funcionales, técnicas, organizativas y de servicio recogidas en la documentación contractual, garantizando su adecuada cobertura mediante una solución alineada con las mejores prácticas del ecosistema Salesforce y con los estándares de calidad exigidos por la organización.

Nos comprometemos a ejecutar el proyecto conforme a los alcances definidos, respetando los plazos, hitos y condiciones de prestación del servicio, así como los niveles de servicio (SLA), criterios de seguridad, confidencialidad y protección de datos que resulten de aplicación. Asimismo, aseguraremos la asignación de un equipo cualificado y dimensionado adecuadamente, la aplicación de una metodología de implantación contrastada y la adopción de mecanismos de gobierno, seguimiento y control que permitan garantizar la trazabilidad, la transparencia y la consecución de los objetivos del proyecto.

Del mismo modo, Ayesa asume el compromiso de colaboración activa con los equipos de LDA, promoviendo un enfoque de trabajo conjunto, orientado a resultados y basado en la mejora continua, asegurando en todo momento la calidad de los entregables, la correcta gestión del cambio y la sostenibilidad de la solución implantada a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[1] Resumen ejecutivo


Se detalla en el presente apartado un resumen ejecutivo a alto nivel de lo que bajo nuestro entendimiento son las claves y aspectos más relevantes de nuestra oferta

[1.1] Objetivos de LDA



Potenciar el servicio de atención comercial

Unificación y homogeneización de los canales de entrada que permita la optimización del servicio de atención. Esto contribuye a diferenciarse de la competencia al ofrecer un servicio de calidad y personalizado ayudando a identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.




Servicio End-to-End

Considerando los desafíos actuales y las demandas cambiantes del mercado, es necesario que LDA adopte un **enfoque holístico** en la revisión de los **flujos funcionales**. No basta con abordar casos de uso concretos de forma aislada. Esto permite identificar oportunidades para la implementación de soluciones digitales que mejoren la operatividad y posicionen a LDA estratégicamente en el mercado.




Homogeneización de flujos funcionales

Implica la **estandarización y optimización de los flujos** de trabajo en el marco de la cotización y atención (Hogar, Motor, Salud…) avanzando hacia el *"fit-to-standard"* de la plataforma. Esto implica identificar las mejores prácticas, eliminar pasos innecesarios o duplicados, y establecer estándares y pautas claras para cada proceso.



Mapa de sistemas: Arquitectura tecnológica

Implementación de **sistemas y herramientas modernas** que se integren de manera eficiente en los procesos existentes y brinden **soporte** a las nuevas **necesidades** digitales de la compañía. Deben permitir la automatización de tareas repetitivas, la mejora de la colaboración entre equipos y la reducción de la burocracia.



Visión 360º del cliente

Recopilar y centralizar toda la **información** relevante sobre cada **cliente** en un solo lugar. De esta manera, LDA puede ofrecer un servicio altamente personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

[1.2] Contexto LDA

Desde Ayesa, somos conscientes de que LDA encuentra inmerso en un proceso de transformación global que abarca negocio, tecnología y procesos.

Transformación integral

Se están impulsando múltiples iniciativas digitales con un alto impacto en su modelo operativo futuro y en la evolución hacia una organización más ágil y orientada al dato.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Modernización del ecosistema comercial y de relación con clientes

La compañía está ejecutando un programa estratégico para transformar sus sistemas front de comercialización y atención al cliente.

Este programa incluye:

- Migración del Contact Center desde Avaya On-Premise a Genesys Cloud, con un implantador ya adjudicado.
- Proceso activo de selección de la nueva plataforma CRM, actualmente entre Salesforce y Microsoft Dynamics.

Adaptación del CORE y alineamiento de sistemas

A nivel de arquitectura y sistemas, LDA está evolucionando su **CORE transaccional** para asegurar su integración y alineamiento con las iniciativas de **CCaaS** (Genesys Cloud) y el futuro **CRM** (entre otras). Esto implica rediseños y adecuaciones técnicas para garantizar escalabilidad, calidad del dato y consistencia funcional.

Evolución del ecosistema de datos y capacidades digitales

Se están ejecutando iniciativas clave para reforzar la arquitectura digital con impacto directo en este proyecto como:

- Nuevo proyecto de arquitectura de datos basado en **Lakehouse**.
- Evolutivos de la **pasarela de pagos**.
- Evolutivos del **ramo de Salud**.
- Evolutivos de los **activos digitales**.
- Impulso de la **gestión de leads con Walmeric** para mejorar la conversión y trazabilidad comercial.

En resumen, sabemos que LDA está en un momento CLAVE donde confluyen iniciativas estratégicas, tecnológicas y de negocio. **Desde Ayesa, entendemos que el éxito depende de la coordinación entre los distintos programas (CCaaS, CRM, CORE y datos) y de una arquitectura sólida que soporte la transformación integral objetivo.**

[1.3] Solución propuesta

La solución propuesta tiene su eje central en **Salesforce Sales & Service Cloud** como producto diseñado para la gestión de la relación con los clientes en los ámbitos de venta y atención.

Adicionalmente, en base a nuestro entendimiento y propuesta de solución consideramos clave la contratación por LDA de los siguientes productos o módulos.

- **Salesforce Service Voice:** clave para habilitar el canal voz y su integración con Genesys Cloud.
- **Salesforce Service Knowledge base:** centralizar la base de conocimiento y artículos.
- **Digital Engagement:** capacidades para la activación de los canales digitales y la integración del canal chat.
- **Salesforce Shield:** capacidades de seguridad avanzada que permite proteger datos sensibles mediante cifrado, auditoría y monitoreo de actividad
- **Salesforce Experience Cloud:** proporciona una plataforma para crear portales dirigidos a los usuarios externos a LDA.
- **Agentforce y Data Cloud:** plataforma para la construcción de agentes IA con los que potenciar la capacidad comercial de LDA.


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Mulesoft:** La arquitectura contempla el uso de MuleSoft como plataforma de integración basada en APIs para conectar Salesforce con sistemas corporativos y aplicaciones externas.
- **Einstein NBA:** permite recomendar automáticamente al agente la mejor acción u oferta para cada cliente, basándose en reglas de negocio y análisis de datos.

Es importante remarcar que todos estos productos o elementos, están totalmente integrados en un único sistema, **Salesforce Platform**, disponiendo de los mismos recursos globales y operando bajo una misma base de datos.

A pesar de no ser objeto de alcance de la presente RFQ, aportamos nuestro valor y entendimiento respectos al proyecto Genesys Cloud y algunas consideraciones en base a experiencias previas.

Uno de los objetivos del proyecto, es que los usuarios perciban la solución como una **única plataforma**, independientemente de las tecnologías y componentes que la conforman.

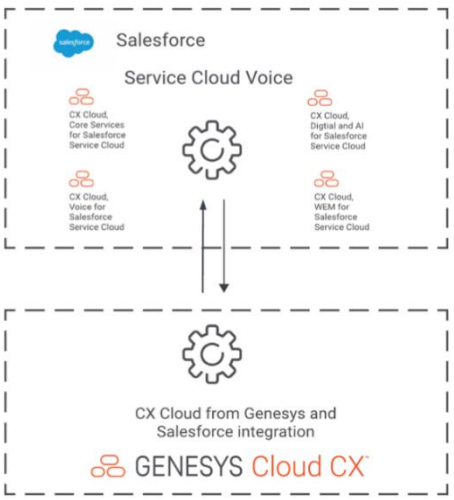

En este sentido, proponemos la solución de **CX Cloud** de Genesys y Salesforce que permite conectar ambas plataformas proporcionando un centro de contacto unificado.

Esta solución permitirá disponer de un modelo de orquestación único que diseñe experiencias end-to-end que fusionen datos, bots, reporting y soluciones de IA de ambas plataformas sin necesidad de codificación.


La solución propuesta para la gestión de la telefonía utiliza una **arquitectura BYOC (Bring Your Own Carrier) en la nube**. Este enfoque permitiría a LDA conservar sus actuales proveedores de telecomunicaciones para las comunicaciones de voz, otorgándole mayor flexibilidad y control sobre su infraestructura de telecomunicaciones.

En este modelo, tanto la voz como la señalización se enrutan a través de la nube hasta el agente correspondiente, utilizando tráfico basado en Internet mediante un SIP Trunk. Los agentes acceden a Genesys Cloud a través de Internet con teléfonos WebRTC, lo que les permite gestionar la aplicación y realizar llamadas de voz de manera eficiente.

Para LDA, la propuesta contempla la continuidad de los SBC existentes, complementados con un **SIP Trunk hacia la nube** del proveedor. Esto facilita una integración ágil entre la infraestructura actual y la plataforma Genesys Cloud, garantizando una transición sin contratiempos. Además, esta solución preserva los acuerdos de tarificación actuales LDA tiene establecidos con sus operadores. Durante la fase de análisis y diseño, se determinará el dimensionamiento adecuado de los canales SIP Trunk según los datos de llamadas simultáneas proporcionados por LDA.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

El acceso a la plataforma por parte de los agentes se realizará exclusivamente a través de una conexión a Internet, utilizando navegadores comerciales como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Los operadores externos podrán operar bajo las mismas condiciones, asegurando una experiencia uniforme.

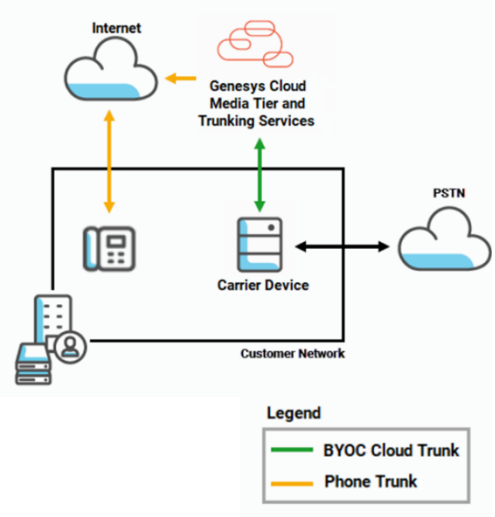

Entre las **ventajas clave** de la arquitectura BYOC en la nube destacan:

- **Autonomía y adaptabilidad:** Esta arquitectura permite a LDA elegir y gestionar sus propios proveedores de telecomunicaciones, ajustando la infraestructura según sus necesidades específicas y prioridades estratégicas.
- **Integración eficiente:** Al reutilizar componentes de la infraestructura existente, se minimizan los cambios disruptivos, optimizando la transición hacia la nueva solución sin sacrificar funcionalidad.
- **Fiabilidad en las comunicaciones:** Gracias al uso de teléfonos WebRTC y el protocolo SIP, la calidad de audio es consistente y robusta, lo que mejora la experiencia tanto para los agentes como para los usuarios finales.
- **Simplificación operativa:** El diseño basado en la nube reduce la necesidad de incorporar equipamiento adicional, lo que no solo facilita la implementación, sino que también contribuye a una gestión más sencilla del sistema**.**
- **Optimización de costes:** Al prescindir de hardware especializado, esta solución representa un ahorro significativo en infraestructura, manteniendo un modelo de operación eficiente y escalable.

[1.3.1] Justificación Salesforce Sales & Service

Desde Ayesa, con el objetivo de aportar el mayor valor a LDA, resumimos en los siguientes puntos como se cubriría la ausencia de la vertical de seguros para la solución final:

- **Configuración del modelo de datos para el sector asegurador,** que facilita la gestión estructurada de clientes, pólizas, relaciones y productos.
- **Desarrollo de LWC como componentes para** como el grafo de relaciones, que permite visualizar el parque contratado y disponer de una visión 360° del cliente.
- **Desarrollo de reglas de negocio a través de Flows y Apex**, que habilita la gestión centralizada y flexible de reglas de negocio, con aplicación directa en procesos de venta cruzada y condicionales de salida en base a parámetros de entrada en una operación.
- **Desarrollo de Visualforce Page o integración con plataforma tercera de formularios**, que permiten la generación automatizada de documentación asociada a los procesos comerciales y operativos.
- **Flow**, para la orquestación de procesos complejos, guiados y multietapa dentro de la plataforma.
- **Scren Flow**, que facilita la ejecución de procesos guiados que pueden involucrar múltiples equipos y niveles de aprobación.

[1.4] Plan de transformación

Desde Ayesa, somos plenamente conscientes del proceso de transformación al que se enfrenta LDA, y como socio estratégico detallamos las palancas y **nuestro enfoque respecto al plan de despliegue y convivencia de sistemas.**

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Evitar silos de información entre plataformas

Garantizar que **Salesforce y Galgo compartan la información** relevante de clientes, cotizaciones para que ambos sistemas mantengan una visión coherente de la actividad comercial durante la convivencia, evitando duplicidades o inconsistencias.

Preservar la trazabilidad completa de la actividad por ramo

Es clave mantener el seguimiento de las interacciones y cotizaciones realizadas en cualquiera de los sistemas, especialmente para ramos que aún no estén operativos en Salesforce**, asegurando que la "foto" del cliente y su historial comercial** permanezcan accesibles independientemente del sistema utilizado.

Minimizar cambios de contexto innecesarios durante la atención al cliente

Diseñar la operativa para **reducir al máximo situaciones en las que el agente deba alternar entre Salesforce y Galgo mientras atiende al cliente**, habilitando mecanismos de continuidad operativa cuando se requiera cotizar distintos productos o ramos gestionados en plataformas diferentes.

Reducir escenarios en los que un mismo proceso pueda ejecutarse en ambos sistemas

A pesar de ser conscientes de la particularidad de LDA y la naturaleza de su negocio, durante la convivencia, se buscará limitar los casos donde una misma funcionalidad esté disponible simultáneamente en Salesforce y Galgo. Por ejemplo, una vez habilitada la cotización de Hogar en Salesforce para todas las casuísticas, este sistema debería convertirse en el punto único para iniciar nuevas cotizaciones de ese ramo.

Definir reglas claras de continuidad para procesos iniciados en un sistema

Se establecerán **criterios operativos para gestionar situaciones como cotizaciones iniciadas en Salesforce que deban continuar en Galgo (o viceversa),** por ejemplo cuando un agente abandona una cotización y otro la retoma posteriormente en el sistema legacy, garantizando continuidad sin pérdida de información.

Asegurar un entorno estable mediante despliegues progresivos

La adopción de nuevas capacidades se realizará de forma gradual, **priorizando procesos de menor complejidad y riesgo** antes de abordar funcionalidades más críticas o transversales.

Impulsar la confianza y adopción de los usuarios finales

La **transición deberá minimizar fricciones operativas**, garantizando claridad en los procesos, estabilidad de la plataforma y soporte adecuado para que los agentes adopten Salesforce como herramienta principal de forma progresiva.

Definir una estrategia coherente de gestión de datos históricos y operativos

Determinar qué **información histórica debe migrarse o consultarse desde el sistema legacy, priorizando los datos necesarios** para la operativa diaria y evitando complejidades innecesarias durante la fase de convivencia.

Evitar migraciones forzadas de procesos ya iniciados en sistemas legacy

A pesar de ser conscientes de la particularidad de LDA y la naturaleza de su negocio, durante la convivencia como principio general trataremos de reducir los procesos de atención ya iniciados en Galgo a Salesforce.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Definir un sistema maestro por proceso y momento del ciclo de vida

Durante la convivencia debe quedar claramente definido qué sistema es el **origen y responsable del dato** en cada fase del proceso (inicio de cotización, modificación, emisión, etc.), evitando conflictos cuando una misma información pueda existir en Salesforce y Galgo.

Diseñar una experiencia operativa clara para el agente

Durante la convivencia es fundamental que el agente tenga **reglas simples y claras sobre dónde iniciar cada gestión**, qué sistema utilizar según el ramo y cómo actuar ante excepciones (por ejemplo, cambio de producto o continuidad de una cotización existente).


[1.5] Plan de proyecto

Con el objetivo de cumplir plenamente con los requerimientos establecidos por LDA, hemos diseñado un plan que no solo se ajusta a las necesidades de la RFP, sino que también incorpora un enfoque estratégico que asegura una ejecución eficiente y sin desviaciones significativas.

Este cronograma ha sido cuidadosamente elaborado para reflejar **plazos realistas**, **asegurando la dedicación del equipo de LDA y garantizando que las actividades del negocio experimenten el menor impacto** posible durante la implementación.

Desglose de fases:

- **Fase 1:** (Telefonía + Hogar)
- **Fase 2:** (NBO, Knowledge Base, UP/Cross Selling Hogar/Motor)
- **Fase 3:** (Coche)
- **Fase 4:** (Moto)
- **Fase 5:** (Expats, Suplementos, UP/Cross Selling Otros ramos)
- **Fase 6:** (Retención, Recibos y Pagos, Recobro)
- **Fase 7:** Salud
- **Fase 8:** Empresas
- **Fase 9:** Fidelización + ATC y Chat

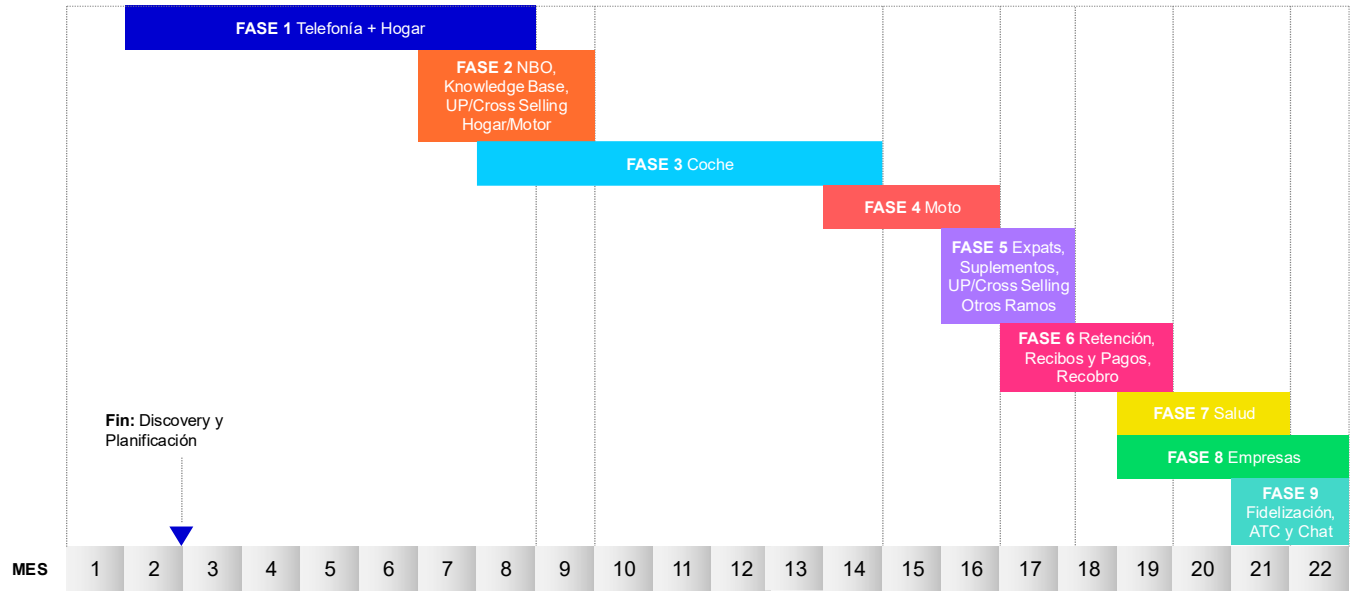

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[1.6] Retos de proyecto

A partir del análisis realizado y de nuestro entendimiento actual del contexto tecnológico y organizativo, identificamos una serie de retos relevantes que deberán ser considerados y gestionados de forma adecuada para garantizar el éxito del proyecto y minimizar impactos en la operación y en la atención al cliente.

Convivencia de iniciativas en el ámbito CCaaS

El proyecto se desarrolla en **paralelo a una iniciativa de Contact Center as a Service basada en Genesys Cloud liderada por otro partner,** lo que requiere un alto nivel de coordinación técnica y funcional para asegurar la correcta integración de capacidades, evitar solapamientos y garantizar una experiencia homogénea para los agentes.

Convivencia operativa entre sistemas Galgo y Salesforce

Durante el periodo **de transición será necesario gestionar la coexistencia entre Galgo y Salesforce**, definiendo mecanismos que permitan mantener la continuidad de los procesos comerciales y de atención al cliente sin penalizar la eficiencia operativa ni la experiencia del usuario.

Nivel limitado de conocimiento sobre el alcance funcional y técnico del proyecto de Genesys Cloud

Actualmente existe un **grado de incertidumbre respecto al alcance detallado de la implementación de Genesys Cloud**, lo que puede dificultar la definición completa de integraciones, flujos de atención y responsabilidades entre plataformas.

Falta de claridad en el modelo de convivencia entre Genesys, Avaya, Salesforce y Galgo

La **coexistencia de diferentes soluciones de atención y gestión comercial, incluyendo Avaya, Salesforce y Galgo,** plantea la necesidad de definir de forma precisa el modelo operativo, los puntos de integración y el reparto de responsabilidades entre sistemas.

Alineamiento entre el licenciamiento adquirido y la solución propuesta

Será necesario **validar que las capacidades contempladas en la arquitectura funcional y técnica estén adecuadamente cubiertas por el licenciamiento** disponible, evitando desviaciones funcionales o necesidades adicionales no previstas.

Existencia de iniciativas paralelas en LDA con impacto en el proyecto

El desarrollo de otras iniciativas estratégicas dentro de LDA puede **generar dependencias, cambios de prioridad o impactos en los sistemas implicados**, por lo que será necesario establecer mecanismos de coordinación y gobierno que permitan gestionar dichas interrelaciones.

Complejidad en la integración con sistemas existentes

La integración con determinados **sistemas legacy presenta retos técnicos derivados de la coexistencia de tecnologías, APIs y protocolos potencialmente incompatibles**, lo que puede requerir adaptaciones específicas o capas de integración adicionales para garantizar la interoperabilidad.

[1.7] Valor añadido Ayesa

Con el fin de reforzar nuestra propuesta y maximizar el impacto del proyecto**, presentamos a continuación los elementos de valor añadido que Ayesa incorpora de forma diferencial**. Estas aportaciones complementan el alcance establecido y contribuyen a una ejecución más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos estratégicos de LDA.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Experiencia

Ayesa cuenta con amplia experiencia en la transformación de procesos comerciales y modelos de atención al cliente, con foco en **omnicanalidad, automatización** y mejora de la relación con el cliente. Ha desarrollado proyectos para organizaciones como **Heineken** y **ENEL**.

También ha participado en iniciativas de transformación y modernización de la atención al cliente para entidades como **Osakidetza**, **IB Salut**, **ASISA**, **Ejie** y **Moeve**.

Asimismo, se ha desarrollado proyectos de integración de plataformas centradas en el cliente para compañías como **Generali**, así como la implantación de **agentes basados en inteligencia artificial generativa y conversacional**. La compañía cuenta además con certificaciones oficiales en la plataforma Salesforce.

Actualmente, Ayesa lidera la implantación del nuevo modelo de atención en ASISA y en el Servicio Balear de Salud, utilizando el conector CX Cloud de Genesys y Salesforce (Service Voice) como base de su plataforma omnicanal. Ambos proyectos constituyen las **primeras implementaciones de gran escala en España de omnicanalidad** utilizando este conector.

Conocimiento

Ayesa dispone de conocimiento especializado en plataformas líderes de gestión de clientes y experiencia de usuario, con capacidades consolidadas en **Salesforce** y **Genesys**, así como en tecnologías de **IA** y **analítica de datos**.

Este conocimiento se articula a través de **Centros de Excelencia** especializados, que permiten concentrar capacidades técnicas, metodológicas y sectoriales, facilitando la implantación de soluciones complejas y la evolución continua de las plataformas.

La compañía cuenta con **más de 247 profesionales certificados**, **más de 750 certificaciones, +60 proyectos y +10 proyectos BFSI en 2025** en tecnologías como Salesforce y Genesys, lo que garantiza una elevada capacidad técnica para abordar proyectos de transformación digital, implantación de modelos de atención omnicanal y automatización de procesos.

+247 profesionales certificados

+753 certificaciones

+60 Proyectos 2025

+10 Proyectos BFSI 2025

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Calidad

Ayesa trabaja con metodologías consolidadas de gestión y entrega, combinando marcos como **PMI** y **Scrum** según la naturaleza del proyecto. Tiene experiencia en entornos **multi-proveedor**, donde la coordinación y el gobierno del servicio son críticos.

Este modelo se refuerza con mecanismos de **aseguramiento de la calidad** y **fábricas de testing**, orientados a reducir riesgo, validar integraciones y asegurar estabilidad en producción.

Innovación

Ayesa no se limita a implantar tecnología. Desarrolla capacidades propias para acelerar la transformación. Ha trabajado en automatización de procesos, integración de sistemas y despliegue de soluciones basadas en **IA generativa** y **conversacional**, con aplicación directa en modelos de atención.

Además, cuenta con activos y aceleradores sobre **Salesforce** que permiten reducir tiempos de implantación, simplificar integraciones y llevar antes a operación las capacidades de negocio.

API ACCELERATOR By AYESA

EASYFORMS By AYESA

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[2] Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

[2.1] Contexto y nuestro entendimiento

Nuestro entendimiento como punto de partida (AS-IS), de los retos y objetivos que LDA se ha trazado y que justifican la implantación de una solución CRM de mercado (Microsoft Dynamics 365 o Salesforce).

Nuestro diagnóstico se orienta a:

1. Describir el ecosistema operativo actual (Galgo + mainframe + satélites),
2. Identificar fricciones y riesgos relevantes para el CC y equipos operacionales
3. Traducir dichas observaciones en necesidades de diseño para la fase de Discovery+UX, la implementación, el despliegue progresivo y la posterior transferencia al futuro CoE de CRM.

El CRM debe habilitar una gestión más eficiente e integral del cliente, con visión 360, trazabilidad auditable de interacciones, capacidad de automatizar tareas mediante IA y coexistencia temporal con el portal Galgo, manteniendo integración en tiempo real o casi en tiempo real en ambos sentidos.


[2.2] Situación actual: ecosistema operativo y canales

[2.2.1] Galgo como frontal operativo del core asegurador

Actualmente, LDA utiliza el portal Galgo (desarrollo interno) como herramienta principal de gestión del ciclo de vida del negocio: cotizaciones, suplementos, retención, cancelaciones y otras operativas. Galgo actúa como frontal “amigable” del core en mainframe, utilizado por operadores internos y externos.

A nivel tecnológico, la lógica de negocio reside mayoritariamente en programas COBOL sobre mainframe z/OS, accedidos mediante CTG (CICS Transaction Gateway). El frontal de Galgo está desarrollado en JavaServer Faces y dispone de una capa de servicios que expone funcionalidades de negocio a Galgo y a otras aplicaciones.

Los datos principales residen en DB2 del mainframe, con un gestor documental en DB2 Content Manager accesible a través de servicios.

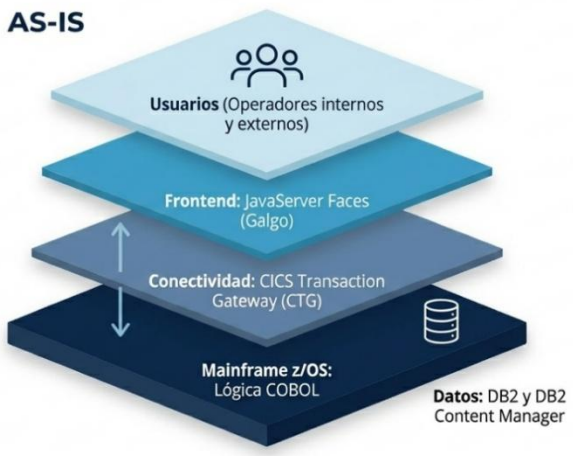

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[2.2.2] Limitaciones actuales respecto a un CRM de mercado


Galgo, aun cubriendo gran parte de la operación, no satisface necesidades típicas de CRM: visión 360 unificada, mapa de interacciones, agenda/citas más ágiles, gestión omnicanal y capacidades avanzadas de IA para asistir a los agentes.

En particular, se requiere una agenda vinculada a oportunidades, paneles de rendimiento en tiempo real, transcripción y resumen de llamadas, asistentes/argumentarios inteligentes y gestión multi-producto (carrito) con pago único, que evidencian una brecha entre el AS-IS y la ambición TO-BE, pero que según nuestra experiencia en TI y en el negocio asegurador, alcanzable.

[2.2.3] Canales e interacción con el cliente (Contact Center)

LDA está desplegando una nueva plataforma CCaaS en Genesys Cloud durante 2026/27. La premisa de partida es que Genesys Cloud sea el gestor de interacciones (voz y chat; email pendiente de confirmación), mientras que el CRM debe integrarse para que el **agente opere en una única experiencia** (contexto y registro en CRM + canal gestionado en Genesys).

La transcripción de llamadas será proporcionada por Genesys Cloud, y se espera que el CRM persista la conversación de chat como registro asociado al cliente, además de habilitar analítica/sentimiento también para chat cuando esté integrado.

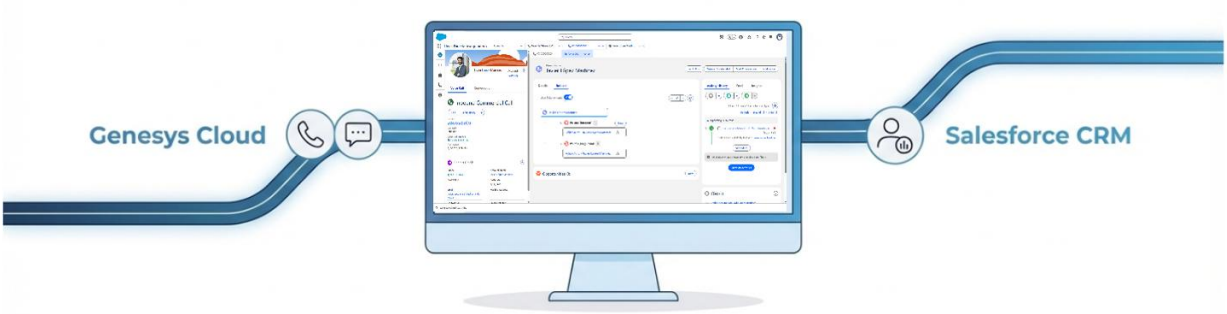

Desde AYESA entendemos esta experiencia, no solo para mejorar la calidad sino también para mejorar la productividad. Ya lo hemos hecho con éxito…

[2.3] Arquitectura actual y patrón objetivo de integración

[2.3.1] Principio rector: coexistencia Galgo - CRM y sincronización near-real-time

El objetivo inmediato no es un 'big bang' sustituyendo el core, sino una convivencia funcional entre Galgo y el nuevo CRM, con fases donde algunos procesos se embeben o se referencian a Galgo y, progresivamente, se rediseñan procesos aprovechando capacidades nativas del CRM.

El modelo de integración requerido es bidireccional, desacoplado y resiliente, con latencia objetivo inferior a 5 segundos (p95) para el flujo Galgo a CRM, y un patrón síncrono request/reply (APIs REST vía API Manager) para CRM a Galgo. Se limita el batch a tablas de referencia.

[2.3.2] Flujo Galgo a CRM (event - driven)

Como uno de los componentes principales de la captura de eventos en el flujo CRM, LDA dispondrá de un sistema de Change Data Capture (CDC) que capturará cambios en DB2 y los publicará en un bus (Kafka o equivalente) como eventos canónicos, sin adaptación al modelo del consumidor. Desde AYESA asumiremos la capa de consumo y transformación.


El modelo de evento, versionado y compatibilidad hacia atrás estarán gobernados por LDA, donde debemos adaptarnos en la integración.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[2.3.3] Flujo CRM a Galgo (request / reply)

Para escrituras y consultas desde CRM hacia el core, se establece un API Manager (a determinar) que expondrá APIs REST con autenticación (tokens/JWT), TLS, rate limiting, logging y auditoría con correlación end-to-end. Además de los errores que seguirán el estándar RFC 7807.

Basado en nuestra experiencia, vamos a proponer opciones de API Management y estándares de API en paralelo se están definiendo, que cubran transacciones complejas (como p.ej. la cotización multi-producto).

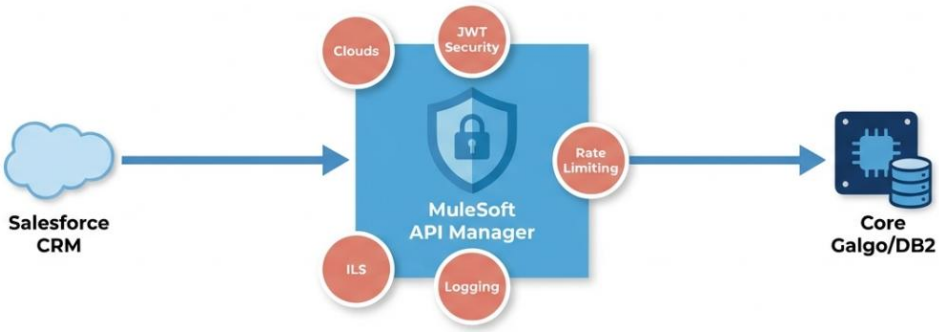

[2.3.4] Observabilidad y trazabilidad

LDA utiliza ELK y Dynatrace como tecnologías base. El integrador deberá instrumentar la capa de consumo Kafka y la invocación de APIs desde el CRM, mientras que la instrumentación del core corresponde a LDA.

[2.4] Datos, maestros y volumetría

[2.4.1] Sistemas maestros (source of truth)

El mainframe seguirá siendo sistema maestro para entidades core y transaccionales (pólizas, cotizaciones/presupuestos, siniestros, recibos y pagos, datos bancarios, riesgos, fidelización).

El CRM será maestro de entidades de relación generadas y gestionadas en CRM (avisos, aprobaciones, encuestas, reclamaciones, actividades, etc.).

En las respuestas a dudas se reafirma que los datos de identidad y direcciones del cliente residen en el mainframe y que el pricing/tarificación permanece en el core; el CRM invocará servicios para cotizar y recalcular, evitando duplicidades de lógica entre Galgo y CRM.

[2.4.2] Volúmenes y concurrencia

LDA comparte volumetrías claves como referencia que reafirma la importancia de una solución CRM robusta y ágil.

3.6M Clientes	**6M** Pólizas	**~7M** Cotizaciones (y 1.7M de leads)
~7M Cotizaciones (y 1.7M de leads)	**58.5M** Transacciones de recibos y pagos	**1.000 - 1.300** Usuarios concurrentes en hora pico con capacidades completas

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Nota: No se dispone aún de un volumen exacto de eventos CDC/día, que ayudaremos a determinar durante el proyecto.

Estos datos condicionan dimensionamiento, rendimiento de UI, diseño de integraciones y límites de API.

[2.4.3] Migración y persistencia en CRM


Debemos definir una estrategia de migración (big bang vs fases) y la persistencia exacta de entidades de negocio en CRM, que es clave para la continuidad de la operación

En ese sentido, la migración de presupuestos en curso no cerrados (al menos última versión) y el histórico de leads, incluyendo exclientes son necesarios para lograr dicha continuidad.

No se pretende migrar documentos al CRM, los cuales permanecerán en el gestor documental corporativo, con consulta desde CRM vía APIs.

Nuestra visión y experiencia en la implantación y mantenimiento de Core aseguradores y soluciones CRM, la migración, transformación e carga al modelo CRM, con validación pre/post migración, regularización del dato y reconciliación periódica sobre entidades core maestras del mainframe (prioritarias), es un proyecto que se ejecuta en paralelo al proyecto principal de implantación del CRM. Tal como LDA requiere.

[2.5] Retos principales identificados (AS-IS / TO-BE)

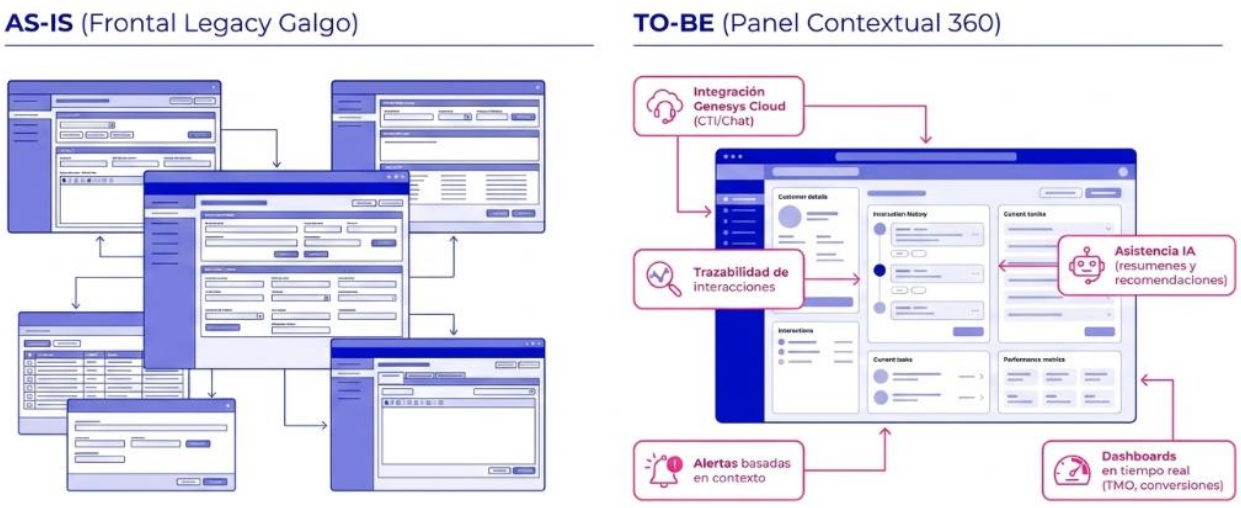

[2.5.1] Experiencia del agente: eficiencia operativa y “single pane of glass”

El reto central es evolucionar desde un frontal legacy (Galgo) hacia un CRM operacional que soporte el trabajo del Contact Center y equipos operacionales con una experiencia más guiada, menos repetitiva y con visibilidad contextual (cliente, pólizas, oportunidades, interacciones). Esto incluye: agenda ligada a oportunidades, navegación optimizada, edición en línea y alertas/avisos basados en contexto.

Dado que Genesys Cloud gestionará las interacciones, el CRM debe integrarse con CTI/chat para presentar al agente el contexto adecuado (resumen/transcripción, histórico, motivos y próximos pasos), evitando saltos de herramienta y reduciendo TMO.

[2.5.2] Procesos core complejos: multi-producto, verificación, suplementos, recibos

El backlog funcional describe procesos con elevada complejidad operativa: oportunidad multi-ramo con versionado y “carrito”, verificación (presencial/foto/app/vídeo) con estados y SLAs,

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

documentación pendiente, suplementos con versionado y periodos de renovación, y recibos/pagos con múltiples acciones.

Estos procesos requieren una orquestación fina entre CRM y core, manteniendo el mainframe como maestro y garantizando consistencia.

El CRM actuará como frontend/orquestador del 'carrito', pero la ejecución del pago se delega al backend vía APIs (pasarela con API REST; tokenización PCI por tercero).

Para oportunidades, debemos proponer si el estado/etapas aplican por producto o por oportunidad completa, especialmente cuando conviven productos pagados y pendientes.

[2.5.3] Gobierno de reglas (suscripción, retención, campañas) y dependencia de sistemas satélite

Muchas decisiones de negocio (suscripción, pricing, retención 'pirámide') residen en el mainframe y/o herramientas internas, y el CRM debe consumirlas en tiempo real. Adicionalmente, campañas y comunicaciones combinan Centro de Notificaciones (CDN) on-premise (API REST para transaccional) y Adobe Campaign para campañas; la integración con Adobe para consulta de ofertas existe (incluyendo SOAP en algunos puntos).

[2.5.4] Cumplimiento (RGPD/DORA) y datos sensibles

Se tratarán datos personales, bancarios y de salud (Vivaz), con clasificación de máxima sensibilidad como los datos de salud, por tanto, DORA, como reglamento de la UE obligatorio de ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos para el sector asegurador, se debe aplicar y cumplir desde el inicio del proyecto.

Se facilitará un catálogo de retención por tipo de dato. La lógica de borrado/anonimización se ejecutará principalmente desde el mainframe, con casuísticas especiales desde el CRM (potenciales, derechos ARCO). Además, la anonimización/enmascaramiento en entornos de prueba es obligatoria y LDA proporcionará datasets ficticios.

[2.5.5] Gestión del cambio y adopción (escala Contact Center)

El proyecto impacta a ~2.000 usuarios en varios colectivos (contact center, operativos, consultivos, externos/partners). LDA solicita una alta presencialidad para Discovery+UX y gestión del cambio, con formaciones principalmente presenciales en Madrid, soportadas por la plataforma LMS corporativa Iseazy y un esquema de certificación propio.

Actualmente no existe un CoE de CRM en LDA y vamos a hacer una propuesta de mentoring, transferencia de conocimiento y duración. Esto refuerza la necesidad de diseñar un modelo de operación futura (roles, administración, DevOps, release management) desde etapas tempranas.

[2.6] Necesidades derivadas del diagnóstico que debemos resolver

[2.6.1] A nivel funcional/operativo

- Visión 360 en CRM con componentes transversales (panel contextual) y trazabilidad auditable de interacciones, integrando voz/chat de Genesys.
- Orquestación de oportunidad multi-producto con versionado, comparativas y 'carrito' con pago único delegando ejecución al backend.
- Automatización y asistencia al agente (IA) orientada a casos de uso operacionales: resúmenes, recomendaciones, argumentarios y alertas.
- Gestión robusta de procesos de verificación/documentación/valoración y de suplementos con reglas de periodos y bloqueos operativos.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- Dashboards en tiempo real para operador y supervisor con KPIs operativos (TMO, conversiones, etc.) alimentados por Genesys y el core.

[2.6.2] A nivel técnico y de arquitectura

- Diseño y construcción de la capa de consumo Kafka: mapeos, upserts, control de duplicados y eventos fuera de orden, DLQ, reintentos, alertas y reprocesos.
- Diseño de integraciones CRM→Galgo vía API Manager: contratos de API, seguridad (OIDC/OAuth2 con AzureAD/Entra), throttling, RFC 7807 y catálogo de errores orientado a operación.
- Estrategia de migración y reconciliación por entidades, con decisiones explícitas de persistencia vs consulta, y mecanismos de enmascaramiento en entornos no productivos.
- Observabilidad end-to-end con ELK/Dynatrace: correlación de IDs, métricas de latencia p95 y SLIs/SLOs por flujo.
- Diseño para rendimiento y escalabilidad considerando 1.000–1.300 concurrentes, límites de API y patrones de caché/lecturas optimizadas.

[2.6.3] A nivel de cambio y modelo operativo

- Plan de despliegue secuencial por colectivos y releases, con formación principalmente presencial en Madrid y soporte en Iseazy.
- Modelo de adopción con métricas (uso, eficiencia, curva de aprendizaje) comparables con la línea base actual.
- Hipercare por release (mínimo 6 semanas) y transición al futuro CoE (sin experiencia previa en plataformas) mediante Train-the-Trainer, mentoring y documentación operativa.
- Modelo de soporte L1/L2/L3 integrado con ServiceNow (CMDB e ITSM), incluyendo guardias 24x7 para críticos.

[2.7] Conclusión del diagnóstico

En síntesis, LDA parte de un ecosistema robusto y altamente transaccional (mainframe + Galgo) que ha soportado el crecimiento del modelo directo, pero que presenta limitaciones para una gestión moderna de relación con el cliente y una operación omnicanal asistida por IA.

La implantación de un CRM de mercado debe resolver esas limitaciones sin comprometer la estabilidad del core, mediante una coexistencia planificada y una integración near-real-time con resiliencia, gobierno de dato y observabilidad.

El éxito dependerá de:

1. Diseñar una experiencia de agente coherente en un entorno de alta concurrencia,
2. Asegurar integraciones y consistencia de datos a escala,
3. Cumplir RGPD/DORA desde el arranque, y
4. Ejecutar una gestión del cambio intensiva y presencial que garantice adopción y transferencia a un CoE interno.

Aspecto clave que nos deja el diagnóstico: Un proyecto de implantación del CRM exitoso debe contemplar la implantación a futuro de un nuevo Core Asegurador en LDA, ejecutando un proyecto de integración entre el CRM y el nuevo Core, de “desenganche y enganche” de forma viable y sin traumas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[3] Propuesta técnica

En este apartado se presenta la propuesta de solución de Ayesa, acotando el alcance **funcional y tecnológico** de la iniciativa en base a los requerimientos establecidos por LDA en la RFQ.

[3.1] Alineamiento de la solución

El objetivo de este apartado es explicar por qué, para LDA, Salesforce encaja mejor como plataforma central para **cotización, contratación y atención**. El punto de partida es conocido: **información distribuida**, **canales no homogéneos**, **poca trazabilidad end-to-end** y **mucha carga manual**, con impacto directo tanto en la experiencia del asegurado como en la eficiencia de los equipos. Para LDA, esto se traduce en algo muy concreto, **poner al agente a trabajar con contexto completo desde el minuto uno** (cliente, pólizas, histórico y situación comercial), con un hilo de gestión único y medible. El foco es reducir fricción operativa, estandarizar la atención y habilitar automatización allí donde hoy hay tareas manuales y saltos de herramienta.

En este contexto, Salesforce no se plantea como un cambio tecnológico por modernizar, sino como una decisión práctica de **negocio** para **llegar antes y con menos riesgo** al modelo objetivo. En seguros, el diferencial está en partir de una plataforma ya preparada para **operación comercial y de servicio.**

[3.1.1] Especialización y garantía sectorial (seguros)

En el sector asegurador, Salesforce parte con ventaja por madurez y adopción. Según referencias compartidas por Salesforce, en España **8 de las 10 principales aseguradoras** de No Vida lo utilizan ya en Contact Center, ventas y/o marketing. Esto reduce riesgo y acelera porque hay patrones y experiencias previas comparables. A esto se suma la **madurez del ecosistema** (aceleradores, partners y perfiles con experiencia real en Contact Center y Seguros), que facilita industrializar el despliegue y sostenerlo en el tiempo. Y, según el benchmark compartido por Salesforce, las organizaciones con mayor adopción han mostrado mejores resultados de crecimiento en ramos como Multirriesgo (2021–24), lo que refuerza que no es una apuesta experimental.

[3.1.2] Integración nativa frente a arquitectura fragmentada

El modelo objetivo requiere que ventas, servicio y marketing trabajen con el **mismo dato y el mismo contexto**, y que el histórico de la relación con el cliente sea trazable. Con **Customer 360**, Salesforce permite operar de forma unificada, evitando dependencias innecesarias de soluciones separadas para compartir información.

Dos capacidades refuerzan este enfoque:

- **Data Cloud**, para unificar datos de distintas fuentes en tiempo casi real, reduciendo duplicidades y retrasos.
- **Einstein Trust Layer**, para aprovechar IA generativa con controles y salvaguardas adecuados, especialmente relevante cuando tratamos información sensible.

[3.1.3] Impacto directo en P&L y ROI

La mejora más tangible está en la operación diaria: menos pantallas, más contexto y más automatización. Según referencias de Salesforce, la reducción de tareas administrativas (especialmente post-llamada) y la concentración de la operativa del agente en un único entorno puede traducirse en mejoras de productividad del **10%–30%**, en función del alcance.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

A esto se suma el **time-to-market**: con enfoque low-code y herramientas como **OmniStudio**, es más rápido ajustar procesos y journeys cuando cambian productos, campañas o condiciones de mercado.

[3.1.4] Visión de socio estratégico a largo plazo

La transformación no termina en el go-live. Salesforce mantiene un ritmo de **tres lanzamientos anuales** y, según la información aportada, dispone de **releases específicas para servicios financieros**, lo que facilita incorporar nuevas capacidades sin proyectos de actualización pesados.

Con **Hyperforce**, se refuerza la escalabilidad y los requisitos de residencia de datos y cumplimiento (p. ej., **GDPR**), acompañando el crecimiento de la plataforma a medida que crece la operación.

[3.1.5] Encaje con el modelo objetivo del proyecto

Con Salesforce como plataforma central, el proyecto permite **unificar oportunidades, cotizaciones y casos** y operar con una experiencia omnicanal coherente y medible. El modelo combina:


- Atención humana especializada (equipos comerciales y de servicio).
- Automatización e IA para clasificar, priorizar y acelerar la resolución.
- Base de conocimiento única, para asegurar consistencia.
- Visión 360º del cliente (pólizas, cotizaciones, siniestros e interacciones).
- Evolución progresiva alineada con el roadmap tecnológico y de producto.

[3.2] Alcance de la solución

[3.2.1] Mapa tecnológico conceptual

En el presente apartado, desde Ayesa en base a nuestro conocimiento de alcance, cliente y producto detallamos el modelo conceptual de la solución propuesta.

A continuación, se detallan las soluciones específicas que componen la plataforma apoyada sobre tecnología Salesforce.

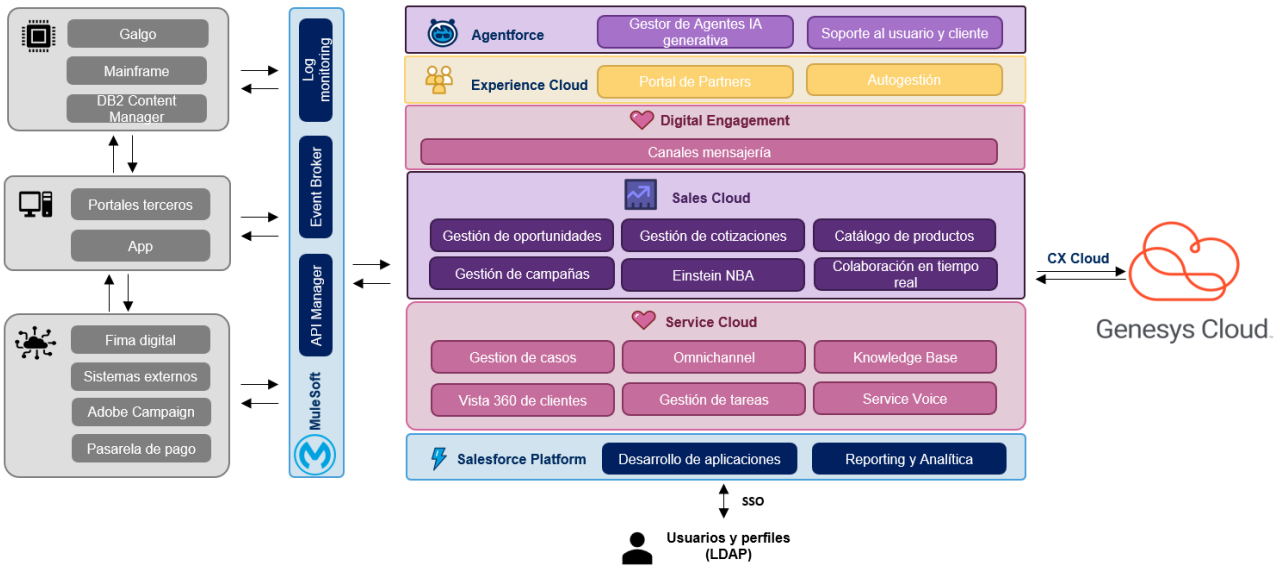

La solución propuesta se estructura en varios componentes integrados para ofrecer una experiencia unificada para equipos comerciales, operación de atención y canales digitales, con capacidad de evolución hacia automatización e IA:

- **Capa CRM Comercial y Servicio (Sales + Service):** entorno unificado para la gestión del ciclo de vida del cliente, combinando capacidades de Sales Cloud (oportunidades, cotizaciones, campañas, catálogo, colaboración) y Service Cloud (casos, omnicanalidad, knowledge, tareas, Service Voice y vista 360). Es la consola principal de trabajo para usuarios internos y equipos de atención de LDA.

- **Capa de interacción e IA (Digital Engagement + Experience + Agentforce):** habilita canales de mensajería, portales y atención digital con continuidad de contexto, complementándose con Agentforce para agentes de IA generativa orientados tanto a soporte al usuario/cliente como a automatización asistida (resolución, guía, y ejecución de acciones cuando aplique).

- **Ecosistema e integraciones (Genesys + MuleSoft):** coexistencia con Genesys Cloud como plataforma de contact center, conectada mediante CX Cloud, y conexión con Galgo y sistemas core del asegurador, portales de terceros/apps y otras plataformas externas a través de MuleSoft como orquestrador de eventos, APIs e integraciones.

Todos los componentes Salesforce (Sales, Service, Digital Engagement y Agentforce) se apoyan en **Salesforce Platform**, compartiendo gobierno, seguridad compartiendo gobierno, seguridad **(enriquecido con Salesforce Shield para auditoria),** automatización, datos y capacidades operativas bajo una misma base tecnológica gracias a los puntos de conexión brindados por MuleSoft y el conector CX Cloud con el resto de los sistemas. Esto permite que la solución opere como un único sistema desde el punto de vista del usuario y de la gestión.

Salesforce Platform nos permitirá personalizar, integrar y escalar las soluciones de Salesforce para ajustarse a las necesidades específicas de LDA, presentando capacidades transversales necesarias:

- **Automatización y orquestación de procesos:** construcción de flujos end-to-end para procesos comerciales y de atención, con reglas de negocio, integración con sistemas core y externos y experiencias guiadas.

- **Modelo de datos y visión 360:** consolidación del contexto del cliente apoyándose en el modelo de datos adaptado y Service para consistencia y evolutividad, aportando una visión completa de entorno familiar y parque contratado.

- **Reporting y analítica:** explotación de KPIs operativos y comerciales desde la propia plataforma, con cuadros de mando para seguimiento de rendimiento, productividad y calidad.

- **Operación y gobierno:** control de acceso, auditoría, monitorización y operación alineada con necesidades enterprise (incluyendo observabilidad de integraciones y trazabilidad).

- **Gestión y operatividad:** capacidad de gestión de trabajo y planificación para los usuarios, apoyando los flujos de trabajo mediante tareas, eventos, notificaciones, UX adaptada y funcionalidades de caja que optimizan la operativa diaria de los agentes.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

De forma adicional a las capacidades base del core de Salesforce, la plataforma contará con funcionalidades vitales y

Agentforce: Implementaremos agentes conversacionales personalizados con lógica de negocio de LDA y nutridos con base de conocimiento para automatizar consultas frecuentes del cliente y usuarios internos (genéricas y contextualizadas) y ejecutar acciones cuando aplique. Agentforce actúa como catalizador del conocimiento, NBO y NBA frente a los flujos contextualizados del agente.

Experience Cloud: Utilizado como portal de acceso para los usuarios partners relacionados con línea directa. Permitirá el alta de oportunidades y gestión de leads y referals de forma integrada con el resto del core de la solución.

Digital Engagement: Utilizaremos como capa de atención asíncrona/síncrona para operar canales de mensajería (Chat-web y WhatsApp) y centralizar la conversación del cliente como una interacción trazable y gestionable por colas/agentes, con continuidad y contexto compartido con casos y el histórico del cliente.

Sales Cloud: Gestor del pipeline comercial, permitiendo gestionar oportunidades y cotizaciones, apoyándose sobre el modelo de productos y prizebook vinculado a los sistemas core. Permitirá la gestión de cross y up-selling apoyándose en Einstein Next Best Action adecuado a las reglas de negocio de LDA y la gestión de campañas comerciales o de renovación/fidelización.

Service Cloud: Se implementa el núcleo operativo de atención: modelo de caso, tipificación, estados y flujos de trabajo, comentarios internos/externos, tareas y documentos asociados, trazabilidad de cambios, y capacidad de registro manual o automatizado desde canales y agentes IA.

Service Cloud — Voice: Implementaremos Omni-Channel para enrutar llamadas desde Genesys, controlar el estado de los agentes y la supervisión operativa para asegurar carga equilibrada y SLAs. Contaremos con capacidades aumentadas gracias al conector nativo entre las plataformas de CX Cloud.

MuleSoft (Integración, eventos y gobierno API): Se utiliza como capa de integración entre Salesforce y los sistemas del esquema (Galgo/mainframe/DB2 content manager, portales de terceros/app, firma digital, Adobe Campaign, pasarela de pago y otros externos), evitando integraciones punto a punto y estandarizando el intercambio de datos. Actúa como API Manager para publicar/consumir APIs con gobierno (seguridad, políticas, control de uso y versionado) y como broker de eventos para comunicaciones NRT (Near Real Time). Además, incorpora monitorización y trazabilidad (logs/métricas/errores) para operar y diagnosticar de extremo a extremo los flujos entre el CRM y el resto del ecosistema.

Platform — Desarrollo de aplicaciones: Cubriremos necesidades transversales del piloto mediante capacidades estándar de plataforma: objetos y pantallas específicas , automatizaciones, servicios/APIs, seguridad y gobierno, auditoría y mecanismos de despliegue y operación acordes a la política de LDA.

Platform — Reporting y Analítica: Haremos uso de los reports y dashboards operativos para su visualización por parte de los usuarios de los diferentes servicios así como para el seguimiento y la toma de decisiones de rollout, apoyándose en reporting estándar de Salesforce.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[3.2.2] Arquitectura técnica


[3.2.2.1] Visión estratégica

Nuestra propuesta consolida una **Plataforma Corporativa de Integración** que trasciende lo técnico para ser un habilitador de transformación digital. Evolucionamos el modelo de LDA desde conexiones punto a punto hacia una arquitectura **gobernada, desacoplada y orientada a la reutilización**.

Esta estrategia se alinea con criterios de **sostenibilidad presupuestaria y optimización de costes** mediante:

- **Eficiencia en el Gasto Público:** El diseño **API-First** crea activos reutilizables que eliminan duplicidades. Al construir módulos estándar, Linea Directa reduce el gasto en mantenimientos y futuras iniciativas.
- **Optimización del TCO (Costo Total de Propiedad):** El desacoplamiento permite evolucionar sistemas de registro sin reconstruir integraciones, minimizando el impacto económico de futuras actualizaciones.
- **Retorno de Inversión y Agilidad:** Un catálogo de APIs preexistente reduce los tiempos de entrega, maximizando el rendimiento de los recursos financieros y humanos.
- **Soberanía Tecnológica:** Evitamos la dependencia del proveedor (*vendor lock-in*), asegurando que LDA posea activos perdurables y financieramente sostenibles.

La propuesta se fundamenta en: **desacoplamiento, seguridad por diseño (ENS), observabilidad y escalabilidad**, garantizando una infraestructura técnica solvente y responsable.

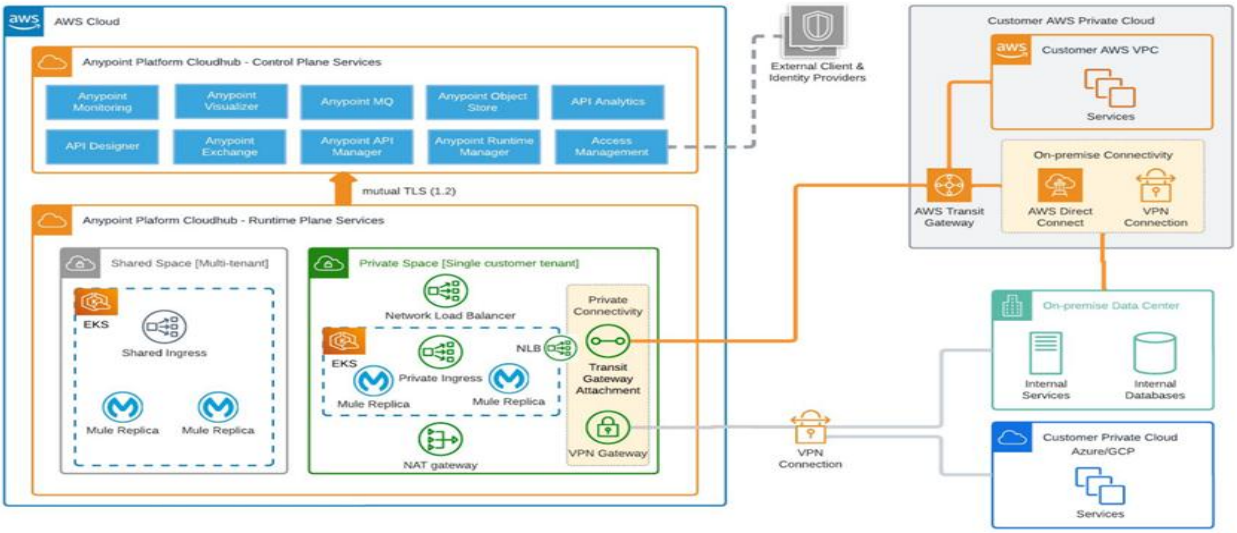

[3.2.2.2] Arquitectura lógica API-LED

La arquitectura se estructura siguiendo el modelo **API-Led Connectivity**, organizado en tres capas claramente diferenciadas que permiten aislar responsabilidades y minimizar el impacto de cambios.

- **Capa de Sistema**: Encapsula los sistemas de registro (bases de datos, aplicaciones legacy, ERP, CRM y servicios externos). Estas APIs protegen los sistemas core, evitando accesos directos y proporcionando una capa de abstracción estable.
- **Capa de Proceso**: Orquesta procesos de negocio transversales, compone datos provenientes de múltiples sistemas y aplica reglas de negocio comunes. Permite reutilización sistemática y evita duplicidad de lógica.


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Capa de Experiencia**: Adapta la información a los distintos canales de consumo (web, móvil, terceros, partners, organismos públicos). Permite optimizar formatos, seguridad y rendimiento según el consumidor final.

Este modelo garantiza una **arquitectura modular** donde los cambios en un sistema de registro no impactan directamente a los canales digitales, permitiendo evolución independiente.

Control de Proliferación y Gobierno: Para evitar la redundancia y garantizar la sostenibilidad, implementamos un **modelo de gobierno con revisión arquitectónica previa** a cada desarrollo. Antes de crear una nueva API, se valida su necesidad frente al catálogo existente en **Anypoint Exchange**, bloqueando la proliferación de servicios duplicados y asegurando que cada nuevo activo aporte valor incremental y cumpla con los estándares de diseño de Linea Directa.

Este modelo garantiza una arquitectura modular y desacoplada, permitiendo que los cambios en sistemas de registro no impacten en los canales digitales.

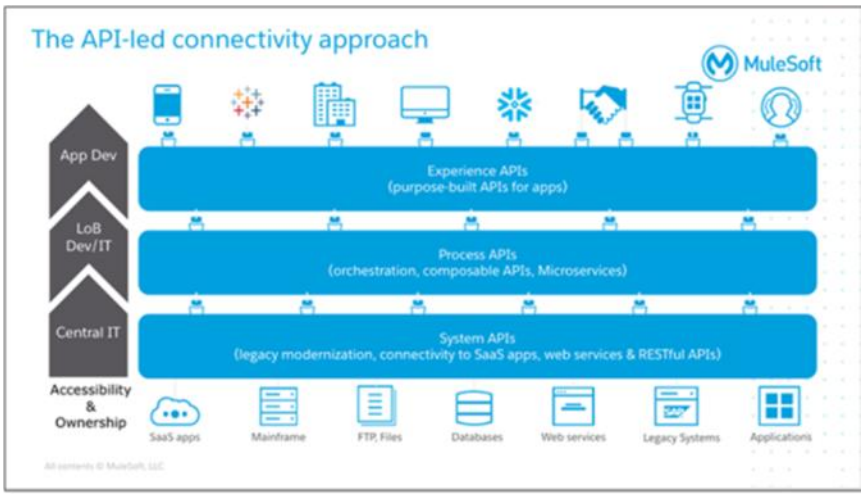

[3.2.2.3] Arquitectura orientada a eventos y mensajería

Para garantizar resiliencia, desacoplamiento temporal y escalabilidad, la arquitectura incorpora una **capa de mensajería distribuida** basada en **Apache Kafka y/o Anypoint MQ**, seleccionando la tecnología más adecuada según el caso de uso, criticidad y modelo de operación requerido, desde **Ayesa** se propone que en **la fase de Análisis** se revise con el **Arquitecto** hacia qué solución es conveniente dirigir el proyecto según las necesidades y características del **ecosistema tecnológico de Linea Directa**.

Este enfoque permite implementar un modelo **Event-Driven Architecture (EDA)** donde los sistemas publican y consumen eventos sin depender de respuestas síncronas inmediatas, reduciendo el acoplamiento entre componentes y mejorando la flexibilidad evolutiva del ecosistema tecnológico.

La incorporación de mensajería aporta:

- **Desacoplamiento tecnológico y temporal** entre productores y consumidores.
- **Persistencia garantizada de mensajes**, evitando pérdidas ante fallos.
- **Escalabilidad horizontal**, permitiendo absorber picos de carga sin degradación del rendimiento.
- **Tolerancia a fallos y alta disponibilidad**, mediante replicación y mecanismos de reintento.
- **Procesamiento asíncrono optimizado**, mejorando tiempos de respuesta en los canales digitales.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

La arquitectura contempla dos aproximaciones complementarias:

Apache Kafka como plataforma de streaming distribuido para escenarios de alta volumetría, integración masiva, procesamiento en tiempo real y necesidad de retención prolongada de eventos.

Anypoint MQ como solución gestionada e integrada nativamente en la plataforma MuleSoft, especialmente adecuada para flujos desacoplados dentro del ecosistema de APIs y para simplificar la operación en entornos cloud gobernados.

La combinación de **APIs síncronas** para procesos transaccionales críticos y **mensajería asíncrona** para procesos desacoplados permite optimizar simultáneamente la experiencia de usuario, la eficiencia operacional y la resiliencia del sistema.



[3.2.2.4] Seguridad, gobierno y diseño API

La arquitectura propuesta incorpora un modelo integral de **Seguridad y Gobierno**, concebido como una capa transversal que afecta a todos los componentes de la solución: APIs, mensajería, identidades, infraestructuras y procesos de desarrollo.

Este enfoque no impone un modelo externo, sino que se integra de forma nativa en el marco de cumplimiento de LDA, reforzándolo mediante la aplicación estricta del **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** y las mejores prácticas de la industria de integración.

El enfoque se basa en cuatro pilares fundamentales:

3.2.2.4.1. Modelo de Seguridad Zero-Trust y Cumplimiento ENS

La arquitectura adopta el principio **Zero-Trust**, donde ningún acceso es considerado confiable por defecto. En cumplimiento con el ENS, cada solicitud gestionada por la plataforma será:

- **Autenticada y Autorizada:** Mediante políticas centralizadas en **Anypoint API Manager**.
- **Registrada y Monitorizada:** Utilizando **Anypoint Monitoring** para la detección temprana de anomalías.
- **Trazada de extremo a extremo:** Garantizando la auditabilidad completa de los flujos de datos.

Este modelo reduce la superficie de ataque, limita los movimientos laterales y asegura un control total sobre el acceso a los servicios y datos críticos de LDA.

3.2.2.4.2. Integración con el IAM Corporativo de LDA

La solución se integrará plenamente con el sistema de gestión de identidades (IAM) de LDA (Microsoft Entra ID o equivalente), adaptándose a sus protocolos de autenticación y reglas de segregación de funciones. La arquitectura soporta de forma nativa:

- **Protocolos Estándar:** OAuth2, OpenID Connect y SAML 2.0.
- **Capacidades de Identidad:** Single Sign-On (SSO), Multi-Factor Authentication (MFA) y control de acceso basado en roles (**RBAC**).
- **Gestión de Aplicaciones:** Emisión y validación segura de tokens para la comunicación entre aplicaciones (*client credentials*).

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

3.2.2.4.3. Seguridad en la Capa de APIs (API-Led Connectivity)

Siguiendo el modelo de tres capas solicitado en el pliego, el **API Gateway** de MuleSoft aplicará políticas diferenciadas según la criticidad de la API:

- **Validación Estricta:** Uso de políticas de *IP Whitelisting*, *Rate Limiting* y control de cuotas para evitar la saturación de los sistemas *backend* (SAP, Salesforce, etc.).
- **Protección Avanzada:** Protección frente a ataques DoS, validación de esquemas/payloads y cifrado **TLS 1.2+** de extremo a extremo.
- **Segmentación de Catálogo:** Separación clara entre APIs internas (capa System), privadas (capa Process) y públicas o expuestas a terceros (capa Experience), cada una con su propio ciclo de vida y niveles de exposición controlados.

3.2.2.4.4. Diseño API-First con OpenAPI y RAML

La arquitectura adopta un enfoque **API-First**, donde todas las integraciones se definen mediante especificaciones formales antes de su implementación.

- **Contratos Formales:** El uso de **RAML** (nativo de MuleSoft) y **OpenAPI (OAS)** garantiza la interoperabilidad y reduce ambigüedades funcionales.
- **Anypoint Exchange como Catálogo Corporativo:** Todas las especificaciones serán almacenadas en Exchange para fomentar la **reutilización de activos**, gestionar el versionado y evitar los *breaking changes*.
- **Soberanía Tecnológica:** El uso de estándares abiertos asegura la independencia tecnológica de LDA y el alineamiento con los marcos normativos de interoperabilidad del sector público.

[3.2.2.5] Seguridad, gobierno y diseño API

Nuestra propuesta plantea una arquitectura de infraestructura robusta y escalable sobre la plataforma **MuleSoft Anypoint**, diseñada para garantizar la resiliencia operativa de Linea Directa y el cumplimiento de los niveles de servicio (ANS) más exigentes.

Arquitectura Híbrida y Alta Disponibilidad

Proponemos un modelo de despliegue flexible que se adapta a las necesidades de Linea Directa, aprovechando las capacidades de **Anypoint Runtime Fabric** o **CloudHub** según se requiera. Esta arquitectura garantiza la **Alta Disponibilidad (HA)** mediante:

- **Escalado Horizontal y Vertical:** Implementación de múltiples *workers* o nodos de *runtime* distribuidos, permitiendo absorber picos de carga sin degradación del servicio.
- **Balanceo de Carga y Resiliencia:** Uso de balanceadores de carga inteligentes para la distribución del tráfico y mecanismos de **Self-healing** (auto-recuperación) que reinician automáticamente los nodos ante fallos detectados.

Segregación de Entornos y Calidad del Software

Para asegurar una evolución tecnológica segura y sin interrupciones en el negocio, establecemos una segregación estricta de entornos bajo un modelo de promoción de código controlado:

- **Desarrollo (DEV):** Entorno de construcción y pruebas unitarias (MUnit).
- **Preproducción (PRE):** Espejo de producción para pruebas de integración (SIT) y aceptación de usuario (UAT).
- **Producción (PROD):** Entorno crítico con máxima protección y monitorización.

Estrategia DevOps y CI/CD Industrializado

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

El despliegue se gestiona bajo una metodología **DevOps** avanzada, automatizando el ciclo de vida de las APIs para minimizar el error humano y acelerar el *Time-to-Market*:

- **Pipeline de CI/CD:** Automatización de la integración y el despliegue continuo mediante herramientas estándar (Maven, Jenkins/Azure DevOps), garantizando que solo el código que supera los umbrales de calidad y seguridad (SAST) llegue a producción.
- **Infraestructura como Código (IaC):** Gestión de configuraciones mediante scripts, asegurando la consistencia entre entornos y facilitando la **Recuperación ante Desastres (DRP)**.

Observabilidad y Gobernanza Operativa

La arquitectura se completa con un ecosistema de monitorización integral:

- **Anypoint Monitoring & Visualizer:** Proporcionamos visibilidad en tiempo real de la topología de red, el rendimiento de las APIs y la detección proactiva de cuellos de botella.
- **Registro Unificado de Logs:** Centralización y persistencia de logs para auditoría, facilitando el cumplimiento normativo y la trazabilidad total exigida por el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**.

[3.2.2.6] Flujo de Integración

Con el objetivo de alinearse con el modelo de integración definido por Línea Directa en el presente pliego, la plataforma MuleSoft actuará como capa de middleware de orquestación y gobierno, proporcionando las capacidades necesarias para la comunicación bidireccional entre el CRM y el sistema CORE.

La arquitectura propuesta se integra con los patrones de comunicación establecidos en el documento técnico, combinando eventos asíncronos y APIs síncronas según la naturaleza de cada operación

3.2.2.6.1. Integración Galgo/CRM (Event-Drivent)

Para la propagación de cambios desde el sistema core Galgo hacia el CRM se implementará un modelo **Event-Driven Architecture (EDA)** basado en un bus de eventos.

El flujo operativo será el siguiente:

1. **Captura de cambios en Galgo (CDC):** Los cambios producidos en las bases de datos del mainframe serán capturados mediante mecanismos de **Change Data Capture (CDC)** desplegados en el entorno del core asegurador.
2. **Publicación de eventos en Kafka o Anypoint Mq:** Los eventos generados por el CDC serán publicados en tópicos de **Apache Kafka o anypoint Mq**, actuando como bus de eventos central del ecosistema.
3. **Consumo de eventos desde MuleSoft:** MuleSoft actuará como **consumidor de eventos Kafka o Anypoint Mq**, mediante conectores nativos o integración con brokers corporativos, suscribiéndose a los tópicos correspondientes a las entidades de negocio.
4. **Transformación y normalización:** Los eventos recibidos serán transformados mediante **DataWeave** a un modelo canónico alineado con el modelo de datos del CRM.
5. **Actualización del CRM:** Finalmente, MuleSoft invocará las APIs del CRM (Salesforce) para realizar operaciones de **upsert, actualización o creación de entidades**, garantizando consistencia y trazabilidad.

Este enfoque permite:

- Desacoplar completamente el core asegurador del CRM.
- Escalar el procesamiento de eventos de forma horizontal.
- Procesar grandes volúmenes de cambios con baja latencia.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

3.2.2.6.2. Integración CRM/Galgo (API-LED)

Para las operaciones iniciadas desde el CRM que requieren actualización del sistema core, se implementará un modelo de invocación síncrona mediante APIs gestionadas por MuleSoft.

El flujo de integración será el siguiente:

1. Invocación desde CRM: Las operaciones iniciadas en el CRM invocarán APIs REST publicadas en la plataforma MuleSoft.
2. Exposición de APIs de Experiencia: MuleSoft expondrá Experience APIs adaptadas a las necesidades del CRM, proporcionando interfaces simplificadas para las operaciones de negocio.
3. Orquestación en Process APIs: Las Process APIs implementarán la lógica de negocio necesaria para validar datos, aplicar reglas y orquestar llamadas a los sistemas backend.
4. Acceso a sistemas core mediante System APIs: MuleSoft encapsulará el acceso al sistema Galgo mediante System APIs, que abstraen la complejidad técnica del mainframe y permiten la evolución independiente del sistema core.
5. Invocación de servicios del mainframe
   Estas APIs consumirán los servicios expuestos por el core Galgo a través de los mecanismos disponibles (HTTP/REST o servicios accesibles vía CICS/CTG).
6. Este modelo garantiza:
   - Control centralizado de seguridad y gobierno.
   - Independencia entre el CRM y los sistemas legacy.
   - Reutilización de servicios para futuros canales o aplicaciones.

3.2.2.6.3. Gestión de resiliencia y consistencia

La plataforma MuleSoft incorporará mecanismos avanzados de resiliencia para garantizar la robustez de los flujos de integración:

- **Reintentos automáticos y políticas de backoff**
- **Dead Letter Queues (DLQ)** para eventos no procesados
- **Idempotencia en operaciones críticas**
- **Correlación de transacciones mediante correlationId**
- **Procesos de reconciliación periódica**

Estos mecanismos aseguran que ningún evento se pierda y que las inconsistencias puedan detectarse y corregirse de forma controlada.


3.2.2.6.4. Observabilidad y monitorización

La solución integrará las capacidades de observabilidad de MuleSoft con las herramientas corporativas de LDA:

- **Anypoint Monitoring** para visibilidad operativa de APIs y eventos.
- **Integración con Dynatrace** para monitorización de rendimiento y trazabilidad distribuida.
- **Centralización de logs en ELK**, permitiendo auditoría completa de los flujos.

Este modelo proporciona trazabilidad end-to-end desde la generación del evento en el core hasta su materialización en el CRM.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

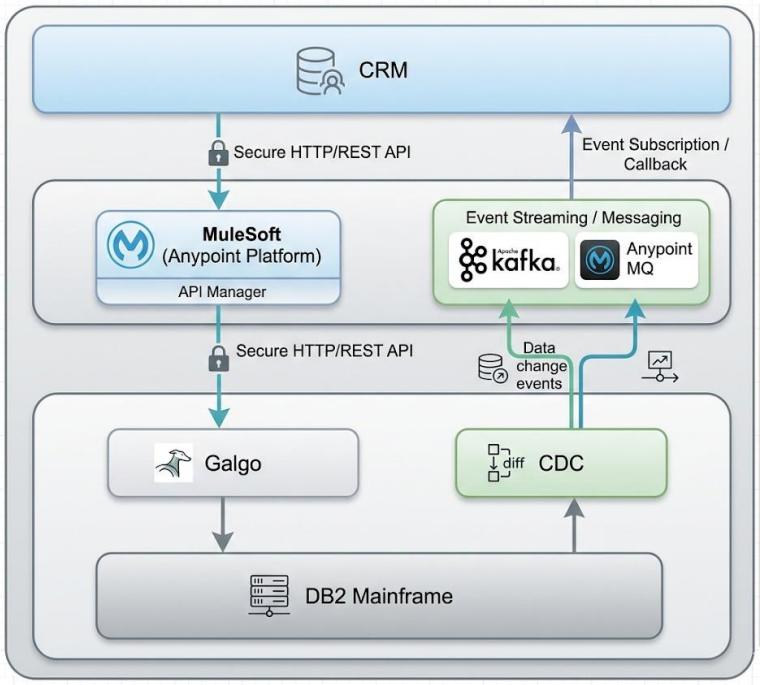

[3.2.2.7] Listado de integraciones

A continuación, se detalla el alcance de integración o sincronización con los sistemas de LDA

ID	Integración / Sincronización
1	**Genesys Cloud:** Canal Voz
2	**Galgo:** front actual
3	**Mainframe** (Pólizas, Cotización/Presupuestos, Siniestros, Recibos y Pagos, Datos Bancarios, Riesgos y Fidelización)
4	**Usuarios y Perfiles (LDAP)**
5	**Firma digital Loyalty**
6	**DB2 Content Manager**
7	**Sistemas de verificación/suscripción**
8	**Adobe Campaing**
9	**Pasarela de pago**

[3.2.2.8] Valor añadido a través del framework API Acelerator by Ayesa


Para optimizar la integración entre Salesforce y los sistemas corporativos de LDA, proponemos hacer uso de nuestro framework **API Accelerator by Ayesa**, una solución innovadora y completamente personalizada que simplifica la forma en que gestionamos las integraciones. Este framework, diseñado exclusivamente por Ayesa, es un Managed Package que se instala de manera sencilla en tu organización Salesforce. Proporciona una aplicación intuitiva que, mediante permisos controlados, ofrece un panel de control potente para gestionar todas las integraciones de forma eficiente.

Alguna de las ventajas clave:

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Reducción significativa de tiempos y costes**: Nuestra solución simplifica el proceso de implementación y mantenimiento de integraciones, eliminando la complejidad de las integraciones tradicionales y reduciendo de forma drástica el tiempo de puesta en marcha.

- **Accesibilidad y control directo**: El diseño configurable y paramétrico te da un control total sobre las integraciones, facilitando su gestión sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Los usuarios y administradores de Salesforce tendrán acceso directo a las integraciones a través de interfaces amigables e intuitivas.

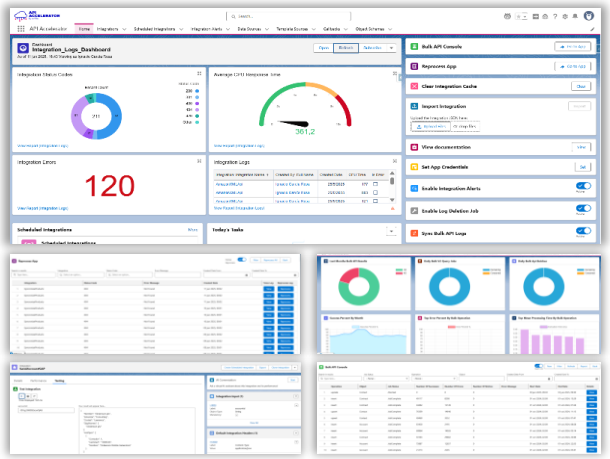

- **Optimización de recursos**: Con el uso de **Platform Cache**, el rendimiento de las integraciones se mantiene inalterado, asegurando que no haya impacto en la performance del sistema.

Además, el paquete incluye componentes estándar que permiten **ejecutar integraciones de forma totalmente configurable**, sin necesidad de desarrollo adicional:

- **Configuración sin código**: A través de entidades como **DataSource** y **TemplateSource**, puedes configurar de manera sencilla los parámetros de entrada y el formato del mensaje, sin necesidad de escribir una sola línea de código.

- **Flexibilidad en la creación de mensajes**: Puedes generar mensajes en formato **JSON** (o **XML**) de manera intuitiva, simplemente configurando los parámetros de entrada, como el Id de la cuenta. Para integraciones más complejas, también es posible incluir código personalizado.

- **Integración bidireccional**: No solo puedes integrar Salesforce con otros sistemas, sino también exponer integraciones para ser consumidas por aplicaciones externas, con la posibilidad de generar un **Swagger** para facilitar la integración.

Una de las principales ventajas del API Accelerator by Ayesa es su potente sistema de **monitorización y trazabilidad**. La herramienta registra todas las llamadas a sistemas externos y las respuestas obtenidas, lo que permite tener un control total sobre el estado de las integraciones en tiempo real.

- **Monitorización avanzada**: Puedes visualizar el estado de salud de tus integraciones mediante paneles y cuadros de mando intuitivos.

- **Alertas automáticas**: Configura notificaciones para recibir alertas cuando se superen umbrales de fallos, permitiendo una intervención rápida y proactiva.

- **Reprocesos**: La herramienta incluye una aplicación de reprocesos que permite gestionar los errores de manera eficiente y visualizar los fallos para su pronta corrección.

[3.2.3] Aspectos de seguridad

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Salesforce y nuestras políticas de seguridad se basan en el marco de mejores prácticas y cuenta con evaluaciones y certificaciones de privacidad y seguridad realizadas por terceros.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Anonimización de datos - La información almacenada dentro de la infraestructura de base de datos multi-tenant y almacenamiento de documentos de Salesforce está encriptada en reposo dentro del sistema de archivos. Salesforce entiende que la decisión de almacenar datos sensibles, confidenciales o propietarios con un tercero a menudo lleva a los clientes a investigar de cerca las regulaciones internas y externas y las políticas de cumplimiento de datos, como PCI-DSS, HIPAA o HITECH, y FedRAMP. Por ello, proporcionamos capacidades que apoyan a los clientes mientras adoptan un enfoque pragmático pero conservador para la protección de datos en la nube.

Cifrado en Tránsito - El servicio de Salesforce utiliza productos de cifrado aceptados por la industria para proteger los Datos del Cliente y las comunicaciones durante las transmisiones entre la red del cliente y los servicios. Esto incluye el uso de Cifrado de Capa de Transporte (TLS), que aprovecha certificados de servidor RSA de al menos 2048 bits y claves de cifrado simétrico de 128 bits.

Además, todos los datos se transmiten entre centros de datos para fines de replicación a través de enlaces cifrados que utilizan cifrado AES-256. Esto asegura que los datos estén protegidos tanto durante la transmisión como durante la replicación entre centros de datos.

Gestión de auditorías – Haremos uso de las capacidades de auditoría que proporcionan información sobre el uso de aplicaciones y datos, ayudando a diagnosticar problemas de seguridad.

Los campos de modificación de registros almacenan el nombre del usuario que creó y modificó el registro por última vez, brindando información básica de auditoría. El seguimiento del historial de campos permite rastrear cambios en hasta 20 campos por objeto, aplicable a objetos personalizados y a ciertos objetos estándar. El historial de inicios de sesión registra hasta 20,000 intentos exitosos y fallidos en los últimos seis meses, incluyendo información sobre la ubicación geográfica de las direcciones IP de los usuarios. El historial de verificación de identidad rastrea hasta 20,000 registros de intentos de verificación de identidad de los últimos seis meses. Por último, el registro de auditoría de configuración permite a los administradores revisar modificaciones realizadas en la configuración de la organización durante los últimos seis meses.

Salesforce utiliza un modelo **proactivo** y estructurado, diseñado para minimizar fricciones mediante despliegues automatizados y una comunicación transparente.

- **Cadencia y Distribución de Actualizaciones:**
  - **Lanzamientos Principales:** Ocurren **tres veces al año**. Las fechas se publican con hasta un año de antelación en el sitio *Salesforce Trust*. Durante estas ventanas, puede haber una breve interrupción del servicio de hasta **cinco minutos**.
  - **Mantenimiento y Parches:** Los parches y versiones de emergencia se despliegan en horas de baja actividad. Están diseñados para ser fluidos y, siempre que es posible, no interrumpen el servicio.
- **Gestión de Errores y Seguridad:**
  - **Errores Funcionales (Bugs):** Las correcciones se entregan mediante ciclos regulares de mantenimiento y parches, sin impactar los flujos de trabajo o personalizaciones existentes.
  - **Brechas de Seguridad:** Salesforce cuenta con un equipo **CSIRT** de monitoreo 24/7. La seguridad se refuerza con pruebas ofensivas, evaluaciones de terceros y un programa privado de recompensas por errores (*bug bounty*). Los registros (logs) se archivan por al menos un año.
- **Plazos de Notificación:**
  - **Estándar:** El mantenimiento se notifica con **una semana** de antelación.
  - **Mayor/Requiere Acción:** Se comunica con **meses** de antelación.
  - **Emergencia:** Puede notificarse con menos de una semana de aviso.
  - **Canales:** Las notificaciones se envían por correo electrónico, recordatorios dentro de la aplicación y el sitio *Salesforce Trust*.
  - **Monitoreo de Estado:** Los clientes pueden supervisar en tiempo real el estado del servicio y las actualizaciones de corrección de errores en status.salesforce.com.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Medidas Proactivas:** Incluye monitoreo diario de capacidad, escaneo de vulnerabilidades y pruebas de recuperación ante desastres. Los clientes pueden usar *Shield Event Monitoring* para obtener datos de rendimiento en tiempo real.

[3.2.4] Licenciamiento propuesto

Se detalla sobre el presente apartado los aspectos a nivel de licenciamiento. En base a las especificaciones de la RFP, no está incluido en el ámbito de este contrato la adquisición de licencias por parte de Ayesa. En cualquier caso, desde Ayesa asesoraremos a LDA durante las primeras etapas del proyecto en la adquisición o modificación de las licencias que mayor cobertura y rentabilidad puedan ofrecerle.

Adicionalmente, añadimos los siguientes aspectos a considerar para optimizar esta gestión:

Salesforce

Desde el inicio del proyecto es importante tener en cuenta ciertas decisiones que pueden impactar en la eficiencia operativa y económica a medio plazo:

- **Asignación de perfiles según rol funcional:** Se recomienda definir perfiles y permisos adaptados a cada tipo de usuario (agente, supervisor, backoffice, etc.), para evitar el sobredimensionamiento innecesario en la asignación de licencias. Esto permitirá optimizar el uso de licencias tipo **Salesforce Sales & Service** frente a posibles necesidades de usuarios con acceso limitado mediante **Salesforce Platform**, ajustando el modelo de licenciamiento a las funciones reales de cada perfil.

- **Entornos sandbox y pruebas: Salesforce Platform** incluye por defecto al menos un entorno sandbox tipo Developer con las licencias Enterprise. Sin embargo, para realizar formaciones o pruebas funcionales con datos reales, será necesario valorar la contratación de entornos adicionales tipo Partial Copy o Full Sandbox. Recomendamos tener en cuenta esta necesidad desde el inicio para asegurar una transición fluida entre fases y entornos sin sobrecostes.

- **Uso de funcionalidades complementarias:** El proyecto contempla funcionalidades adicionales del ecosistema Salesforce como **Service Voice** para la gestión de interacciones de voz integradas en el entorno de atención, **Digital Engagement** para la gestión de canales digitales como chat, mensajería y redes sociales desde Salesforce, **Knowledge Base** para la gestión centralizada de artículos de conocimiento y **Einstein Next Best Action (NBA)** para la recomendación automática de acciones basadas en inteligencia artificial. Estas capacidades se dimensionarán con precisión durante la fase de diseño para asegurar que cubren los procesos de negocio sin incurrir en sobredimensionamiento.

- **Integración con sistemas corporativos:** La arquitectura contempla el uso de **MuleSoft** como plataforma de integración basada en APIs para conectar Salesforce con sistemas corporativos y aplicaciones externas, facilitando la interoperabilidad entre plataformas, la reutilización de servicios y una gestión centralizada de las integraciones.

- **Seguridad y cumplimiento:** Para reforzar la protección de la información y garantizar el cumplimiento normativo, se contempla el uso de **Salesforce Shield**, que proporciona funcionalidades avanzadas de cifrado de datos, monitorización de actividad y auditoría de eventos dentro de la plataforma.

- **Automatización y asistencia mediante IA:** El modelo podrá complementarse con capacidades de inteligencia artificial como **Agentforce**, que permite desplegar agentes digitales capaces de asistir a los usuarios, automatizar tareas y ejecutar acciones dentro del ecosistema Salesforce, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de cliente.

Licenciamiento sugerido adquirido por LDA en el proyecto de CCaaS:

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Genesys

Genesys Cloud CX 3: Versión premium del Centro de Contacto que incluye las funcionalidades completas para el canal voz (IVR, Transcripción, Grabación), canales digitales y otras funcionalidades avanzadas como enrutamiento omnicanal, Workforce Management, bots, asistentes virtuales, analítica e Inteligencia Artificial.

CX Cloud from Genesys and Salesforce: Conector desarrollada entre Genesys y Salesforce para ofrecer un espacio de trabajo único con capacidades totalmente integradas de Contact Center y Workforce Management.

Entornos de laboratorio: Entornos de prueba para desarrollar y validar las configuraciones antes de llevarlas al entorno de producción.

Servicio de soporte 24x7 del fabricante.

Costes de numeración: LDA asumirá los costes asociados a numeraciones telefónicas que requiere o requerirá en la implantación, procesos de portabilidad ni al tráfico de llamadas, ya sean nacionales o internacionales.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[4] Cobertura de requisitos

Se detalla en el presente apartado la cobertura de las necesidades y requerimientos trasladados por LDA en la presente RFQ.


Hay que destacar que:

- Se ha realizado un **diagnóstico y evaluación de las Necesidades de Usuario, con el objeto de presentar cual es nuestro entendimiento y cobertura por módulos un nivel superior a los requerimientos ya compartidos.**
- Se ha realizado un diagnóstico y evaluación categorizando por:
  - **Módulo:** se entiende por módulo la nube o licencia de Salesforce que da cobertura a la necesidad.
  - **Bloque:** se entiende por bloque aquel ámbito funcional dentro de un módulo. Permite conocer si alguna necesidad es cubierta con alguna capacidad concreta de un módulo.
  - **Clasificación:** Ayesa se ha adaptado a las ya trasladadas por LDA
  - **Proceso:** Ayesa se ha adaptado a los ya trasladados por LDA
- Se ha realizado un **diagnóstico y evaluación de los requerimientos trasladados para cada uno de los procesos.** Desde nuestro punto de vista, consideramos de mayor relevancia el nivel de categorización en la Necesidad, ya que los requerimientos son repetidos por procesos y su grado de detalle ya es alto.

[4.1] Grado cobertura necesidades del usuario

El presente análisis se basa en el entendimiento actual de la solución, el alcance y el contexto de LDA. Esta información es preliminar y podría ajustarse o modificarse en fases posteriores del proyecto.


[4.1.1] Cobertura por módulo

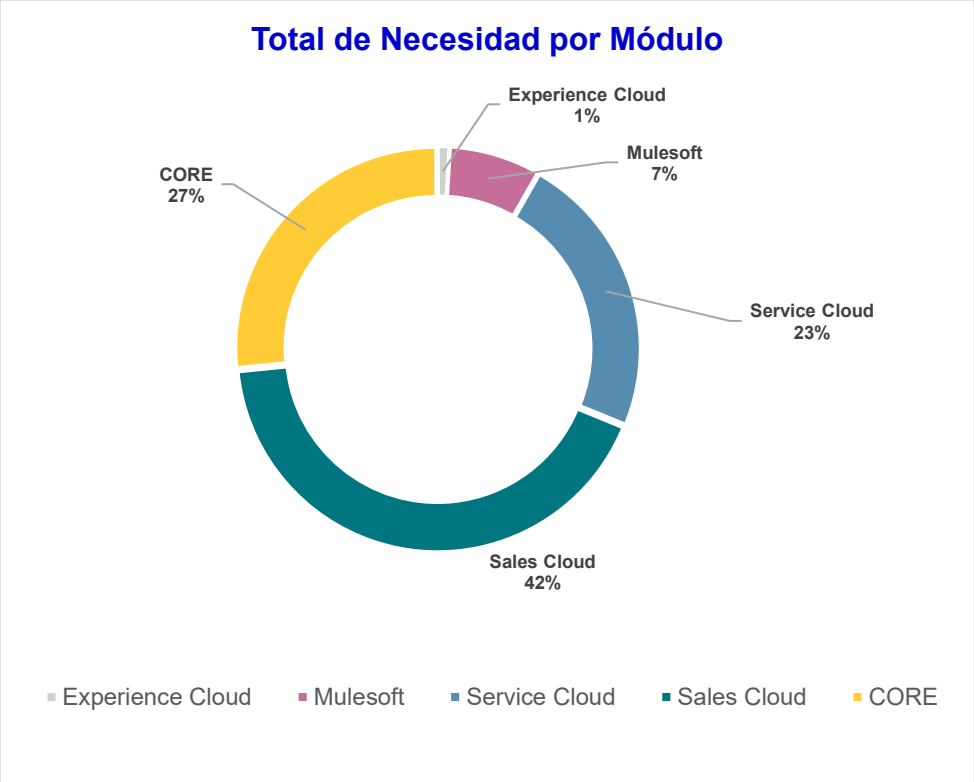

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- Foco en **capacidades "front" (CORE + Sales + Service)**
- MuleSoft aparece como integrador, con volumen menor, pero criticidad técnica alta.


[4.1.2] Clasificación por módulo

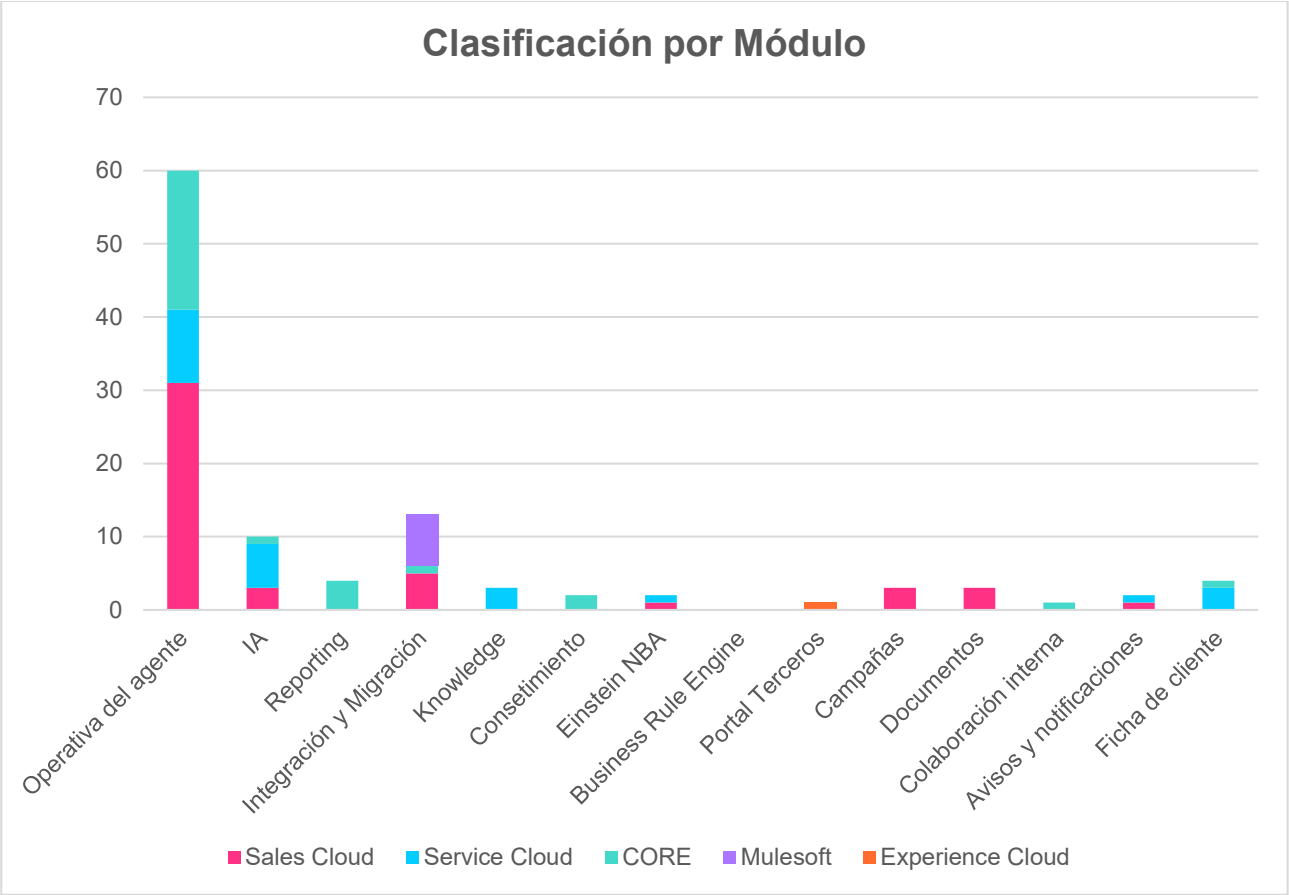

- La categoría dominante es **Operativa del agente** y está repartida entre Sales/Service/CORE, esto es coherente con una aseguradora como LDA donde productividad, consistencia y control del front office determinan coste de servicio y calidad.
- Integración y migración concentra el aporte de **MuleSoft (y parte de Sales/CORE):** típico de entornos aseguradores con sistemas core preexistentes.
- Aunque módulos como **Experience Cloud o MuleSoft** representan un porcentaje reducido del total de requisitos, son componentes estructurales para lograr una arquitectura integrada.


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.


[4.1.3] Análisis de solución

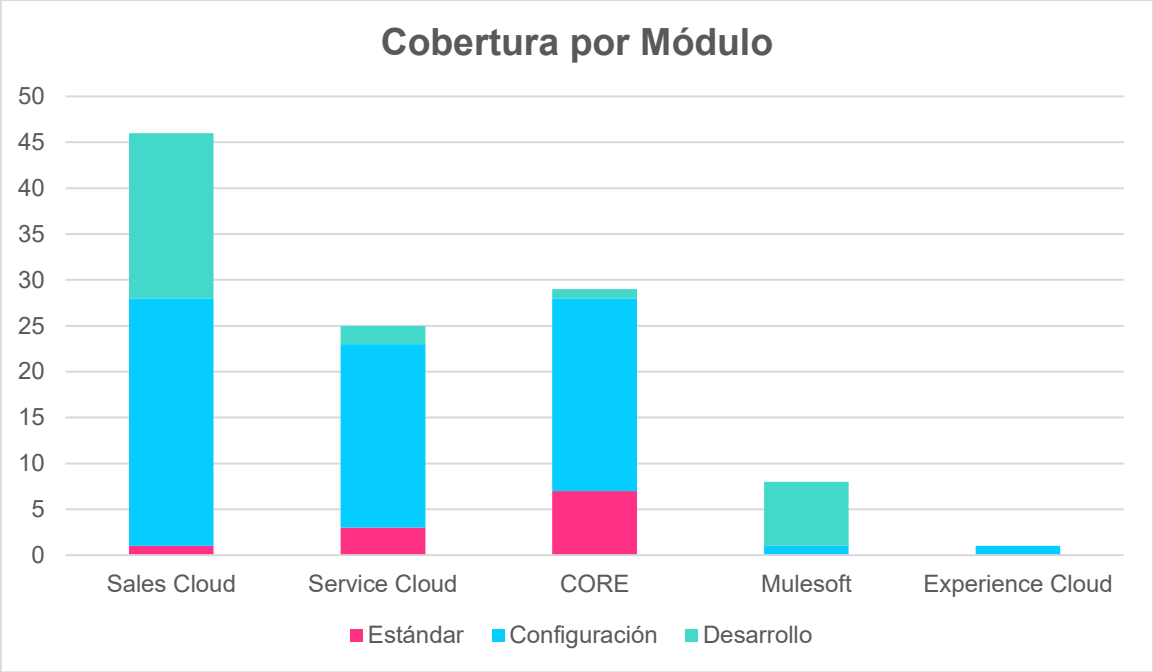

- CORE tiene la **mayor cobertura estándar** por tratarse de capacidades nativas transversales de la plataforma.
- Sales Cloud / Service Cloud se adapta principalmente mediante **configuración de procesos comerciales y de atención.**
- MuleSoft predomina **de desarrollo al centrarse en integraciones y APIs con sistemas core**.
- Experience Cloud tiene **bajo volumen actual y su valor depende de la activación futura de portales y experiencias digitales.**

[4.1.4] Cobertura general

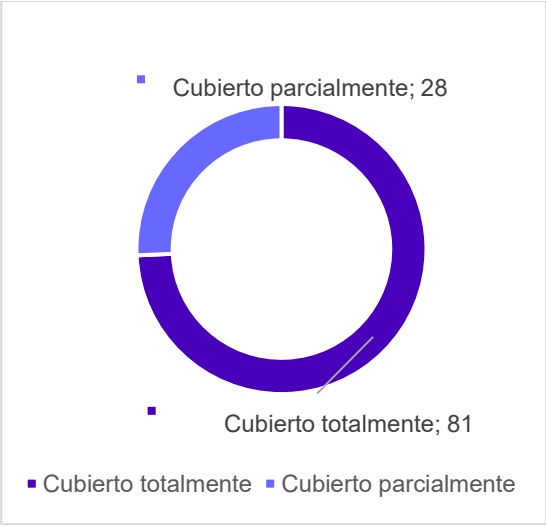


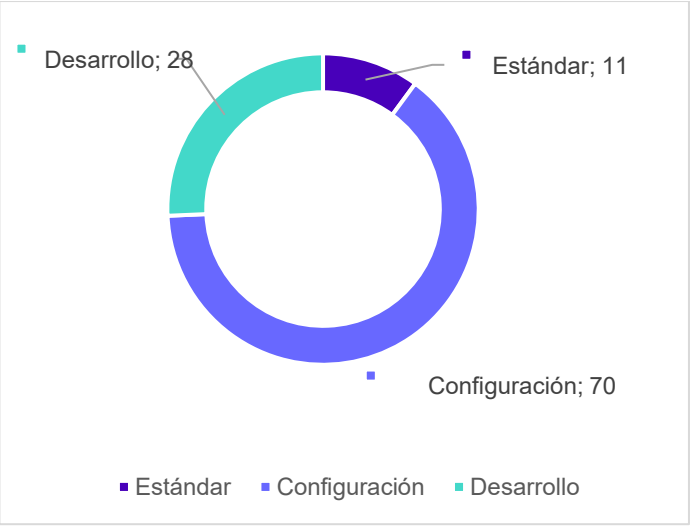


La gran parte del alcance se resuelve con estándar/configuración, esto hace reducir la deuda técnica y riesgo de upgrade. El desarrollo se concentra donde hay diferenciación real o integración compleja.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[4.1.5] Urgencia de las Solicitudes

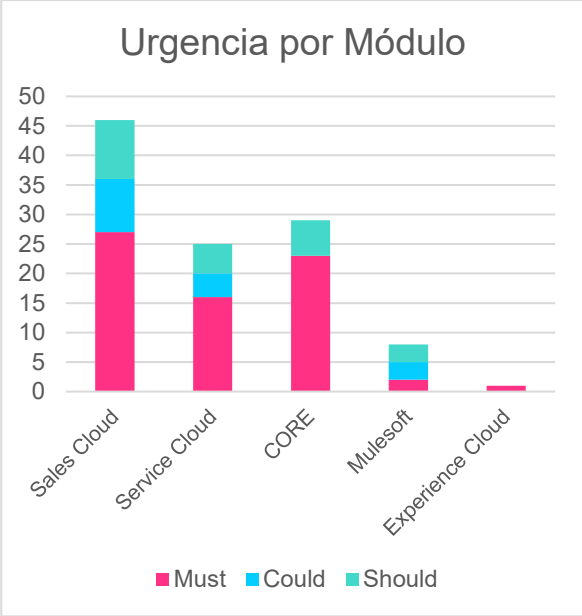

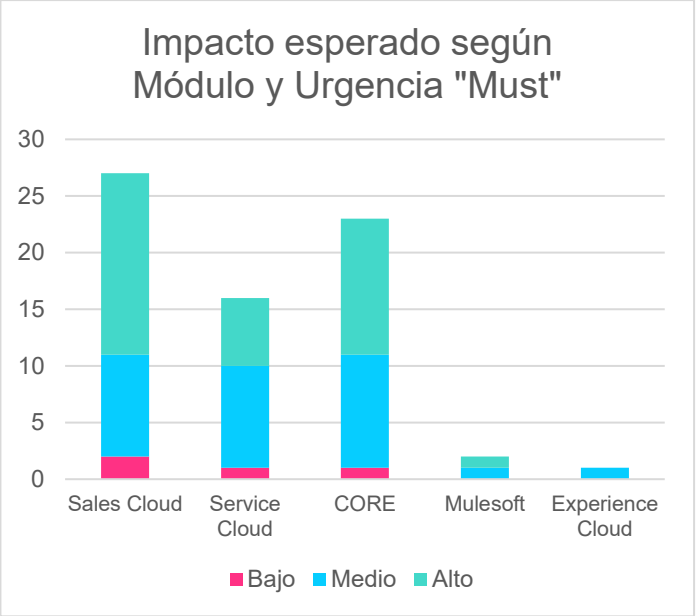

- La urgencia se concentra en **"Must" especialmente en CORE y en los módulos operativos (Sales/Service)**, se prioriza operativa y procesos.
- El **impacto alto se concentra principalmente en CORE y Sales/Service,** seguido por FSC: patrón típico cuando el objetivo principal es eficiencia operativa y crecimiento comercial.
- Se observa la necesidad y el impacto que generan los **módulos de Mulesoft y Experience Cloud**, a pesar de tener necesidad reducidas.

[4.2] Grado de cobertura requerimientos

[4.2.1] Cobertura por proceso

Se detalla en el presente apartado la cobertura por procesos y como de manera funcional se daría respuesta a casa uno de los requerimientos.

[4.2.1.1] Cotización

4.2.1.1.1. Identificación – validación del riesgo

El proceso de cotización propuesto permitirá gestionar de manera homogénea la captación, análisis y formalización de oportunidades de negocio, asegurando la trazabilidad de la información. La solución acompañará al operador desde el primer contacto con el cliente, apoyándose en automatizaciones y validaciones que agilizarán la gestión y reducirán errores. Durante la fase inicial el sistema verificará si el cliente ya existe o si debe darse de alta, dando paso a la **Ficha Cliente**, que centralizará toda la información relevante para la gestión comercial y de servicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.1.1.2. Ficha Cliente

La ficha incluirá una sección estructurada de datos personales del tomador o asegurado, distinguiendo visualmente los campos obligatorios e integrando verificaciones externas para los campos que lo requieran, gestión documental (vía email o app) y una vista consolidada de las pólizas existentes con su estado y subestado. El operador podrá consultar el listado de oportunidades del cliente con capacidades de filtrado y acceso directo. Tanto las oportunidades como los productos cotizados se presentarán con datos mínimos diferenciadores a simple vista y un segundo nivel de información desplegable. Desde la propia ficha se podrán crear nuevas oportunidades y agendar llamadas con registro automático en el calendario del agente.



4.2.1.1.3. Creación/Gestión Oportunidad

Cada oportunidad seguirá un modelo flexible y navegable en el que cada producto tendrá un camino independiente de cotización según el riesgo a asegurar, pudiendo avanzar, pausar y retomar el proceso en cualquier etapa. Las oportunidades contarán con etapas y estados de seguimiento condicionados por plazos y reglas de negocio, incorporando un histórico completo de cambios y la posibilidad de solicitar su eliminación con motivo. Los productos dentro de cada oportunidad podrán editarse, duplicarse, versionarse y eliminarse de forma lógica, conservándose las versiones eliminadas en el histórico. La oportunidad podrá enviarse como presupuesto completo, parcial o por producto individual.



Al crear la oportunidad, el sistema mostrará una recomendación de producto basada en reglas de negocio y perfil del cliente, junto con un indicador de probabilidad de cierre asociado a la etapa. Al seleccionar un producto se autocompletarán los datos existentes del cliente, se validará la información necesaria para la contratación y se identificarán automáticamente los miembros del grupo familiar (household) cuando el producto lo requiera.

La solución adaptará el proceso a las particularidades de cada ramo, realizando consultas a fuentes internas y externas para validar y enriquecer la información del riesgo e integrándola con el motor de reglas de negocio para la evaluación del riesgo. La captura de datos se estructurará dinámicamente según los roles requeridos en cada producto, automatizando relaciones entre figuras y facilitando el autorrelleno. Se permitirán campos de texto libre y campos dependientes generados dinámicamente según el valor de otros campos.



En los productos de motor, los datos personales se organizarán por secciones (tomador, conductor principal, propietario, conductores declarados), con autorrelleno por defecto y verificación de coincidencia entre figuras. La zona de circulación se autocompletará si coincide con los datos de notificación o se habilitará un campo libre en caso contrario. Se permitirá incorporar varios asegurados cuando el producto lo requiera y se aplicarán validaciones específicas por ramo —como la coherencia de código postal entre tomador y asegurados en salud—. En salud, el sistema mostrará además avisos dinámicos en función de los períodos de carencia aplicables.



La gestión de coberturas se realizará mediante un módulo específico que **permitirá añadir, eliminar o ajustar garantías,** respetando las coberturas obligatorias como no editables. Cada producto incorporará información

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

detallada de sus coberturas, recomendaciones de upselling o cross-selling con detalle adaptado al perfil del cliente y la posibilidad de aplicar beneficios como el saldo de fidelización. Se podrán replicar coberturas de productos ya contratados, comparar coberturas de productos del mismo ramo dentro de una oportunidad y consultar una base de conocimiento de benchmark como referencia.

4.2.1.1.4. Cierre

En la etapa de precio —común a todos los productos— **el sistema consolidará automáticamente todas las campañas y bonificaciones aplicables al producto y al cliente**, incluyendo las temporales, obteniéndolas mediante conexión con los motores internos de cálculo de descuentos. Los ajustes se aplicarán directamente sobre el precio sin intervención manual, mostrando el máximo descuento disponible, un desglose por producto, campaña y cliente, y un indicador de la campaña aplicada. Se incluirá un botón de recálculo para actualizar el importe ante cualquier cambio o versionado. El resumen de datos de la póliza será editable por el usuario. Al alcanzar esta etapa se generará el identificador de póliza, manteniendo la posibilidad de regresar a la oportunidad para iterar sobre nuevas versiones.

Desde la pantalla de precio —o directamente desde la oportunidad— se accederá al carrito, que presentará las formas de pago disponibles (mensual, semestral, cuatrimestral, anual) condicionadas por las reglas técnicas de la compañía en función de prima, rentabilidad y solvencia**. El carrito mostrará un resumen del precio total por producto, el desglose de descuentos y un resumen consolidado de productos cotizados y comprados**, permitiendo eliminar un producto del proceso de pago sin perderlo en la oportunidad. El sistema permitirá seleccionar distintos métodos, formas de pago y pagadores por producto, reutilizar datos de pago existentes o registrar nuevos, diferenciando si el titular de la póliza coincide o no con el pagador. Cuando difieran, se consultarán fuentes externas para cumplimentar los datos del pagador, permitiéndose también la introducción manual. Se habilitará la captura y validación de IBAN y la tokenización segura de tarjetas —con almacenamiento enmascarado—, verificándose su viabilidad mediante integración con la pasarela externa correspondiente.



Durante el cierre se generará automáticamente la documentación en formato PDF para su envío al cliente y se permitirá la ejecución del pago tanto desde el entorno operativo como desde activos digitales (web/app). Tras la confirmación se emitirá el recibo correspondiente y se mantendrá un histórico completo de recibos. El sistema incorporará un indicador de verificación o documentación pendiente —especialmente en motor—, asumiendo la verificación automáticamente cuando no sea necesaria. Solo las cotizaciones de salud permanecerán como cotización; las de los demás ramos pasarán directamente a póliza con estado activa.

[4.2.1.2] Suplementos

El proceso de suplemento engloba todas las acciones de **modificación de datos** y/o condiciones de una póliza asociada a un cliente y puede ser desencadenado tanto de forma puntual y aislada como formando parte de otro proceso (e.g. retención). Antes de comenzar el proceso, el usuario realizará la identificación de cliente de forma semejante al proceso de cotización.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.1.2.1. Cambio de datos

El usuario accederá a la póliza sobre la que quiere realizar las modificaciones y el sistema le permitirá ajustar y modificar los datos de la póliza y registros relacionados que necesite y, para datos no personales, como el método de pago, el usuario contará con la opción de **propagar los cambios** a las pólizas que seleccione, respetando siempre las limitaciones y reglas de negocio pertinentes a cada dato.



Las modificaciones de datos podrán ser **programadas para diferentes periodos** temporales, permitiendo que el suplemento entre en vigor cuando sea especificado (anualidad actual, próxima…), indicando en los casos en los que aplique la fecha de inicio y finalización del cambio de dato.

Cada modificación relevante podrá generar **distintas simulaciones/alternativas (versiones)** del suplemento, de forma que el usuario pueda comparar opciones antes de decidir. Estas versiones se gestionarán como un conjunto trazable y auditable, incluyendo avisos cuando existan múltiples versiones asociadas a un mismo contexto de renovación y una señalización inequívoca de la versión finalmente seleccionada. Una vez seleccionada la versión final, el usuario podrá realizar las acciones pertinentes a la casuística de modificación.

El suplemento reutilizará el enfoque de recogida y enriquecimiento de datos propio de una cotización, adaptado al ramo y cumplimentando datos tanto de forma manual como automática. Si el suplemento requiere verificación adicional, el flujo se integrará con el **proceso de verificación** mostrando el estado de "pendiente" y aplicando los controles de negocio necesarios.

4.2.1.2.2. Cierre

Tras la aceptación del suplemento por deseo del cliente, la póliza se actualizará automáticamente y se presentará un resumen de cambios. En función de reglas internas, el proceso gestionará la **generación y envío de documentación**, asegurando que el resultado del suplemento queda reflejado y comunicado conforme a las obligaciones del negocio. En el contexto de renovaciones, el proceso contemplará tanto aceptación manual dentro de la ventana habilitada como automatismos próximos a la fecha de vigor.



El sistema ofrecerá trazabilidad completa e histórica de los suplementos del cliente y de la póliza, permitiendo ver el **historial de cambios**.

[4.2.1.3] Recobro

El proceso de recobro se inicia cuando el sistema detecta el **rechazo de un pago** asociado a un recibo, habilitando en la ficha de cliente un aviso claro de la situación de impago. El motivo/tipo de rechazo se registrará como parte de la información del recibo, asegurando trazabilidad y permitiendo la aplicación de reglas de recobro específicas por casuística. Previo al comienzo del proceso, el usuario realizará la identificación de cliente de forma semejante al proceso de cotización.

4.2.1.3.1. Comunicaciones y visibilidad

El sistema notificará con **comunicaciones proactivas** al cliente (p.ej., preaviso y opciones de pago inmediato), integrándose con el centro de notificaciones/campañas y, opcionalmente, habilitando la carga de datos en telefonía para impulsar acciones de contacto.



A nivel operativo, cada recibo contará con un **espacio de eventos de recobro** que refleje el ciclo completo (rechazo, comunicaciones enviadas, intentos de cobro, fechas relevantes y resultado). Adicionalmente, el proceso consolidará el histórico de llamadas y el histórico de notificaciones como parte del expediente del cliente, permitiendo un control integral de la actividad realizada.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.1.3.2. Gestión y cierre

El proceso contemplará tanto la recuperación asistida como la recuperación inmediata: desde el propio recibo se podrá iniciar un **flujo de autopago** mediante pasarela de pagos, con capacidad de distribuir el enlace o la instrucción por los canales definidos (SMS/email/push), y también se permitirá vincular manualmente un pago a un recibo/cliente cuando aplique.

Finalmente, el proceso soportará **capacidades de productividad y reporting**, como la selección múltiple de duplicados de recibos para su tratamiento, la consulta del saldo disponible de fidelización para potencial uso en el pago, y la emisión/entrega del histórico de pagos del cliente, incluyendo el desglose por garantías cuando sea necesario para trazabilidad y atención al cliente.

[4.2.1.4] Recibos y pagos

El módulo de **Recibos y Pagos** centraliza la operativa sobre un recibo (gestión, cobro y seguimiento) bajo reglas internas y permisos por rol, incluyendo acciones de aplazamiento/paralización, cambios de estado y ejecución de pagos.

4.2.1.4.1. Acciones

Se habilitan acciones para diferir la emisión de un recibo y revertir dicha acción cuando aplique, así como un modo de recobro especial que pausa temporalmente la gestión y su correspondiente anulación. El recibo mantiene un **ciclo de estados** y el usuario puede actualizar su situación conforme a validaciones y controles definidos.



4.2.1.4.2. Gestión y cierre

La operativa incluye capacidades de **preaviso y registro de intentos**/resultado, además de opciones para anular pagos dentro de la ventana permitida por rol. También se contemplan ajustes puntuales de datos de cobro para un recibo específico, sin necesidad de persistirlos como dato maestro del cliente.



En términos de atención y backoffice, el recibo incorpora funciones de **documentación y comunicaciones** (p.ej., generación de duplicados y gestión de envío), y acciones para liberar recibos o transferencias según temporizadores/reglas del sistema, preservando trazabilidad para reemisión cuando proceda.

Finalmente, se proporciona una vista de **histórico y detalle** (movimientos, comentarios y desglose económico a nivel general), incluyendo particularidades por línea de negocio cuando aplique, manteniendo siempre un registro auditable de las acciones realizadas sobre cada recibo.

[4.2.1.5] Retención

El proceso de retención se inicia desde la ficha del cliente y sitúa al usuario en un **flujo guiado de negociación** sobre una póliza, con visibilidad inmediata del contexto económico y de las palancas disponibles para evitar la baja. Antes de comenzar el proceso, el usuario realizará la identificación de cliente de forma semejante al proceso de cotización.

4.2.1.5.1. Estrategia de retención

El usuario identifica la póliza y selecciona la estrategia de retención aplicable según elegibilidad (producto, momento de la póliza y campañas vigentes). A partir de esa selección, el sistema

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

presenta las **opciones de actuación** y permite guardar la propuesta para continuar la negociación sin perder trazabilidad.

Cuando la estrategia implique incentivos no monetarios, el usuario registra el incentivo y el sistema calcula su impacto y coherencia con el **programa de fidelización**, alertando si el cliente no es elegible y habilitando el alta cuando proceda.



Si la negociación requiere ajustes de precio o condiciones, el **flujo deriva a la gestión correspondiente**, aplicando controles de gobierno (validación de necesidad de supervisión, notificación al responsable y bloqueo de la aceptación hasta resolución). Una vez aprobada, se habilitan las acciones de cierre asociadas a la negociación económica.

4.2.1.5.2. Cierre

El usuario finaliza la interacción seleccionando el **resultado de la negociación** (cerrada, pendiente o baja) y, en caso de baja, registrando la tipificación y motivos de forma normalizada, incorporando las consideraciones legales necesarias.

Durante todo el flujo, el sistema mantiene un **histórico estructurado** de negociaciones y acciones (con costes e impacto agregados), y facilita el acceso a herramientas de soporte operativo como agenda, comentarios, argumentario y navegación a procesos relacionados (p. ej., recibos y pagos), priorizando una experiencia eficiente y trazable.



[4.2.1.6] Fidelización

El proceso de fidelización **se presenta de forma transversal** en los principales puntos de trabajo del usuario (cliente, póliza, cotización y procesos asociados), con un indicador visual que permite identificar rápidamente el estado del cliente en el programa y acceder al detalle sin abandonar el contexto operativo.

4.2.1.6.1. Alta en el programa

El usuario puede iniciar el alta en el programa desde los puntos habilitados, con controles de elegibilidad para asegurar que la gestión se realiza con la figura correspondiente (p. ej., el tomador). Cuando procede, el alta activa automáticamente la experiencia de **bienvenida mediante comunicaciones**, y si la solicitud no se puede formalizar por el interlocutor, el sistema deriva la gestión al canal adecuado para que el tomador complete el proceso.



Una vez dentro del programa, el usuario dispone de una **vista estructurada con la información principal** del estado del cliente, el detalle de movimientos y el histórico de altas/bajas, garantizando trazabilidad. Determinadas modificaciones quedan restringidas por rol, y la baja del programa se gestiona mediante una acción controlada con confirmación, asegurando consistencia y evitando cambios accidentales.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.1.6.2. Gestión y operativa

El proceso también actúa como **habilitador de estrategias comerciales**: desde retención y otros flujos relacionados, el usuario puede aplicar beneficios y promociones disponibles, distinguiendo entre opciones gestionadas internamente (campañas/códigos) y opciones externas que continúan en canal digital. En los procesos donde corresponda, la fidelización se integra como un input reutilizable (p. ej., aplicación de códigos o saldo) sin duplicar operativa.

El programa **se gestiona a nivel de cliente** y no de póliza, permitiendo que el saldo/beneficio acompañe al asegurado entre renovaciones y nuevas contrataciones. Cuando existe renovación, el sistema aplica el beneficio por defecto y, cuando no la hay, el usuario puede utilizar el saldo acumulado en procesos comerciales como un nuevo presupuesto, incluyendo escenarios de exclientes que mantienen vigencia en el programa.



Finalmente, fidelización se integra en momentos clave del ciclo de vida (p. ej., precancelación, determinados suplementos y cambios relevantes), de forma que el usuario pueda **activar palancas de valor de manera contextual**, alineadas con el motivo y el proceso en curso.

[4.2.1.7] Cancelación

El proceso de cancelación se inicia desde la retención cuando el resultado de la negociación deriva en baja, aunque también puede activarse por reglas automáticas. En ambos casos, el usuario entra en un **flujo de precancelación** que concentra la captura de datos, validaciones y generación documental.

4.2.1.7.1. Flujo de precancelación

Durante la precancelación, el usuario registra el tipo de solicitud y selecciona motivo y submotivo de forma guiada, de modo que el sistema pueda aplicar reglas específicas de negocio y documentación. A continuación, el usuario define la **fecha de efecto de la cancelación** mediante opciones controladas por el estado de la póliza; en ciertos escenarios la fecha queda predefinida y no editable, y en otros se permite indicar una fecha alternativa.



Una vez completada la solicitud, el usuario confirma/guarda la precancelación y el sistema pasa a la **fase de documentación**, donde se determina el canal de envío por defecto según los datos disponibles del cliente, permitiendo ajustar el canal o incluso no enviar documentación si el caso lo permite. Cuando no existe información suficiente (p. ej., ausencia de email), el flujo habilita la captura del dato necesario y adapta el canal de salida. Según la tipificación de la baja, el sistema genera los documentos requeridos y abre el flujo de envío, que podrá ejecutarse en el momento o de forma programada según la operativa definida.

El proceso incorpora **controles de coherencia** para evitar inconsistencias entre intención del cliente, fechas, estado de recibos y situación de la póliza. Si se detectan discrepancias relevantes, el sistema genera alertas y/o deriva el caso para revisión, asegurando que la cancelación se formaliza correctamente y que puede corregirse (p. ej., ajustando la fecha de efecto y regenerando la documentación) mediante acciones de modificación o eliminación de la precancelación cuando proceda.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.1.7.2. Cierre

Tras la aceptación y ejecución, **la póliza refleja el estado** de baja, manteniendo trazabilidad entre la solicitud (precancelación) y el resultado final. En paralelo, el flujo contempla avisos contextuales (p. ej., impacto en programas asociados o saldo pendiente) para que el usuario gestione correctamente la conversación y el cierre.

En relación con la **PNC** (prima no consumida), el proceso deja registrada la información necesaria para su aplicación/regularización, integrándose con los flujos posteriores donde corresponda: uso manual en cotización, aplicación automática en renovación y tratamiento automatizado de devolución en los escenarios definidos por la compañía.



[4.2.1.8] Up / Cross Selling

El proceso de **upselling y cross-selling** se inicia desde el módulo de recomendaciones en la ficha del cliente y acompaña al usuario durante los momentos clave de decisión, apareciendo también de forma contextual en la sección de precio y coberturas dentro de una cotización o un suplemento.

4.2.1.8.1. Recomendaciones

Al acceder, el sistema presenta un listado de **ofertas recomendadas priorizadas**, construido a partir de reglas técnicas de elegibilidad (suscripción) y criterios comerciales, complementado por señales "inteligentes" basadas en el histórico y características del cliente. El usuario puede alternar/parametrizar el criterio de recomendación según las necesidades del negocio, manteniendo siempre la coherencia con las restricciones técnicas del producto.

Para cada recomendación, el usuario dispone de un **argumentario contextual** que explica el "por qué" de la propuesta y facilita la conversación. En cross-selling, las recomendaciones se organizan por producto y el flujo permite registrar el resultado (aceptado/rechazado) junto con el motivo, de modo que quede trazabilidad y se reutilice en futuras ofertas al mismo cliente.



4.2.1.8.2. Acciones

Desde la propia recomendación, **el usuario puede ejecutar la acción**: iniciar una nueva cotización, recuperar presupuestos existentes o lanzar un suplemento cuando la propuesta es sobre una póliza activa. En escenarios específicos (p. ej., derivaciones a equipos especializados), el flujo permite agendar o transferir desde la misma recomendación, conectando con agenda y generando una cita vinculada al producto con contexto precargado, incluyendo la confirmación al cliente y reglas de programación según el perfil del caso.

Cuando la propuesta es de **upselling** sobre coberturas, el usuario selecciona entre opciones presentadas de forma simplificada y consistente (riesgo, forma de pago y coste), con recalculo automático según reglas técnicas para evitar cálculos manuales. Tras la confirmación, el sistema aplica el cambio de forma controlada y, cuando corresponda, actualiza automáticamente la póliza dejando el registro de la acción y su resultado.

[4.2.1.9] Procesos adicionales

4.2.1.9.1. Verificación

El proceso de verificación se activa de forma contextual al finalizar una **cotización de motor** (tras informar pago) o desde la gestión de póliza cuando un suplemento lo requiere. Desde el inicio, el

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

sistema aplica reglas internas para determinar si la verificación es necesaria, asignar el tipo por defecto y abrir el flujo correspondiente, siempre dentro de un plazo máximo de cierre.

Al entrar, el usuario visualiza una cabecera con el resumen de póliza y un cuadro informativo de los tipos disponibles. El sistema muestra únicamente **los tipos de verificación** permitidos para ese caso (p. ej., presencial, foto web, app, video), y cuando aplique, controla si la opción seleccionada requiere supervisión.

Según el tipo elegido, el flujo guía al usuario en la captura de datos mínimos y en la concertación:



- En **verificaciones digitales**, el sistema asegura los datos de contacto necesarios y lanza el envío por los canales internos habilitados.
- En **verificaciones con cita** (presencial o video), el usuario agenda con el cliente desde una pantalla de cita: el sistema consulta agendas externas cuando aplique, propone disponibilidad y permite confirmar la cita con la información esencial, incluyendo recordatorios operativos para la conversación con el cliente.

Una vez iniciada la verificación, el proceso mantiene un **histórico y un resumen de hitos** para que el usuario entienda rápidamente qué ha ocurrido (citas, envíos, cambios y resultados). En función del estado y de la fecha de efecto de la póliza, el sistema genera avisos y tareas de seguimiento para evitar verificaciones sin concretar o sin respuesta, incluyendo acciones proactivas para cerrar citas pendientes.

El cierre se gestiona por estado y resultado, alineando el estado de verificación con el indicador operativo y, en consecuencia, con el **estado de la póliza**. El usuario puede registrar el resultado (p. ej., verificada OK / no OK / asumida / no verificada) y, cuando exista informe, el sistema lo adjunta y muestra un resumen descriptivo. Determinados cambios de resultado o de indicadores quedan sujetos a supervisión según reglas internas.

Si la verificación no se completa en plazo o falta documentación, el sistema ejecuta el **tratamiento definido** (p. ej., cancelación de la orden y derivación) y habilita acciones controladas para reasignar una nueva verificación o resolver el caso (asumir/cancelar) según corresponda. En paralelo, el proceso integra la gestión con repositorios internos y plataformas de comunicaciones, ofreciendo **trazabilidad del listado de envíos** y su filtrado para consulta operativa.

4.2.1.9.2. Documentación pendiente

El proceso de documentación pendiente se activa de forma controlada únicamente en cotizaciones o suplementos del **producto de motos**, cuando las reglas técnicas determinan que es necesario solicitar documentación adicional. En ese momento, el sistema actualiza el estado de la póliza a “documentación pendiente” e identifica los documentos requeridos para ese caso.



Al acceder a la etapa, el usuario visualiza una cabecera con el resumen de póliza y un **flujo guiado** para gestionar el reclamo, donde el sistema adapta la solicitud según el tipo de documentación pendiente aplicable. La gestión se apoya en integraciones internas para sincronizar el estado del expediente y mantener consistencia entre sistemas.

Desde esta etapa, el usuario puede comunicar al cliente la **documentación requerida** a través de los canales disponibles, con trazabilidad completa: se muestran las comunicaciones emitidas, se pueden filtrar y seleccionar envíos, y queda registro para seguimiento. Los documentos aportados por el cliente se almacenan en el gestor documental corporativo y, cuando se reciben, el sistema notifica al equipo responsable para su revisión.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

El flujo permite **resolver el expediente** con un resultado normalizado (p. ej., OK, no OK, asumida o mantener pendiente). Si el resultado es OK, el sistema automatiza la continuidad operativa (actualizando y emitiendo la póliza según corresponda). Si el resultado es no OK, el usuario queda habilitado para encadenar el proceso de cancelación/anulación aplicable. Adicionalmente, existe una opción controlada para asumir la no aportación de documentación por parte del cliente, cerrando el caso conforme a reglas internas.

4.2.1.9.3. Valoración médica

El proceso de valoración médica se activa desde una cotización o desde una póliza (vía suplementos) cuando el flujo lo requiere. El caso se deriva al **equipo de valoradores** (según roles) y se gestiona fuera del circuito operativo estándar, manteniendo separación de funciones y confidencialidad.

Todos los casos se consolidan en un **panel de trabajo** para su seguimiento por estado y contexto (producto, cita y situación del expediente). Los usuarios operativos acceden con visibilidad limitada: no consultan información médica, únicamente el resultado y el estado necesario para continuar la gestión con el cliente.

Al generarse la necesidad de valoración, el CRM envía el expediente a la herramienta interna con la información recopilada y se **coordina la cita** mediante integración con agenda/CTI cuando aplique. Una vez el valorador completa la evaluación, el resultado se registra y se devuelve al CRM, actualizando el panel y generando un aviso para que el operador retome el caso.



El **cierre** se resuelve por resultado: en caso de KO, el flujo habilita alternativas operativas (ajustes sobre asegurados y/o cambio de producto mediante los mecanismos ya definidos para cotización o suplementos) o acciones de cancelación si corresponde; en caso de OK, se completa la contratación/actualización y se orquestan los pasos posteriores conforme a la operativa definida.

[4.2.2] Casos de uso

En este apartado se presentan dos casos de uso representativos —**cotización de seguros de Hogar y campaña de fidelización**— con el fin de ilustrar cómo la solución propuesta se aplica a situaciones reales de negocio.

Ambos escenarios se describen de extremo a extremo para facilitar la comprensión de la aproximación funcional de la solución en la operativa diaria. El objetivo es mostrar de forma gráfica y tangible el encaje de la propuesta con los procesos definidos por LDA, permitiendo evaluar con claridad su adecuación a las necesidades del negocio.

No obstante, los flujos descritos deben entenderse como **ejemplos de implementación de referencia**, y no como una definición cerrada o final, ya que podrán ajustarse durante las fases de análisis y diseño detallado.

[4.2.2.1] Cotización

El objetivo de este caso de uso es mostrar cómo LDA puede gestionar de extremo a extremo la **cotización de un seguro** originada por una llamada entrante, desde la identificación automática del cliente hasta la formalización y cobro, integrando **Genesys Cloud** para la orquestación de la atención y la telefonía, y empleando **Salesforce Agentforce** y **Einstein AI** para asistir al operador con recomendaciones, gestión de objeciones y acciones guiadas orientadas a maximizar la conversión. Los sistemas y usuarios intervinientes en este proceso son los siguientes:


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Sistemas Intervinientes	Interlocutores Intervinientes
• Salesforce CORE • Genesys Cloud • Service Cloud Voice • Agentforce • Knowlede Base • Einstein NBA • CORE Asegurador	• Cliente • Agente Comercial • Agente IA Agentforce

4.2.2.1.1. Recepción de la llamada e identificación del cliente

El cliente contacta con el servicio de atención telefónica de LDA. Tras navegar por el IVR y seleccionar la opción correspondiente al ramo de Hogar, la llamada se enruta automáticamente al entorno de atención en Salesforce.

En este punto, la plataforma reconoce el contexto de la interacción y prepara la experiencia del operador para iniciar la gestión de forma inmediata, reduciendo tiempos de identificación y evitando tareas manuales.

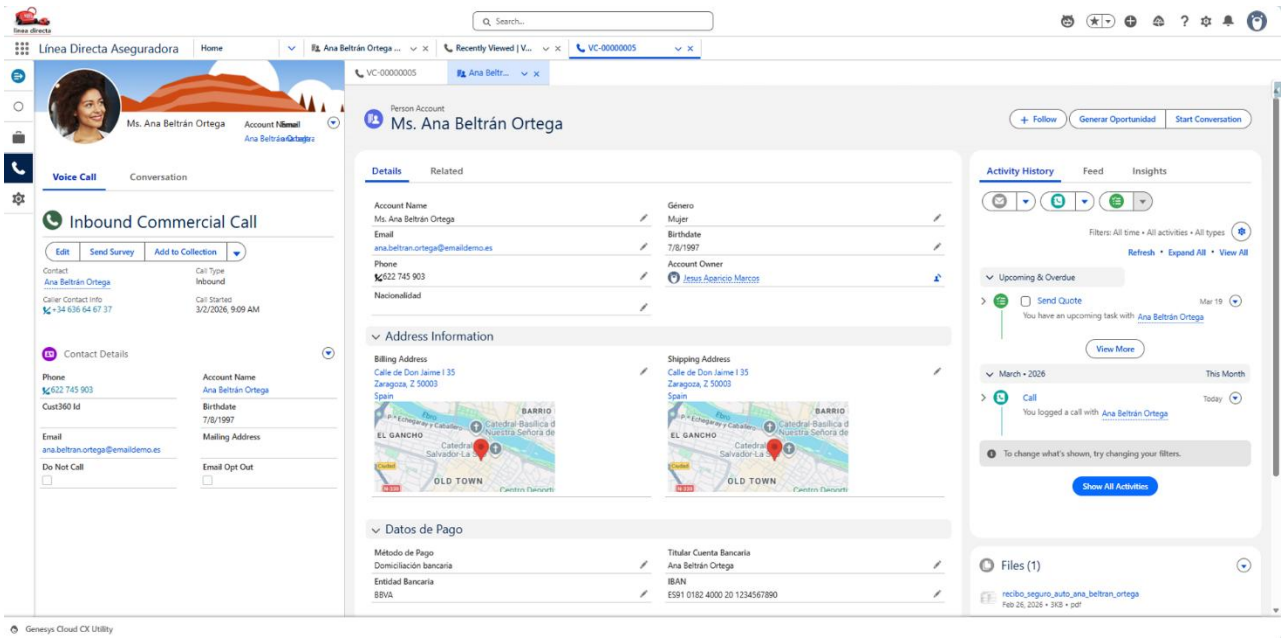


4.2.2.1.2. Ficha de cliente

De forma automática al recibir la llamada, Salesforce presenta al operador la ficha completa del cliente. Esta vista consolida la información relevante para la atención, permitiendo entender rápidamente la relación del cliente con la compañía y su situación comercial.

Gracias a esta visión unificada, el operador puede contextualizar la conversación desde el primer momento y detectar oportunidades de venta o de cross-selling basadas en el parque ya contratado.


Durante la llamada, el cliente manifiesta su interés en conocer la oferta de seguros de hogar, lo que da pie al inicio del proceso comercial.


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

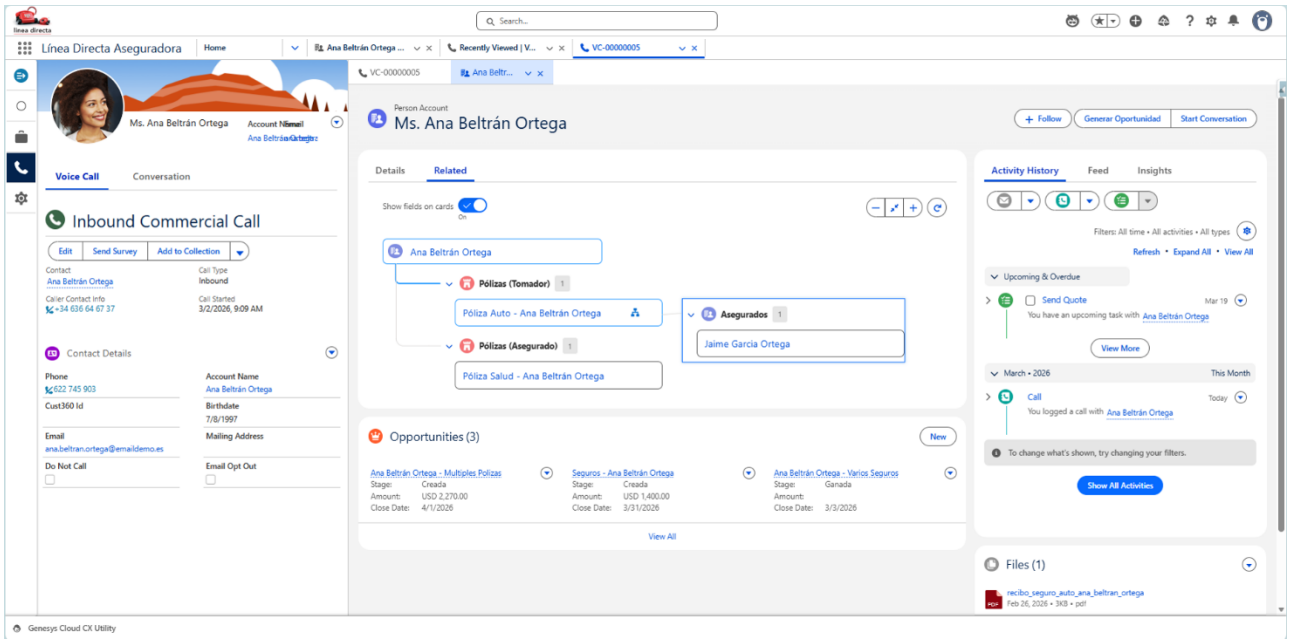

4.2.2.1.3. Alta de oportunidades y presupuestos


Desde la propia ficha del cliente el operador inicia el proceso comercial generando una nueva oportunidad asociada a la intención en curso.




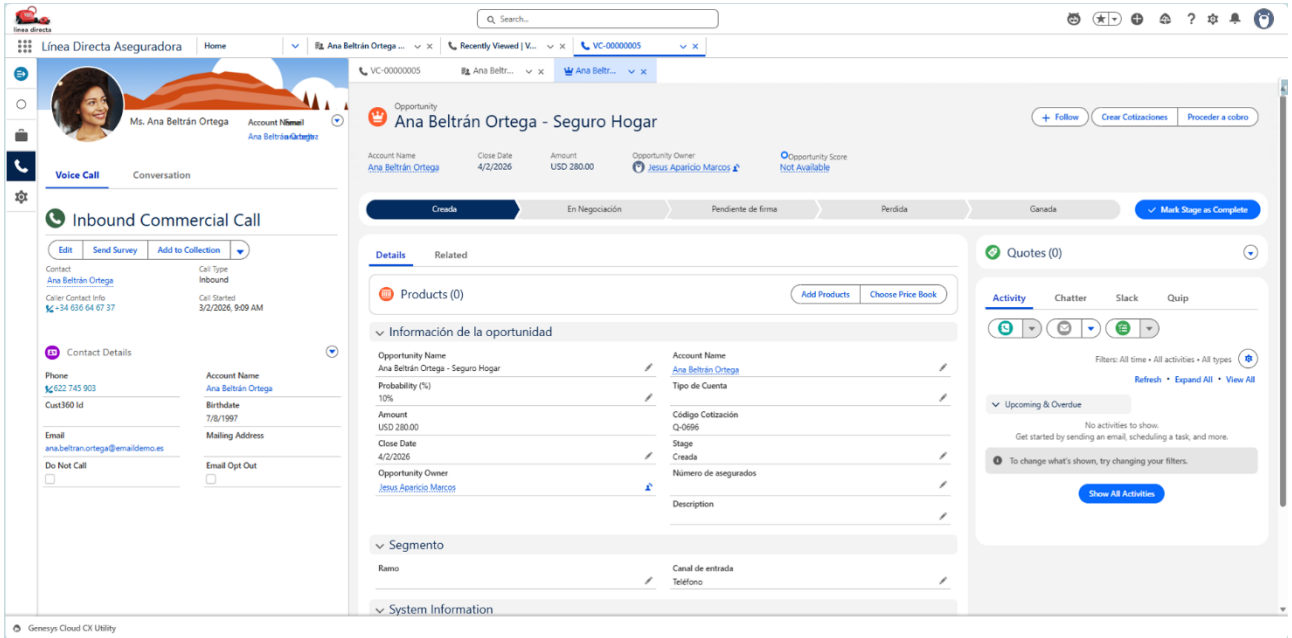

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.


Con la oportunidad en marcha, el agente comercial decide apoyarse en el agente de **IA Agentforce** para orientar la propuesta comercial. El **agente Agentforce** recopila la información del cliente y de la llamada para recomendar el producto óptimo además de posibles campañas asociadas al mismo, y que apliquen a las características del cliente. Esta recomendación contextual permite ofrecer al cliente una propuesta coherente con su perfil alineada con las iniciativas comerciales vigentes.

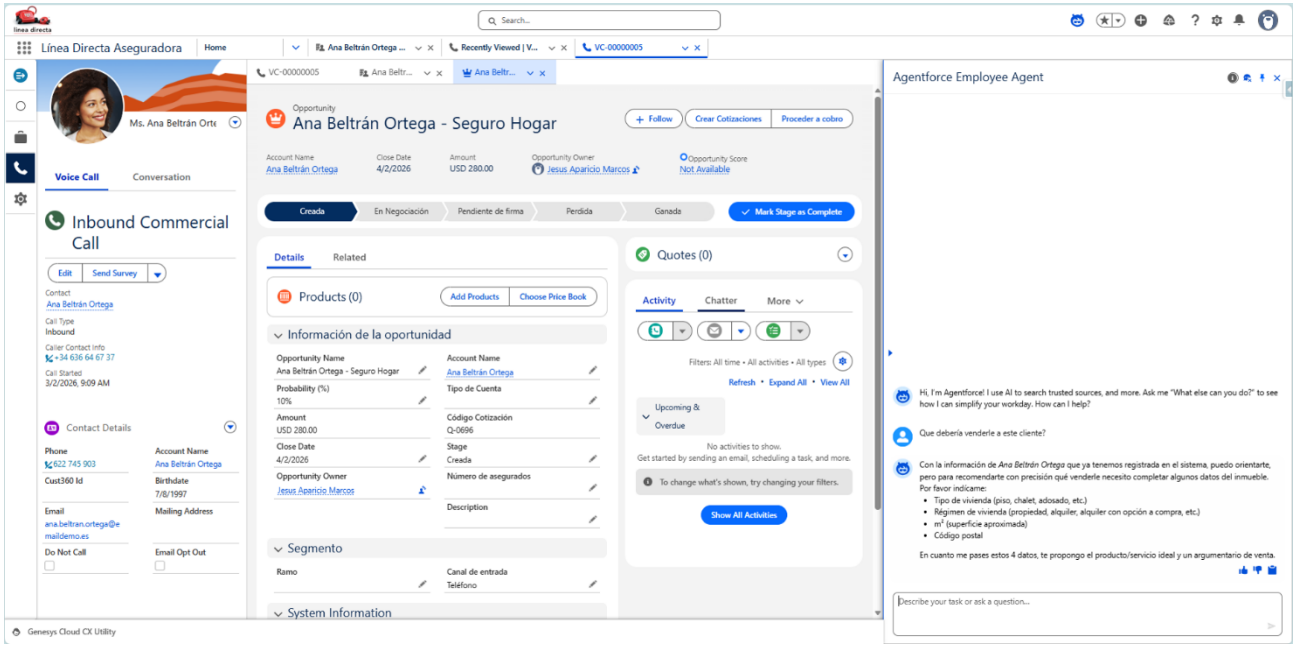

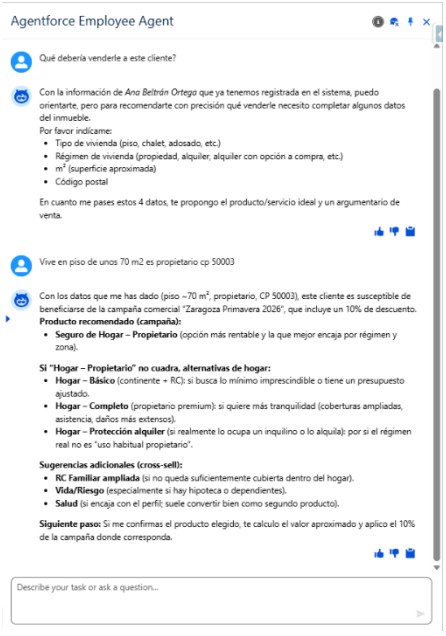


Siguiendo la recomendación, el agente comercial crea la cotización directamente desde la oportunidad. Salesforce facilita la selección del producto y genera la cotización asociada a la oportunidad, permitiendo avanzar en la conversación comercial con una propuesta concreta.


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

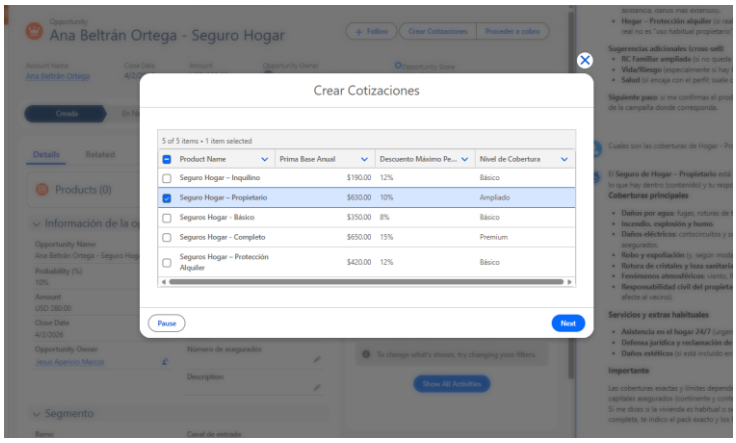


Abierta la pantalla de la cotización, el cliente solicita información sobre las coberturas incluidas en el seguro, momento en el cual el agente decide consultar nuevamente a **Agentforce**, que devuelve un resumen estructurado de las coberturas del producto seleccionado. La disponibilidad de este agente a lo largo de todo el proceso permite al agente mantener una conversación fluida apoyada por la IA de la plataforma.

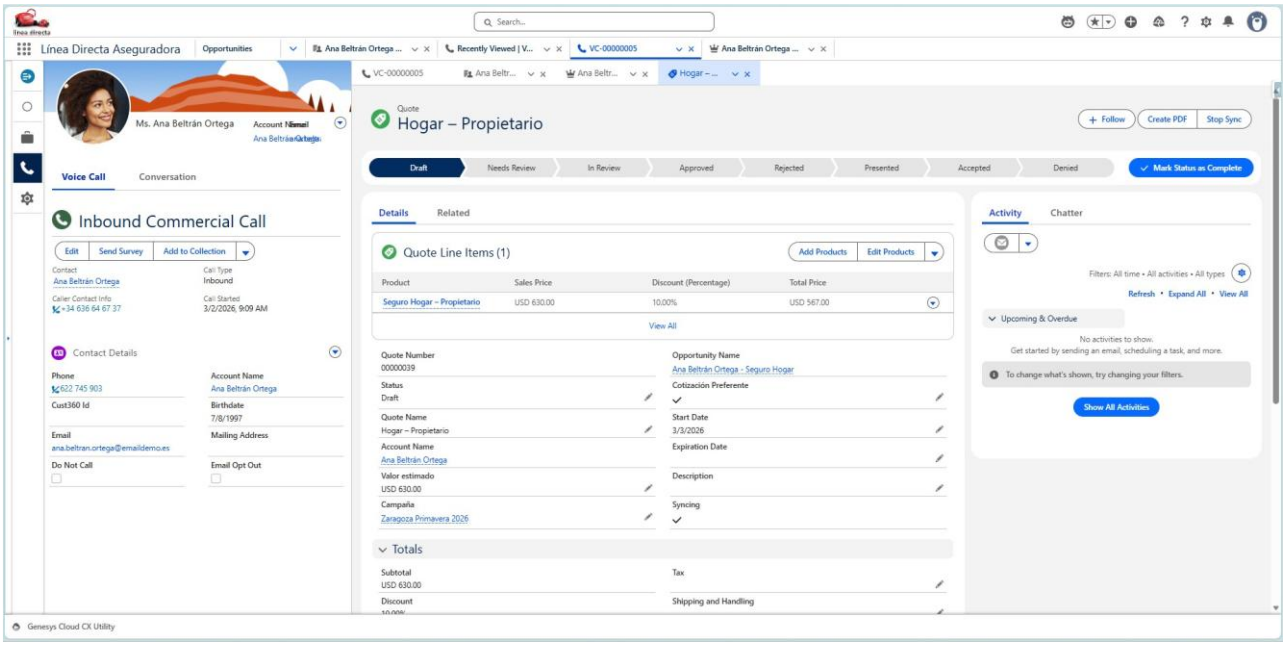


A continuación, el cliente presenta dudas en cuanto al coste del seguro, en ese momento, Salesforce activa el componente "**Next Best Action**" conectado a **Einstein AI**, que a través del contexto global de la oportunidad sugiere posibles medidas para concretar la oportunidad.

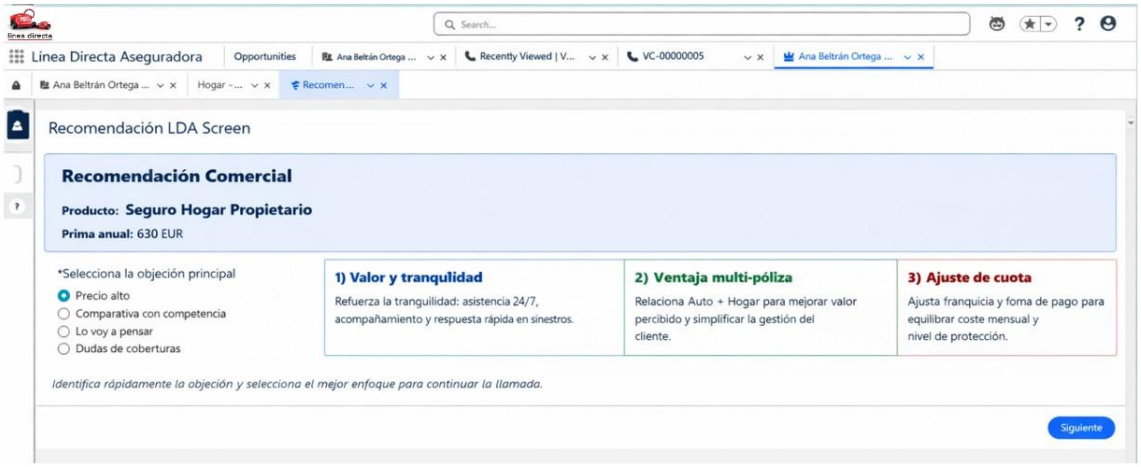


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

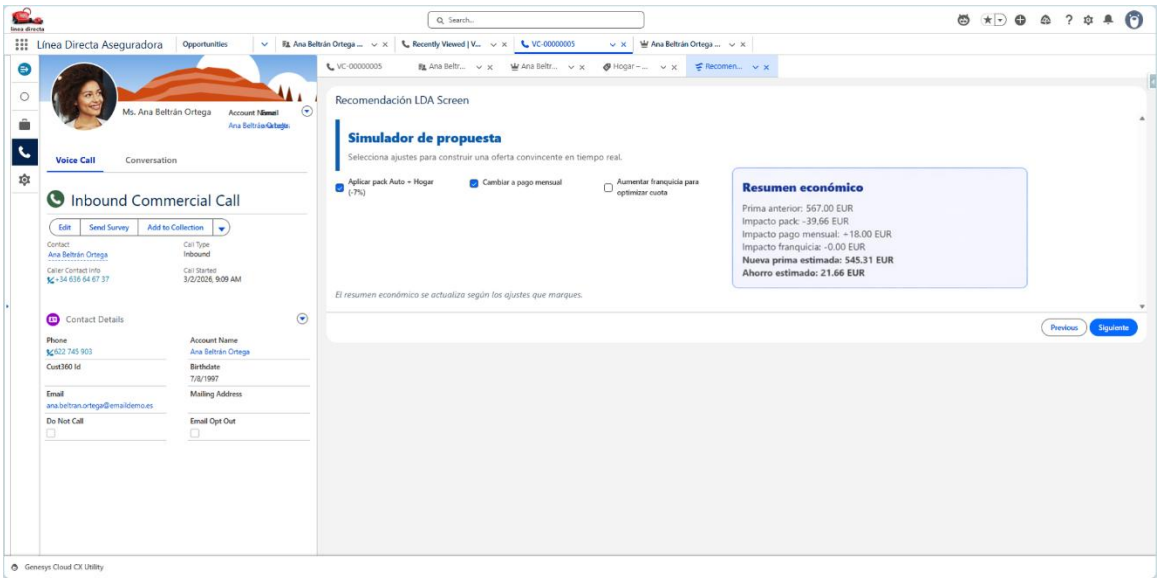

Finalmente, mediante aplicación de ofertas de negocio y cambios en la frecuencia de pago aconsejados por Einstein AI el cliente decide seguir adelante con la contratación. El agente comercial cierra el componente "**Next Best Action**" habiendo aplicado las medidas sugeridas. A continuación, desde la pantalla de la cotización, genera el documento PDF de la cotización y lo envía al cliente para su revisión.

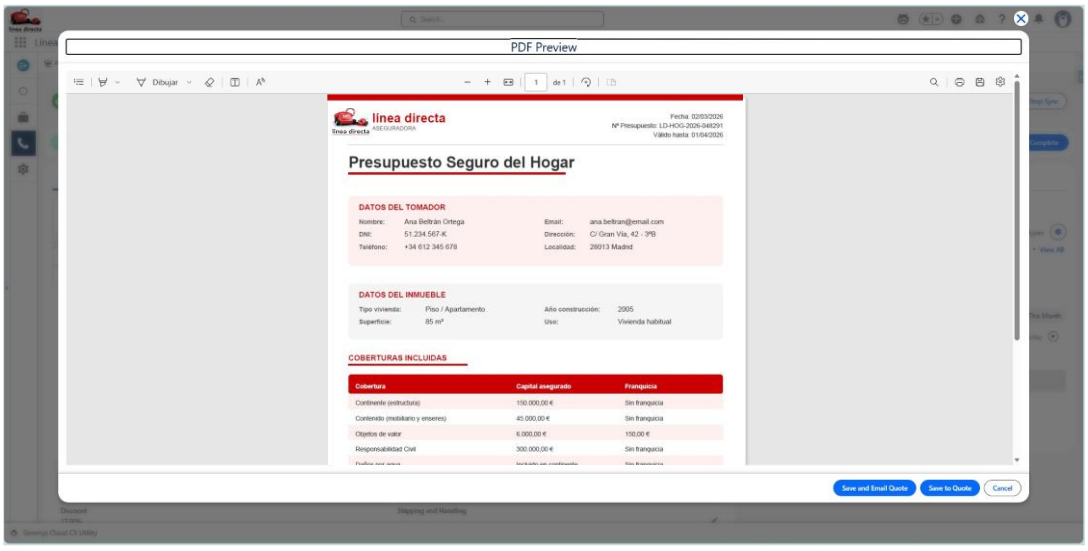


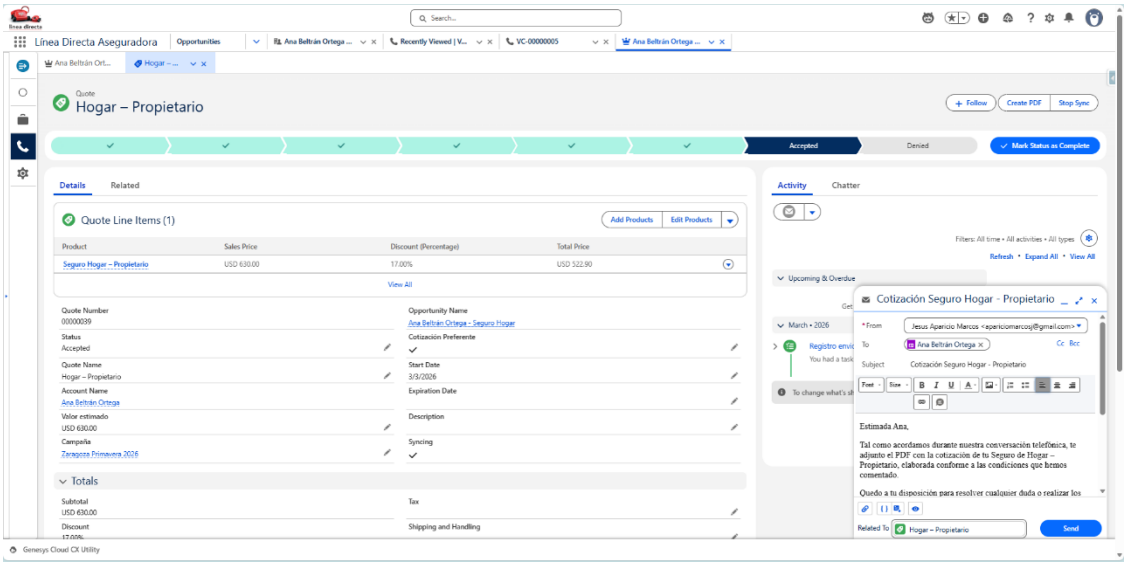


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.2.1.4. Cierre de oportunidades y presupuestos

Una vez ajustada la propuesta, enviado el presupuesto y la conformidad del cliente con el mismo, la cotización pasa a estado **Aceptada**, lo que lleva a la oportunidad al estado **Pendiente de firma**, donde el agente comercial podrá proceder a la ejecución del cobro desde la propia pantalla de la oportunidad.

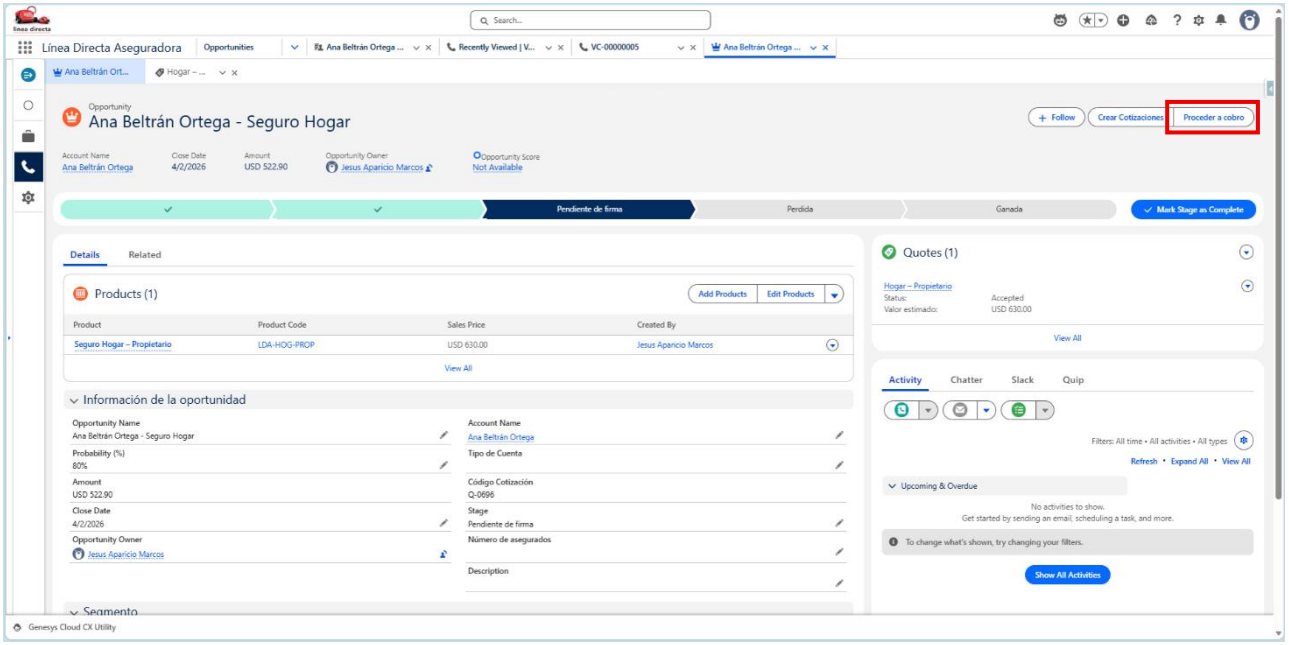


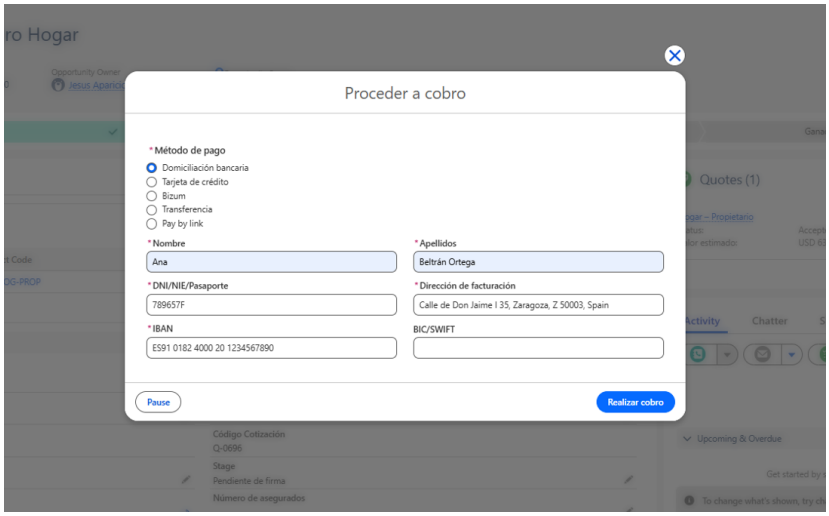

[4.2.2.2] Fidelización

Durante la llamada, el agente opera directamente sobre la ficha del cliente Javier López Martínez (registro Person Account) con la información necesaria para situar la conversación: datos del asegurado, relación con la compañía y contexto comercial. Desde esta vista se inicia la gestión de fidelización sin cambiar de herramienta, reduciendo tiempos y pasos operativos en Contact Center.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

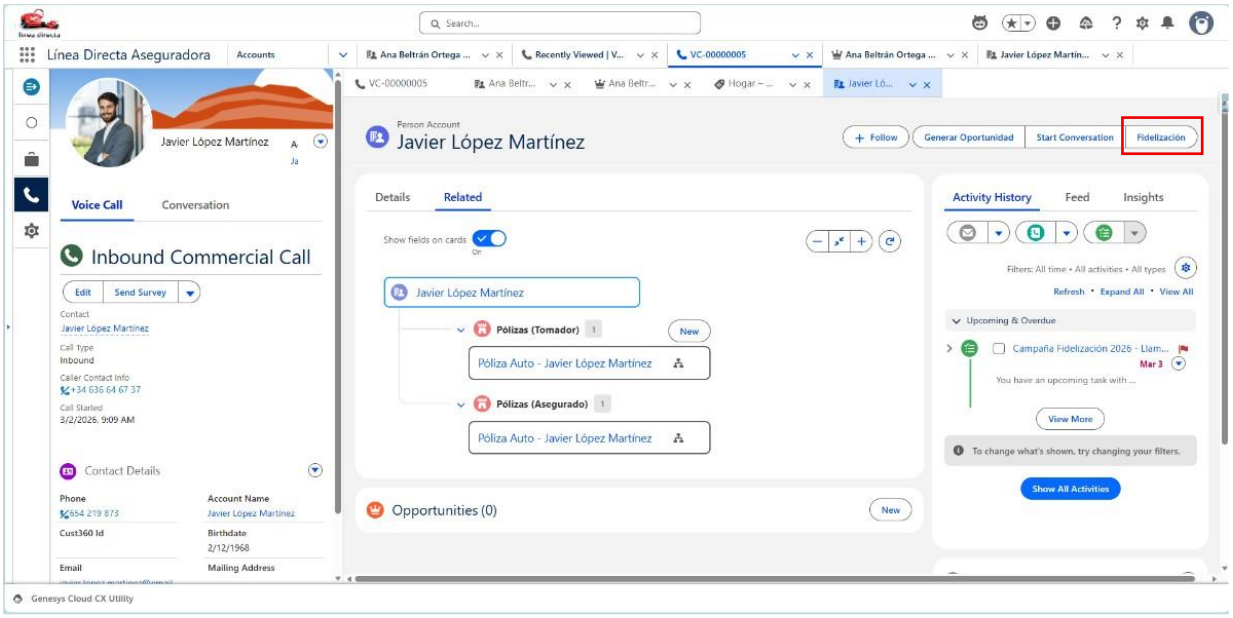


La activación se ejecuta mediante una Quick Action en la propia ficha del cliente, que abre un proceso guiado orientado a operación en llamada: pocos clics, decisión visual rápida y un resultado inmediato para comunicar al cliente.

4.2.2.2.1. Selección de campañas

El agente accede a una pantalla de selección de campañas presentada como un catálogo visual por tarjetas, evitando listas largas o campos poco intuitivos. Cada campaña muestra la información necesaria para tomar una decisión rápida durante la llamada:

- Tipo de promoción (interna o externa).
- Beneficio asociado para el cliente (descuento, ventaja o condición especial).
- Vigencia y dato clave para el argumentario comercial.

Este formato permite que el agente identifique rápidamente la campaña más adecuada para el cliente y continúe la gestión sin interrumpir el ritmo de la conversación.

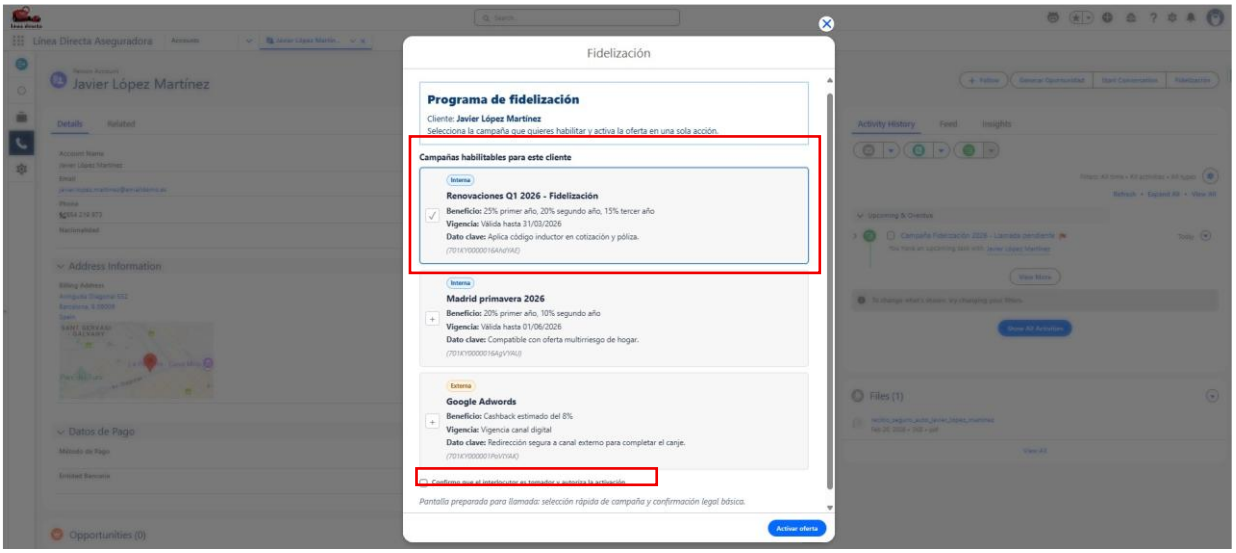


Una vez seleccionada la campaña, el proceso solicita al agente una confirmación obligatoria para validar que el interlocutor es el tomador y autoriza la activación de la oferta. Este paso introduce un control claro dentro del propio flujo operativo, asegurando que la activación se realiza con el consentimiento correspondiente.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.2.2.2. Generación del código de campaña


Tras la confirmación, el sistema valida la campaña seleccionada y genera automáticamente el código inductor asociado a la promoción, que queda disponible para su utilización inmediata. El agente visualiza una pantalla de confirmación con el código generado y su fecha de expiración, lo que permite comunicarlo al cliente durante la propia llamada y cerrar la gestión en el mismo contacto.

La activación queda registrada y vinculada al cliente, permitiendo acceder directamente al detalle de la campaña aplicada y a la póliza relacionada. Desde esta vista el agente puede consultar la información relevante para la conversación comercial, incluyendo el estado de la campaña, los clientes asociados y su evolución.

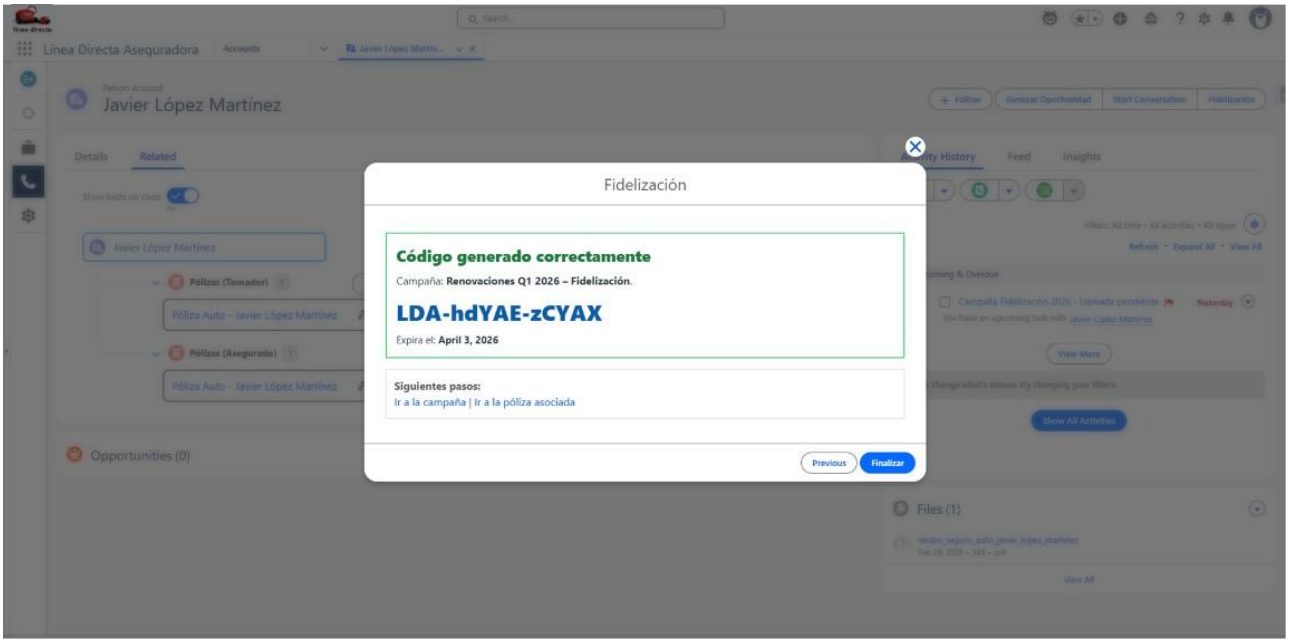

4.2.2.2.3. Registro del cliente en la campaña

La activación queda registrada automáticamente en la campaña correspondiente, vinculando al cliente como participante en la misma. De esta manera, desde la vista de la campaña es posible consultar qué clientes han sido incluidos, mantener trazabilidad de las activaciones realizadas y facilitar el seguimiento de las acciones comerciales asociadas a la campaña.

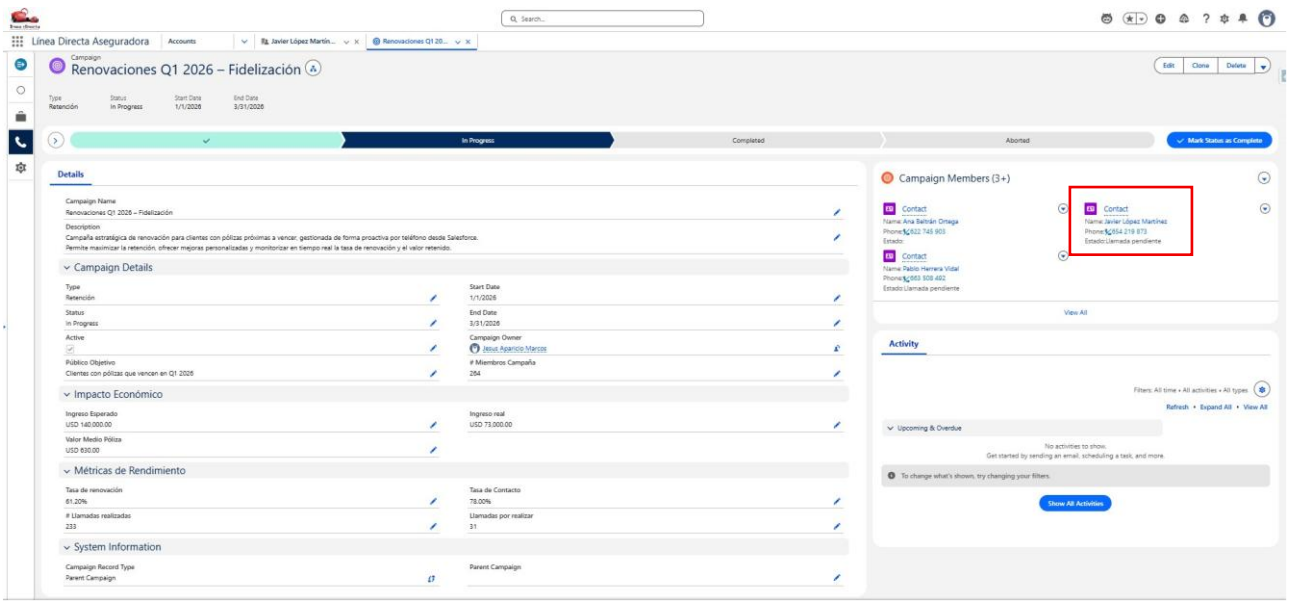


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

4.2.2.2.4. Consulta del detalle de póliza y movimientos económicos

El agente también puede acceder al detalle de la póliza del cliente directamente desde dicha pantalla, donde se muestra una visión completa del contrato. Esta vista incluye la información principal de la póliza y un resumen económico de movimientos, donde se reflejan los recibos emitidos, descuentos aplicados y suplementos realizados sobre la póliza.

En este caso, el suplemento registrado el 1 de marzo se genera automáticamente como resultado de la activación realizada en el proceso de fidelización. De esta manera, la campaña aplicada no solo queda registrada a nivel comercial, sino que también tiene su reflejo en el contexto económico de la póliza.

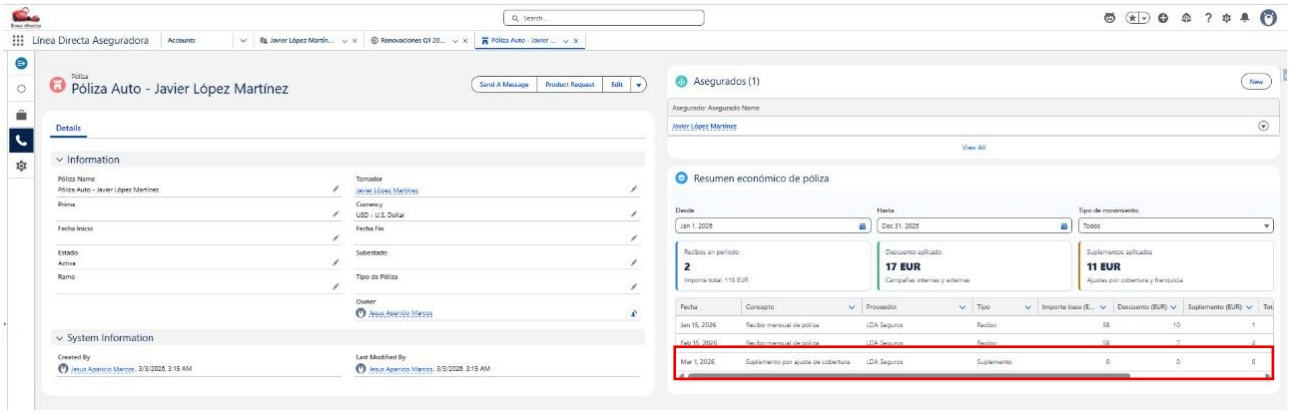

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[5] Plan de Transformación

Desde Ayesa, somos plenamente conscientes del proceso de transformación al que se enfrenta LDA, y como socio estratégico detallamos en el presente apartado **nuestro enfoque respecto al plan de despliegue y convivencia de sistemas.**

El enfoque se basa en los siguientes pilares:

- **Evitar silos de información:** Asegurar que ambos sistemas compartan los datos relevantes de clientes y cotizaciones, manteniendo coherencia y evitando duplicidades.
- **Mantener trazabilidad por ramo:** Garantizar que cualquier interacción o cotización sea accesible sin importar en qué sistema se realizó.
- **Minimizar cambios de sistema durante la atención:** Diseñar la operativa para que el agente no tenga que alternar entre plataformas salvo cuando sea imprescindible.
- **Reducir procesos duplicados:** Evitar que la misma funcionalidad esté activa simultáneamente en ambos sistemas; definir un único punto de inicio por ramo.
- **Reglas claras para continuar procesos iniciados en otro sistema:** Establecer criterios para continuar cotizaciones entre Salesforce y Galgo sin pérdida de información.
- **Despliegues progresivos y controlados:** Incorporar nuevas capacidades de forma gradual para asegurar estabilidad.
- **Facilitar la adopción del usuario final:** Minimizar fricciones, asegurar claridad operativa y ofrecer soporte adecuado.
- **Estrategia coherente de gestión de datos históricos:** Definir qué información migrar o consultar desde el legacy según su relevancia operativa.
- **Evitar migrar procesos ya iniciados en el legacy:** No forzar el traslado de gestiones activas en Galgo a Salesforce.
- **Definir un sistema maestro por proceso:** Establecer qué plataforma gobierna cada dato según la fase del ciclo de vida.
- **Ofrecer una experiencia operativa sencilla:** Proporcionar reglas claras sobre dónde iniciar cada gestión y cómo actuar ante excepciones

[5.1] Enfoque de convivencia

Previo a cada puesta en marcha, desde Ayesa consideramos clave las consideraciones e las siguientes tareas para asegurar una transición fluida.

- **Integraciones definitivas (y/o adaptaciones):** Son aquellas integraciones que vincularán sistemas Salesforce y satélites de manera definitiva. Estas integraciones, aunque definitivas, irán sufriendo adaptaciones para así poder asumir los diferentes negocios y funcionalidades adicionales que se vayan desplegando en las diferentes fases.
- **Integraciones temporales**: Serán aquellas integraciones que se desarrollarán al uso durante el periodo de convivencia y cuya vigencia no se extenderá más allá del periodo de implantación. Su objetivo será mantener los sistemas alineados para obtener, entre otras, una visión transversal de todos los datos, con el fin último de prestar el mejor servicio a la ciudadanía.
- **Migraciones iniciales:** Las migraciones de datos iniciales dotarán a los nuevos aplicativos de los datos históricos existentes en los sistemas a decomisar. Como parte de las tareas de migración, se contemplan la solicitud de extracción de datos del sistema origen, la conversión y transformación de los mismos para acomodarlos al nuevo modelo de datos Salesforce, y la carga masiva programada en el nuevo sistema para su uso y explotación.
- **Migraciones periódicas**: Dependiendo de la complejidad y el período de tiempo de convivencia entre algunos aplicativos, se determinará si conviene realizar integraciones temporales, o migraciones periódicas para mantener alineados los sistemas.
- **Transformación del dato y acciones para garantizar "Data Quality":** Tal y como hemos comentado, el proceso de migración abordará las posibles necesidades de transformación


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

de los datos a migrar. Además de la necesidad de transformar dichos datos, durante la misma, se articularán las medidas y reglas de negocio para garantizar la calidad y consistencia del dato en el nuevo aplicativo (reglas de duplicidad, merge de registros ya existentes determinando registro primario y secundarios, validaciones durante el proceso de carga para depuración de datos con problemas provenientes desde el sistema origen, etc).

- **Acompañamiento al negocio**: Durante los periodos de convivencia, se realizará el consecuente acompañamiento a los usuarios de negocio para garantizar el entendimiento necesario para su actividad diaria, explicando las posibles limitaciones y workarounds definidos para la consecución de los procesos funcionales.

[5.1.1] Periodo Fase 1

Durante el primer periodo, proponemos el siguiente escenario funcional y tecnológico:

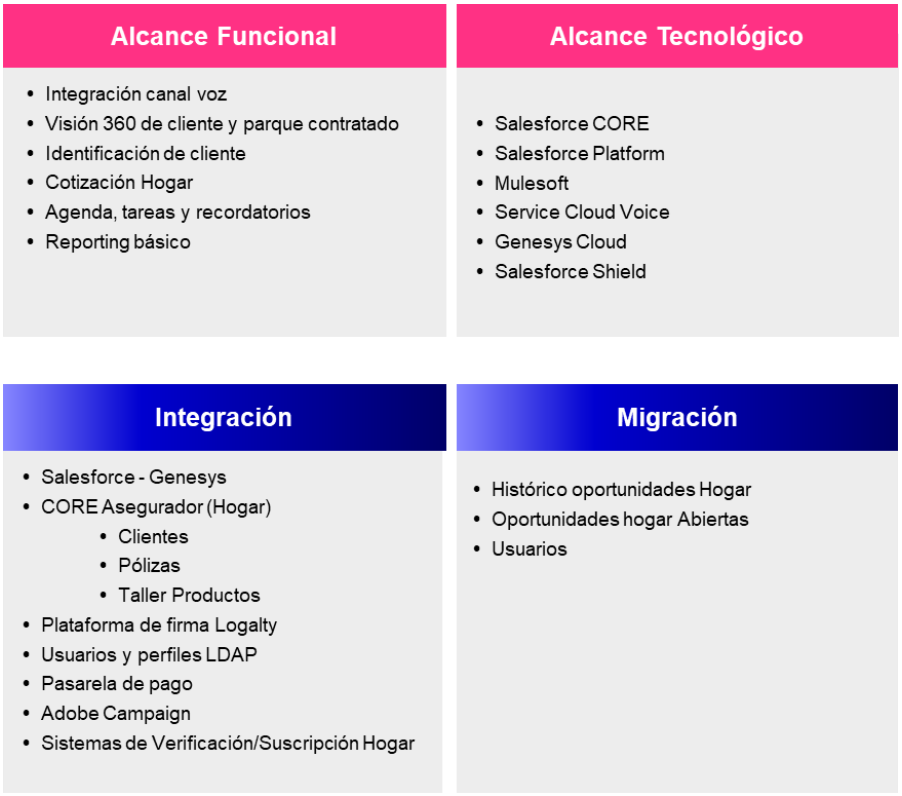

El enfoque propuesto para este periodo se basa en un alcance funcional diseñado para maximizar el valor desde el primer día, **integrando el canal voz, una visión 360º del cliente y la identificación unificada en todos los puntos de contacto y parque contratado.**

Adicionalmente, se contempla la **cobertura de la cotización de Hogar** y la gestión de agenda y tareas garantizan mayor eficiencia operativa y mejor experiencia para el equipo comercial.

Sobre esta base, se apoya un ecosistema tecnológico sólido con Salesforce Sales Cloud complementado por Mulesoft, Service Voice y Genesys Cloud, lo que asegura escalabilidad, automatización y una arquitectura preparada para el crecimiento.

A nivel tecnológico, se apoya en Salesforce Shield y MuleSoft para garantizar orquestación, seguridad e integración con el CORE asegurador (clientes, pólizas y productos), firma digital, LDAP, pasarela de pago, Adobe Campaign y sistemas de verificación. Se incluye la migración del histórico y oportunidades abiertas de Hogar, así como usuarios, priorizando continuidad operativa, trazabilidad y adopción, bajo un enfoque incremental que minimiza riesgos y evita silos durante la convivencia con sistemas legacy.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

La estrategia de integración conecta de forma fiable **Salesforce con Genesys y con los sistemas CORE del asegurador: pólizas, productos,** firma digital, LDAP, pasarela de pago, Adobe Campaign y sistemas de verificación

Finalmente, la migración centrada en oportunidades abiertas para este ramo minimiza el impacto en el negocio, acelera el time-to-value y permite validar capacidades en producción de forma controlada.

[5.1.2] Periodo Fase 2

Durante este periodo, proponemos el siguiente escenario funcional y tecnológico. A grandes rasgos entendemos este periodo como un aumento de las capacidades funcionales de los usuarios desplegados en el periodo anterior:

Alcance Funcional	Alcance Tecnológico
• NBO • Base de conocimiento • Funciones avanzadas IA • Cross Selling Hogar/Motor	• Salesforce CORE • Salesforce Platform • Mulesoft • Service Cloud Voice • Genesys Cloud • Salesforce Shield • Knowlede Base • Einstein NBA • Agentforce

Integración	Migración
• Salesforce - Genesys • CORE Asegurador • Clientes • Pólizas • Taller Productos Hogar • Plataforma de firma Logalty • Usuarios y perfiles LDAP • Pasarela de pago • Adobe Campaign • Sistemas de Verificación/Suscripción Hogar	• Histórico de ofrecimientos • Artículos Conocimiento • Documentos Conocimiento • Reglas NBO • Usuarios

El alcance de esta fase se centra en **habilitar capacidades avanzadas sobre la plataforma ya implementada, incorporando NBO, base de conocimiento y funciones avanzadas de IA**, apoyadas en **Knowledge y Salesforce Einstein (Einstein NBA), así como Agentforce**, sin requerir intervenciones sobre los componentes previamente desplegados.

La iniciativa contempla la configuración y orquestación de reglas de Next Best Offer y Cross Selling hacia motor, con el objeto de no dejar huérfano tras la puesta en marcha de la fase 1 la posibilidad de activar venta cruzada hacia el producto más core de LDA.

Asimismo, se incluye la **migración del histórico de ofrecimientos, artículos y documentos de conocimiento, reglas NBO y usuarios,** garantizando continuidad operativa, trazabilidad y adopción, maximizando el valor de la plataforma existente sin impactar las integraciones ya productivas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[5.1.3] Periodo Fase 3

Durante este periodo, proponemos el siguiente escenario funcional y tecnológico. Entendemos este periodo como clave en el desarrollo del proyecto.

Alcance Funcional	Alcance Tecnológico
• Cotización Coche	• Salesforce CORE • Salesforce Platform • Mulesoft • Service Cloud Voice • Genesys Cloud • Salesforce Shield • Knowlede Base • Einstein NBA • Agentforce

Integración	Migración
• Salesforce - Genesys • CORE Asegurador • Clientes • Pólizas • Taller Productos Hogar • Plataforma de firma Logalty • Usuarios y perfiles LDAP • Pasarela de pago • Adobe Campaign • Sistemas de Verificación/Suscripción Hogar • DB2 Content Manager • Sistemas de Verificación/Suscripción Coche • CORE Asegurador - Coche	• Histórico oportunidades Coche • Oportunidades Coche Abiertas • Usuarios

El alcance de esta fase contempla la **habilitación del proceso de Cotización Coche sobre la plataforma ya implementada, apalancándose en la solución ya operativa con las adaptaciones necesarias para este nuevo ramo.**

Se incorporan las integraciones específicas con **DB2 Content Manager, los sistemas de verificación y suscripción coche**, así como la integración con el CORE para la cobertura del proceso de cotización. Se reutilizarán las capacidades existentes de integración, seguridad y canal voz.

Asimismo, se incluye la migración del histórico de oportunidades Coche, oportunidades abiertas y usuarios, garantizando continuidad comercial, trazabilidad y experiencia unificada para el agente.

El enfoque prioriza reutilización del stack actual, minimización de riesgos y despliegue controlado, extendiendo el modelo operativo ya consolidado en otros ramos sin generar impacto en las integraciones productivas existentes.

En el ámbito de integración, se suma la conexión con los **sistemas de detección de deuda del cliente**, habilitando alertas tempranas y permitiendo integrar automáticamente esta información en los procesos de recobro.


Por último, la estrategia de migración contempla la incorporación de **procesos de recobro abiertos**, **procesos de suplementos abiertos** y **usuarios**, asegurando una transición ordenada y

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

sin impacto en la operación diaria. Este enfoque facilita continuidad, asegura consistencia de datos y reduce riesgos en la puesta en marcha.

[5.1.4] Periodo Fase 4 – Fase 6

Durante este periodo, proponemos el siguiente escenario funcional y tecnológico:

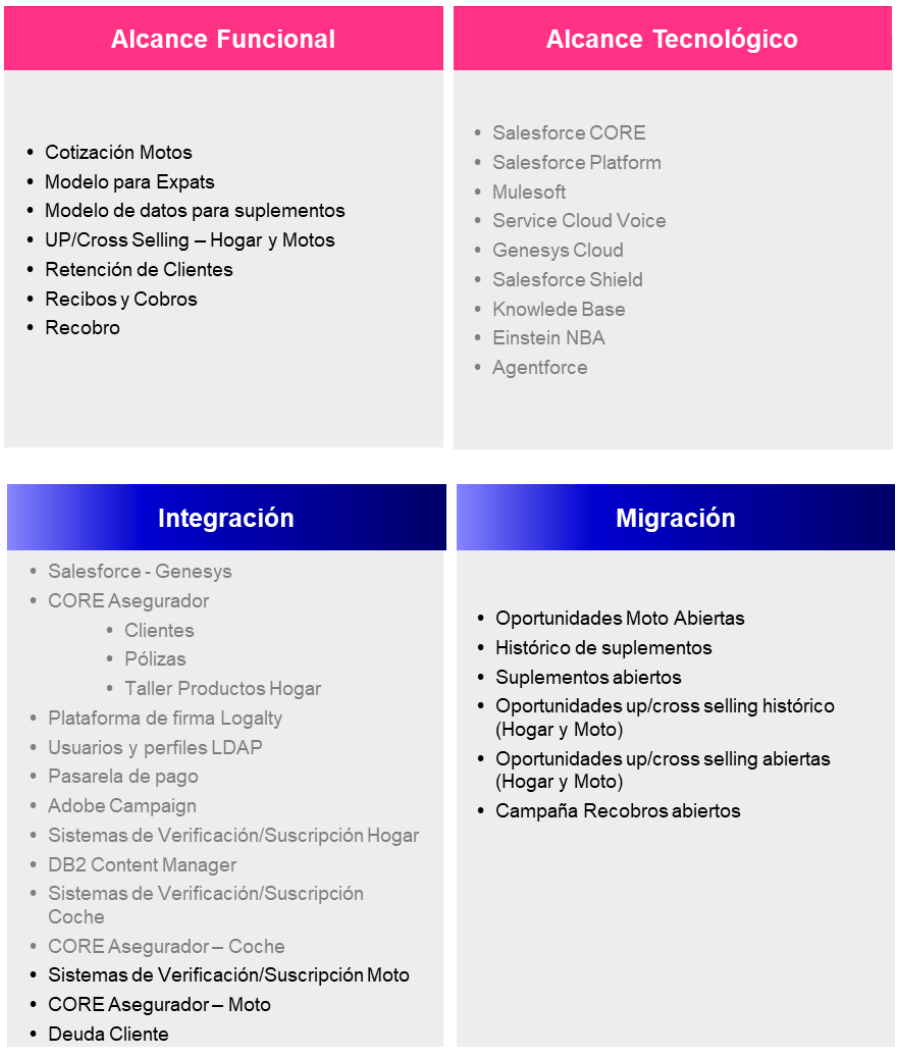

En esta fase se habilita el **proceso de cotización de motos** sobre la plataforma ya implantada, incorporando las adaptaciones necesarias para este ramo y ampliando las capacidades comerciales existentes. Se incorpora asimismo un **modelo específico para clientes expats y el modelo de datos necesario para la gestión de suplementos, junto con capacidades de up y cross selling entre productos de hogar y motos.** Adicionalmente, se refuerzan los **procesos de retención de clientes y se habilitan las funcionalidades de gestión de recibos, cobros y recobros**, ampliando la cobertura operativa del ciclo de vida de la póliza.

Se incorporan las integraciones específicas con los **sistemas de verificación y suscripción de moto**, así como con el **CORE asegurador de este ramo**, garantizando la correcta sincronización de la información durante el proceso de cotización y gestión de pólizas. Asimismo, se incluye la integración con los **sistemas de detección de deuda del cliente**, permitiendo incorporar esta información dentro de los procesos de seguimiento financiero y recobro.

Por último, la estrategia de migración contempla la **incorporación de oportunidades abiertas de moto, el histórico y los suplementos abiertos, así como las oportunidades históricas y abiertas de up y cross selling para los productos de hogar y moto y las campañas de recobro**

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

abiertas. Este enfoque garantiza continuidad operativa, preserva la trazabilidad de la actividad comercial y facilita una transición ordenada hacia la nueva plataforma.

[5.1.5] Periodo Fase 6 – Fase 9

Durante este periodo, proponemos el siguiente escenario funcional y tecnológico. A grandes rasgos consideramos en este periodo las capacidades para la cotización de Salud, la incorporación al modelo del segmento empresas B2B, los programas y procesos de fidelización, así como la incorporación del modelo de ATC en su totalidad. Se integrará el canal Chat como un nuevo punto de contacto con el cliente.

Alcance Funcional	Alcance Tecnológico
• Cotización Salud • Cotización Empresas • Programas y procesos de fidelización • Atención al Cliente • Canal Chat	• Salesforce CORE • Salesforce Platform • Mulesoft • Service Cloud Voice • Genesys Cloud • Salesforce Shield • Knowlede Base • Einstein NBA • Agentforce

Integración	Migración
• Salesforce - Genesys • CORE Asegurador • Clientes • Pólizas • Taller Productos Hogar • Plataforma de firma Logalty • Usuarios y perfiles LDAP • Pasarela de pago • Adobe Campaign • Sistemas de Verificación/Suscripción Hogar • DB2 Content Manager • Sistemas de Verificación/Suscripción Coche • CORE Asegurador – Coche • Sistemas de Verificación/Suscripción Moto • CORE Asegurador – Moto • Deuda Cliente • Sistemas de Verificación/Suscripción Salud • CORE Asegurador- Salud • CORE Asegurador – B2B	• Oportunidades salud abiertas • Oportunidades B2B abiertas

En esta fase se incorporan **nuevas capacidades funcionales para los ramos de salud y B2B** sobre la plataforma ya implantada, ampliando el modelo operativo existente. Se habilitan los procesos de cotización para productos de salud y empresas, **junto con la implantación de programas y procesos de fidelización orientados a mejorar la retención y el valor del cliente. Asimismo**

En el ámbito de integración, se incorporan las conexiones con **los sistemas de verificación y suscripción de salud,** así como con los **CORE aseguradores de salud y B2B**, garantizando la sincronización de la información y la correcta orquestación de los procesos de contratación y gestión de pólizas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Por último, la estrategia de migración contempla **la incorporación de las oportunidades abiertas de salud y B2B**, asegurando continuidad en la actividad comercial y permitiendo a los equipos operar desde la nueva plataforma sin interrupciones en la gestión de oportunidades activas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6] Plan de trabajo


[6.1] Enfoque de solución

Uno de los principales retos al que nos enfrentamos es lograr un **enfoque de solución** que sea aceptado por toda la organización y que maximice los resultados, al tiempo que reducimos cualquier impacto en los clientes de LDA. En base a las necesidades planteadas, las tecnologías actuales y nuestra experiencia previa, planteamos un enfoque que permita la **consecución de los objetivos y garantice el éxito** en cada etapa del proyecto.

Proponemos una estrategia de solución en la que se aproveche al máximo las funcionalidades estándar de la plataforma cubriendo los requerimientos del proyecto sin recurrir a desarrollos personalizados, a menos que sea completamente necesario y que se traten de funcionalidades específicas que no comprometan la estabilidad de la solución.

Los beneficios que consideramos más relevantes de esta estrategia son:

- **Reducción de tiempos de proyecto**: Al enfocarnos en las funcionalidades estándar de Salesforce podremos acelerar significativamente el ciclo de implementación.
- **Solución robusta y confiable**: Nos aseguraremos garantizar que la solución sea robusta y fiable desde el principio, además de estar alineada con las mejores prácticas recomendadas por Salesforce, minimizando el riesgo de problemas técnicos o de seguridad a futuro.
- **Reducción de costes de mantenimiento**: Evitar desarrollos personalizados no solo reducirá los costes de implementación inicial, sino que también disminuirá los costes de mantenimiento y soporte.
- **Beneficios de nuevas versiones**: Al mantenernos en el ámbito de las funcionalidades estándar, estaremos en una posición óptima para aprovechar las nuevas releases de manera inmediata, obteniendo sin esfuerzo una mejora y evolución continua de la solución.




En base a esta estrategia se ha diseñado una solución que entendemos se ajustan perfectamente a las necesidades planteadas y que describimos en a continuación.

[6.2] Fases y Actividades

Describimos a continuación el alcance de los servicios a proporcionar desde Ayesa adecuándonos a los requerimientos de LDA para la implementación de la solución sobre la plataforma Salesforce. En este sentido se hará foco en conseguir una visión totalmente alineada de los objetivos y estrategia del proyecto entre el equipo de implementación y los usuarios clave de LDA.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

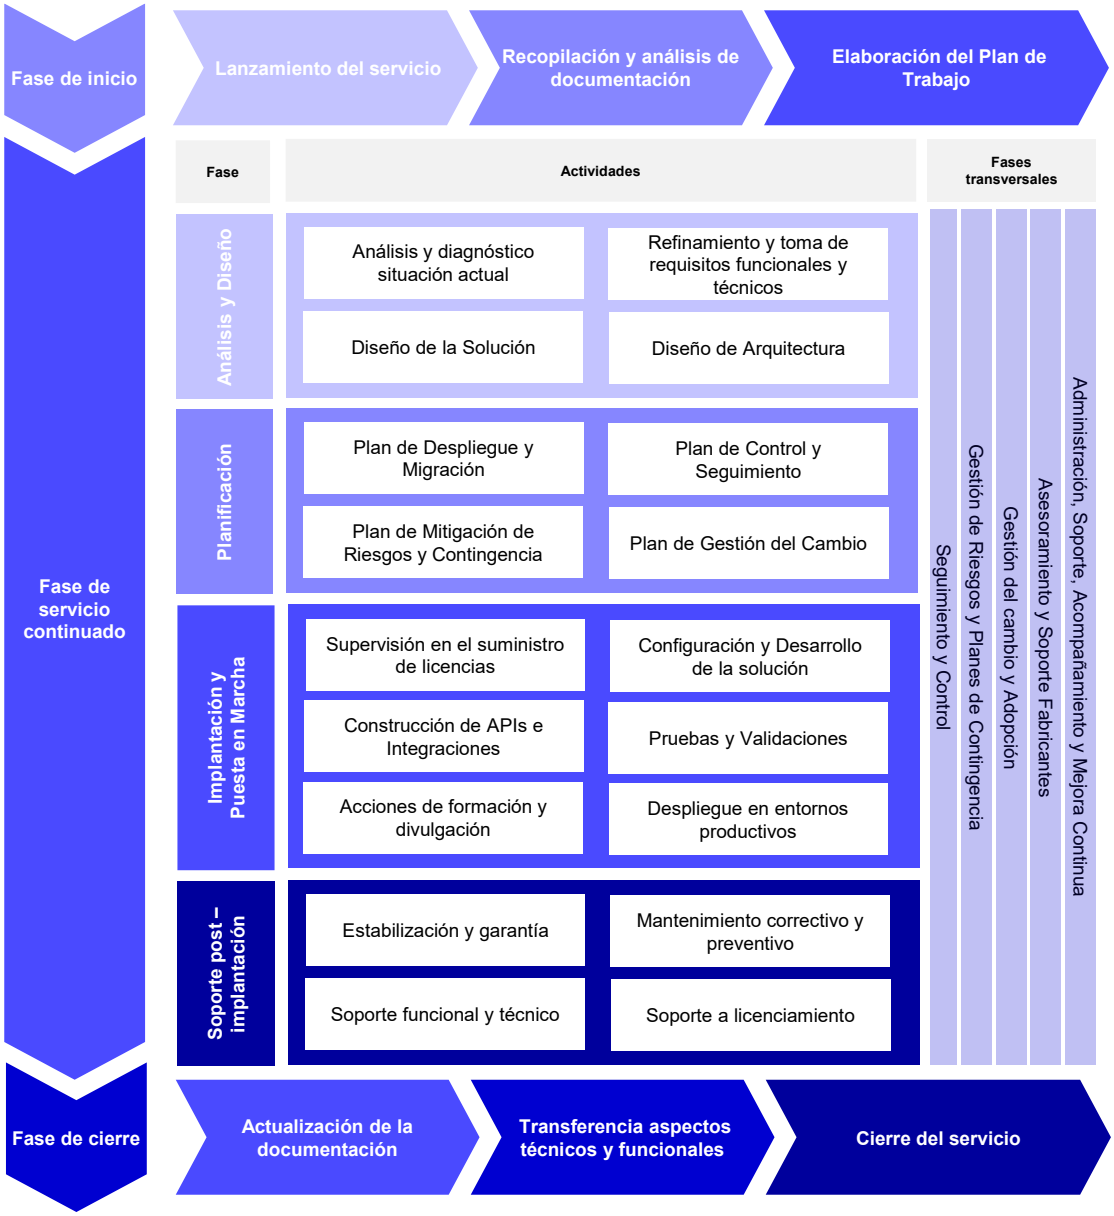

<u>Hay que destacar que, en base a nuestra estrategia de implementación, a excepción de la fase de constitución el resto de fases sucederán de manera cíclica por waves/fases de implementación.</u>

[6.2.1] Fase de constitución

La **Fase de Inicio** abarcará todas las actividades necesarias para la puesta en marcha del servicio del proyecto. Los objetivos principales serán planificar todas las actividades necesarias para asegurar el correcto desarrollo de este, fijando los mecanismos de gobernanza, estableciendo los modelos de relación y comunicación para garantizar la coordinación entre todos los involucrados y la agilidad en la ejecución.

Lanzamiento del servicio

El proyecto dará comienzo con la reunión de Kick-Off en la que se revisará conjuntamente el planteamiento del proyecto para alinear alcance, metodología, objetivos y entregables. Se presentará al equipo de trabajo y se identificarán los interlocutores de LDA con los que se va a relacionar el equipo y se definirán roles y responsabilidades de todos los miembros.

Recopilación y análisis de documentación

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

En esta fase se llevará a cabo la recopilación y análisis de la documentación disponible por LDA y relevante para el proyecto, permitiendo garantizar el óptimo traspaso de información al equipo de trabajo.

Elaboración del Plan de Trabajo

Se deberá definir y validar conjuntamente el Plan de Proyecto y Modelo de Gobierno, se acordará la disponibilidad de los miembros del equipo de LDA y se procederá a candelarizar las primeras sesiones de trabajo y las sesiones periódicas.

[6.2.2] Análisis y Diseño

Durante la Fase de Análisis y Diseño se llevará a cabo el análisis de la situación actual, la recogida de necesidades y el diseño de la solución.

Análisis de la situación actual para obtener un entendimiento de procesos, organización y sistemas actuales, así como de los principales puntos de dolor. Desde Ayesa realizaremos durante esta primera fase el levantamiento y entendimiento de la situación de LDA a nivel tecnológico, identificando los componentes de la solución CRM actual, bloques funcionales y equipos involucrados a fin de detectar cualquier posible impacto en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Refinamiento requerimientos de la RFQ funcionales y técnicos a través de workshops con el objetivo de validar el correcto entendimiento, detallar la necesidad a bajo nivel y definir el Backlog de Requerimientos.

Diseño de la solución funcional una vez bajado a detalle los requerimientos y casos de uso del alcance. Se mantendrán sesiones conjuntas de validación de las propuestas y se elaborará un Documento de Diseño Funcional que deberá ser validado por LDA. Este documento contara con los prototipos sobre figma de pantalla previo a su desarrollo,

Se llevará a cabo el **diseño de arquitectura y seguridad** en relación con el nuevo modelo a implementar.

[6.2.3] Planificación

Durante la Fase de Planificación se acordará el plan de implementación y la metodología de despliegue del proyecto:

Se aterrizará una **hoja de ruta** que identifique los principales hitos de puesta en marcha para las diferentes funcionalidades y usuarios.

Se validará un **plan de migración** del proyecto definiendo responsabilidades y planificando las tareas necesarias. A pesar de las especificaciones de LDA, se trabajará en la identificación de los datos mínimo-indispensables existentes en los sistemas actuales para la gestión de la nueva plataforma con el objeto de migrar los datos necesarios que aseguren la puesta en marcha de la nueva solución.

Se definirá una **estrategia de integración** cos acuerdos de interfaz a alto nivel para las diferentes integraciones identificadas, así como los modos de conexión, autenticación e integración entre los sistemas involucrados.

Se elaborará un **plan de gestión de riesgos** y aseguramiento de la seguridad, incluyendo estrategias de contingencia.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



Se elaborará el **plan de gestión del cambio** que asegure la capacitación y adopción de los usuarios administradores para aprovechar al máximo los beneficios de la solución.

[6.2.4] Implementación y puesta en marcha

Durante la fase de Implementación y Puesta en Marcha incluiremos las tareas de construcción, validación y despliegue de la solución acorde a la planificación acordada.



Supervisión en el suministro y activación de licencias de los diferentes modulos y productos de la solución para poder ejecutar las tareas necesarias para su implementación.



Construcción de la solución diseñada en los entornos de desarrollo y aseguramiento del correcto funcionamiento mediante la ejecución de pruebas internas.



Implementación del **modelo de interoperabilidad** mediante la elaboración de los acuerdos de interfaz detallados, protocolos de comunicación y seguridad, establecimiento de conexiones y construcción de APIs e Integraciones.




Ejecución del **plan de migración de datos** del proyecto llevando a cabo las tareas de extracción, transformación, carga y validación y realizando los dry runs planificados.



Elaboración de la **documentación técnica** final que deberá ser validado por LDA.



Despliegue en entorno de UATs y creación de juego de datos para ejecutar las pruebas de aceptación.



Ejecución de las **pruebas de integración** con los equipos de IT de LDA y/o proveedores de otros sistemas implicados.



Ejecución de las **pruebas de aceptación** por parte de los usuarios de negocio. En caso de que no se dé por validada, se realizarán los ajustes necesarios hasta que se obtenga la validación completa.



Ejecución de las **acciones de comunicación y formación**, y elaboración de manuales de usuario y documentación para garantizar la puesta en marcha en base a los plazos requeridos por LDA.



Elaboración de **plan de contingencia y back-up** que nos permita gestionar riesgos durante la puesta en marcha y planificará el decomisado completo de la solución actual.



Ejecución del **plan de despliegue y migración en producción**, que incluirá tareas de validación tanto por parte del equipo de proyecto como por parte de los usuarios de negocio. Se llevarán a cabo las correcciones que sean necesarios hasta que se dé por validado el despliegue.



Establecimiento del **modelo de monitorización y seguimiento continuo** para la supervisión en tiempo real de las APIs, flujos de integración y rendimiento del sistema

[6.2.5] Soporte post – implantación

Una vez finalizada la fase de implementación, dará comienzo la fase Soporte post – implantación de la plataforma hacia un modelo de mejora continua.



Brindar **asistencia y soporte integral** cubriendo tanto aspectos técnicos como funcionales de la plataforma, así como cualquier consulta o petición relacionada con el licenciamiento.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Realización de **acciones planificadas para prevenir** posibles problemas en la plataforma, optimizando el rendimiento y garantizando su estabilidad

Corrección de problemas o fallos que surgen de manera imprevista en la plataforma, respuesta a incidencias detectadas, errores de funcionamiento, caídas del sistema o problemas de integración.

Adaptación de la solución ante imperativos legales, normativos u organizativos o nuevas versiones de los productos.

[6.2.6] Fase de devolución

Esta última fase consiste en la **finalización de todos los trabajos** realizados por el equipo de proyecto.

Actualización de la documentación: durante esta fase Ayesa tiene el compromiso de actualizar la documentación completa del servicio para su entrega y validación por LDA

Transferencia de aspectos técnicos y funcionales: durante esta fase, se traspasará al equipo de LDA los aspectos más relevantes a nivel de arquitectura, sistemas, seguridad y otros que puedan ser de interés para el conocimiento interno de LDA.


Cierre del servicio: El proyecto finalizará con una reunión en la que se hará un resumen de las líneas más importantes ejecutadas por Ayesa, así como las mejoras implementadas y objetivos alcanzados.

[6.3] Enfoque metodológico

En nuestra propuesta de implantación, nos comprometemos a seguir una metodología sólida y probada para garantizar el éxito del proyecto. Nuestro enfoque **combina lo mejor de las metodologías *waterfall* y *agile***, permitiendo gestionar proyectos de alcance cerrado con una planificación robusta y fechas de despliegue claramente definidas, pero manteniendo flexibilidad en la entrega de funcionalidades a través de iteraciones ágiles.

Esto asegura una ejecución eficiente, que se adapta a las necesidades y condiciones de LDA, asegurando un balance adecuado entre planificación predictiva y adaptabilidad iterativa.

El enfoque *hybrid-agile* se basa en los siguientes principios clave:

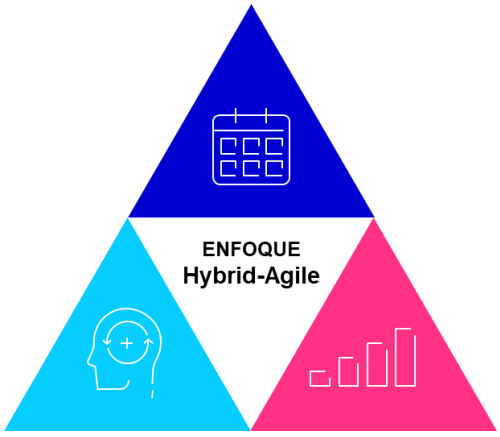

Planificación global del proyecto: Se establece una planificación inicial detallada que define las fases clave del proyecto, incluyendo dependencias y fechas críticas. Esta planificación se ajusta para garantizar que los hitos importantes sean alcanzados según lo previsto.

Entrega incremental: A lo largo de la ejecución del proyecto, se entregan incrementos de producto, basados en un ciclo de despliegue propuesto que permite la implementación progresiva de funcionalidades. Esto asegura que los usuarios puedan validar avances y proponer ajustes de manera continua, siempre dentro del marco de las limitaciones de tiempo y alcance predefinidas.

Gestión del cambio controlada: Si bien se adopta la flexibilidad de las metodologías ágiles, cualquier cambio en los requisitos o el alcance se evalúa cuidadosamente para garantizar que se mantengan las fechas y el presupuesto del proyecto, alineándose con los compromisos acordados al inicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Este enfoque híbrido garantiza que se respeten los hitos y dependencias críticas, al mismo tiempo que permite la entrega continua de valor a través de ciclos iterativos y revisiones regulares. Además, se refuerza la comunicación transparente y la colaboración constante con LINEA DIRECTA para asegurar una implementación personalizada y orientada a resultados.

La aplicación de un enfoque híbrido para la implementación de Salesforce ofrece múltiples beneficios:



Balance entre previsibilidad y flexibilidad: La planificación inicial detallada permite una mayor previsibilidad en cuanto a fechas y entregables clave, mientras que la entrega iterativa permite ajustes de forma controlada y eficiente. Esto facilita la incorporación de cambios cuando son realmente necesarios, sin comprometer el cronograma del proyecto.



Reducción de riesgos: La estructura *waterfall* permite identificar y mitigar riesgos desde el principio, mientras que la entrega iterativa permite validar continuamente las funcionalidades implementadas. Esto ayuda a reducir los errores al recibir retroalimentación constante de los usuarios.



Aceleración del tiempo de valor: Aunque el proyecto tiene un alcance definido, el enfoque iterativo permite entregar funcionalidades antes del final del proyecto completo, facilitando un retorno de inversión más temprano.



Mejora de la calidad y aceptación de usuarios: Al involucrar a los usuarios en cada iteración, se aumenta la aceptación de la solución, ya que las funcionalidades pueden ser ajustadas según el *feedback* de los usuarios finales, mejorando así la calidad del producto y alineándolo con las expectativas de negocio.



Aumento de la colaboración y transparencia: La metodología promueve una comunicación constante y transparente entre todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta los *stakeholders*. Esto asegura que todos estén alineados en los objetivos del proyecto y facilita la toma de decisiones informadas en tiempo real.




Facilitación del cambio cultural y organizativo: Más allá de los beneficios específicos para este proyecto, la adopción de una metodología ágil impulsa una cultura organizativa más dinámica y abierta al cambio, que puede aplicarse a otros proyectos futuros, favoreciendo una mentalidad de mejora continua y adaptación rápida a las condiciones del mercado.

Un elemento clave es asegurar la **máxima colaboración entre nuestro equipo y el equipo de LDA** durante toda la implementación del proyecto. Desde el inicio hasta la finalización de la implementación, los equipos estarán compuestos por miembros tanto de lda como de Ayesa. Esta integración garantizará una participación activa del equipo de LDA a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, permitiendo validar cada entrega, ajustar los requisitos en tiempo real y adaptarse a los cambios de manera ágil, minimizando su impacto en el desarrollo del proyecto.

Aunque el alcance está predefinido, la construcción se desarrollará de forma iterativa, con **revisiones continuas del avance y ajustes necesarios**. Los ciclos de trabajo o *sprints* permitirán entregar funcionalidades incrementales, siempre respetando la planificación general del proyecto y las fechas de despliegue establecidas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

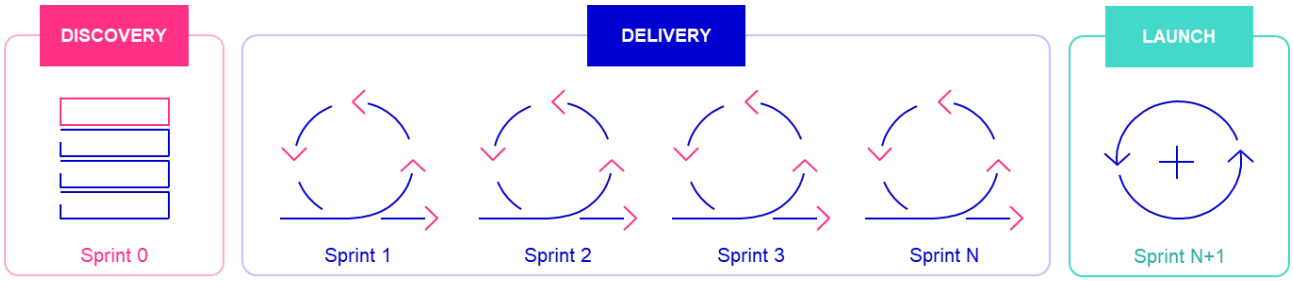

Iniciaremos con un *Sprint 0*, dedicado a la fase de ***Discovery***, donde se explorarán y entenderán en detalle los requisitos y se acordará la planificación del proyecto. A continuación, comenzaremos la fase de ***Delivery***, que comienza con el *Sprint 1*, en el que se definirán y desarrollarán de manera iterativa las nuevas funcionalidades necesarias. Como fase final de cada una de las releases planificadas, durante la fase de ***Launch***, el objetivo será la consolidación del producto y su puesta en marcha en producción.

La fase de ***Discovery*** marca el inicio formal del proyecto y tiene como objetivo comprender a fondo los requerimientos y establecer las bases del modelo de trabajo conjunto. Durante esta etapa, realizaremos una revisión exhaustiva de los procesos de CRM sobre Salesforce, combinando nuestra experiencia en implementación y conocimiento del sector con las habilidades específicas de los miembros del equipo. Este enfoque permitirá minimizar riesgos y establecer un marco sólido para el desarrollo posterior.

La fase de ***Delivery*** se organizará en *sprints* con una duración de entre 2 y 4 semanas. En cada sprint, se entregarán incrementos de producto según lo priorizado en el *backlog*. Estos incrementos se validarán y ajustarán si es necesario, pero siempre dentro del marco del plan general.

En la fase de ***Delivery*** se desarrollará la solución de forma iterativa, utilizando el *Product Backlog* definido durante la fase de ***Discovery*** como punto de partida. Este *backlog*, que se mantendrá actualizado y revisado a lo largo de todo el proyecto, servirá para priorizar las funcionalidades a desarrollar en cada sprint.

Al final de cada sprint, se producirá un 'incremento de producto' que cumplirá con las especificaciones establecidas por el *Product Owner* de LDA. Durante cada sprint, nuestro equipo evaluará qué parte de los requisitos funcionales puede implementarse utilizando la funcionalidad estándar de Salesforce y cuáles requerirán desarrollos específicos para cerrar posibles *gaps*. El objetivo es maximizar el uso de funcionalidades estándar de la plataforma para aprovechar futuras actualizaciones de la plataforma, y asegurar que cada propuesta de solución sea validada y alineada con las expectativas de los *Product Owners* mediante demostraciones o prototipos.

Cada *sprint* tendrá un enfoque diferente, dependiendo de las prioridades y el progreso del proyecto, pudiendo centrarse más en análisis, configuración, desarrollo, integraciones, arquitectura, o documentación. Esto permite una planificación meticulosa de las actividades y entregables en cada iteración, asegurando la máxima eficiencia y alineación con los objetivos del proyecto.



Product Backlog: Este *backlog* será un documento vivo durante toda la ejecución del proyecto, enriquecido continuamente por el *Product Owner* con historias de usuario (*User Stories*), priorizaciones y criterios de aceptación para cada requisito funcional. Esta revisión continua se realizará en sesiones de refinamiento y priorización del *backlog*.



Sprint Planning: Al inicio de cada *sprint*, se llevará a cabo una reunión de planificación para acordar el alcance de la iteración, basado en el *Product Backlog* priorizado. En esta sesión, se definirán los criterios de aceptación del *sprint* (*Definition of Done*) y se establecerá el *Sprint Backlog*, que guiará las actividades de todo el equipo durante ese periodo.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Desarrollo del Sprint: Las tareas correspondientes a cada *sprint* pueden ser de desarrollo de producto, integraciones, arquitectura, documentación, preparación de pruebas, migración, ejecución de UATs, despliegues, etc. Son las tareas necesarias para ejecutar el 'incremento del producto' acordado.

Daily: Se realizará una reunión diaria corta (15-30 minutos) donde el equipo de desarrollo compartirá lo que ha logrado, lo que planea hacer y los obstáculos que enfrenta. El objetivo es asegurar la alineación del equipo, permitir identificar rápidamente impedimentos y fomentar una comunicación continua para realizar ajustes ágiles durante el sprint.


Sprint Review: Al final de cada *sprint*, se realizará una revisión en la que se presentará al *Product Owner* y a los *stakeholders* todo el trabajo completado durante la iteración. Esta demostración permitirá validar los incrementos de producto entregados y recibir *feedback* directo.

Sprint Retrospective: Esta sesión se dedicará a evaluar cómo ha sido la colaboración del equipo durante el *sprint*, identificando qué aspectos han funcionado bien, cuáles podrían mejorar y qué nuevas prácticas se pueden implementar. Esta evaluación fomenta una cultura de mejora continua y asegura que todo el equipo esté alineado y comprometido con los objetivos del proyecto.

Ayesa apoyará y guiará al equipo de LDA en la priorización de tareas y la gestión del cambio, utilizando su experiencia en la implementación de Salesforce para proponer mejores prácticas y optimizar el flujo de trabajo. Nuestro enfoque está diseñado para minimizar dependencias entre funcionalidades y asegurar una adopción eficaz por parte de los usuarios finales, garantizando que el proyecto se desarrolle sin contratiempos y cumpla con los objetivos estratégicos definidos.

[6.4] Gestión de Riesgos

El objetivo principal de nuestra **metodología para la Gestión de Riesgos** es identificar los riesgos potenciales en el ámbito del servicio, analizar su probabilidad de ocurrencia y definir las medidas preventivas adecuadas. El siguiente gráfico resume el enfoque de gestión de riesgos definido por Ayesa para esta colaboración:

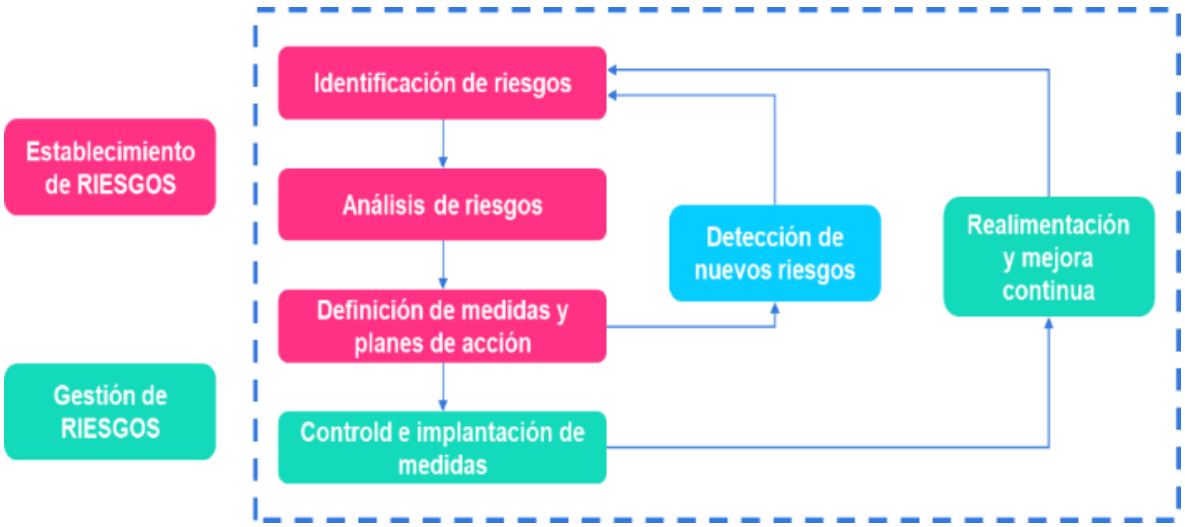

En este sentido trataremos de minimizar la probabilidad de que ocurran y las consecuencias de los riesgos negativos *(amenazas)* y maximizar la probabilidad y las consecuencias de ocurrencia para los riesgos positivos *(oportunidades)* identificados, de forma que se cumplan los objetivos marcados. Esto se consigue siguiendo una serie de directrices:

- **Identificar todos los riesgos conocidos**, tanto en el ámbito del contrato marco como en el del contrato específico.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- Realizar una **evaluación de la probabilidad** de ocurrencia **y del impacto** potencial.
- **Cuantificar el "coste"** (no necesariamente financiero) en caso de que se produzcan.
- **Elaborar planes de acción** para gestionar los riesgos prioritarios.
- **Detectar y gestionar los riesgos** lo antes posible.

Desde las primeras fases de ejecución del contrato se elaborará un **Registro de Riesgos**, que se actualizará continuamente durante el ciclo de vida del servicio y deberá formar parte relevante del contenido de las reuniones periódicas de seguimiento.



- **Identificación del riesgo:** para cada riesgo, se recogerá un conjunto de información como parte del registro y se adjuntará a la Lista de Riesgos.
- **Plan de Mitigación**, en el que se define el conjunto de medidas y acciones para prevenir las consecuencias de cada riesgo. La situación ideal se producirá cuando, como resultado de estas actividades, sea posible minimizar o eliminar completamente el riesgo, reduciendo la incertidumbre asociada al mismo. Una vez establecido y determinado el plan de mitigación, se debe volver a ponderar el riesgo de forma que tengamos la probabilidad de riesgo final con las mitigaciones asociadas.
- **Plan de Contingencia**, que define las actividades a realizar en caso de que el riesgo finalmente se haga realidad. El objetivo es establecer un plan de acción en caso de que el riesgo se convierta en un problema.

[6.4.1] Análisis Cualitativo de Riesgos

Además de identificar un posible riesgo con la información indicada en el apartado anterior para conformar el Registro de Riesgos, será necesario analizar y valorar el riesgo desde un punto de vista cualitativo.

Para disponer de una correcta caracterización del escenario de riesgo, será necesario aplicar un sistema homogéneo a lo largo de todos los riesgos identificados para su evaluación, que deberá tener como elementos de referencia la evaluación del impacto y su probabilidad de ocurrencia.

En este sentido, se considera conveniente utilizar elementos normalizados de valoración de la importancia del riesgo basados en dos variables, **impacto y las consecuencias** derivadas de la materialización del riesgo y la **probabilidad** de que el riesgo se haga realidad.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

ATRIBUTO	VALOR	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
IMPACTO	1-2	Mínimo	Impacto mínimo; cambios en el coste o el calendario < 10% del plan
	3-4	Pequeño	Impacto pequeño; problemas fáciles de resolver durante el desarrollo; interrupciones del coste o del calendario < 15% del plan.
	5-6	Moderado	Daños moderados en los productos realizados; pérdida moderada de funcionalidad; alteraciones en los costes o en la planificación < 40% de lo previsto.
	7-8	Elevado	Alto impacto en los productos realizados; grave pérdida de funcionalidad; perturbación de los costes o de la planificación < 60% del plan.
	9-10	Muy Elevado	Muy alto Daño a productos realizados; pérdida de funcionalidad crítica; interrupciones de costes o planificación > 80% de lo previsto.

ATRIBUTO	VALOR	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD	1-20%	Improbable	Baja probabilidad de que el riesgo se haga real
	21-40%	Baja probabilidad	Alguna probabilidad de que el riesgo se haga real
	41-60%	Probable	Probabilidad media de que el riesgo se haga real
	61-80%	Altamente probable	Alta probabilidad de que el riesgo se haga realidad y dé lugar a un problema.
	81-99%	Inminente	Probabilidad muy alta de que el riesgo se haga real y dé lugar a un problema.

En función de su probabilidad y de su impacto en el desarrollo del proyecto, la importancia de un riesgo puede ser baja, media, alta o inaceptable. Para calcular la importancia de un riesgo se utiliza la siguiente tabla:

IMPORTANCIA DEL RIESGO					
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	MÍNIMO	PEQUEÑO	MODERADO	ELEVADO	MUY ELEVADO
INMINENTE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	INACEPTABLE
ALTAMENTE PROBABLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
PROBABLE	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
BAJA PROBABILIDAD	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO
IMPROBABLE	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO

[6.4.2] Riesgos identificados y contingencias

En base a nuestra experiencia, consideramos fundamental anticipar, gestionar y mitigar los riesgos que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto.

En este sentido, se detalla la siguiente **matriz de riesgos inicial** que abarca desde riesgos técnicos hasta operativos y de la cual partiremos al inicio del proyecto.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Cada riesgo identificado incluye las estrategias de mitigación y los planes de contingencia que nos permitirán reaccionar de manera rápida y efectiva ante cualquier imprevisto. Es importante destacar que se presentan como riesgos preliminares en base a nuestro contexto y experiencia previa, pudiendo aparecer otros durante el desarrollo del proyecto o no existir algunos de los planteados.

Riesgo	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
R001: Alcance telefonía y proveedor tercero Genesys Cloud	• Definición detallada alcance CTI • Workshops técnicos integrales • Validación APIs y modelo autenticación • Plan de proyecto con proveedor	• Despliegue técnico de la funcionalidad asociada para el cumplimiento de los hitos de proyecto
R002: Iniciativas en curso LDA y evolutivos core asegurador	• Mapa dependencias cruzadas • Comité arquitectura transversal • Versionado APIs • Ventanas de congelación funcional • Entorno integración estable	• Activación parcial alcance • Replanificación faseada
R003: Retraso decisión arquitectura y piezas de integración	• Escenario continuista con los métodos de integración existentes entre Galgo y el CORE	• •Arquitectura provisional aprobada • Priorizar funcionalidades no dependientes • Ajuste roadmap por quick wins
R004: Convivencia Galgo y nuevo CRM	• Definir plan de convivencia • Definir sistema maestro por dominio • Reglas operativas claras por rol • Sincronización mínima obligatoria	• Bloqueo progresivo creación en Galgo • Auditoría semanal duplicados
R005: GAP Licenciamiento solución propuesta	• Se llevará a cabo una validación conjunta de los tipos de licencia con LDA y Salesforce, asegurando la alineación entre la solución funcional y las condiciones de licenciamiento. Además, se diseñará una base funcional mínima común sobre la que estimar distintos escenarios en función del tipo de licencia adquirido.	• LDA deberá contemplar un presupuesto de contingencia en caso de que surjan diferencias críticas y, si fuera necesario, se ajustará el alcance funcional para asegurar la viabilidad del proyecto.
R006: Juego de datos para pruebas reales	• Definir estrategia de datos desde Fase 0 • Identificar tipologías críticas (multirramo, impagos, suplementos, siniestros abiertos) • Validación dataset con negocio antes de SIT/UAT	• Ampliación ciclo de pruebas • Refresco extraordinario de datos • Test focalizado post Go-Live
R007: Los responsables de LDA no están disponibles tal y como se había planificado	• Si la disponibilidad de un participante implica un alto riesgo para el proyecto, se deberá contar con personas de backup	• Escalar la situación • Reagendar sesiones dentro del margen previsto

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

R008: Falta de coordinación con los equipos de Infraestructura y Comunicaciones	• Debido al alto número de tareas a coordinar en el inicio del proyecto, se propondrá una sesión de seguimiento semanal con este equipo.	• Escalar la situación. • Ampliar la frecuencia de seguimiento.
R009: Validación de los entregables de proyecto	• Debe existir un procedimiento claro para la validación de los entregables. Para ello, se definirá un repositorio de documentación, con una matriz de entregables asociados identificando plazos y responsables de LINEA DIRECTA para su validación	• En caso de sobrepasar el plazo de aprobación en un periodo pactado, se darán por aprobados para no poner en riesgo el proyecto
R010: Integración con sistemas existente e incompatibilidades entre APIs o protocolos	• Realizar un análisis profundo de los sistemas heredados. • Identificar limitaciones y puntos de fallo potenciales en las APIs de los sistemas a integrar. • Planificar iteraciones tempranas de integración en entornos controlados para detectar incompatibilidades. • Documentar todos los protocolos de comunicación y APIs.	• Mantener integraciones paralelas temporales con sistemas heredados mientras se completa la implementación. • Desarrollar soluciones de rollback rápidas para revertir a una integración anterior si falla. •
R011: Problemas de seguridad y brechas de datos	• Involucrar a expertos en seguridad desde el inicio. • Aplicar las mejores prácticas de seguridad y cifrado de datos. • Implementar controles de acceso estrictos., • Realizar pruebas de vulnerabilidad y auditorías de seguridad frecuentes.	• Implementar revisiones periódicas de seguridad • Diseñar un plan de respuesta ante incidentes que involucre la identificación y cierre inmediato de las brechas. • Realizar simulacros periódicos en entornos no productivos
R012: Falta de alineación entre los equipos de TI y negocio	• Asegurar una comunicación clara y continua entre el equipo técnico y las partes interesadas del negocio. • Validar requerimientos con los usuarios clave desde las primeras etapas.	• Organizar talleres y sesiones adicionales para alinear expectativas. • Reasignar un equipo de consultores o analistas de negocio si se identifican grandes desalineamientos
R013: Retrasos en la entrega de componentes externos (APIs de terceros)	• Coordinar con proveedores externos desde el inicio del proyecto. • Incluir hitos y fechas límite para la entrega de componentes clave en el contrato.	• Identificar alternativas a los servicios externos con retrasos. • Asegurar un plan B para componentes críticos de terceros (APIs, conectores).

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

R014: Adopción y resistencia al cambio	• Se deberá contar con un plan de gestión del cambio que permita conocer en LDA la nueva operativa a través de personas clave	• Modificación de usuarios clave con la incorporación de nuevos interlocutores
R015: GAP entre la estimación y las necesidades de desarrollo	• Estimar cuidadosamente el alcance de la integración y el esfuerzo. • Desarrollar un plan detallado de proyecto. • Asegurar la participación de expertos en las primeras fases del proyecto.	• Revisar el alcance y priorizar entregables claves. • Redistribuir recursos o ajustar el cronograma si es necesario.
R016: Pérdida de datos durante la integración/migración	• Implementar validación de datos en cada punto de integración. • Realizar pruebas exhaustivas de migración de datos en entornos de prueba. • Usar mecanismos de auditoría para verificar la integridad de los datos.	• Desarrollar mecanismos de backup y recuperación de datos. • Tener un plan de recuperación de datos en caso de corrupción o pérdida.

[6.5] Modelo de control y seguimiento

A continuación, se describe el Modelo de Gobierno que se considera más adecuado, con el objeto de crear un entorno de gestión simple y ágil que permita una coordinación fluida entre LDA y Ayesa. Dicha estructura organizativa se configura mediante la creación de los siguientes órganos de relación. **Este modelo de seguimiento aplicará tanto para los servicios de mantenimiento como de soporte**.

- **Comité Dirección (CD):** órgano encargado de la gestión global del contrato.
- **Comité de Seguimiento Servicio (CS):** responsable del control de las etapas del proyecto, el control del servicio a nivel operativo en su etapa de prestación regular y el control de los potenciales proyectos de mejora que se acometan a futuro.
- **Comité Weekly (WK):** comités semanales por equipos de trabajos, con el fin de realizar una gestión ágil de las peticiones de mantenimiento y proyecto asignadas. Estos comités están adaptados a la estructura ágil implantada. Ceremonias Scrum a nivel de equipo ágil, ceremonias a nivel de tribu, o tren ágil, etc.
- **Comité Day to Day:** comités operativos de seguimiento diario.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



[6.5.1] Comité de Dirección del Contrato (CD)

En los niveles de gestión estratégico y táctico se establece el Comité de Dirección. Este órgano será el **responsable de la supervisión global del contrato a nivel estratégico**, decidiendo los aspectos que permitan asegurar los niveles de prestación y eficiencia requeridos por LDA.

Periodicidad	Trimestral y extraordinaria
Composición LDA	**Composición Ayesa**
• Responsable del Contrato • Responsable del Proyecto	• Dirección del Proyecto • Jefatura de Proyecto

Funciones

Dirección, coordinación y seguimiento de la ejecución del Servicio contratado, a nivel estratégico y táctico, y de que se ejecute conforme a los plazos y calidad comprometidos.

Objetivos

- Supervisión global del Servicio y el seguimiento del cumplimiento y grado de avance de los objetivos estratégicos planteados en la reunión anterior o al inicio de Servicio.
- Establecimiento de nuevos objetivos estratégicos para el siguiente periodo, en la búsqueda de eficiencias del Servicio.
- Aprobación y Seguimiento de planes de Acción y evolución en el ámbito del Servicio.
- Resolución de situaciones de especial significación surgidas en el Servicio y no resueltas a nivel operativo.
- Seguimiento de los resultados alcanzados en los ANS acordados, o en el período de análisis para asegurar que se alcanzan los niveles de calidad y eficiencia acordados.
- Seguimiento del modelo económico, con el objetivo de asegurar su adecuación a las necesidades del Servicio.
- Supervisar y aprobar el perfil de las personas designadas por Ayesa a cada puesto de trabajo dentro del Servicio
- Detectar cualquier circunstancia que comprometa los términos contractuales en los que se haya pactado el desarrollo del Servicio, incumplimientos, etc.

[6.5.2] Comité de Seguimiento Servicio (CS)

Este comité tiene por objeto garantizar el **seguimiento Servicio**, proporcionando un adecuado y permanente nivel de comunicación a nivel operativo entre ambas partes.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Periodicidad	Mensual
Composición LDA	**Composición Ayesa**
• Jefatura de Proyecto • Responsable Técnico	• Jefatura de Proyecto • Responsables funcionales y técnicos (si aplica)

Funciones

Responsable a nivel operativo de las actividades del servicio. Su nivel de responsabilidad será la gestión de los servicios que componen la prestación, su seguimiento y control hasta su finalización, cumpliendo los niveles de calidad y compromisos establecidos a nivel de contrato.

.

Objetivos

- Revisión del cumplimiento y grado de avance de los objetivos plateados en anteriores Comités Operativos.
- Establecimiento de nuevos objetivos operativos para buscar eficiencias en el Servicio.
- Resolución de situaciones de especial significación surgidas en la gestión diaria del Servicio y no resueltas.
- Revisión de riesgos y dificultades para la consecución de los hitos.
- Planificación y seguimiento de actividades y los servicios encomendados.
- Realizar el seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos.
- Análisis de los indicadores acordados, su evolución e incumplimientos, proponiendo, si lo creen conveniente, alteraciones de los indicadores.
- Revisar la prioridad de las tareas solicitadas en el ámbito del servicio.
- Revisar los riesgos y dificultades para la entrega de cualquier actividad asignada.
- Proponer acciones de mejora enfocadas a un perfeccionamiento del servicio
- Gestión del equipo de trabajo en general, cambios, formación, etc.
- Facilitar al CD los informes, propuesta e información sobre el estado del servicio para la celebración de los comités correspondientes o ante solicitudes especiales.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de LDA.
- Facilitar al CD cuanta información requiera, e implantar cuantas medidas y cambios determine éste en su contenido.
- Escalar al CD los desacuerdos producidos a nivel operativo, que no hayan podido ser resueltos.
- Detectar cualquier circunstancia que comprometa los términos operativos en los que se haya pactado el desarrollo del Servicio, incumplimientos, etc.

[6.5.3] Weekly (WK)

Este comité tiene por objeto **asegurar el seguimiento técnico y táctico de la solución**, garantizando una coordinación continua entre los equipos de LDA y del adjudicatario, así como un nivel adecuado y permanente de comunicación para la correcta evolución, estabilidad y mejora del servicio.

Periodicidad	Semanal
Composición LDA	**Composición Ayesa**
• Responsables del Proyecto • Responsables técnicos	• Jefatura de Proyecto • Responsables técnicos

Funciones

Órgano de seguimiento técnico encargado de la supervisión de incidencias críticas y tendencias, monitorización de interfaces e integraciones, planificación de versiones, control de seguridad y cumplimiento, así como del análisis de capacidad y consumos de la plataforma

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Objetivos

- Revisión de tickets críticos, análisis de tendencias en errores recurrentes y coordinación con otros equipos técnicos.
- Monitorización estado de las interfaces e integraciones existente para la implementación de mejoras.
- Planificación de nuevas versiones.
- Revisión de auditorías, vulnerabilidades de seguridad, parches y cumplimiento
- Seguimiento consumos, carga / capacidad.

[6.5.4] Diario (Day to Day)

Para facilitar una gestión ágil del servicio, el equipo de Ayesa utilizará un Modelo de Gestión ágil para la realización de las peticiones de servicio recibidas. El marco ágil se adaptará a la estructura ágil implantada en LDA.

Periodicidad	Diario
Composición LDA	**Composición Ayesa**
• Responsables del Proyecto • Responsables funcionales	• Jefatura de Proyecto • Responsables funcionales

Funciones

Facilitar una gestión ágil del servicio

Objetivos

- Realizar el seguimiento diario del servicio:
- Revisión de actividades finalizadas, en curso y próximas
- Elaboración y seguimiento de Tableros Kanban.
- Seguimiento consumos, carga / capacidad
- Detección de Incidencias, problemas e impedimentos

[6.5.5] Seguimiento, Supervisión y Control de la Actividad

En todos los Comités:

- La convocatoria para todas las reuniones partirá inicialmente de los responsables correspondientes de Ayesa, con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de cada reunión.
- De todas las reuniones se levantará acta que deberá recoger los asuntos tratados en la misma y se firmará por todos los asistentes. Ayesa será responsable del levantamiento de actas, de su difusión en las 48 horas siguientes a la finalización de los Comités y de la incorporación de modificaciones o comentarios fruto de su revisión.
- LINEA DIRECTA y Ayesa llevarán un registro donde se archiven todas y cada una de las actas en las que se recojan los asuntos tratados.

En los 8 días laborables previos (con un mínimo de 5 días Laborables previos) a cada Comité de Dirección, Ayesa presentará a LINEA DIRECTA los Informes de Seguimiento (**Informes de Control del Servicio**) que correspondan, que proporcionarán los mecanismos para el seguimiento y control del Servicio y por tanto la capacidad de toma de decisión en cuanto a acciones correctivas y/o preventivas necesarias. El contenido de los informes para cada Comité, que será acordado en la fase de Asunción del Servicio, contendrá principalmente la información necesaria para identificar los hechos relevantes del Servicio, así como para proporcionar el detalle de los Indicadores y métricas del Servicio obtenidos, que permita el análisis de tendencias y adopción de medidas preventivas o promover el cambio servicio demandado.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

La estructura de los Informes de Control del Servicio será acordada por ambas partes al inicio del Servicio, dimensionando los recursos necesarios para su elaboración. En el siguiente apartado se incluye el detalle propuesto por Ayesa para los Informes de Seguimiento correspondientes a cada Comité de seguimiento.

[6.5.6] Seguimiento del feedback

Para garantizar que la calidad del servicio no solo se mida en términos de cumplimiento técnico, sino también en la **percepción y satisfacción del cliente**, proponemos un **modelo de seguimiento proactivo** que se articula en varias iniciativas clave. Nuestro objetivo es que LINEA DIRECTA no solo reciba un servicio acorde a los estándares definidos, sino que también sienta que sus expectativas son superadas en cada interacción. A continuación, detallamos las medidas concretas que implementaremos:

Nuestro modelo incluye la realización de **encuestas de satisfacción trimestrales**, dirigidas tanto a los **responsables operativos de LDA** como a los **usuarios finales del servicio**. Esta segmentación nos permitirá obtener una visión integral de la satisfacción, evaluando desde la gestión operativa hasta la experiencia directa de los usuarios que interactúan con el sistema.

El formato de la encuesta Incluirá tanto preguntas de carácter cualitativo como cuantitativo, con el fin de capturar tanto la percepción general del servicio como áreas específicas de mejora. Se evaluarán aspectos como:

- Rapidez de respuesta a las solicitudes e incidencias.
- Calidad y adecuación de las soluciones aportadas por el equipo.
- Eficiencia y claridad en la comunicación con los diferentes equipos involucrados.
- Satisfacción con la evolución continua del servicio y percepción de su continuidad.
- Percepción de la flexibilidad y capacidad de adaptación del servicio a nuevas necesidades de negocio.

Cada encuesta se analizará en detalle para identificar patrones o áreas recurrentes de satisfacción o insatisfacción. Además, los resultados serán compartidos en los **comités de seguimiento**, garantizando que los responsables de gestión puedan tomar decisiones basadas en información precisa y actualizada.

A partir del análisis exhaustivo de las encuestas, implementaremos **planes de mejora continua** diseñados para abordar de forma proactiva las áreas de mejora identificadas. Este enfoque garantiza que LINEA DIRECTA no solo reciba un servicio alineado con los estándares, sino que también participe en un **proceso de mejora evolutiva**, basado en sus necesidades y expectativas.

[6.6] Planificación temporal

Con el objetivo de cumplir plenamente con los requerimientos establecidos por LDA, hemos diseñado un plan que no solo se ajusta a las necesidades de la RFP, sino que también incorpora un enfoque estratégico que asegura una ejecución eficiente y sin desviaciones significativas.

Este cronograma ha sido cuidadosamente elaborado para reflejar **plazos realistas**, **asegurando la dedicación del equipo de LDA y garantizando que las actividades del negocio experimenten el menor impacto** posible durante la implementación.

El enfoque propuesto tiene los siguientes objetivos y premisas principales:

- **Asegurar que el proyecto de implementación se ejecute dentro del plazo planteado**.
- **Minimizar el impacto en los usuarios y negocios involucrados**, garantizando la continuidad operativa durante el desarrollo.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Tomar medidas preventivas para evitar retrasos significativos**, mediante una distribución efectiva de las dependencias.
- **Permitir el testeo exhaustivo de las funcionalidades implementadas**, priorizando la detección temprana y resolución de posibles problemas, aunque esto conlleve ampliar los tiempos de ejecución de pruebas.
- **Optimizar los recursos tecnológicos y humanos de LDA**, aplicando metodologías ágiles y herramientas de automatización en todo el proyecto.
- **Definir y alinear los objetivos estratégicos y operativos del proyecto**, garantizando que cada hito contribuya de manera clara a las expectativas esperadas.
- **Fomentar la transparencia y la comunicación constante** entre todos los equipos involucrados, asegurando que todos los stakeholders estén alineados y comprometidos.
- **Establecer mecanismos de seguimiento y control continuos**, con indicadores clave (KPIs) que permitan evaluar el progreso y realizar ajustes en tiempo real.
- **Facilitar la adopción de los usuarios proporcionando una capacitación y acompañamiento suficientes**, asegurando una transición progresiva hacia las nuevas herramientas y procesos.

En base a este enfoque hemos diseñado un plan de implantación con una **duración de 22 meses**, siendo los hitos principales los que se describen a continuación.

- Se propone una **fase inicial de *Discovery y Planificación*, con una duración de 2 meses**. Durante esta fase se llevarán a cabo los hitos de análisis, diseño y planificación del proyecto. Como se ha indicado en apartados anteriores, durante esta fase realizaremos un diagnóstico detallado de la situación actual, identificando los puntos críticos y necesidades existentes, así como los requisitos futuros. Con esta información, desarrollaremos el plan de la solución futura y acordaremos una planificación detallada que abarque la implementación y la puesta en marcha.

- Una vez finalizada la fase inicial, arrancaremos la fase de **Implementación y puesta en marcha por hitos, siguiendo todos ellos la siguiente estructura cíclica:**

    - Construcción y desarrollo con una duración
    - Preparación pruebas y formación con una
    - Pruebas integradas y UAT con una
    - Formación a usuarios con una
    - Despliegue y puesta en producción

    - **<u>Existirán las siguientes fases para la puesta en marcha:</u>**

        - **Fase 1:** (Telefonía + Hogar)
        - **Fase 2:** (NBO, Knowledge Base, UP/Cross Selling Hogar/Motor)
        - **Fase 3:** (Coche)
        - **Fase 4:** (Moto)
        - **Fase 5:** (Expats, Suplementos, UP/Cross Selling Otros ramos)
        - **Fase 6:** (Retención, Recibos y Pagos, Recobro)
        - **Fase 7:** Salud
        - **Fase 8:** Empresas
        - **Fase 9:** Fidelización + ATC y Chat

- Una vez finalizada la fase primera puesta en **producción (mes 7,5), se iniciará la fase Asesoramiento experto, soporte funcional y técnico + AM Correctivo.**

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- Finalizada la **fase de Discovery inicial (mes 2)** arrancaremos una línea de trabajo con la idea de ir validando previo al arranque de cada fase las necesidades y priorizades en tiempo real. Utilizaremos esta línea de trabajo para el diseño de la solución, UX/UI y necesidades técnicas. **Esta línea de trabajo será Entendimiento del negocio, procesos y diseño de la solución Fases**

- Cada finalización de fase, actualizaremos la documentación y realizaremos la entrega del servicio y traspaso al equipo de LDA **como se indica en el cronograma Documentación y transferencia de conocimiento a LDA**

Aspectos Clave de nuestra propuesta


- Línea previa de **análisis y entendimiento antes de cada fase**, validando prioridades funcionales, diseño UX y pantallas para asegurar consistencia y claridad antes de construir.
- **Solapamiento de fases** gracias a la incorporación del equipo de Mantenimiento (AM), lo que incrementa capacidad y acelera el avance sin comprometer calidad.
- **Despliegue inicial en Telefonía + Hogar**, priorizado por criticidad operativa y volumen transaccional. Se unifican los despliegues al entender que la propuesta inicial de LDA no tenía carga funcional con la identificación del cliente.
- **Validación técnica como Quick Win en la fase 1**, centrada en la identificación del cliente para asegurar solidez de datos y procesos desde el inicio.
- **Incorporación capacidades de IA, funcionalidades KB y Cross Selling Motor** con el objeto de ofrecer al agente herramientas con las que ser más productivo e incentivar la venta de motor mediante estrategias de cross selling sin dejar huérfano el producto más core de LDA.
- Todos los despliegues **incluyen estabilización HARD + Soporte Hypercare**, asegurando acompañamiento intensivo y control de incidencias en la puesta en producción.

Desde Ayesa, consideramos este como el planteamiento inicial, si bien, durante la fase inicial valoraremos la posibilidad de realizar un despliegue progresivo de funcionalidades para LDA en caso de ser viable.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.


[6.6.1] Cronograma detallado

[6.6.1.1] Arranque y Fase 1

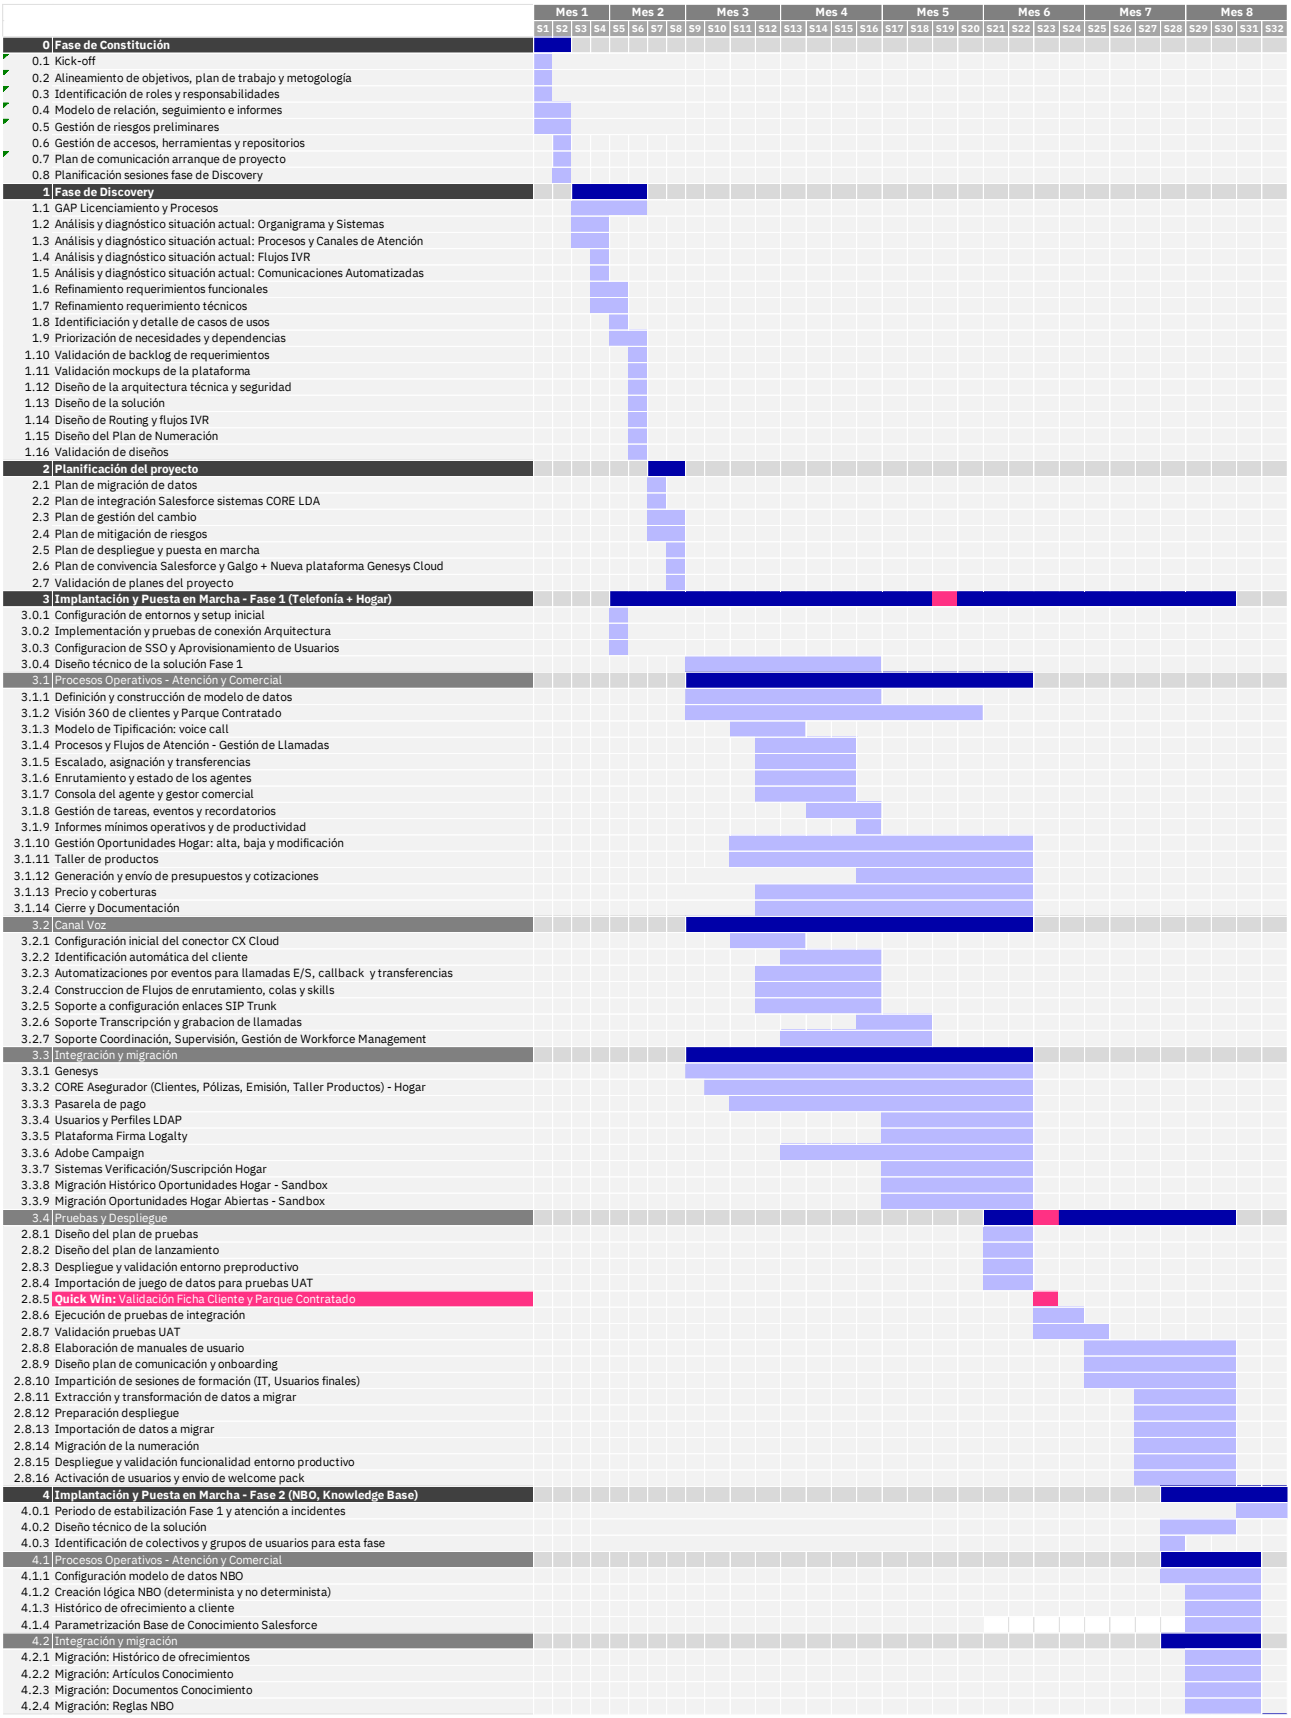


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.6.1.2] Fase 2 - Fase 3

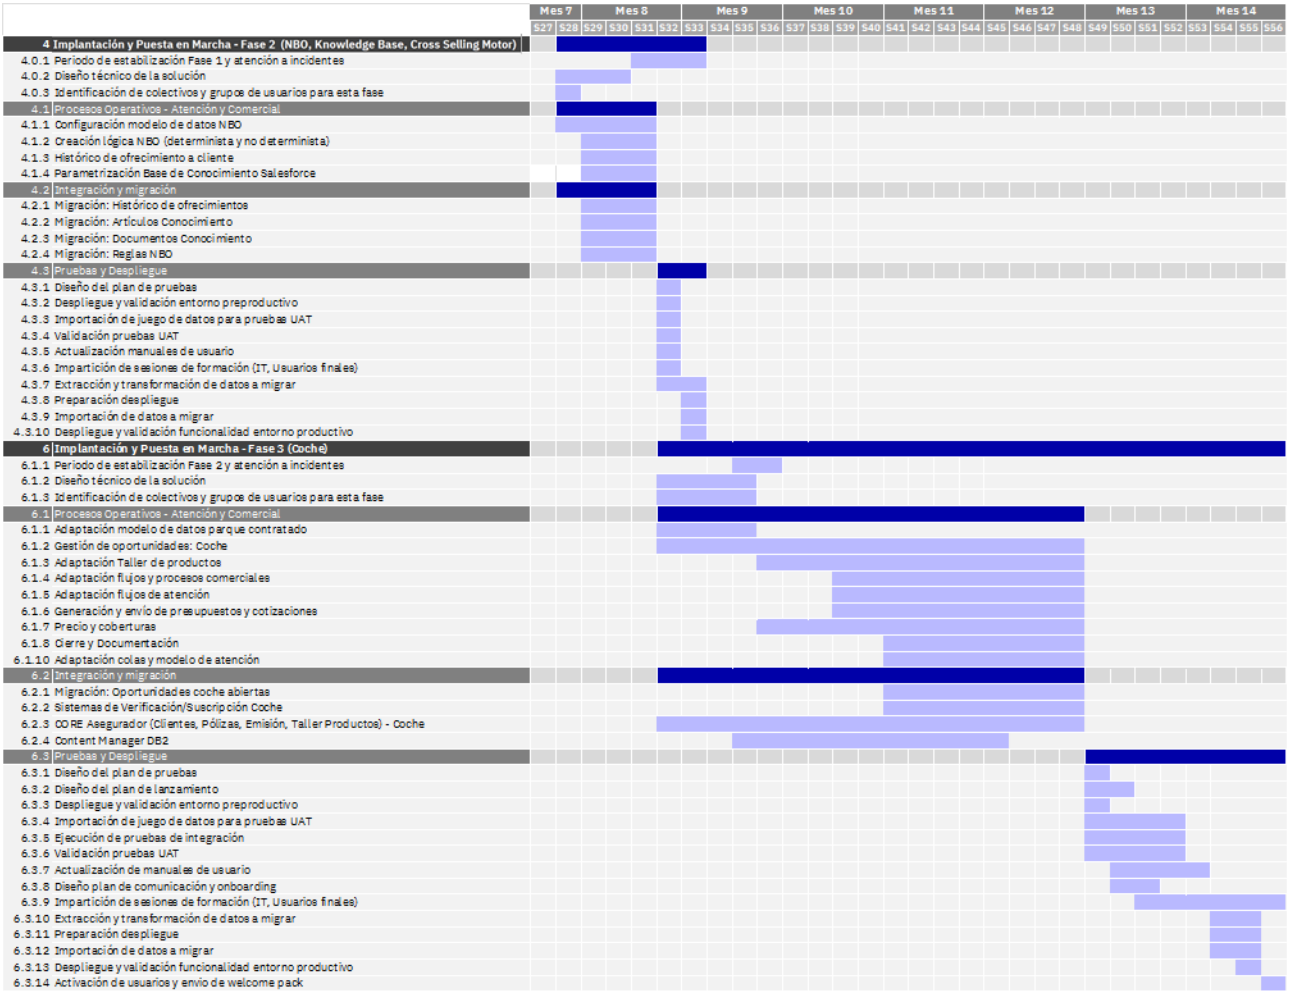


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.6.1.3] Fase 4 – Fase 5

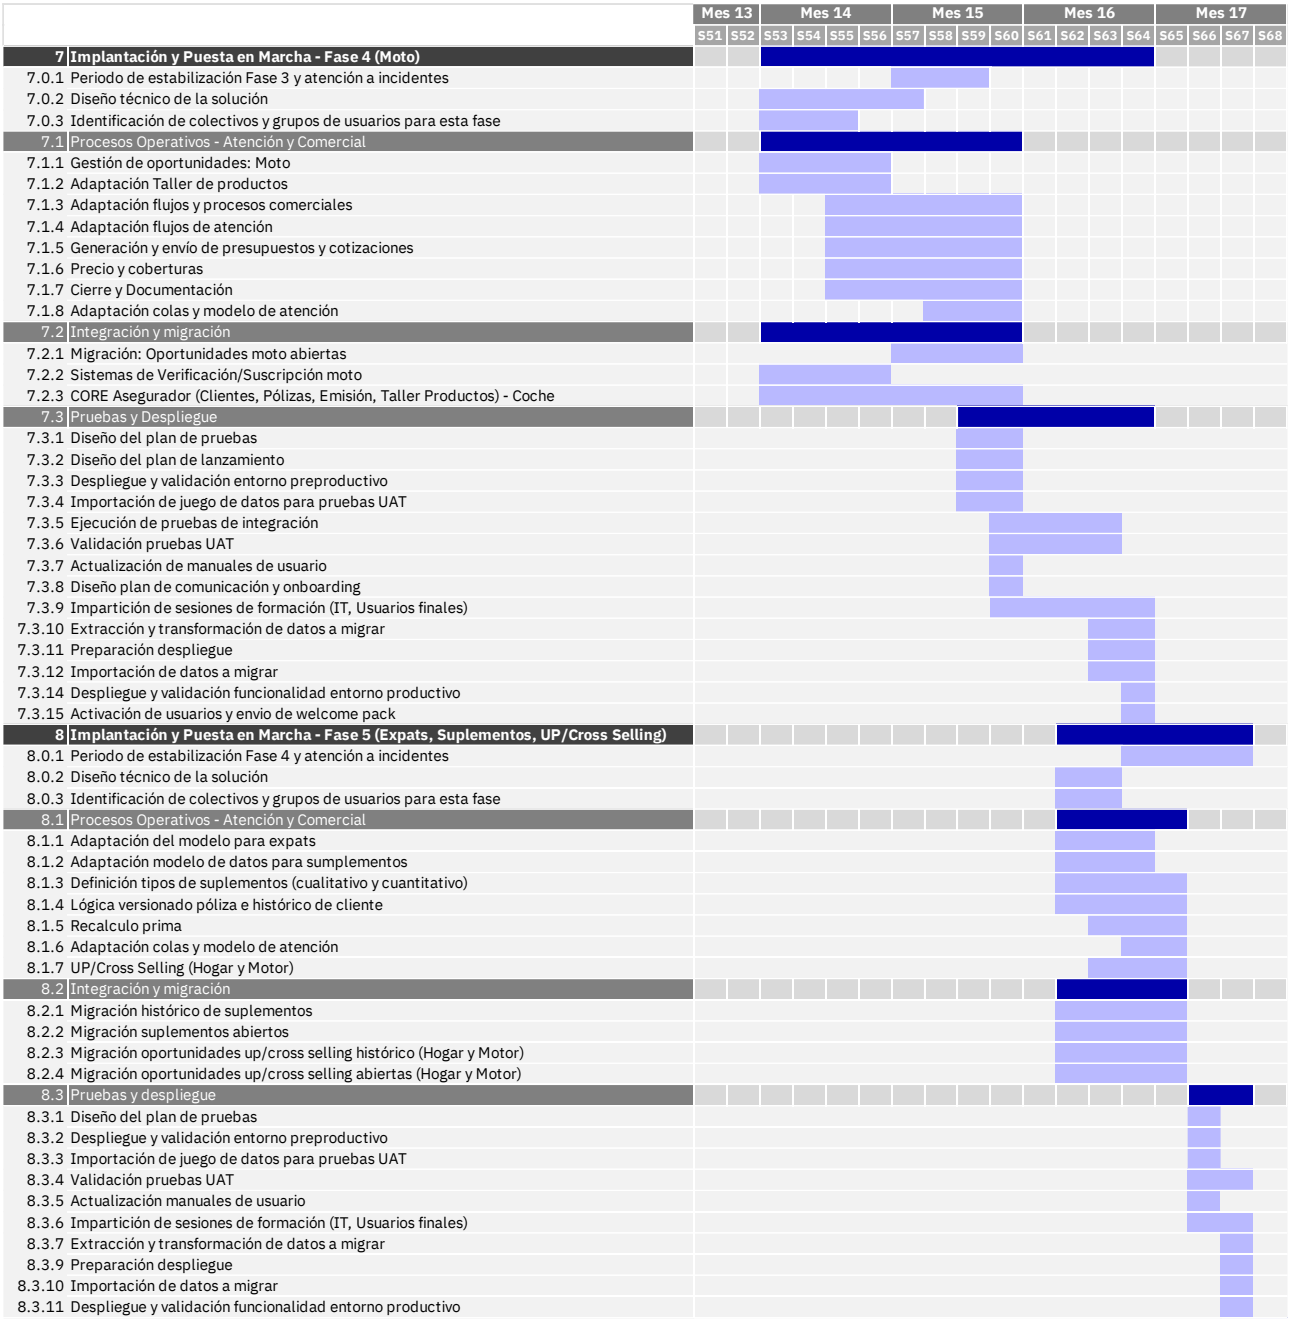


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.6.1.4] Fase 6 – Fase 7

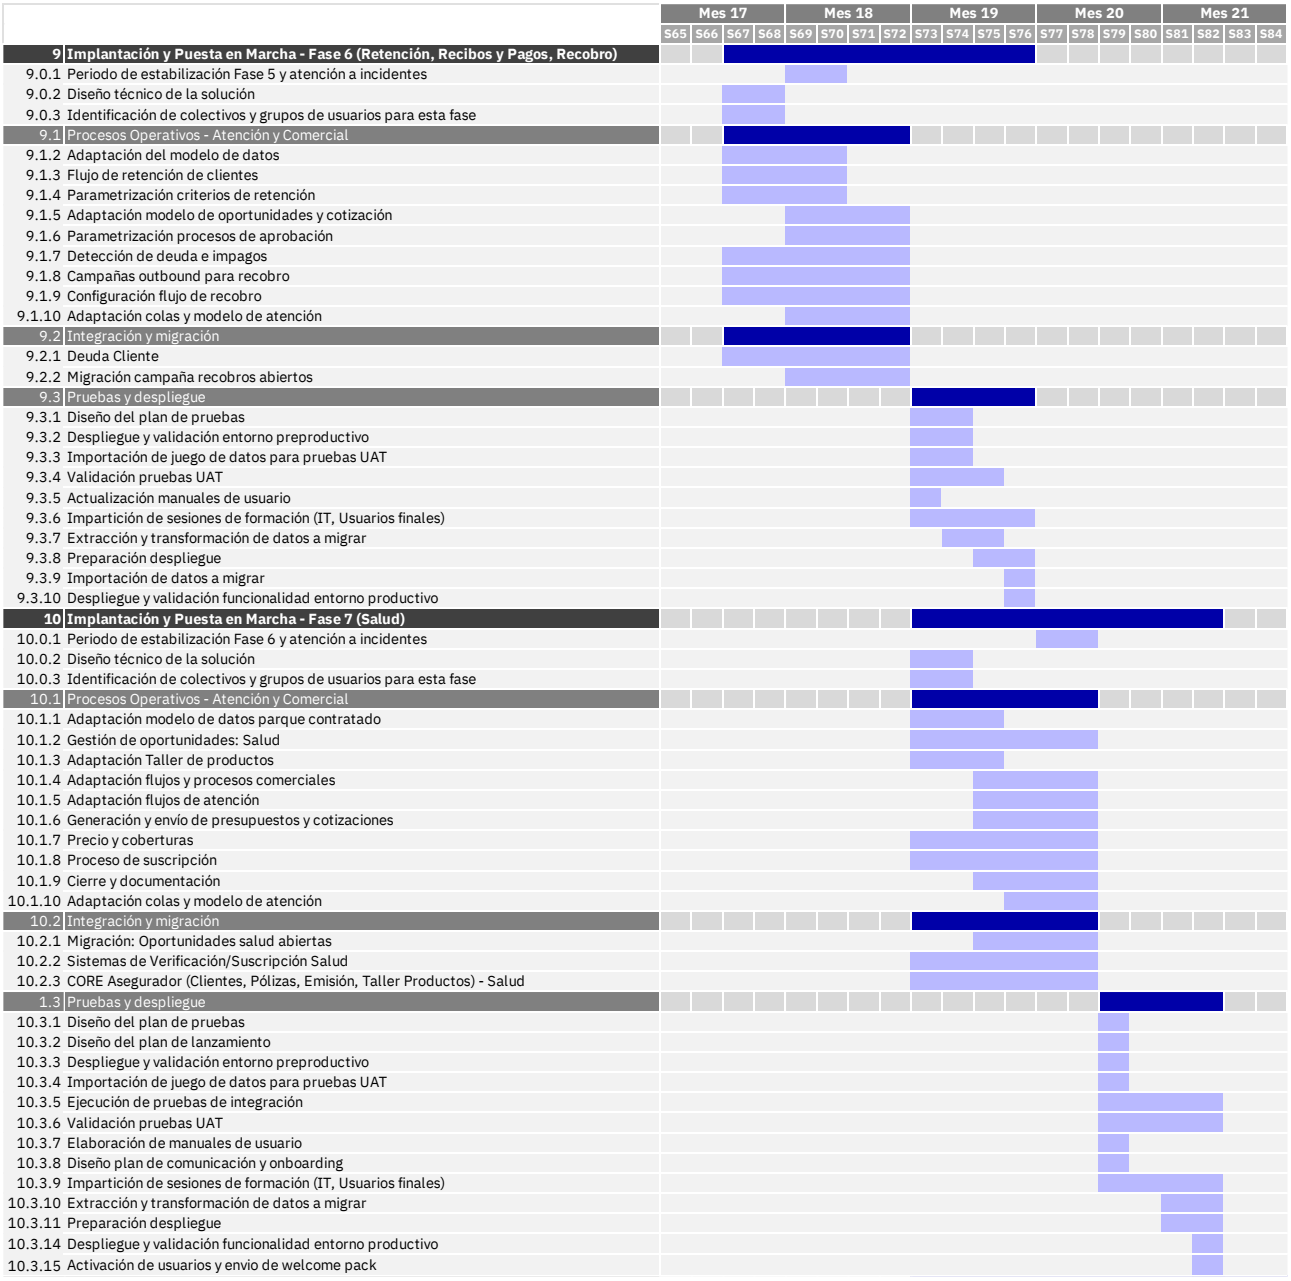


Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.6.1.5] Fase 8 – Fase 9

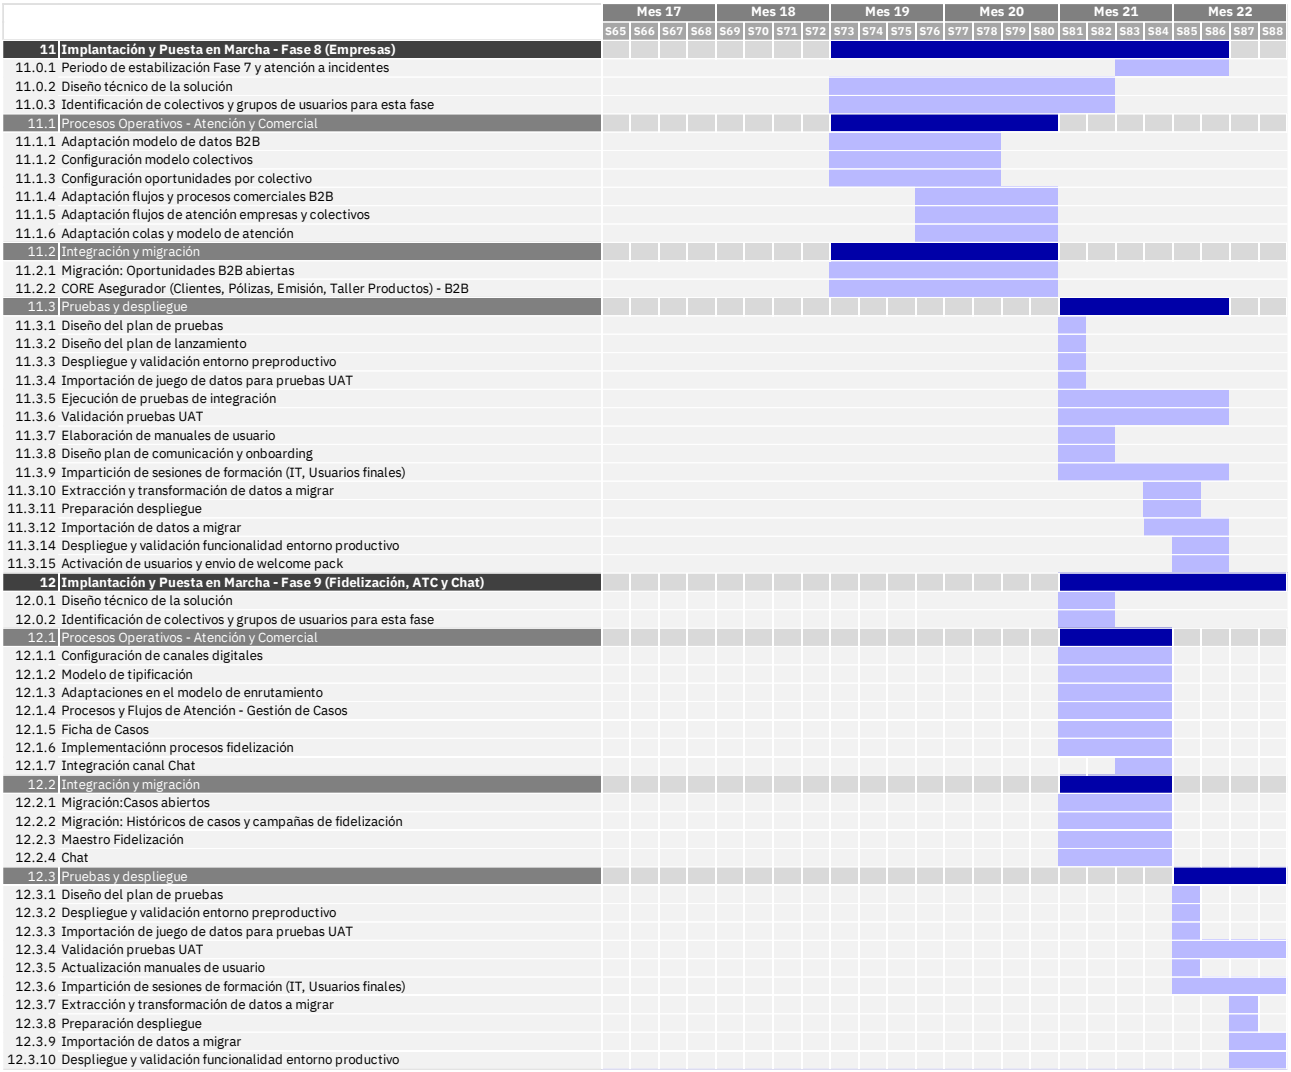

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.6.2] Cronograma global

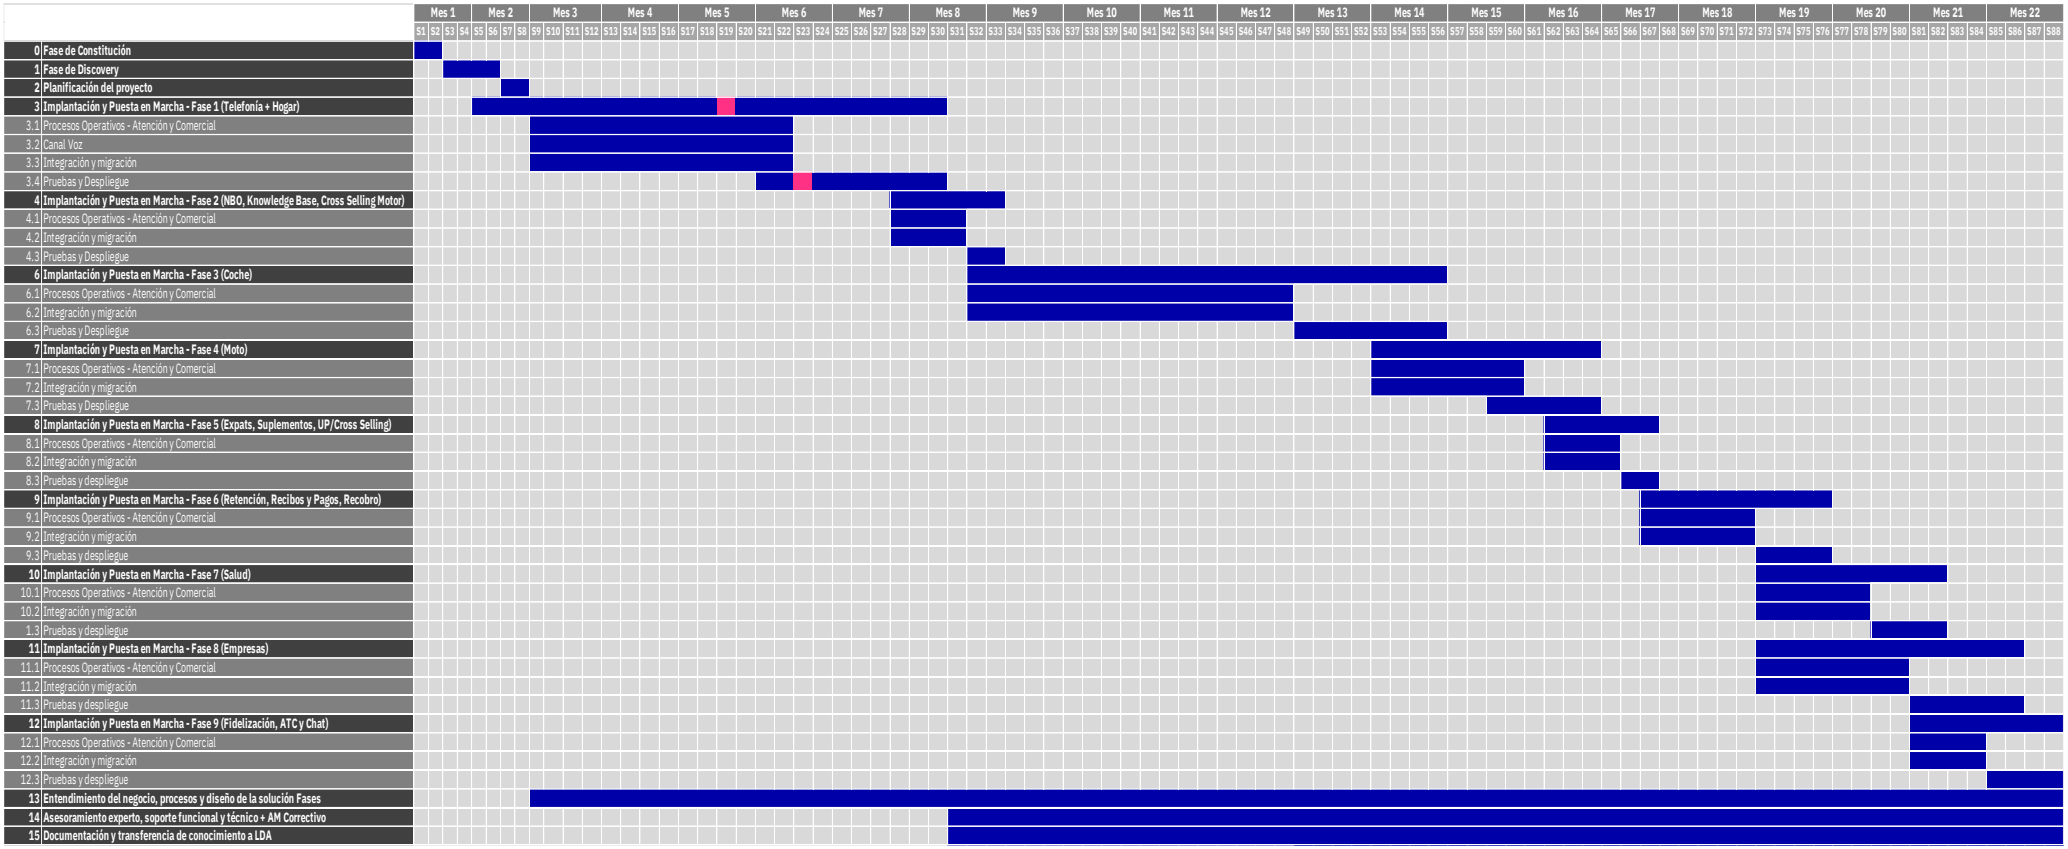

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.7] Claves operativas y estratégicas

Nuestra experiencia en proyectos previos ha identificado áreas clave para el éxito del proyecto. Estas estrategias optimizadas abordan desafíos comunes y garantizan una transición fluida, alineada con los objetivos estratégicos de LDA.

1 COLABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE INTERLOCUTORES CLAVE:

- Asegurar que las validaciones de diseños y documentos sean realizadas por personas con conocimiento detallado de los procesos y sistemas.
- Identificar interlocutores específicos para cada área, incluyendo diseño, integraciones con otros sistemas, traducciones, validación de documentación y migraciones de datos.
- Mantener sesiones iterativas de validación para ajustar los diseños según sea necesario antes de avanzar a la construcción.

2 DIFUSIÓN ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO:

- Garantizar que toda la organización, no solo los usuarios directos, esté al tanto del impacto, beneficios y objetivos del nuevo sistema.
- Establecer un plan de comunicación que incluya actualizaciones periódicas sobre avances, hitos y próximos pasos.
- Facilitar acciones informativas específicas para asegurar que los equipos de soporte y los responsables operativos comprendan los cambios.

3 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN CURSO O PLANIFICADOS:

- Mapear todos los proyectos relacionados desde las primeras etapas del proyecto para evitar interferencias y asegurar la alineación estratégica.
- Coordinar con los responsables de proyectos paralelos para integrar dependencias clave en la planificación inicial.

4 INFORMACIÓN COMPLETA PARA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:

- Proveer, desde el inicio, detalles clave como extensiones telefónicas, planes de numeración, especificaciones técnicas de sistemas a integrar y datos a migrar.
- Validar la consistencia de esta información para minimizar ajustes y rediseños durante la implementación.

5 FORMACIÓN GRADUAL Y ESCALONADA:

- Implementar un plan de formación progresivo que inicie con conceptos básicos y, a medida que los usuarios adquieran confianza, avance hacia funcionalidades más complejas.
- Proporcionar acceso a entornos de pruebas para que los usuarios puedan practicar sin riesgos antes de operar en producción.
- Diseñar sesiones de refuerzo y píldoras formativas para resolver dudas y mejorar la comprensión.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

6 GESTIÓN ÁGIL DE TRADUCCIONES:

- Establecer un equipo o recursos dedicados a las traducciones que puedan incorporar cambios de forma iterativa y eficiente.

7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y ACOMPAÑAMIENTO:

- Designar un líder interno para gestionar el cambio dentro de la organización, promoviendo la aceptación del sistema.
- Implementar un canal ágil de soporte durante las primeras semanas de cada fase para resolver dudas de los usuarios de manera eficiente.

Antes de cada despliegue, es esencial completar una serie de tareas previas tanto por parte de AYESA como LDA para garantizar que todos los aspectos técnicos, funcionales y organizativos estén alineados. Estas tareas incluyen:

Preparación Telefónica

Validar DDIs y Extensiones

- Asegurar que los DDIs y extensiones asignados a los nuevos usuarios estén activos y configurados según sus necesidades específicas.
- Confirmar los DDIs de desbordes asignados al grupo para manejar saturaciones de llamadas.

Configuración del IVR

- Validar que las rutas del IVR asignadas a los nuevos equipos o centros reflejen los flujos definidos previamente.

Horarios Operativos:

- Revisar y configurar los horarios de atención telefónica en el sistema.
- Asegurar que las reglas de fuera de horario (desvíos, mensajes pregrabados) estén correctamente implementadas.

Redirección de Llamadas:

- Confirmar la configuración de las redirecciones a otros agentes, equipos o servicios en caso de inactividad o fuera de horario.

Preparación de Usuarios y Equipos

Configuración de Usuarios

- Identificar y cargar en el sistema los usuarios del nuevo despliegue.
- Verificar que la información de los usuarios esté completa y correcta para evitar problemas de acceso o asignaciones incorrectas durante el despliegue.

Acceso a la herramienta

- Verificar que todos los usuarios nuevos tengan credenciales activas y acceso al entorno de producción.
- Validar que no existe ningún tipo de bloqueo en los equipos de trabajo que no permitan la apertura de las aplicaciones Web.

Comunicación Interna

- Informar a todos los usuarios relevantes sobre el cronograma de despliegue

Configurar Paneles de Supervisión

- Diseñar paneles claros y accesibles que permitan monitorear el desempeño desde el inicio del despliegue.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.


[6.8] Release Management

En base a las especificaciones de LDA, se detalla en el presente apartado las consideraciones y aspectos más relevantes que consideramos desde Ayesa para su consideración e implementación en caso de así ser aprobado.

La experiencia adquirida por parte del equipo de Ayesa en sistema de Salesforce complejos evidencia la necesidad de trabajar con un equipo específico de Release Mangement, que permita coordinar de manera global los despliegues de funcionalidades por cada uno de los negocios, minimizando el impacto y riesgo en dependencias con otras líneas.

[6.8.1] Mapa de entornos

Se detalla en el siguiente diagrama el modelo de entornos que proponemos para la gestión del servicio.

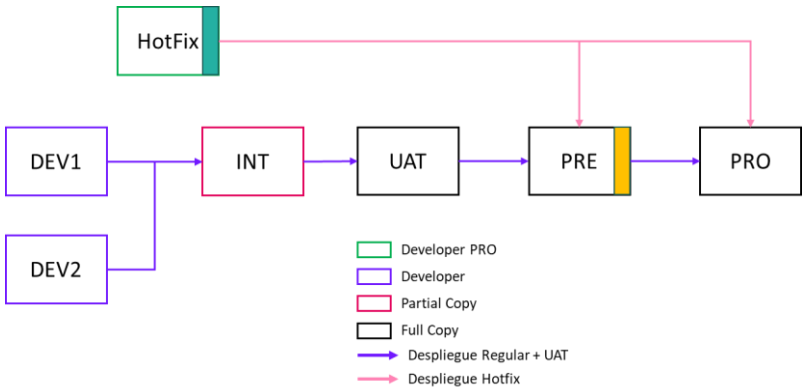

Como se muestra en el gráfico y en base a nuestra experiencia en proyectos de esta naturaleza, proponemos más allá de las ramas regulares de gestión lo siguiente:

- **Incorporación de rama de PRE** como paso previo a producción. Permite extender el periodo de regresión y la validación contra un entorno el cual permite reproducir la subida a producción, siendo su foto actualizada en PRO+Subida SPRINT.
- **Transfer vía INT:** Cualquier despliegue sobre UAT implica un paso previo por el entorno de integración. Esto permite asegurar una correcta validación en entornos previos para asegurar la subida y la calidad del software. Adicionalmente, estabiliza el entorno de UAT, evitando riesgo en las pruebas con negocio.
- **Hotfix:** Existencia de una rama específica para atender las incidencias críticas, sin contaminación con los desarrollos en curso. Posibilidad de validar los cambios en entorno previo a producción.

En este sentido, desde Ayesa nos acomplaremos a las herramientas de despliegue actualmente empleadas porLDA, si se proponen los siguientes puntos:

- Contar con un **entorno de desarrollo** refrescado tras cada instalación permitiendo reducir las tareas manuales a la hora de validar nuevos desarrollos.
- Asegurar el **uso de INT** que permita validar las subidas a UAT.
- **Mejora en la alineación con el resto de los sistemas** al establecerse un calendario de refrescos para toda la organización.
- Contar con **un entorno previo a producción** de PRE permitirá realizar unas pruebas de regresión efectivas garantizando la calidad del software a desplegar a producción. Las pruebas de regresión serán llevadas a cabo tanto durante el curso de los sprint normales como a la hora de desplegar correctivos a incidencias críticas.
- Contar con la existencia de un **entorno dedicado HOTFIX para acometer los cambios críticos provocados por incidencias más graves** sin interferencia con desarrollos en

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

curso, así como cambios que por su urgencia no pueda esperar hasta el siguiente sprint. Se dispondrá de un refrescado con una periodicidad acordada. Este enfoque permitirá la validación previa en el entorno de preproducción disminuyendo el riesgo de introducir nuevas incidencias en producción.


[6.9] Equipo de proyecto

El equipo de proyecto estará formado por los siguientes perfiles encargados de la gestión, implementación y puesta en marcha del proyecto:

[6.9.1] Equipo Ayesa

[6.9.1.1] Organigrama

En el siguiente esquema se muestran los perfiles que proponemos para conformar el equipo de proyecto:

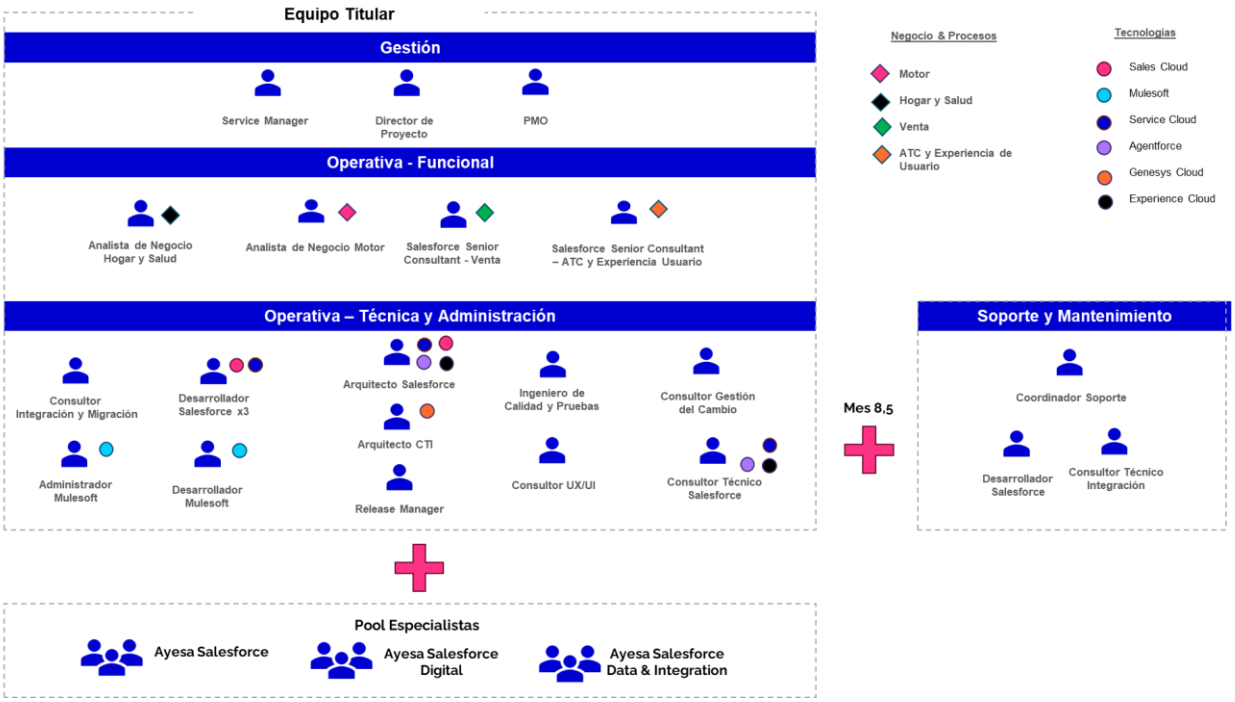

En la siguiente tabla se describen las funciones y responsabilidades de estos perfiles.

Perfil	Responsabilidades
Director de Proyecto	• Supervisión general del cumplimiento de plazos, presupuesto y alcance del proyecto. • Gestión de la relación ejecutiva con stakeholders y resolución de escalaciones críticas. • Coordinación global entre los streams funcional, técnico, integraciones y calidad.
PMO	• Seguimiento de planificación, hitos y entregables del proyecto asegurando alineación con los objetivos del programa.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Perfil	Responsabilidades
	• Coordinación del reporting de avance, riesgos y dependencias entre los distintos equipos y líneas de trabajo. • Soporte en la gestión documental, control de alcance y gobierno del proyecto.
Service Manager	• Monitorización de los niveles de servicio (SLAs) durante estabilización y soporte post-implantación. • Gestión priorizada de incidencias, peticiones de cambio y mejoras evolutivas. • Elaboración de informes de seguimiento del servicio y propuestas de mejora continua.
Release Manager	• Planificación y coordinación de las entregas a los distintos entornos hasta producción • Definición de los procesos de versionado, empaquetado y despliegue de Salesforce • Medición de adopción post-implantación y propuesta de acciones correctivas
Arquitecto Salesforce	• Diseño de la arquitectura global: modelo de datos, integraciones y límites de plataforma. • Definición de patrones de desarrollo, estándares de codificación y mejores prácticas. • Validación de decisiones técnicas y resolución de limitaciones de la plataforma Salesforce.
Analista de Negocio Sector Motor	• Relevamiento de procesos del ramo motor (cotización, emisión, siniestros y renovaciones) y definición de historias de usuario. • Enlace entre las áreas de negocio de la aseguradora y el equipo de implementación. • Validación funcional de entregables y apoyo en UAT asegurando alineación con procesos y normativa del sector.
Analista de Negocio Sector Hogar y Salud	• Relevamiento de procesos de seguros de hogar y salud y traducción en historias de usuario. • Coordinación entre áreas de negocio (producto, operaciones, asistencia) y el equipo de implementación. • Validación funcional de entregables y soporte en pruebas de aceptación garantizando cumplimiento de procesos y normativa.
Salesforce Senior Consultant - Venta	• Configuración de procesos de venta: oportunidades, cotizaciones, productos y precios. • Diseño de flujos de cotización multi-ramo incluyendo coberturas, descuentos y versionado. • Asesoramiento en funcionalidades avanzadas (CPQ) para optimizar la conversión.
Salesforce Senior Consultant - ATC y Experiencia Usuario	• Configuración de Service Cloud y canales de atención omnicanal al asegurado. • Diseño de flujos de atención, enrutamiento inteligente y scripts de agente.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Perfil	Responsabilidades
	• Definición de la experiencia de autoservicio del asegurado en portales digitales.
Consultor Técnico Salesforce	• Configuración de Service Cloud y canales de atención omnicanal al asegurado. • Diseño de flujos de atención, enrutamiento inteligente y scripts de agente. • Definición de la experiencia de autoservicio del asegurado en portales digitales.
Consultor UX/UI	• Diseño de experiencia de usuario para las pantallas clave del proceso de cotización. • Creación de prototipos interactivos y guías de estilo validados con usuarios finales. • Supervisión de que la implementación respete fielmente los diseños aprobados.
Arquitecto CTI	• Diseño de la integración telefónica (CTI) entre la centralita y Service Cloud. • Especificación de flujos de screen pop, click-to-call y registro automático de actividades. • Garantía de calidad del servicio CTI y coordinación de pruebas con telefonía.
Desarrollador Salesforce x3	• Desarrollo de componentes LWC, lógica Apex y flujos de cotización. • Construcción de integraciones, generación de documentos PDF y pasarela de pago. • Automatización de procesos post-venta, revisiones de código y cobertura de tests.
Ingeniero de calidad y pruebas	• Definición de la estrategia de testing y diseño de casos de prueba por sprint. • Ejecución de pruebas manuales y automatizadas sobre flujos críticos de negocio. • Coordinación de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con la aseguradora.
Consultor Gestión del Cambio	• Elaboración del plan de gestión del cambio, comunicación y sensibilización por colectivo. • Diseño y ejecución del programa de formación adaptado a cada perfil de usuario. • Medición de adopción post-implantación y propuesta de acciones correctivas.
Consultor Integración y Migración	• Diseño de la estrategia de integración entre Salesforce y sistemas legacy de la aseguradora. • Planificación y ejecución de la migración de datos históricos hacia Salesforce. • Coordinación de pruebas de integración end-to-end verificando integridad de datos.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Perfil	Responsabilidades
Administrador Mulesoft	• Administración de la plataforma Anypoint: entornos, despliegues y monitorización de APIs. • Configuración de políticas de seguridad, alertas operativas y dashboards de seguimiento. • Gestión del ciclo de vida de APIs: versionado, documentación y control de accesos.
Desarrolladror Mulesoft	• Desarrollo de APIs y flujos de integración conectando Salesforce con sistemas core. • Implementación de patrones API-led connectivity asegurando reutilización y desacoplamiento. • Desarrollo de mecanismos de resiliencia y pruebas de carga sobre integraciones críticas.

[6.9.2] Equipo LDA

[6.9.2.1] Gobierno y jefatura

Perfil	Responsabilidades
Program Manager	- Gobierno de alcance, plazo y presupuesto; control de cambios y priorización ejecutiva. - Gestión de riesgos, dependencias y escalados (CTI, IAM/SSO, core, DWH, redes). - Planificación de releases y cutover; reporting y decisiones en Steering Committee.

[6.9.2.2] Responsables funcionales

Perfil	Responsabilidades
Owner Operación Contact Center	- Definición del modelo operativo de atención: colas, SLAs, tipificación, escalados y supervisión. - Definición de requerimientos CTI: routing, screen-pop, grabación, horarios y skills. - Liderazgo de UAT operativa con casuística real y criterios de aceptación del front.
Owner Ventas	• Definición del proceso comercial end-to-end (lead→ oportunidad → cierre) y handoffs con servicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Perfil	Responsabilidades
	• Definición de reglas de asignación, pipeline, actividades y reporting comercial. • Validación UAT de Sales: consistencia de datos, trazabilidad y métricas de gestión.
Owner Producto (Motor + Hogar/Salud)	• Definición de reglas por ramo: datos obligatorios, validaciones, excepciones y políticas operativas. • Alineamiento del modelo FSC/Core con “source of truth” y consistencia multirramo. • Validación UAT de escenarios de producto y documentación/comunicaciones asociadas.
Change Lead	• Gestión del cambio por colectivos: impactos, comunicación operativa y plan de adopción. • Diseño y ejecución de formación por rol; red de champions/superusers y materiales. • Control de readiness y coordinación de hypercare post go-live con operación/IT.

[6.9.2.3] Responsables técnicos

Perfil	Responsabilidades
Solution Owner (CoE)	- Definición de estándares (guardrails) y gobierno del org: seguridad, datos y patrones de configuración/desarrollo. - Gobierno del backlog e intake de demanda; calidad técnica y control de deuda técnica. - Gobierno de entornos y releases; modelo de soporte y operación (Run) de la plataforma.
Integration Owner	• Definición de arquitectura de integración: contratos, sync/async, errores, reintentos y trazabilidad. • Gobierno de APIs (versionado, políticas, accesos) y SLAs técnicos de integraciones críticas. • Coordinación técnica de migración y reconciliación de datos end-to-end.
Sistemas Owner	• Preparación de pre-requisitos corporativos: IAM/SSO, red, certificados, conectividad con core y CTI. • Operación técnica: monitorización, logging, alertas, capacidad y continuidad del servicio. • Integración con ITSM: soporte L1/L2, gestión de incidencias/cambios y accesos operativos.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Perfil	Responsabilidades
QA / UAT Lead	• Definición de estrategia de pruebas (SIT/E2E/UAT/regresión) y criterios de entrada/salida. • Gestión de defectos, evidencias de aceptación y control de regresión por release. • Coordinación de NFR (rendimiento/concurrencia/estabilidad) y go/no-go de calidad.

[6.10] Mantenimiento y operación

Dicho servicio dará comienzo tras la primera puesta en PROD de funcionalidad y el go live de usuarios establecido en el mes 8

En el ámbito de este servicio, desde Ayesa se dará respuesta a las necesidades especificadas en el contrato por LDA. Proponemos establecer una metodología de gestión clara y definida que permita aprovechar sinergias con el equipo de mantenimiento y optimizar de esta forma la prestación del servicio.

De esta forma, se recoge en el presente apartado el alcance de las tareas asociadas a dicho servicio.

SOPORTE EXPERTO	CONSULTAS	PETICIONES	INCIDENCIAS
Prestación de todas las tareas de asesoramiento, configuración, administración y vigilancia de la infraestructura desplegada en la nube.	Gestión de consultas funcionales o técnicas solicitadas por LDA o interlocutores interesados.	Gestión de peticiones de servicio asociadas a la plataforma implementada, monitorización y seguimiento continuo.	Soporte especializado para la gestión de las incidencias generadas por LDA y su escalado para resolución en caso de así ser necesario.

[6.10.1] Soporte funcional y técnico

Proponemos una metodología que combina la estandarización de procesos con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diferentes necesidades (consultas, peticiones e incidencias).

- **Recepción y registro:** Todas las consultas, incidencias o solicitudes levantadas por LDA son recibidas y registradas en la herramienta de gestión oportuna.
- **Diagnóstico inicial:** El equipo de soporte realiza un análisis preliminar para comprender la necesidad específica y determinar el avance en el escalado o resolución.
- **Clasificación y resolución nivel 1:** El equipo asignado a este nivel tendrá el conocimiento suficiente para la atención de solicitudes de esta naturaleza. De esta forma, en caso de poder atenderla la resolverá reduciendo la carga de trabajo de los niveles posteriores como el mantenimiento correctivo. Adicionalmente, en caso de detecta que



Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

el ticket no corresponde al ámbito de este contrato, tendrá capacidad de interlocución con el usuario peticionario para su confirmación y escalado a proveedores terceros.

- **Clasificación y escalado:** En caso de que el diagnóstico inicial determine que el problema excede las capacidades de este equipo se realizará el escalado al equipo de mantenimiento correctivo.
- **Cierre y documentación:** De cara a conformar un catálogo de servicios y una base de conocimiento enriquecida, será en esta etapa donde se realice el cierre del ticket y la documentación rigurosa de las acciones llevadas a cabo para su resolución.
- **Seguimiento y mejora continua:** Se realiza un análisis periódico de los tickets gestionados para identificar:
    - **Tendencias recurrentes:** Problemas comunes que pueden abordarse de forma preventiva.
    - **Oportunidades de mejora:** Ajustes en los procesos, configuración de la plataforma o formación de usuarios.
    - **Cumplimiento de SLAs:** Evaluación del tiempo de respuesta y resolución frente a los acuerdos de nivel de servicio.

En base a nuestra experiencia en servicios de esta naturaleza, se consiguen entre otros los siguientes **beneficios** en la aplicación de este enfoque metodológico:


- **Optimización de la carga:** El Nivel 1 actúa como un filtro inicial, revisando y clasificando las peticiones, consultas e incidencias, lo que evita la saturación de los niveles superiores.
- **Resolución ágil de casos comunes:** Al gestionar solicitudes dentro de su ámbito de acción, el equipo de primer nivel resuelve rápidamente problemas comunes y consultas frecuentes, reduciendo tiempos de espera y aumentando la satisfacción de los usuarios finales.
- **Escalado estructurado:** Cuando una incidencia supera las capacidades del primer nivel, se escala de manera controlada al Nivel 2 o Nivel 3 con la información relevante bien documentada. Esto asegura que los niveles superiores puedan trabajar de forma eficiente sin duplicar esfuerzos.
- **Trazabilidad y mejora continua:** La documentación detallada de las solicitudes y sus resoluciones no solo asegura trazabilidad, sino que también alimenta un proceso de mejora continua
- **Adaptabilidad:** Gracias a su conocimiento directo del día a día de los usuarios finales, el primer nivel puede adaptarse rápidamente a los cambios en las necesidades de LDA y proporcionar una experiencia de soporte personalizada.

[6.10.1.1] Flujo de actuación

De manera adicional, detallamos en el siguiente flujo de atención el proceso de resolución tipo:

Es importante destacar que se muestra como una propuesta de manera ilustrativa, la cual será validada y refinada en fases previas una vez iniciado el servicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

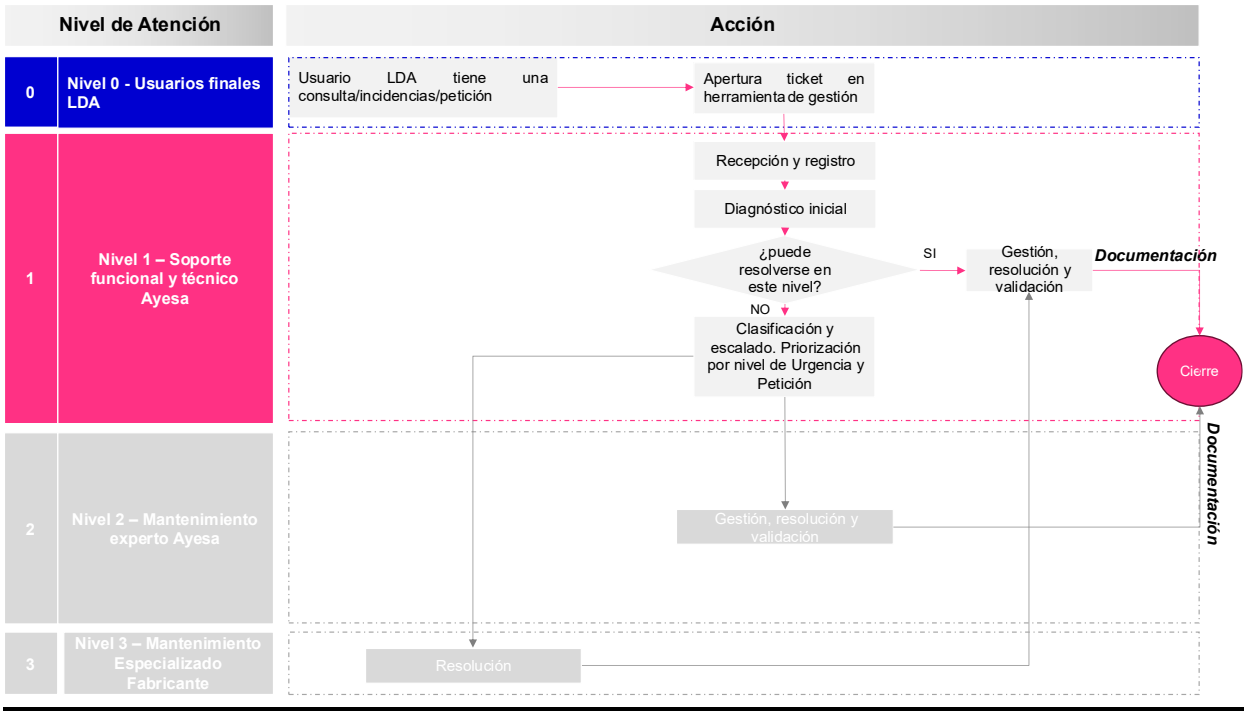

El flujo de atención para este servicio comienza con el **nivel 0**, donde los usuarios finales registran peticiones/consultas/incidencias en el sistema interno, describiendo el asunto con ejemplos concretos. El **nivel 1** revisa la solicitud realizando un primer diagnóstico sobre el que evaluar la capacidad de atender el ticket. De esta forma, en caso de poder dar respuesta y estar relacionado al ámbito del soporte o atención en este primer nivel, se avanzará en la gestión y en su defecto se escalará a **nivel 2** o **nivel 3**.

Si no se resuelve, se escala al **nivel 2**, donde el equipo de mantenimiento realiza un análisis detallado, identifica la causa raíz y diseña una solución en un entorno seguro (HOTFIX). Tras probar la solución, esta se presenta LDA para su validación. Una vez aprobada, se implementa en producción en una ventana de mantenimiento acordada, asegurando la continuidad del negocio.

Si se detecta un problema relacionado con la plataforma y el fabricante, se escala al **nivel 3** (soporte especializado del fabricante). Finalmente, se documenta la incidencia, el proceso de resolución y las acciones preventivas, asegurando trazabilidad y mejoras continuas.

De manera trasversal a todo el flujo de actuación y las diferentes peticiones gestionadas, el equipo de soporte prestará monitorización y seguimiento continuo del estado del servicio transmitiendo a LDA los resultados y aspectos más relevantes de manera transparente.

[6.10.2] Mantenimiento correctivo

Proponemos gestionar el mantenimiento correctivo basado en el marco de buenas prácticas de ITIL, específicamente en los procesos de **Gestión de Incidencias** y **Gestión de Problemas**.

De manera esquemática se presenta la metodología en el siguiente gráfico:



Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Recepción, registro e identificación de la causa raíz:** Con independencia del canal utilizado para la comunicación de la incidencia o problema, se procederá al registro de todos los tickets en Salesforce, garantizando su correcta trazabilidad, seguimiento y control. En esta fase se realizará el análisis funcional y técnico necesario para identificar la causa raíz de la incidencia y avanzar en su resolución o, en su defecto, proceder a su escalado conforme a los procedimientos establecidos.
- **Clasificación y priorización:** Con el fin de asegurar una gestión eficiente y orientada a resultados, se llevará a cabo una clasificación y priorización exhaustiva de todas las incidencias registradas, atendiendo a su criticidad, impacto en el negocio y recurrencia.
  En este sentido, Ayesa se acoplará sin limitaciones a los ANS definidos en el ámbito de este contrato, así como a los tiempos máximos de respuesta TR en función de la criticidad.
- **Validación y resolución:** Previo a cualquier actuación sobre los entornos de LDA, se presentarán las soluciones propuestas para su validación y aprobación, asegurando un modelo de gestión basado en la transparencia y el control. La resolución de la incidencia se realizará mediante la implantación de una solución parcial o definitiva, incluyendo las actuaciones necesarias para la recuperación de estados estables de la plataforma. En el caso de soluciones parciales, se abrirá el correspondiente "Milestone Correctivo" para el análisis exhaustivo de la causa raíz y la implantación de la solución definitiva. Asimismo, se realizarán las pruebas oportunas y la entrega de la solución para su paso a producción y, cuando resulte necesario.
- **Cierre y tipificación final:** Una vez verificada la correcta resolución de la incidencia, se procederá a su cierre formal y a la notificación correspondiente. Asimismo, se tipificará la causa de la incidencia y se asignará a su causa raíz correspondiente.

En base a nuestra experiencia en servicios de esta naturaleza, se consiguen entre otros los siguientes **beneficios** en la aplicación de este enfoque metodológico.


- **Rápida resolución de incidentes:** Priorización efectiva y tiempos de respuesta claros con los que asegurar y mejorar los SLA.
- **Prevención de problemas recurrentes:** Reducción de incidencias repetitivas mediante un análisis profundo de causas raíz.
- **Satisfacción de LDA y transparencia:** Comunicación continua y documentación rigurosa de las acciones realizadas, generando confianza en la calidad del servicio.
- **Optimización del servicio:** Incorporación de aprendizajes para gestionar incidencias futuras con mayor eficiencia. La base de conocimiento enriquece el servicio, reduciendo tiempos de resolución en problemas similares.

[6.10.2.1] Flujo de actuación

De manera adicional, detallamos en el siguiente flujo de actuación el proceso de resolución tipo para un incidente.

Es importante destacar que se muestra como una propuesta de manera ilustrativa, la cual será validada y refinada en fases previas una vez iniciado el servicio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

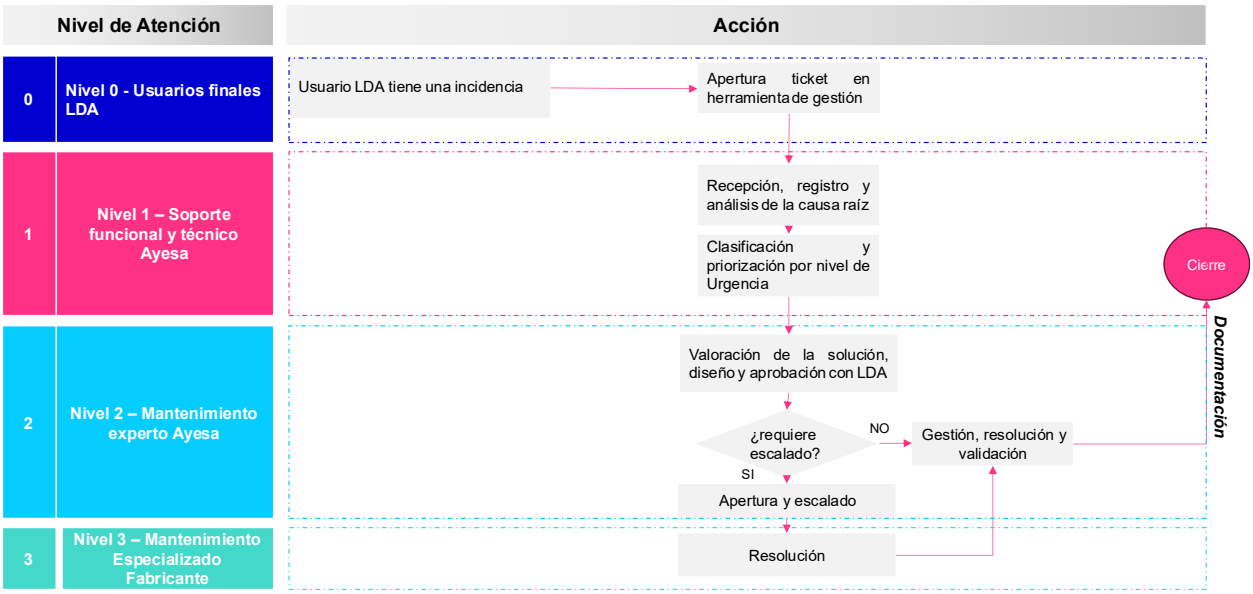

El proceso se inicia en el **nivel 0**, donde los usuarios finales envían las incidencias a través de la herramienta de gestión, describiendo el problema detectado y aportando la información necesaria para su análisis. En el **nivel 1**, se realiza una revisión inicial para descartar consultas funcionales, errores básicos o incidencias conocidas. Aquellas incidencias que no puedan resolverse en este nivel serán escaladas.

El **nivel 2** lleva a cabo el análisis y diagnóstico detallado de la incidencia, identificando la causa raíz y definiendo la solución más adecuada, ya sea parcial o definitiva. Las soluciones se diseñan e implementan inicialmente en entornos preproductivos, incluyendo las actuaciones necesarias para la recuperación de estados estables. En caso de soluciones parciales, se abrirá de manera obligatoria el correspondiente correctivo para garantizar el análisis exhaustivo y la implantación de la solución definitiva.


Las soluciones serán probadas y presentadas para su validación antes de su paso a producción. Una vez aprobadas, se desplegarán en producción dentro de una ventana de mantenimiento acordada, asegurando la continuidad del servicio. Cuando resulte necesario, se elaborarán scripts de reparación y regularización de datos para preservar la calidad de la información.

Las incidencias que requieran soporte especializado del fabricante serán escaladas al **nivel 3**. Previamente al cierre del ticket, se tipificará la causa de la incidencia y la asignación de la causa raíz correspondiente.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[6.10.3] Mantenimiento preventivo

Proponemos un enfoque basado en el ciclo iterativo de **Plan, Do, Check y Act (PDCA)**, diseñado para identificar riesgos y optimizar el rendimiento del sistema antes de que surjan problemas. Este método es ideal para tareas preventivas, ya que fomenta la mejora continua y permite garantizar la estabilidad y seguridad de la solución implementada.

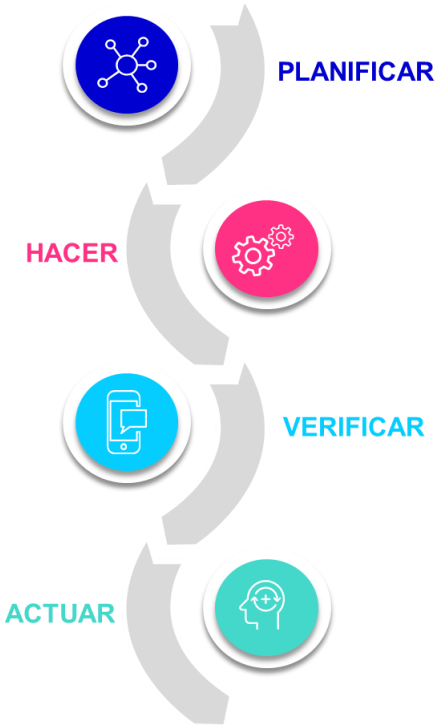

- **Planificar:** Durante la etapa de planificación proponemos elaborar un calendario periódico de revisiones preventivas con las que definir áreas clave de inspección, aspectos de seguridad, límites de almacenamiento y rendimiento completo de la plataforma.
- **Hacer:** Durante esta etapa, proponemos ejecutar las actividades preventivas como evaluaciones de configuraciones y código, auditorias de seguridad, limpieza de datos y la utilización de Salesforce Health Check para evaluar vulnerabilidades y riesgos potenciales.
- **Verificar:** Durante esta etapa analizaremos los resultados obtenidos de las actividades preventivas llevadas a cabo y las desviaciones con los KPIs establecidos. Para ello elaboraremos documentación clara de los procesos ejecutadas y los resultados obtenidos para LDA.
- **Actuar:** Durante esta última etapa se llevará a cabo la implementación y ajuste de mejora tras los hallazgos detectados en las fases previas. Todas estas acciones serán previamente acordadas y validadas por LDA. Adicionalmente, se actualizará el calendario y los procedimientos de mantenimiento según las lecciones aprendidas para optimizar futuros ciclos.

En base a nuestra experiencia en servicios de esta naturaleza, se consiguen entre otros los siguientes **beneficios** en la aplicación de este enfoque metodológico.

- **Método consolidado:** El método PDCA es un método de mejora continua empleado y consolidado en el mercado. Dicho enfoque facilita la toma de decisiones basada en datos y evidencias.
- **Optimización de recursos:** Evita intervenciones de emergencia y reduce costos asociados con la gestión reactiva.
- **Detección temprana de incidentes:** Minimiza la probabilidad de interrupciones mediante la identificación temprana de riesgos.
- **Mayor disponibilidad del sistema:** Al prevenir fallos antes de que ocurran, se garantiza que la solución implementada esté operativa y disponible para los usuarios de LDA en todo momento.
- **Cumplimiento Normativo y de Seguridad:** Las auditorías periódicas aseguran que la solución cumpla con estándares regulatorios y políticas internas de seguridad.
- **Mejora continua:** Garantiza la actualización constante de procesos y configuraciones para adaptarse a las necesidades de LDA.

[6.10.4] Acuerdos a nivel de servicio (ANS)

Se considera en el presente apartado una propuesta de nivel de servicio si bien, será valorada y confirmada en fases de adjudicación. Dichos tiempos de respuesta y resolución hacen únicamente referencia al mantenimiento correctivo.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Tiempos de respuesta / resolución

- **Incidentes críticos** 1h / 8h 95% de las ocasiones
- **Incidentes importantes** = 2h / 16h 95% de las ocasiones
- **Incidentes básicos y preguntas** = 4h / 24h 95% de las ocasiones

Se considerarán **incidencias críticas** las que afecten a más del 75% de los procesos y usuarios finales de LDA.

Se considerarán **incidencias importantes** aquellas que afecten a un volumen superior al 50% de los procesos y usuarios finales de LDA.

El resto de las **incidencias se considerarán básicas**.

[6.11] Modelo de trabajo

Desde Ayesa nos acoplaremos sin excepción a los requisitos de LDA en cuanto a la modalidad de trabajo presencial y en cercanía con el equipo designado.

[6.12] Claves de éxito y lecciones aprendidas

A partir de experiencias similares en proyectos tecnológicos, detallamos las siguientes claves de éxito:



Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[7] Gestión de calidad, seguridad y gobierno del dato

La gestión de calidad, seguridad y gobierno del dato constituye un pilar esencial para garantizar que la información utilizada en los nuevos procesos sea fiable, segura y coherente. Este apartado describe las medidas, controles y mecanismos implantados para asegurar la integridad del dato, protegerlo frente a riesgos y establecer un marco de gobierno que facilite el éxito del proyecto.

[7.1] Estrategia de migración

Las necesidades específicas de migración en base a nuestro entendimiento han sido indicadas en el epígrafe ***[5] Plan de Transformación.***

En este apartado, presentaremos el plan de migración que guiará el proceso de transición de LDA sobre la nueva plataforma. Desde Ayesa, consideramos la migración como un paso crítico en proyectos de esta tipología, donde las necesidades de migración requieren una planificación meticulosa y una ejecución cuidadosa para garantizar un resultado exitoso. En este sentido, entendiendo las volumetrías y entidades a migrar en base a las especificaciones de LDA en la presente RFP, se detalla en el siguiente gráfico las actividades y tareas principales vinculadas a migración de datos durante todo el ciclo de vida de la implantación:

Ayesa será responsable únicamente de la carga de los datos ya extraídos, depurados y transformados que LDA ponga a disposición para su incorporación en el nuevo entorno Salesforce. La preparación de los datos de origen, incluyendo su extracción, limpieza, normalización y cualquier proceso previo de tratamiento será responsabilidad exclusiva de LDA.


Se identifican las siguientes necesidades de migración preliminar:

1. **Usuarios**
2. **Oportunidades en curso** (Hogar, Coche, Moto, Saludo)
3. **Oportunidades históricas** (Hogar, Coche, Moto, Saludo). **Se definirán las volumetrías y periodos en la fase inicial de proyecto.**
4. **Documentos y Artículos de Conocimiento**
5. **Histórico de Ofrecimientos por cliente**
6. **Procesos de fidelización abiertos**
7. **Procesos de suplementos abiertos**

Esta información se integrará en Salesforce respetando la trazabilidad, los vínculos entre entidades y los criterios de visibilidad definidos, de modo que los agentes puedan acceder a todo el contexto relevante de atención anterior al despliegue de la nueva plataforma.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Fase 1 - Estrategia y diseño: durante esta fase se definirán las bases del plan de migración para el transcurso del proyecto, profundizando entre otras en las siguientes tareas:

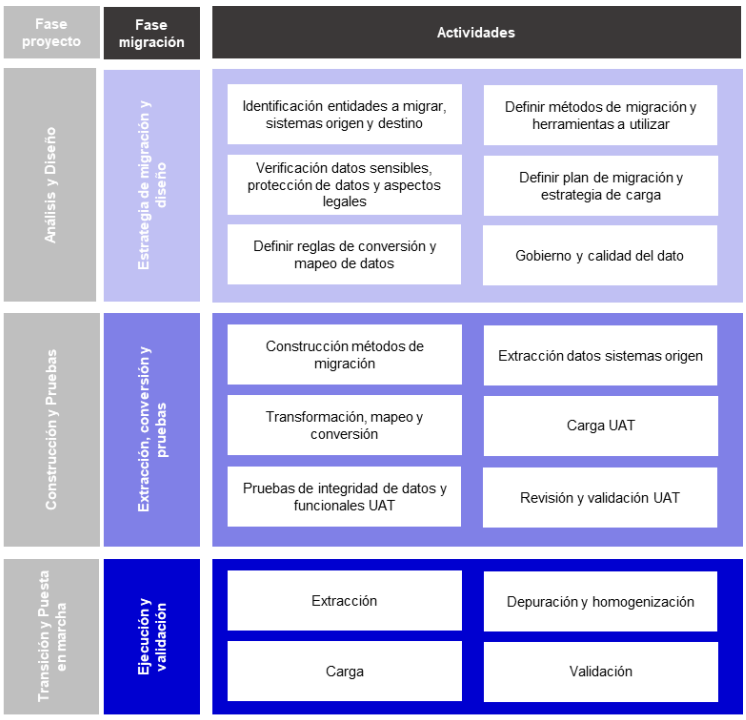

- **Identificación entidades a migrar:** durante la fase de análisis y diseño se identificarán las necesidades de datos maestros a migrar para el correcto funcionamiento de la nueva plataforma Salesforce
- **Identificación sistemas origen:** se deberán identificar los sistemas origen sobre los que hay que realizar la extracción para cada una de las entidades detectadas
- **Validación consentimientos sobre las entidades a migrar, datos sensibles y protección de datos**: se fijarán los consentimientos previos a las cargas en los nuevos sistemas relativos a protección de datos sensibles.
- **Definir métodos de migración**: se fijarán los métodos y herramientas de extracción, transformación y carga a emplear
- **Definir plan de carga y periodos:** Se definirán el plan de migración, extracciones, cargas y validaciones durante toda esta línea de trabajo
- **Mapeo datos sistemas origen y destino:** Se deberá realizar un mapeo de los campos necesarios para las diferentes entidades.
- **Gobierno y calidad dato:** Se definirán las reglas de gobernanza del dato, identificadores únicos por entidades a considerar y se revisará la calidad del dato existente en los sistemas iniciales.
- **Reglas de conversión** Se fijarán las reglas y normalizaciones necesarias para la conversión y transformación de los datos como espera el sistema destino Salesforce

Fase 2 - Extracción, conversión y pruebas: durante esta fase se llevará a cabo la extracción, transformación y carga en los sistemas no productivos, destacando tareas como:

- **Construcción métodos de migración:** se llevará a cabo la implementación o configuración de los métodos de migración definidos, así como la parametrización de las herramientas ETL a considerar
- **Extracción datos sistemas origen:** Se deberán realizar las extracciones de los sistemas origen cuando sea necesario.
- **Validación inicial del dato:** Revisar la calidad del dato con unos niveles de aceptación correctos
- **Revisión del dato:** Se deberá revisar la calidad del dato previo a los procesos de conversión y carga
- **Mapeo, conversión y transformación:** Se deberá realizar el mapeo de campos de la información extraída de los sistemas origen, así como su adecuación y conversión al sistema destino Salesforce
- **Selección muestra de datos** Se deberá seleccionar una muestra de datos real, aproximada a la foto final sobre cada una de las entidades
- **Carga datos UAT:** se realizará la carga de datos en los sistemas no productivos
- **Pruebas de Integridad de Datos UAT:** Se verificará la integridad de los datos migrados para asegurarse de que se hayan transferido correctamente y sin pérdidas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Pruebas funcionales UAT:** Se comprobarán que todas las funcionalidades críticas del sistema migrado estén operativas y funcionen correctamente. Esto puede incluir la realización de pruebas de extremo a extremo para garantizar que los procesos comerciales se puedan completar con éxito en el nuevo entorno.
- **Validación UAT:** Se realizará una validación formal de las pruebas realizadas en entorno UAT

Fase 3: Ejecución y validación: durante esta fase, se llevará a cabo el plan de migración consensuado, llevando a cabo las diferentes tareas ya realizadas en entorno UAT a fin de validar la adecuación de los datos a la nueva plataforma Salesforce. Se destacan tareas como:

- **Preparación entorno destino Salesforce:** Se llevará a cabo la preparación de los entornos destinos, configurando, activando o desactivando funcionalidades en caso de ser necesario
- **Extracción de los datos:** Se realizará la extracción de datos de los sistemas origen, manteniendo las plantillas, campos y consideraciones de la fase anterior pruebas
- **Mapeo, conversión y transformación:** Se deberá realizar el mapeo de campos de la información extraída de los sistemas origen, así como su adecuación y conversión al sistema destino Salesforce
- **Carga de datos:** Se realizará la carga de datos tras las validaciones y conversiones necesarias validadas en anteriores fases
- **Revisión y veredicto:** Se realizará una validación formal de las pruebas realizadas
- **Seguimiento de la estabilidad de la plataforma:** Se realizarán las tareas necesarias para el seguimiento de la estabilidad de la plataforma y aceptación de los datos migrados

[7.2] Plan de calidad y aseguramiento

Proponemos el siguiente modelo de aseguramiento de la calidad, que proporciona tanto el aseguramiento de la calidad de los productos entregados como el cumplimiento de los procedimientos, métodos y normas del **Modelo de Calidad con el que pueda contar LDA**. **El modelo permite establecer los controles y el nivel de calidad exigido, tanto documental como software**, y sobre las actividades que los generan (proceso), asegurando su cumplimiento, en el ciclo de vida de los desarrollos.

[7.2.1] Principios Clave

1. **Incorporación de la Calidad desde la Planificación:** Esto implica definir claramente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, correspondiente a cada evolutivo o modificación de software, así como los criterios de aceptación específicos para cada función o módulo. Al establecer estos criterios desde el inicio, se garantiza que el desarrollo esté siempre orientado a cumplir con las expectativas de calidad del cliente y de las partes interesadas.
2. **Integración de la Calidad en el Diseño y Desarrollo:** Durante el diseño y desarrollo del software, se aplican prácticas de ingeniería de software que promueven la calidad inherente en el producto final. Esto incluye el uso de patrones de diseño adecuados, la implementación de revisiones de código y la adopción de estándares de codificación que prevengan errores comunes y garanticen la mantenibilidad y escalabilidad del software, reforzándolo con la incorporación de herramientas de análisis estático como Sonarqube/PMD**. No consideradas en el alcance actual.**
3. **Pruebas y Validación Continuas:** Implica la realización de pruebas y validaciones continuas a lo largo del desarrollo. Se incorporarán pruebas unitarias, de integración y de aceptación de usuario en cada iteración del desarrollo, además de una **automatización de pruebas que incluya mínimo una prueba por HU**, permitiendo regresiones automáticas y garantizando que cada parte del sistema funcione correctamente y cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de avanzar a la siguiente fase.
4. **Enfoque en la Seguridad y Cumplimiento:** La seguridad es un aspecto integral del modelo, de esta manera se asegura que las prácticas de seguridad estén incrustadas en cada paso del desarrollo. Esto incluye desde la planificación de controles de seguridad específicos y la implementación de prácticas de codificación segura (análisis de código estático), hasta la ejecución de pruebas de seguridad automatizadas y la revisión continua de posibles vulnerabilidades (Hacking Ético). Para dar soporte al **análisis de código estático** sobre los desarrollos realizados, se propone el uso de con

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

herramientas de código abierto como **Sonarqube/PMD** en las que Ayesa ya dispone de parametrizaciones específicas que mejoran la solución base y redunda en una mayor QA de código. **Para el seguimiento de Testing desde Ayesa estamos proponiendo Panaya como plataforma de automatización.**

5. **Gestión de la Calidad en la Implantación:** En la fase final del proyecto, el modelo debe asegurar una implantación sin interrupciones. Esto implica una gestión cuidadosa de la entrega del software, asegurando que todas las funcionalidades estén completamente implementadas y validadas. El proceso incluye la capacitación de los usuarios para utilizar el sistema de manera eficaz, así como la entrega de documentación clara y detallada. Adicionalmente, el modelo de aseguramiento de la QA estará alineado con el modelo de Gestión de Releases definido, para asegurar que se toman las medidas necesarias en consolidaciones, gestión de la configuración, paso de software a entornos de Desarrollo/PI/UAT/Producción.
6. **Gestión de la transferencia del conocimiento.** Durante el periodo de garantía se trabajará con equipo de AMS para asegurar una transición fluida y eficiente. Para ello, se propone establecer una estrategia de formación basada en el detalle de solución y un manual troubleshooting que permita al equipo AMS no perder la visión y experiencia adquiridas durante el proyecto, con periodos de shadowing directo e inverso que permita monitorizar, validar y asegurar un correcto traspaso.
7. **Protección de la Confidencialidad de la Información**: En todas las etapas del desarrollo, se implementarán medidas para garantizar la confidencialidad de los datos e información tratados. Esto incluye el uso de mecanismos de encriptación, controles de acceso estrictos, y políticas de manejo de datos sensibles, asegurando que solo el personal autorizado tenga acceso a la información y cumpliendo con las normativas vigentes en materia de protección de datos.

Nuestro modelo no es sólo un conjunto de prácticas, sino una filosofía que coloca la calidad en el centro de todas las actividades de desarrollo. A través de la incorporación de la calidad en cada etapa del proceso, el uso de herramientas y metodologías avanzadas como Agile y pruebas continuas se asegura que el producto resultante no sólo cumpla con los requisitos técnicos y funcionales, sino que también sea seguro, eficiente y alineado con las necesidades del negocio.

[7.2.2] Cumplimiento de buenas prácticas de Salesforce

En Ayesa nos aseguramos de seguir las mejores prácticas para el desarrollo en Salesforce, siguiendo sus directrices para garantizar un trabajo de alta calidad y completamente alineado con los estándares del sector. Algunas de nuestras principales prácticas incluyen:

- **Uso preferente de herramientas estándar**: Siempre que sea posible, optamos por la configuración y personalización estándar de Salesforce en lugar de recurrir a desarrollos a medida. Esto garantiza soluciones más sencillas, eficientes y fáciles de mantener.
- **Organización clara y autodocumentada**: Nos adherimos a las reglas de nomenclatura establecidas y completamos la metadata de manera obligatoria, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento del sistema.
- **Evitar el uso de código "hardcodeado"**: Nunca escribimos valores fijos directamente en el código. En su lugar, empleamos herramientas estándar para mantener la flexibilidad y seguridad del sistema.
- **Cobertura de pruebas superior**: Superamos el estándar de Salesforce al garantizar un mínimo del 85% de cobertura de código en nuestros desarrollos, lo que asegura la calidad y fiabilidad de las soluciones.
- **Uso de la última versión del API de Salesforce**: Todos los nuevos desarrollos se realizan con la versión más reciente del API de Salesforce. Además, actualizamos cualquier componente antiguo a la versión más reciente para mantener la compatibilidad y aprovechar las últimas mejoras.
- **Código claro y bien documentado**: Todos los desarrollos incluyen comentarios detallados y claros que facilitan la comprensión, mantenimiento y escalabilidad del sistema.
- **Uso del inglés en el código**: Para cumplir con los estándares internacionales, todas las clases de Apex y JavaScript están escritas en inglés.
- **Buenas prácticas en el desarrollo de Apex**: Seguimos las convenciones generales de desarrollo en Apex, optimizando la declaración de variables, estructuración del código, manejo de excepciones y el uso adecuado de consultas dinámicas.
- **Optimización de Triggers**: Limitamos los triggers a uno por objeto, delegando la lógica compleja en otras clases y asegurándonos de que el código esté optimizado para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
- **Rendimiento garantizado**: Optimizamos las consultas, operaciones y flujos de trabajo para evitar problemas de rendimiento y asegurar el funcionamiento ágil del sistema en todo momento.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

- **Seguridad y visibilidad de los datos**: Todos los desarrollos respetan las políticas de seguridad de la organización, asegurando que los perfiles, permisos y reglas de visibilidad estén alineados con las necesidades y normativas internas.
- **Integraciones seguras**: Hacemos un uso adecuado de Named Credentials y Aplicaciones Conectadas para asegurar la integridad y seguridad en las integraciones con sistemas externos.
- **Desarrollo avanzado y optimizado**: Aplicamos técnicas avanzadas para asegurar que el sistema funcione de manera óptima, incluso cuando se manejan grandes volúmenes de datos o procesos complejos.

[7.2.3] Pruebas y validaciones

Para el seguimiento de Testing desde Ayesa estamos proponiendo Panaya como plataforma de automatización.

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias son pruebas que se enfocan en verificar la funcionalidad de las unidades más pequeñas del código, como funciones, métodos o clases individuales. Estas pruebas se escriben para cada componente del software para asegurarse de que cada parte funciona correctamente de manera aislada. Se integran en el **Plan de Pruebas Unitarias**, que define los procedimientos para crear y ejecutar pruebas unitarias a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Pruebas de Integración

Las pruebas de integración evalúan la interacción entre diferentes módulos o componentes de la solución desarrollada para asegurarse de que funcionan correctamente cuando se combinan. Estas pruebas son fundamentales para identificar problemas en la interacción entre módulos. Se integran en el **Plan de Pruebas de Integración**, que define cómo se prueban las interfaces entre los módulos y cómo se validan las interacciones entre ellos.

Pruebas de Sistema

Las pruebas de sistema son pruebas completas de la solución desarrollada como un todo. Evalúan el sistema completo para verificar que todos los componentes integrados cumplen con los requisitos especificados y funcionan de manera correcta y coherente. Se integran en el **Plan de Pruebas de Sistema**, que cubre la verificación completa del sistema en un entorno que simula el entorno de producción.

Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación son realizadas para verificar que la solución desarrollada cumple con los requisitos y expectativas del usuario final. Estas pruebas son generalmente conducidas por el Product Owner o usuarios finales para confirmar la funcionalidad de la solución desarrollada. Se integran en el **Plan de Pruebas de Aceptación**, que asegura que la solución desarrollada se evalúa contra los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. Se definirán KPI de calidad que permita identificar la calidad del SW entregado y la experiencia de usuario (elación de número de errores de software identificados en Pruebas de usuario frente a los casos probados)

Pruebas de Seguridad

Las pruebas de seguridad están diseñadas para identificar vulnerabilidades y riesgos en la solución desarrollada. Incluyen la evaluación de la autenticación, autorización, integridad de datos y protección contra amenazas comunes como ataques de inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS), y otros. Se integran en el **Plan de Pruebas de Seguridad**, que aborda la seguridad del sistema en cada capa de la arquitectura: Pruebas preventivas, pruebas de análisis de código estático y hacking ético. Se propone, además de los análisis de código estático comentados en principios clave de seguridad, la ejecución por parte de Ayesa de un Hacking Ético para aquellos proyectos que tengan un volumen relevante de desarrollo o que modifiquen módulos críticos de la aplicación, asegurando que no existen vulnerabilidades o habilitando su corrección en caso de identificarse.

Pruebas de Rendimiento

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Las pruebas de rendimiento evalúan cómo responde el sistema bajo diferentes condiciones de carga, asegurando que la solución desarrollada funcione eficientemente en situaciones de alto uso o estrés y que cumple con los límites de gobierno marcados por el producto Salesforce. Se integrarán en el Plan de Pruebas de Rendimiento, que incluirá pruebas de carga, pruebas de estrés, y pruebas de escalabilidad. Estas pruebas se ejecutarán principalmente para procesos Batch, procesos asíncronos, interfaces online (concurrencia) y/o transacciones que puedan ser desencadenadas de forma masiva (p.e triggers sobre objetos bajo los que se ejecutan procesos de actualización masiva). Se propone el uso de la Herramienta Apache JMeter para su ejecución.

Pruebas Automatizadas

La automatización de pruebas se ejecutará sobre la herramienta seleccionada para este fin. Estas pruebas permitirán ejecutar pruebas principalmente de carácter regresivo con una mayor eficiencia y velocidad, asegurando la calidad del SW entregado. Esto permitirá a personas de proyecto enfocarse en validar nuevos desarrollos y funcionalidades con la garantía de mantener un correcto funcionamiento de procesos previamente liberados y disponibles dentro de la plataforma.

Para los casos en los que no sea posible la automatización de pruebas de HU, se propone generar y mantener un “script de regresión” que deba ejecutarse manualmente con cada promoción de entorno para asegurar la cobertura de dichas HU.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[8] Gestión del cambio y Adopción

[8.1] Metodología

La gestión de un cambio tecnológico comprende todos los procesos y tareas necesarias para gestionar la transición hacia una nueva realidad. Esto incluye el diseño, planificación y ejecución de una serie de acciones encaminadas a **reducir el impacto** de dicho cambio sobre actividades de las personas usuarias de las tecnologías y/o sistemas implicados. **Formación principalmente presencial en Madrid y soporte en Iseazy.**

Estas actividades quedarán registradas en el **Plan de Gestión del Cambio**, en el que se concretarán, de manera consensuada con la Dirección del Proyecto, acciones de comunicación, formación y participación, así como transferencia tecnológica y del conocimiento.

El **objetivo** del Plan de Gestión del cambio es asegurar que las personas involucradas, conozcan y estén capacitadas en el nuevo contexto para conseguir los resultados esperados

En este capítulo, por tanto, se presenta el modelo de Gestión del Cambio definido por Ayesa. Se presentan los pilares básicos a través de los cuales se articula el Plan por parte de Ayesa y se describen las diferentes etapas y roles que participan en su desarrollo.

Factores Claves para el éxito de la Gestión del Cambio

- Conocer muy bien las necesidades y particularidades de LDA.
- Entender perfectamente en qué consiste el cambio: beneficios, impactos y complejidad
- Identificar las necesidades y características, cuantitativas y cualitativas, de cada colectivo afectado por el cambio
- Involucrar a las personas usuarias afectadas desde el principio, para asegurar su aceptación e implicación
- Medir cómo está evolucionando la ejecución del plan de gestión del cambio para identificar las carencias y solucionarlas lo antes posible



COMUNICACIÓN

Difundir la visión, objetivos y resultados del proyecto



FORMACIÓN

Desarrollar y reforzar los conocimientos y competencias de los usuarios



SOPORTE

Proporcionar apoyo continuado y los elementos necesarios a los usuarios

[8.2] Plan de Comunicación

Una de las principales labores que se deben emprender para facilitar el proceso de cambio o transformación es la tarea de comunicación, entendido esta como la labor de difusión y venta del proyecto a desarrollar.

La información debe de ser abierta, adecuada, transparente y veraz, para evitar la distorsión del mensaje.

De esta forma el Plan de Comunicación trata de definir lo que la dirección del proyecto quiere decir a los distintos públicos y/o audiencias y de cómo y cuándo llevarlo a cabo, de forma que se reduzcan las resistencias al proyecto y se mantenga un contacto permanente con todos los niveles.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

El Plan de Comunicación también debe servir como herramienta de marketing, es decir como un canal de venta del proyecto al resto de áreas de la compañía o grupos externos. De esta manera se busca que todos los nuevos servicios que se deriven de este nuevo modelo sean conocidos y al mismo tiempo todo el mundo sea consciente de la transformación tecnológica que se está llevando a cabo.

Conjuntamente a las acciones de comunicación, se informará al personal de las vías apropiadas para hacer llegar su feedback. Con ello, se busca que todos los implicados en las mejoras se sientan partícipes de las mismas, anticipen cualquier observación que puedan identificar, y aporten en positivo a la realización de las mejoras.



[8.3] Plan de Formación

Cuando en una organización se produce un cambio y/o transformación es esencial diseñar un conjunto de acciones de formación y motivación para aumentar y potenciar las habilidades de las personas que verán afectado su trabajo por el cambio, capacitarlas y elevar su predisposición técnica hacia la transformación.

Lo que las personas necesitan es conocimiento, capacidad y deseo de cambio. Una adecuada formación del personal técnico y funcional en los nuevos sistemas durante el proceso de transformación constituirá un factor clave para el éxito de este.

Por lo tanto, el desarrollo de planes de formación específicos tiene como finalidad facilitar el proceso de cambio para evitar, que las personas aun entendiendo el cambio no sepan o no puedan adaptarse.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



El plan de formación estará orientado a cuatro niveles principales:

- **Formación Inicial para nuevas funcionalidades**: Cada vez que se implementen nuevas releases o se integren nuevas funcionalidades de Salesforce, se organizarán sesiones de formación específicas. Estas sesiones tendrán lugar **al final de las releases en los que se hayan entregado bloques de implementación o evolutivos importantes**, asegurando que los usuarios comprendan y adopten rápidamente las nuevas características.

- **Formación Continua y Refuerzo**: Durante todo el contrato, organizaremos **sesiones mensuales/trimestrales** de actualización para reforzar el conocimiento sobre el uso eficiente de las herramientas actuales y nuevas. Esta formación se adaptará a las necesidades detectadas a lo largo del tiempo y puede incluir sesiones trimestrales que cubran tanto las mejoras funcionales implementadas como las mejores prácticas para su utilización. En estas sesiones se destacará la alineación entre los objetivos de negocio de LDA y las capacidades técnicas de Salesforce.

- **Formación Especializada**: Dada la naturaleza de la plataforma y la evolución esperada, prevemos que algunas **formaciones específicas** serán necesarias para los productos que se vayan integrando, ya sean nuevas funcionalidades o módulos adicionales. Estas sesiones especializadas, dirigidas a usuarios avanzados o administradores, permitirán que el equipo de LDA esté siempre al día en cuanto a nuevas funcionalidades o tecnologías que se vayan implementando.

- **Itinerarios formativos:** Se desarrollará una **matriz de conocimiento** en el que se definen para los diferentes roles definidos los conocimientos actuales y los deseados (As Is / To Be). En función de esta matriz se diseña una ruta formativa personalizada para cada rol. Este plan podrá irse adaptando en función de los resultados y de las nuevas necesidades formativas que se vayan detectando.

Este planteamiento se abordará y detallará durante la fase de adopción del servicio será la elaboración de este plan de formación detallado, garantizando que las sesiones de formación se alineen con las expectativas y necesidades específicas de LDA.

[8.4] Soporte Operativo

Ligado al Plan de Comunicación y al Plan de Formación se define un tercer pilar clave denominado Soporte Operativo, el cual se centra en proporcionar apoyo a los usuarios en cualquier área relacionada a sus actividades asociadas a la gestión del cambio para asegurar su éxito.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



[8.5] Planificación temporal

Como se ha detallado en este documento, el plan de formación está diseñado para garantizar una adopción efectiva del sistema, combinando sesiones iniciales básicas con formaciones periódicas de refuerzo y ampliación. Este enfoque progresivo permite que los usuarios asimilen primero las funcionalidades esenciales y, posteriormente, profundicen en aspectos avanzados y específicos.

Un **equipo especializado** liderará tanto el despliegue como las formaciones, trabajando estrechamente con los equipos designados por LDA. Este equipo garantizará el éxito de las sesiones formativas, brindando apoyo continuo y asegurando su alineación con los objetivos del proyecto.

A continuación, se presenta la planificación detallada de las sesiones formativas para cada release, incluyendo las formaciones iniciales y las de refuerzo, adaptadas al cronograma de los despliegues de usuarios previamente definidos.

Formación Inicial (Pre GO Live): Durante las semanas (depende del alcance y volumen funcional) previas al despliegue de cada bloque de usuarios, se llevarán a cabo sesiones formativas presenciales. Estas sesiones estarán diseñadas con flexibilidad para ajustar el número según las funcionalidades incluidas o el número de usuarios de cada despliegue.

Las sesiones presenciales se planificarán prioritariamente en Madrid. En caso de que no sea viable, se complementarán con sesiones virtuales adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Curso de Usuarios y Agentes (Release 1)

Formación específica para agentes adaptada a sus responsabilidades operativas.

Guía formativa detallada: Instrucciones completas sobre las funcionalidades disponibles.

Guía rápida: Resumen práctico y conciso de los pasos y funciones básicas.

Curso de Administración y Seguridad (Release 1)

Enfocada a supervisores Abordando gestión de usuarios, gestión de colas, roles, accesos y configuración segura del sistema.

Guía formativa detallada: Instrucciones completas sobre las funcionalidades disponibles.

Guía rápida: Resumen práctico y conciso de los pasos y funciones básicas.

Curso de Configuración y Parametrización (Release 1)

Orientado a responsables técnicos, cubriendo flujos IVR, supervisión omnicanal, formularios, encuestas y análisis de métricas clave.

Diseño Técnico: Documento que describe la arquitectura, configuraciones e integraciones del sistema.

Curso de Gestión de contenido

Formación específica para gestores de contenido que les permita actualizar y organizar la información en la base de conocimiento de manera eficiente.

Guía rápida: Resumen práctico y conciso de los pasos y funciones básicas.

Formación de Refuerzo (Post Despliegue): El período de formación de refuerzo se llevará a cabo durante el mes posterior al despliegue, con sesiones semanales en formato online de carácter opcional.

Ampliación Contenidos

Casos prácticos avanzados y funcionalidades específicas

Guía rápida: Resumen práctico y conciso de los pasos del contenido tratado en cada sesión.

Resolución de dudas

Resolución de dudas surgidas tras el uso inicial.

Base de Conocimiento: Incorporar preguntas frecuentes y otros temas relevantes que hayan sido identificados

Video Formativo (adicional): Si se considera necesario se aportará material audiovisual de funcionalidades clave.

Adicionalmente, durante el periodo de estabilización, se recopilarán puntos críticos detectados y preguntas frecuentes. Basados en esta información, se desarrollarán **materiales complementarios** los cuales serán publicados en la base de conocimiento para facilitar la incorporación de futuros bloques de usuarios.

De igual forma, previo al despliegue de las funcionalidades incluidas por Fase, se llevarán a cabo sesiones **formativas iniciales dirigidas a todos los usuarios**. Estas sesiones tendrán un enfoque en las lecciones básicas necesarias para la correcta adopción de las nuevas herramientas.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

Debido a que los usuarios ya están familiarizados con la herramienta se propone incorporar desde el inicio en la base de conocimiento instrucciones prácticas para identificar y resolver problemas de usabilidad del portal.



Siguiendo la misma dinámica en todas las fases, tras la incorporación de la funcionalidad, se organizarán **sesiones de repaso y refuerzo** de manera periódica. Estas sesiones estarán orientadas a resolver dudas surgidas tras el despliegue y a profundizar en aspectos avanzados y casos de uso específicos, asegurando así que los usuarios aprovechen al máximo las nuevas capacidades del sistema.

[8.6] Descripción del equipo

El equipo de Gestión del Cambio estará liderado por un Consultor de Gestión del Cambio, quien será el encargado de diseñar y ejecutar el plan de divulgación y capacitación. Este consultor asumirá la responsabilidad de organizar e impartir las sesiones formativas, asegurando que sean efectivas y adaptadas a las necesidades de los usuarios, y de supervisar la calidad de los materiales elaborados.

El consultor contará con el apoyo activo de los consultores especializados, así como el analista del negocio salud. Estos profesionales aportarán su experiencia específica para garantizar que los contenidos formativos y materiales sean relevantes, completos y alineados con las particularidades de cada área de negocio.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[9] Optimización de costes y sostenibilidad

A lo largo del documento han sido descritas numerosas propuestas de valor añadido para dar cobertura a cada una de las necesidades planteadas por LDA. **Adicionalmente a estas, se proponen las siguientes mejoras funcionales y técnicas con el objeto de mitigar el impacto de este proyecto en costes y escalabilidad:**

- **API Acelerator by Ayesa** para hacer uso de nuestro framework, una solución innovadora y completamente personalizada que simplifica la forma en que gestionamos las integraciones.
- **Ayesa Easy Forms:** Innovación en la creación de formularios para Salesforce
- Una solución ágil, personalizable y 100% integrada con Salesforce para capturar datos de forma inteligente
- **Monitorización activa de uso de licencias y reclasificación de perfiles** asegurando una asignación correcta que permita reducir los costes de licenciamiento.
- **Desplazamiento a PowerBI de los usuarios clasificados como 'consultivos'** o de backoffice en LDA y no realiza operativa transaccional sobre Salesforce
- **Reducción del Average Handle Time en contact center**: Asegurar un screen-pop automático desde Genesys, ficha 360° precargada en el momento de recepción de llamada, y recomendaciones NBO contextuales disponibles sin cambio de pantalla.
- Implementar en el desarrollo las mejores prácticas y metadata personalizada al proyecto permitiendo distinguirlo del desarrollo actual. Dicho planteamiento, permitirá atender las posibles incidencias o vulnerabilidades de manera más ágil.
- Desarrollar una **librería de componentes modulares y reutilizables** dentro de la plataforma que nos permita construir aplicaciones y funcionalidades de manera más eficiente y personalizables para cada uno de los negocios, permitiendo tanto reducir esfuerzos de mantenimientos y homogeneizar procesos como adaptarnos a las particularidades de cada negocio.
- Potenciar las capacidades de **colaboración nativas de Salesforce (Task, Events),** proporcionando a los usuarios internos una funcionalidad para conectar, compartir conocimiento y mantenerse al tanto de actualizaciones importantes en tiempo real sobre la propia ficha de cliente.
- Implementar un sistema de **backup de metadatos** automatizado para realizar copias de seguridad periódicas, garantizando la integridad de la misma en caso de errores accidentales.
- Utilizar herramientas de **análisis estático de código**, como PMD, para identificar y corregir posibles problemas de calidad y rendimiento en el código desarrollado.
- Implementar herramientas de **automatización de pruebas de regresión** basadas en software de código abierto, para automatizar la ejecución de pruebas recurrentes y garantizar una entrega más rápida y fiable de nuevas funcionalidades.
- Uso del módulo **Health Check** para evaluar en tiempo real el estado de la implementación, identificar áreas de mejoras y contrarrestar las potenciales vulnerabilidades de seguridad.
- Establecer un **modelo de visibilidad basado en conjuntos de permisos** en lugar de en perfiles, permitiendo disponer de un mayor control del acceso de cada uno de los usuarios, obtener mayor flexibilidad, así como eliminar los permisos de alto riesgo de los perfiles. La agrupación de permisos permitirá disponer de esta flexibilidad sin que implique un aumento de esfuerzos de mantenimiento.
- Por otro lado, proponemos introducir procesos de **limpieza y normalización de datos** para mejorar la calidad y consistencia de la información almacenada en la plataforma, estableciendo protocolos para identificar y corregir errores de forma periódica, eliminar duplicados y estandarizar la estructura de los datos de manera automatizada.
- Requerimientos **multi-idioma mediante el uso de Custom Labels y translations**

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[10] Lista de entregables

A continuación, se detallan los entregables mínimos que se compartirán a lo largo de la ejecución del proyecto, **si bien se entregará cualquier otra documentación solicitada por LDA:**



Product Backlog: Lista priorizada de todas las funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que se requieren para el producto final. Será un documento vivo que se actualizará continuamente a medida que evoluciona el proyecto, reflejando las necesidades del cliente y los objetivos del negocio.



User stories: Descripciones breves de las necesidades del usuario que detallan qué función debe realizar el sistema, expresadas en un lenguaje comprensible para todos los miembros del equipo. Cada historia de usuario se centra en quién es el usuario, qué quiere lograr, y por qué, ayudando a priorizar el desarrollo en función del valor aportado al cliente y facilitando una comprensión común entre los desarrolladores, el equipo de negocio y los interesados.



Diseño funcional: Un documento detallado que especifica cómo debe comportarse el sistema o aplicación para cumplir con los requisitos del negocio. Incluye descripciones de los procesos, flujos de trabajo, interfaces de usuario y otras características necesarias para alcanzar los objetivos definidos.



Diseño de Arquitectura: Definición de la estructura general del sistema, incluyendo la organización de los componentes, los modelos de integración, la infraestructura de red, la seguridad y la escalabilidad. Este diseño asegura que la solución sea robusta, eficiente y capaz de soportar futuros crecimientos o cambios.



Buenas Prácticas: Conjunto de recomendaciones y directrices que se deben seguir para asegurar un desarrollo eficiente, escalable y mantenible del sistema. Estas incluyen el uso adecuado de patrones de diseño, estándares de codificación, seguridad, y nomenclaturas, para asegurar la consistencia y calidad en todas las etapas del proyecto.



Plan de Integración: Estrategia que define cómo se conectarán y funcionarán conjuntamente los diferentes sistemas, servicios y aplicaciones que forman parte de la solución. Esto incluye la planificación de las interfaces, los métodos de comunicación, la sincronización de datos y la gestión de dependencias, asegurando que los sistemas trabajen de manera cohesiva y eficiente para cumplir con los requisitos del negocio.



Plan de Migración: Identificación de entidades a migrar a la nueva plataforma, volumetrías y tareas y responsabilidades en cuanto a la extracción, transformación y carga de datos en los diferentes entornos y planificadas respecto a los hitos del proyecto.



Diseño técnico: Detalle de la implementación técnica del proyecto, incluyendo las especificaciones de programación, los lenguajes de desarrollo, las bases de datos, las API, los servicios de backend, y otros elementos técnicos necesarios para construir el sistema conforme al diseño funcional y arquitectónico.



Acuerdos de interfaz: Documentación que define los estándares y protocolos de comunicación entre diferentes componentes del sistema o entre sistemas externos. Esto incluye APIs, formatos de datos, protocolos de transmisión y otros acuerdos necesarios para asegurar una integración fluida y coherente.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



Documentación de APIs: Descripción detallada de las APIs desarrolladas, incluyendo sus métodos, endpoints, parámetros, respuestas, errores y ejemplos de uso. La documentación será clara y accesible, proporcionando a los desarrolladores y usuarios toda la información necesaria para integrar y utilizar las APIs de manera efectiva, facilitando la interoperabilidad y el mantenimiento a largo plazo.



Scripts de Pruebas: Conjunto de instrucciones y casos de prueba diseñados para validar que las funcionalidades del sistema funcionan como se espera. Los scripts cubren diferentes escenarios, desde pruebas unitarias hasta pruebas de integración, para asegurar la calidad y el rendimiento del producto final.



Plan de Gestión del Cambio: Estrategia para gestionar la transición organizacional durante la implementación del proyecto. Incluye la comunicación con los interesados, la capacitación del personal, la gestión de la resistencia al cambio y las acciones necesarias para asegurar la adopción efectiva del nuevo sistema o procesos.



Planes de Despliegue: Detalles del proceso para implementar la solución en el entorno de producción. Este plan cubre los pasos, el cronograma, los recursos necesarios, los riesgos identificados y las medidas de mitigación para asegurar un despliegue exitoso y sin interrupciones del servicio.



Planes de Contingencia: Estrategias diseñadas para manejar riesgos o eventos inesperados que puedan surgir durante el despliegue o la operación del sistema. Estos planes aseguran que, en caso de falla, existan procedimientos claros para minimizar el impacto en el negocio y restaurar la funcionalidad lo más rápido posible.



Planes de Convivencia: Planificación de cómo coexistirán el sistema nuevo y el sistema antiguo durante un período de transición. Incluye detalles sobre la interoperabilidad, los flujos de datos, las responsabilidades de los equipos y los procedimientos para la migración gradual.



Manuales de usuario: Documentos diseñados para ayudar a los usuarios finales a entender cómo utilizar las nuevas funcionalidades del sistema. Incluyen guías paso a paso, capturas de pantalla, ejemplos prácticos y soluciones a problemas comunes para asegurar una experiencia de usuario fluida y eficiente.

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.

[11] Consideraciones al alcance

- Ayesa será responsable únicamente de la **carga de los datos ya extraídos, depurados y transformados** que LDA ponga a disposición para su incorporación en el nuevo entorno Salesforce. La preparación de los datos de origen, incluyendo su extracción, limpieza, normalización y cualquier proceso previo de tratamiento será responsabilidad exclusiva de LDA.
- **Pruebas integrales E2E (End-to-End).** Será necesario realizar pruebas E2E en las que participen los equipos de las plataformas **CORE de LDA** y/o **proveedores terceros** involucrados, a fin de validar las integraciones y procesos de extremo a extremo en un entorno representativo.
- **Datos para pruebas de aceptación e integración.** LDA (o los terceros designados por LDA) serán responsables de **proveer un set mínimo de datos reales y representativos** para la ejecución de pruebas de aceptación e integración. La **extracción, anonimización y/o preparación** de dichos datos **no es responsabilidad de Ayesa**.
- **Gobernanza del programa (PMO).** Se considera necesario contar con una **Oficina de Gestión del Programa (PMO)** que **aglutine y coordine** las iniciativas de **CCaaS, CRM y evolutivos del CORE**, con el fin de alinear dependencias, calendario, riesgos y decisiones bajo una **hoja de ruta común**.
- **Gestión de cambios de alcance.** Cualquier **modificación del alcance** inicialmente definido (requisitos, entregables, supuestos, interfases, volúmenes, SLAs, etc.) se tramitará conforme a un **procedimiento formal de gestión de cambios**, incluyendo: solicitud/documentación del cambio, valoración de impacto (técnico, económico y de planificación), aprobación por las partes y actualización contractual correspondiente.
- **Dependencias de terceros y retrasos.** Los **retrasos derivados de dependencias de terceros** (proveedores, integradores, áreas internas de LDA u otros) **no serán atribuibles a Ayesa**. En tales casos, se **evaluará el impacto** en la planificación y costes, y se **acordarán los ajustes** necesarios de alcance, cronograma y condiciones económicas.
- **Ventanas de corte y coordinación operativa.** En caso de que la puesta en producción requiera una **ventana de corte de la operación**, la **coordinación de los equipos de operación** (incluyendo comunicación interna, plan de contingencia, y aprobación de la ventana) **corresponderá a LDA**. Ayesa colaborará en las tareas técnicas de su ámbito durante la ejecución del plan acordado.
- **Licenciamiento y productos de terceros.** Ayesa **asesorará y revisará conjuntamente con LDA** las necesidades de **licenciamiento** asociadas al alcance de esta oferta. La **contratación y costes** de **productos/módulos no serán responsabilidad de Ayesa.**

Documento confidencial. Prohibida su reproducción.



Torre Emperador
Paseo de la Castellana, 259D - plta. 48
28046 Madrid, España

Tel.: +(34) 914 11 96 50
info@ayesa.com
www.ayesa.com

