CRM IMPLANTACIÓN

OTORGANDO SÚPER PODERES A LOS AGENTES DE LDA



Propuesta técnica de Capgemini

linea directa | Capgemini

Una transformación

sin rodeos



Índice



01 Racional de la propuesta



02 Discovery / Implantación / Metodología



03 Integraciones – Aspectos claves Tecnológicos



04 Gestión del Cambio



05 Soporte / Transmisión del Conocimiento



06 Fases del proyecto



07 Casos Éxito



08 Por qué somos la mejor opción



09 Preguntas

Hoy presentan



Mario Aguilar
VP Banking & Insurance



Belén Molina
Account Manager Insurance



Lidia Herrero
CX – VP & Capgemini Spain GTM Head



Fernando Sanz
CX - Líder de industria Servicios Financieros



Javier Bordetas
VP Head of frog Spain



Ricardo Leal
CX - Responsable de la práctica CRM



Alfonso Santolalla
CX - CTO España



Vicent Rico
CX - Head & CTO of Microsoft Spain



Carlos Ruiz
Senior Manager
Experto en Seguros y Transformación



Alicia Martínez
Senior Manager
Experta en CRM y Adopción



Manuel Esteve
Líder de Soluciones de Integración

01.

RACIONAL DE LA PROPUESTA



Lidia Herrero

CX – VP & Capgemini
Spain GTM Head



Fernando Sanz
Líder de industria – CX
Servicios Financieros



Visión general de la propuesta

Nuestro objetivo estratégico es transformar Linea Directa en una compañía data-driven.



Objetivo del proyecto

1.

Obtener una visión 360 real en único entorno operativo.

2.

Incrementar la eficiencia y eficacia comercial y operativa,

3.

Garantizar una gestión omnicanal (CRM + Genesys + ecosistema)

4.

Habilitar un CRM con una arquitectura que soporte el crecimiento futuro

Principales ventajas y puntos diferenciales de Capgemini

6 aspectos a destacar de nuestra propuesta de valor

1.

Un compromiso con un partner estratégico de largo plazo, que cuida a LDA.

2.

Modelo de Discovery específico centrado en la digitalización de la operativa

3.

Conocimiento y experiencia multi vendor de CRM.

4.

Equipos especializados por dominios de negocio y COE's de CRM

5.

Experiencia probada en acompañamiento para la adopción

6.

Activos sectoriales y tecnológicos concretos que aceleran y reducen riesgo

Enfoque de transformación, End to End

No es una implantación, es un programa crítico de transformación que exige un socio con visión global, criterio para co-decidir y firmeza para gobernar el cambio con foco constante en valor y coherencia.



1.

Transformación con CRM

¿Esto es un proyecto de implantación "grande" o es algo más? ¿Qué tipo de socio tecnológico requiero para ello?

2.

Frentes de Trabajo & Gobierno

¿Cómo logro involucrar a todos los equipos, tomar decisiones informadas, considerar planes dependientes, organizar el trabajo y acelerarlo?

3.

Hoja de Ruta de Desarrollo

¿Qué camino equilibra retornos reales y riesgo?

Enfoque requerido




Overview del proyecto

Transformación CRM: el sistema operativo futuro de LDA

~ 2 años de proyecto. Un plan completo desde Inception hasta despliegue final, sin "big bang" +1 año de garantía

Discovery de **12 semanas** para fijar alcance real y eliminar riesgo. Aterrizamos antes de construir.

Implantación industrializada: ~30 sprints + 2 de Hypercare}. Demos cada **3 semanas**, en entornos preproductivos.

8 Go-Lives que apagan Galgo progresivamente. Migración controlada, con valor creciente.

Primera entrega en ~7 meses desde el inicio de implantación.

+9.000 jornadas para transformar y modernizar la operativa de los ejecutivos de LDA.

Modelo **España + India** que acelera y optimiza el delivery, sin comprometer calidad.

Equipo senior liderando: arquitectura, negocio, UX, integración y gestión del cambio.

Planteamos un **gobierno muy firme:** Se tomarán y cerrarán las principales decisiones críticas durante la Inception.

Involucrar y movilizar al usuario es crucial. El éxito dependerá de su adopción: el 70% de los programas falla por resistencia de usuarios y falta de apoyo directivo

02. DISCOVERY / IMPLANTACIÓN / METODOLOGÍA



Carlos Ruiz

Senior Manager Experto en Seguros y Transformación



Ricardo Leal

CX - Responsable de la práctica CRM



Alfonso Santolalla

CX - CTO España





Conocemos cuales son los retos para el sector asegurador desde una perspectiva tanto de negocio como tecnológica

Retos



Legado tecnológico y ecosistemas complejos
Sistemas in house difíciles de integrar con plataformas cloud y fuertes dependencias con sistemas core.

Cliente más exigente y expectativas digitales altas
Que cada interacción empiece donde quedó la anterior.

El Contact Center como "corazón" del negocio
Importancia de alinearse con KPIs y SLAs del Contact Center.

Modelo operativo altamente digitalizado
Procesos que funcionen de forma fluida, sin pasos manuales innecesarios. Foco en "Digital Experience"

Exigencia regulatoria y necesidad de control
El CRM debe garantizar cumplimiento (datos, consentimiento, trazabilidad, documentación) desde la primera interacción.

Palancas



Arquitectura de Integración y Modernización Progresiva
Ir hacia modelo API first, adoptando entornos híbridos cloud + legacy permitiendo evolución gradual sin riesgos y sin romper la operación del día a día.


Visión Única del Cliente (360º Multicanal)
Disponer de un histórico completo de cualquier gestión/interacción con el cliente para dar contexto al agente de cualquier interacción con dicha cuenta. Esto puede potenciar acciones de S2S y cross-selling.

Contact Center integrado
Definir KPIs en CRM y dashboards para supervisión operativa. Automatizar pasos repetitivos mediante flujos guiados para reducir TMO y reforzar FCR.

Procesos orientados a "Digital First"
Alinear y rediseñar procesos repensándolos y orientándolos al cliente. Automatizar tareas: validaciones, creación de casos, notificaciones, actualizaciones de póliza, etc.

Cumplimiento Normativo y Trazabilidad End-to-End
Establecer un modelo de control y trazabilidad que permita cumplir normativa de forma consistente, reducir riesgos y asegurar que cada interacción con el cliente queda correctamente registrada y auditada.

Nuestro enfoque parte del negocio y la operativa hacia la tecnología que habilitará el nuevo CRM

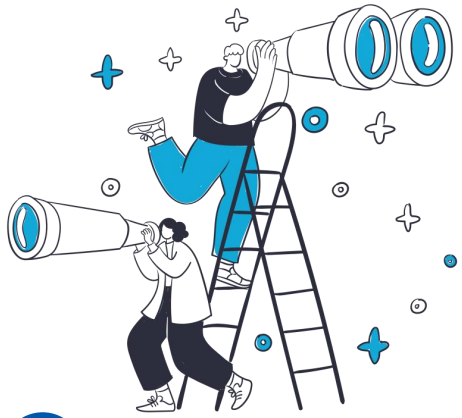

1

Preparación y entendimiento


Radiografía integral del modelo organizativo, operativo y tecnológico para identificar procesos, stakeholders y los principales gaps y pain points de la compañía.



2

Validación del modelo to be


Definición de un modelo que prepare a Línea Directa para un nuevo CRM, garantizando una experiencia óptima y una visión 360º del cliente con foco en eficiencia y excelencia en el servicio.



3

Planteamiento de solución y roadmap

Convertimos el modelo To-Be y los requisitos de Línea Directa en historias de usuario con criterios de aceptación, listas para diseñar un CRM integrable con el core asegurador y desplegarlo por sprints con una planificación cerrada.




4

Validación de funcionalidades

Diseño de pantallas UX hi-fi en Figma para validar funcionalidades antes del desarrollo y testarlas con agentes del Contact Center, asegurando casos de uso validados antes de cada Go-Live.

Comenzaremos con un Set Up y entendimiento situación de partida

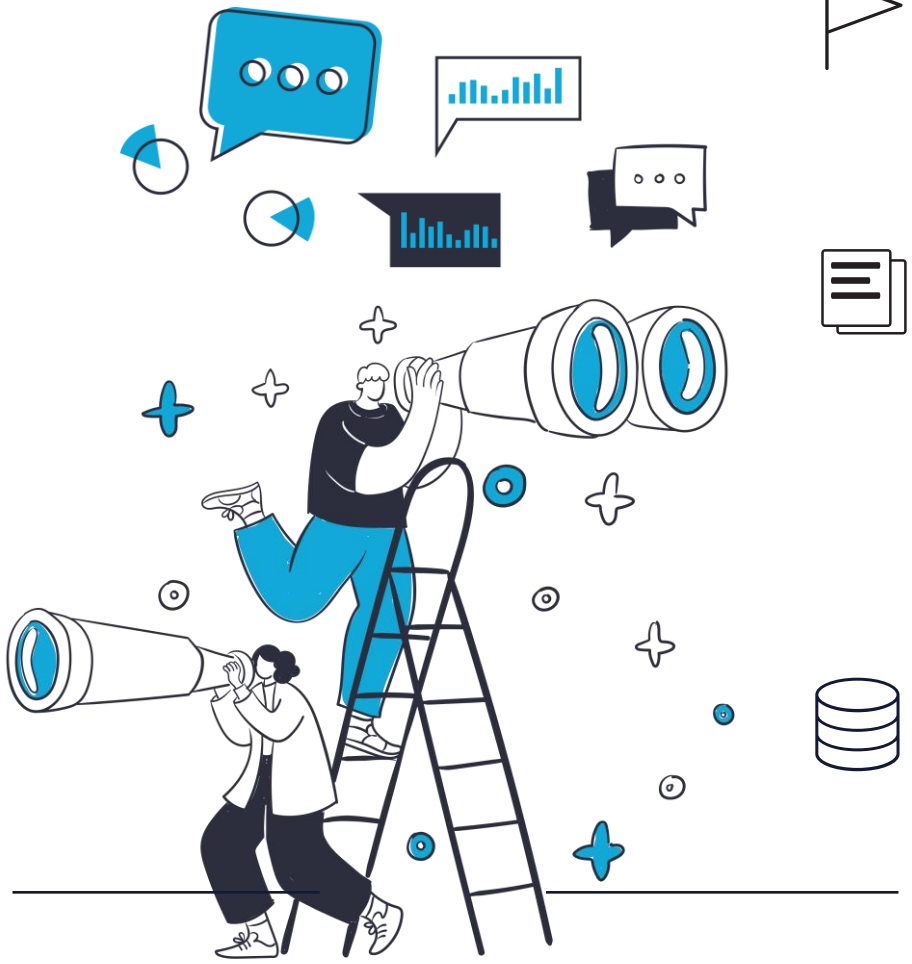

Semana 0: Set-up del proyecto

- Preparación previa
- Planificación detallada de kick-off y workshops


Entendimiento Modelo Organizativo y Operativo

- Sesión de entendimiento del modelo organizativo actual
- Análisis de flujos, KPIs y volumetrías para la evaluación del impacto del modelo TO-BE


Arquitectura y datos

- Sesiones de mapeo para entender el modelo operativo actual
- Identificación de los sistemas implicados y sus integraciones actuales
- Identificación de puntos de mejora y pain points


Entregables



DOCUMENTO AS IS TÉCNICO

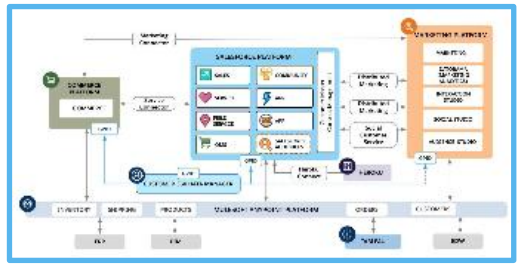


MAPA DE ARQUITECTURA AS IS

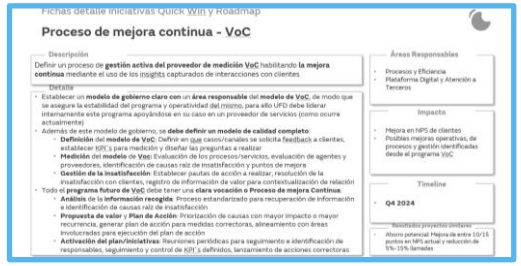

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MEJORA

Haremos “challenge” y Co-Diseñaremos el futuro CRM con las mejores practicas de negocio y tecnología






Entendimiento de necesidades

- Identificar elementos estratégicos para el modelo futuro
- Validación del nuevo modelo TO BE
- Analizar los requerimientos definidos por negocio y validar su viabilidad técnica


Definición del Modelo To be funcional

- Implicaciones en modelos organizativo y operativo
- Mapeo de requerimientos
- Planteamiento de casos de uso
- Validación del modelo TO BE funcional


Entregables

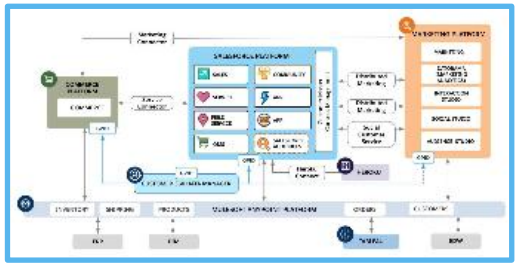

FLUJOGRAMA

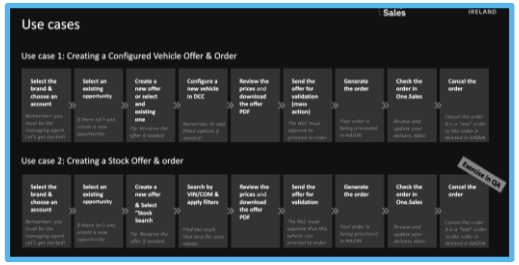


CASOS DE USO

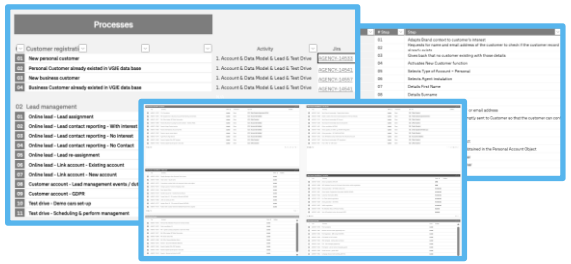

MAPEO DE REQUERIMIENTOS

Construiremos junto con Línea Directa la solución To Be con el mejor fit en el ecosistema tecnológico






Planteamiento de la solución TO BE

Planteamiento de la solución TO BE en la herramienta CRM seleccionada por LDA


Arquitectura

Apoyar en el diseño de la arquitectura TO BE incluyendo integraciones necesarias y modelos de transición


Entregables



MAPA DE ARQUITECTURA TO BE



PROPUESTA DE COBERTURA DE REQUERIMIENTOS y GAPS



RECOMENDACIONES TÉCNICAS



INVENTARIO DE SISTEMAS Y PUNTOS DE INTEGRACIÓN


Detallaremos la solución futura a nivel operativo y técnico para sentar unas bases sólidas para la construcción





Traslado de requerimientos a historias de usuario*

- Planteamiento de la solución TO BE en la herramienta CRM seleccionada por LDA
- Generación de especificaciones técnicas*
- Listado de puntos de integración (API Calls)*

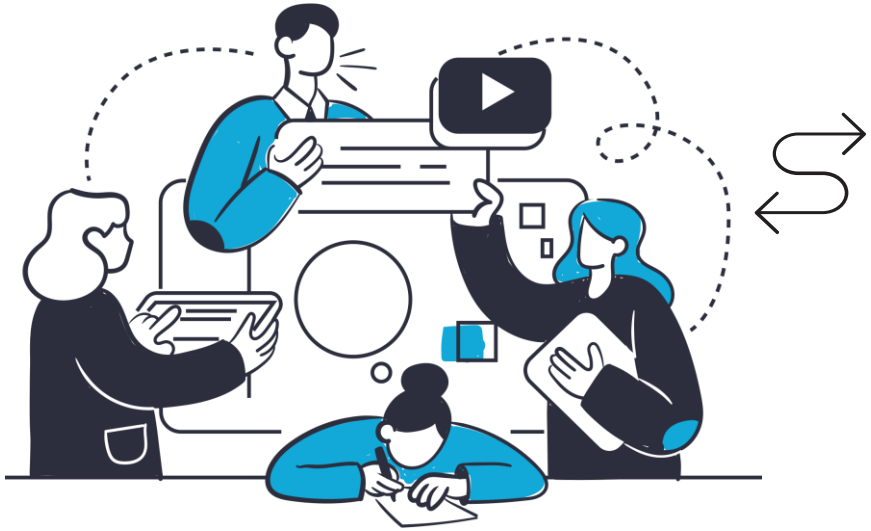


Definición del roadmap de implantación

- Priorización de historias de usuario y calendarización*
- Definición de roadmap
- Ajuste económico de las siguientes líneas de trabajo

Entregables



HISTORIAS DE USUARIO



DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




LISTADO DE PUNTOS DE INTEGRACIÓN



ROADMAP

El diseño nos permitirá el máximo alineamiento con PO`s y usuarios y mayor eficiencia en la Implantación



Diseño UX

- Creación de Pantallas UX*
- Validación de funcionalidades




Testeo

Realización de test para Validar la usabilidad, adecuación y aceptación del producto con usuarios reales

Entregables

Figma



MOCKUPS



Resultados de los tests

Entendemos la complejidad técnica y de integración del futuro CRM

8 sesiones de trabajo.
Decisiones técnicas vinculantes
Entregables de Inception aprobados por LDA antes del inicio de construcción



W1

Arquitectura de Solución CRM + Core Asegurador

SF · D365 · Galgo · Kafka/CDC · API Manager

W2

Genesys CTI: Conector Llamadas + Identificación

Genesys Cloud · CTI · IVR · IA Genesys

W3

Modelo de Datos y Ficha Cliente 360

Ficha 360 · Galgo/DB2 · CDC · Golden Record

W4

Catálogo de Integraciones y Contratos API

~45 conectores · CARFAX · ESRI · Logalty · TPA Salud

W5

Estrategia IA: Einstein/Agentforce vs Copilot/CI

Einstein · Agentforce · Data Cloud · Copilot · Customer Insights

W6

Estrategia de Testing y Criterios de Salida por GL

Copado · Provar · Azure Test Plans · Jira

W7

Estrategia de Migración de Datos por Fase

ETL · DB2 Mainframe · Galgo · Deduplicación

W8

Seguridad, Cumplimiento y Gobierno de Datos

DORA · EIOPA · GDPR · LOPD · SSO/MFA · WAF

DISCOVERY, IMPLANTACIÓN Y METODOLOGÍA

Metodología de implantación

Agile con alcance cerrado y despliegues escalonados



Metodología Agile

Sprints de 3 semanas con ceremonias Scrum, backlog priorizado y demos incrementales que maximizan el control y la visibilidad del avance



Alcance Cerrado por Bloques

Perímetro funcional cerrado por fase; cada bloque es completo y estanco, entregando valor de negocio independiente en cada Go-Live



Despliegues Escalonados

9 Go-Lives progresivos, cada uno precedido de ciclos E2E + UAT dedicados, minimizando riesgo y permitiendo aprendizaje entre entregas



Hypercare desde GL1

Equipo dedicado de soporte post-despliegue activo desde el primer Go-Live, garantizando estabilidad operativa en producción



4 aceleradores disponibles para garantizar la línea de trabajo

01.

ACELERADOR DESIGN-TO-BUILD: FIGMA ↔ SALESFORCE/ MICROSOFT

Acelerador que convierte el diseño UX validado en componentes operativos de CRM, reduciendo tiempos, retrabajo y fricción entre negocio, diseño y desarrollo.

02.

ACELERADOR DEV VELOCITY: GITHUB COPILOT + CLAUDE (MODO REASONING)

Acelerador Dev Velocity (GitHub Copilot + Claude): impulsa desarrollo, documentación y pruebas desde el IDE para acortar ciclos, elevar la calidad y acelerar el delivery desde los primeros sprints.

03.

ACELERADOR DE CALIDAD: "QA ASSIST" PARA PRUEBAS Y UAT

Acelerador de Testing Inteligente que automatiza la generación de datos, casos y defectos para reducir tiempos de UAT, anticipar errores funcionales y asegurar Go-Lives más fiables y con menor hypercare.

04.

ACELERADOR DE OPERACIÓN: "OPS INTELLIGENCE" PARA HYPERCARE Y SOPORTE

Acelerador de Operación Inteligente que agiliza la resolución de incidencias, acelera la estabilización post-Go-Live y convierte cada caso en conocimiento reutilizable para mejorar la eficiencia operativa de forma continua.

03. INTEGRACIONES – ASPECTOS CLAVES TECNOLÓGICOS



Alfonso Santolalla
CX - CTO España



Vicent Rico
CX - Head & CTO of Microsoft Spain



Manuel Esteve
Líder de Soluciones de Integración





Comparativa de alternativas CRM para LDA

Salesforce Core + Service Cloud

Flexibilidad total y rapidez para diseñar procesos CRM a medida

Plataforma ideal cuando se requiere máximo control funcional, time-to-market acelerado y procesos comerciales y de servicio altamente adaptados a la operativa de LDA, sin las restricciones de un modelo asegurador predefinido.

Salesforce Financial Services Cloud (FSC)

Estandarización aseguradora y aceleración funcional desde el primer día

Opción óptima cuando se busca reducir esfuerzo de desarrollo, apoyarse en un modelo de datos asegurador ya probado y disponer de un CRM que ofrece visión 360 coherente y nativa del negocio de seguros, pensando como una aseguradora desde el inicio.

Microsoft Dynamics 365

Ecosistema Microsoft integrado, analítica avanzada y automatización a escala

Propuesta especialmente sólida cuando la organización ya opera sobre Microsoft 365, busca integración nativa extremo a extremo, y prioriza analítica avanzada y automatización low-code apoyada en Power Platform, Customer Insights y Azure, optimizando además el TCO en entornos Microsoft consolidados.

Arquitectura Funcional de Alto Nivel

CAPA CRM — Salesforce / Vertical FSC / Dynamics 365



Sales & Service Cloud
/ Dynamics 365
Customer Service



FS Cloud
/ Dynamics 365
Sales



Platform
/ Power Platform



Einstein / Copilot
(IA Generativa)


Capa de integración



API Manager
(MuleSoft / Azure API
Mangement + Logic Apps)
Real-Time



Apache Kafka / Azure Event Grid + CDC
(Mulesoft Apps /Azure Functions)
Eventos Near Real-Time



ELK + Dynatrace
Monitorización y
Observabilidad

Mainframe (Galgo / DB2)



Core Pólizas
& Siniestros



Motor de
Tarificación

Otros Sistemas LDA



Lakehouse · DB2
Content Mgr
LDAP · Logalty
(Firma Digital)
TPA Salud ·
Pasarela de Pagos

Sistemas Externos



ESRI · CARFAX ·
Axesor · ASNEF
VIP District ·
Bankinter ·
Agregadores
DGT · Catastro

Arquitectura Técnica

CRM Línea Directa Aseguradora SALESFORCE / Vertical FSC

Patrones de Integración

- Galgo → Kafka → MuleSoft → SF (near RT)
- SF → API Manager → Galgo (RT)
- SF → Otros sistemas LDA y externos
- Conciliación
- Telefonía y Marketing



USUARIOS CRM (~2.000)

HTTPS

- Contact Center · Comercial · Supervisores
- Agentes Externos (Experience Cloud) · Consultivos



Marketing (Futuro)

- Adobe Campaign u otro
- Email · SMS · Push



kafka

Bus de Eventos (Near Real Time)

- Tópicos de eventos canónicos – Publicado por CDC de LDA
- (sin adaptación al modelo del CRM)

Suscripción

DLQ

Publicación

Salesforce Platform

Service Cloud · Sales Cloud · Experience Cloud Lightning (LWC) / FSC Cloud · Flows · Apex · Shield (DORA)

Data Cloud (Visión 360 · Segmentación)

Einstein AI / Agentforce

- Predicción · NBO/NBA · Copilot
- Análisis de Sentimiento · Bots
- Resúmenes automáticos de interacciones

Consume datos de Genesys IA

Open CTI · Screen Pop



Genesys Cloud (CCaaS)

- Contact Center · Comercial · Supervisores
- Agentes Externos (Experience Cloud) · Consultivos

API CRM

Plat. Events / Triggers

API Rest

Sync

Apex callout (REST)

Hub de integración Mulesoft

RESPONSABILIDAD DEL INTEGRADOR

Proceso Subscriptor a tópico

Proceso Conciliación

API Manager (real time)

Políticas de seguridad (JWT, cifrado, TLS y autorización)
Rate limiting y Throttling
Logging y Auditoría

API Orquestación, mapeo y transformación

APIs y conectores



Servicios Externos

- ESRI · CARFAX · Axesor · ASNEF
- VIP District · Bankinter · Agregadores
- DGT · Catastro

Petición/respuesta API Rest


Sync



Galgo — Core Asegurador (Mainframe z/OS)

- COBOL/CICS · DB2 · CDC · Tarificadores · Pólizas
- Siniestros · Recibos · Pagos · Master Data

Sistema maestro: datos core y transaccionales



APIs y conectores

Otros Sistemas LDA

- Lakehouse · DB2 Content Mgr
- LDAP · Logalty (Firma Digital)
- TPA Salud · Pasarela de Pagos



Arquitectura Técnica

CRM Línea Directa Aseguradora Dynamics 365



Patrones de Integración

- Galgo → Kafka → Az. Functions → D365 (NRT)
- D365 → API Manager → Galgo (RT)
- D365 → Otros sistemas LDA y externos
- Reconciliación
- Telefonía y Marketing



USUARIOS CRM (~2.000)

HTTPS

- Contact Center · Comercial · Supervisores
- Agentes Externos (Power Pages) · Consultivos



Marketing (futuro)

- Adobe Campaign u otro
- Email · SMS · Push

Dynamics 365 + Power Platform

Customer Service · Sales · Customer Insights
Dataverse · Power Automate · Power Pages
Power BI (Reporting y Dashboards)

Azure AI / Copilot

- Copilot Studio · AI Builder · NBO
- Análisis de Sentimiento · Power BI
- Resúmenes automáticos de interacciones
- Sales Qualification Agent

Consume datos de Genesys IA

Open CTI · Screen Pop

Genesys Cloud (CCaaS)

- CTI · WebRTC · Chat · WhatsApp
- IA Genesys: Transcripción · Resúmenes

API Rest

Sync

Apex callout (REST)

Hub de integración Azure

RESPONSABILIDAD DEL INTEGRADOR



kafka
Event Grid
Bus de Eventos (Near Real Time)

- Tópicos de eventos canónicos –
- Publicado por CDC de LDA
- (sin adaptación al modelo del CRM)

Suscripción

Azure Functions Consumidor de Eventos

- Se suscribe a Kafka · Transforma eventos canónicos
- Mapeo al modelo Dataverse · Errores+reintentos+DLQ
- Empuja datos a D365 vía Dataverse Web API

Data Factory Proceso Reconciliación

API Manager (real time)
Políticas de seguridad (JWT, cifrado, TLS y autorización)
Rate limiting y Throttling
Logging y Auditoría

DLQ

Petición/respuesta API Rest

API

Logic Apps

APIs y conectores



Servicios Externos

- ESRI · CARFAX · Axesor · ASNEF
- VIP District · Bankinter · Agregadores
- DGT · Catastro



Sync




Galgo — Core Asegurador (Mainframe z/OS)

- COBOL/CICS · DB2 · CDC · Tarificadores · Pólizas
- Siniestros · Recibos · Pagos · Master Data

Sistema maestro: datos core y transaccionales

Publicación



APIs y conectores

Otros Sistemas LDA


- Lakehouse · DB2 Content Mgr
- LDAP · Logalty (Firma Digital)
- TPA Salud · Pasarela de Pagos

Arquitectura Técnica — CAPA DE INTEGRACIÓN

La Capa de Integración actúa como elemento desacoplador entre el CRM (Dynamics 365 / Salesforce) y los sistemas core y externos, evitando integraciones punto a punto.

Principios clave:

- ***Separación clara*** *entre canales CRM y sistemas maestros.*
- ***Protección del core asegurador*** *frente a picos de carga del CRM.*
- ***Uso de patrones síncronos y asíncronos*** *según criticidad y latencia.*
- ***Evolución independiente*** *de CRM, core y sistemas externos.*
- ***Gobierno centralizado*** *de seguridad, tráfico y observabilidad.*

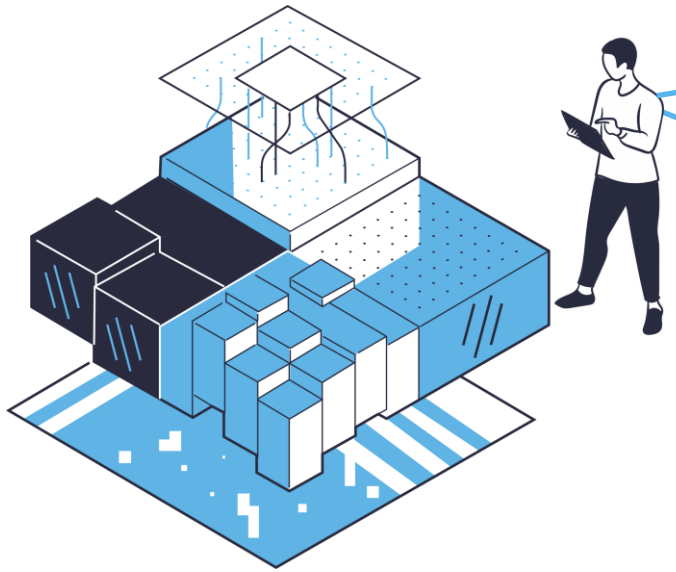

OBSERVABILIDAD Y MONITORIZACIÓN

Observabilidad end-to-end que garantiza trazabilidad completa, alertas proactivas y reducción del MTT.

API MANAGER
real-time

Integración en tiempo real, gobernada y desacoplada

BUS DE EVENTOS
near real-time

Arquitectura event-driven, totalmente desacoplada.

CONSUMIDORES DE EVENTOS
Mulesoft Apps / Azure functions

Adaptar, transformar y entregar eventos al CRM.

RECONCILIACIÓN
Mulesoft Apps / Data Factory

Consistencia de datos garantizada entre core y CRM

Fases

F1: Telefonía + Identificación de Cliente + Ficha 360°

Fase 1 | 5 bloques | S4 – S13



- CTI Genesys integrado
- alta/búsqueda multi-campo
- validadores externos (CARFAX, Axesor, ASNEF)
- deduplicación + SEDA, ficha 360°
- Household potenciado
- dashboard KPIs
- agenda/tareas

F1

DEMO
HOUSEHOLD, CONTACTOS, FICHA 360 Y SALES QUALIFICATION AGENT



Vicent Rico
CX - Head & CTO of
Microsoft Spain

Fases

F2: Ingesta NBO + Cotización Hogar

Fase 2 | 4 bloques | S10 – S17



- Integración modelos NBO/propensión de LDA
- Cotización hogar (coberturas, campañas, descuentos)
- Resumen
- Pasarela pagos unificada PCI
- firma digital Logalty
- Figma HI-FI pre-desarrollo



DEMO
COTIZACIÓN HOGAR



Vicent Rico
CX - Head & CTO of
Microsoft Spain



Fases

F3: Cotización Coches + Verificación + Carrito Multi-producto

Fase 3 | 5 bloques | S17 – S23



- Cotización motor (CARFAX, zona circulación, coberturas)
- Verificación
- Evolución a máquina de estados
- Agenda peritos ESRI
- Multicierre (máx. 5 prod./línea)



Fases

F4: Cotización Motos + Verificación + Doc. Pendiente

Fase 4 | 5 bloques | S23 – S26



- Cotización motos (reutiliza ~60% patrones coche)
- Verificación motos
- Documentación pendiente post-emisión con estados y plazos
- gestión documental DB2 Content Manager via API REST



DEMO
COTIZACIÓN MULTI-PRODUCTO




Vicent Rico
CX - Head & CTO of
Microsoft Spain

Fases

F5: Expats + Suplementos + Upselling / Cross-selling

Fase 5 | 6 bloques | S12 – S27

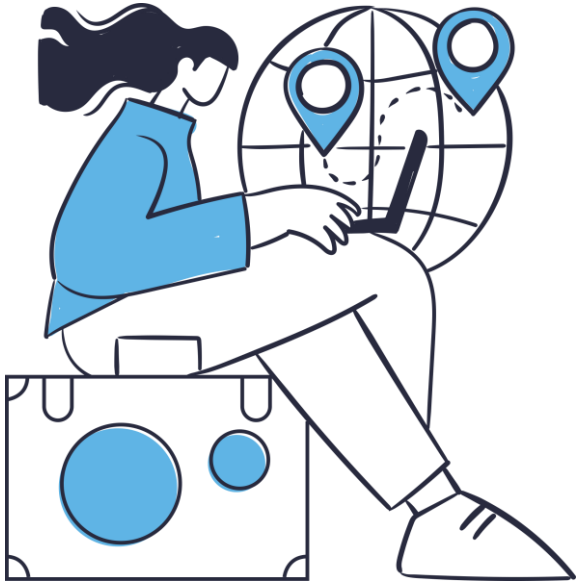

- Multi-idioma (ES/EN/DE)
- suplementos motor+hogar (versionado, renovación, edición simultánea con bloqueo en aceptación)
- upselling/cross-selling con NBO LDA e IA generativa





Fases

F6: Retención + Recibos y Pagos + Recobro

Fase 6 | 4 bloques | S13 – S29




- Ficha retención (pirámide mainframe)
- Validación Adobe Campaign
- Presentación CRM, recibos (generar, diferir, anular, pago tarjeta PCI)
- Recobro (rechazos Kafka, Escalado, Adobe Campaign)



Fases

F7: Cotización Salud + Valoración Médica

Fase 7 | 3 bloques | S18 – S27

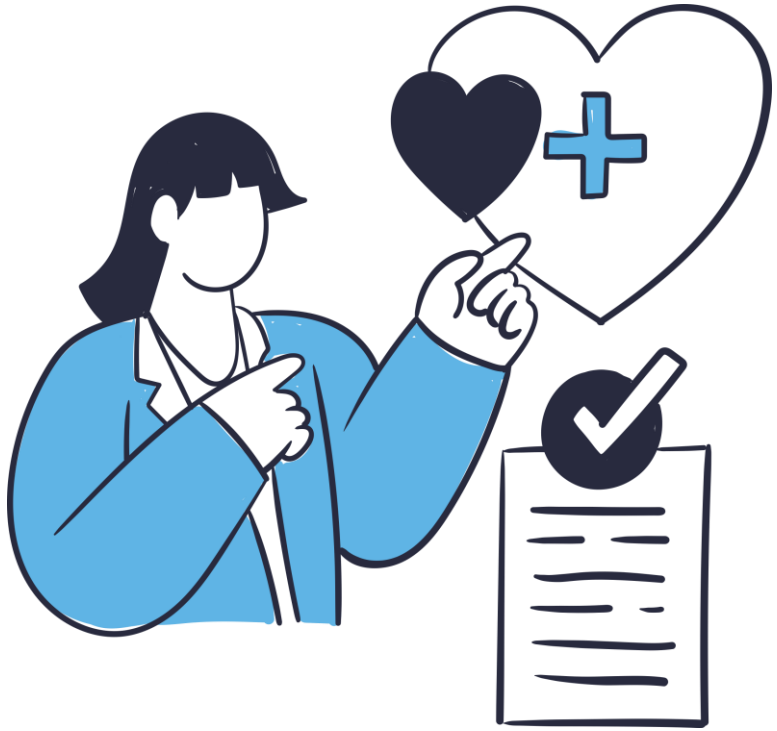

- Cuestionario médico inteligente (IA)
- Datos sensibles GDPR/LOPD con field-level security
- Valoración médica bidireccional con nuevo TPA
- Agenda unificada
- Suplementos salud



Fases

F8: CRM Empresas (B2B)

Fase 8 | 4 bloques | S14 – S22



- Ficha cliente empresa diferenciada (CIF, Axesor)
- Flujos empresa multipóliza, cotización colectiva
- Suplementos empresas
- Operativas B2B diferenciadas de B2C



Fases

F9: Fidelización (Por Ser) + ATC + Omnicanalidad + Portal Partners

Fase 9 | 4+ bloques | S14 – S31



- Programa puntos/beneficios
- Promociones int/ext (VIP District)
- Bankinter (proceso digital nuevo)
- Chat IA + escalado
- Omni-channel Genesys
- Portal Partners (Experience Cloud/Power Pages)



Fases

T: Transversales: Cancel./PNC + Integraciones + IA + Migración + CoE



- Pre-cancelación auto/manual
- ~45 conectores API/Kafka
- API Manager (a proponer)
- Migración completa (incl. leads históricos + exclientes)
- IA nativa CRM
- Mentoring CoE
- DORA desde día 1



Modelo de Convivencia Galgo con el CRM

Principios de coexistencia durante la implantación



Galgo = Maestro de Datos Core

Pólizas, cotizaciones, siniestros, recibos, pagos, datos bancarios y riesgos se mantienen en Galgo como sistema maestro durante todo el proyecto.



CRM = Capa de Relación Cliente

Avisos, aprobaciones, encuestas, reclamaciones, actividades y gestión omnicanal se gestionan íntegramente desde el CRM.



Sincronización Bidireccional RT

Kafka/CDC (Galgo→CRM, near-real-time <5s) y API Manager (CRM→Galgo, real-time). Los usuarios de ambos sistemas nunca ven datos desactualizados.



Transición Progresiva por Go-Live

Cada Go-Live desplaza funcionalidades de Galgo al CRM de forma incremental. Los operadores migran gradualmente sin disrupciones en el servicio.

04. GESTIÓN DEL CAMBIO



Alicia Maria Martínez

Senior Manager Experta en CRM y Adopción






Importancia de la Gestión del cambio

Numerosos estudios nos han enseñado cómo facilitar la transformación dentro de los proyectos de implementación.

CUANDO INICIAR LA HABILITACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

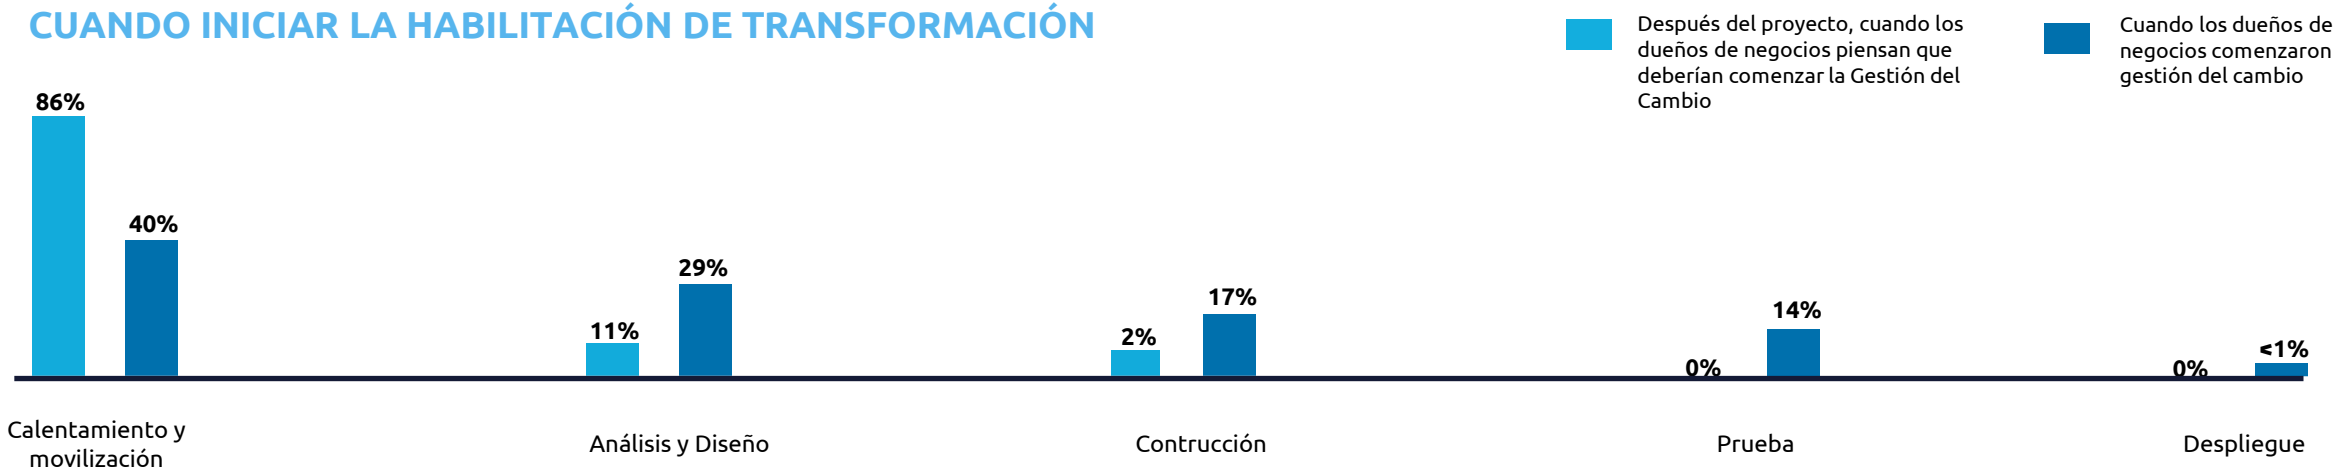

¿La habilitación de la transformación realmente impacta en el ROI?




58%

obtuvo los rendimientos esperados o los superó (Algunos casos hasta en un 200 a 300%)

42%

no cumplió sus objetivos


Razones de fracaso durante los programas de transformación

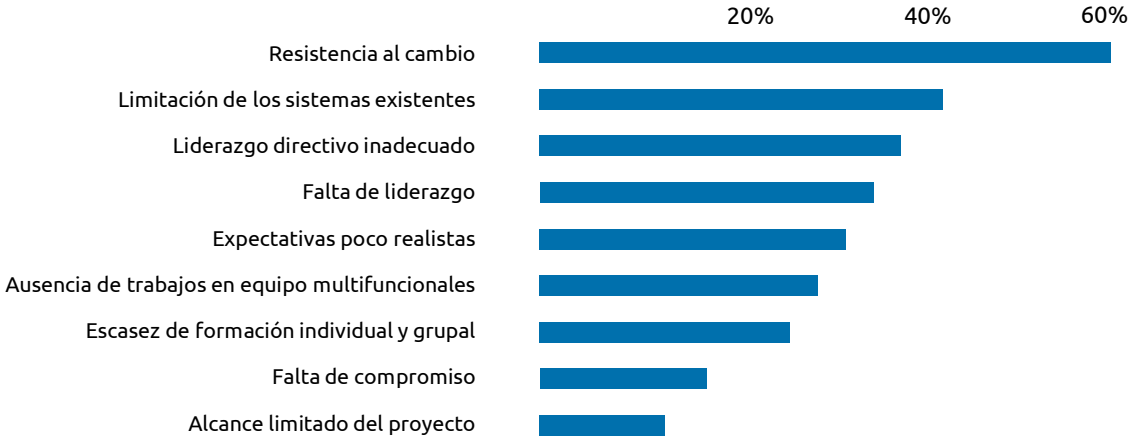

Fuente: CEB 2015 Change Readiness Survey, Prosci 2014 Benchmarking Data y "Helping Employees Embrace Change" en McKinsey Quarterly 2002 Number 4, por Jennifer A. LaClair y Ravi P. Rao

Etapas de la adopción

Tenemos identificadas las diferentes etapas en la gestión del cambio, así como las palancas necesarias para avanzar al siguiente estadio

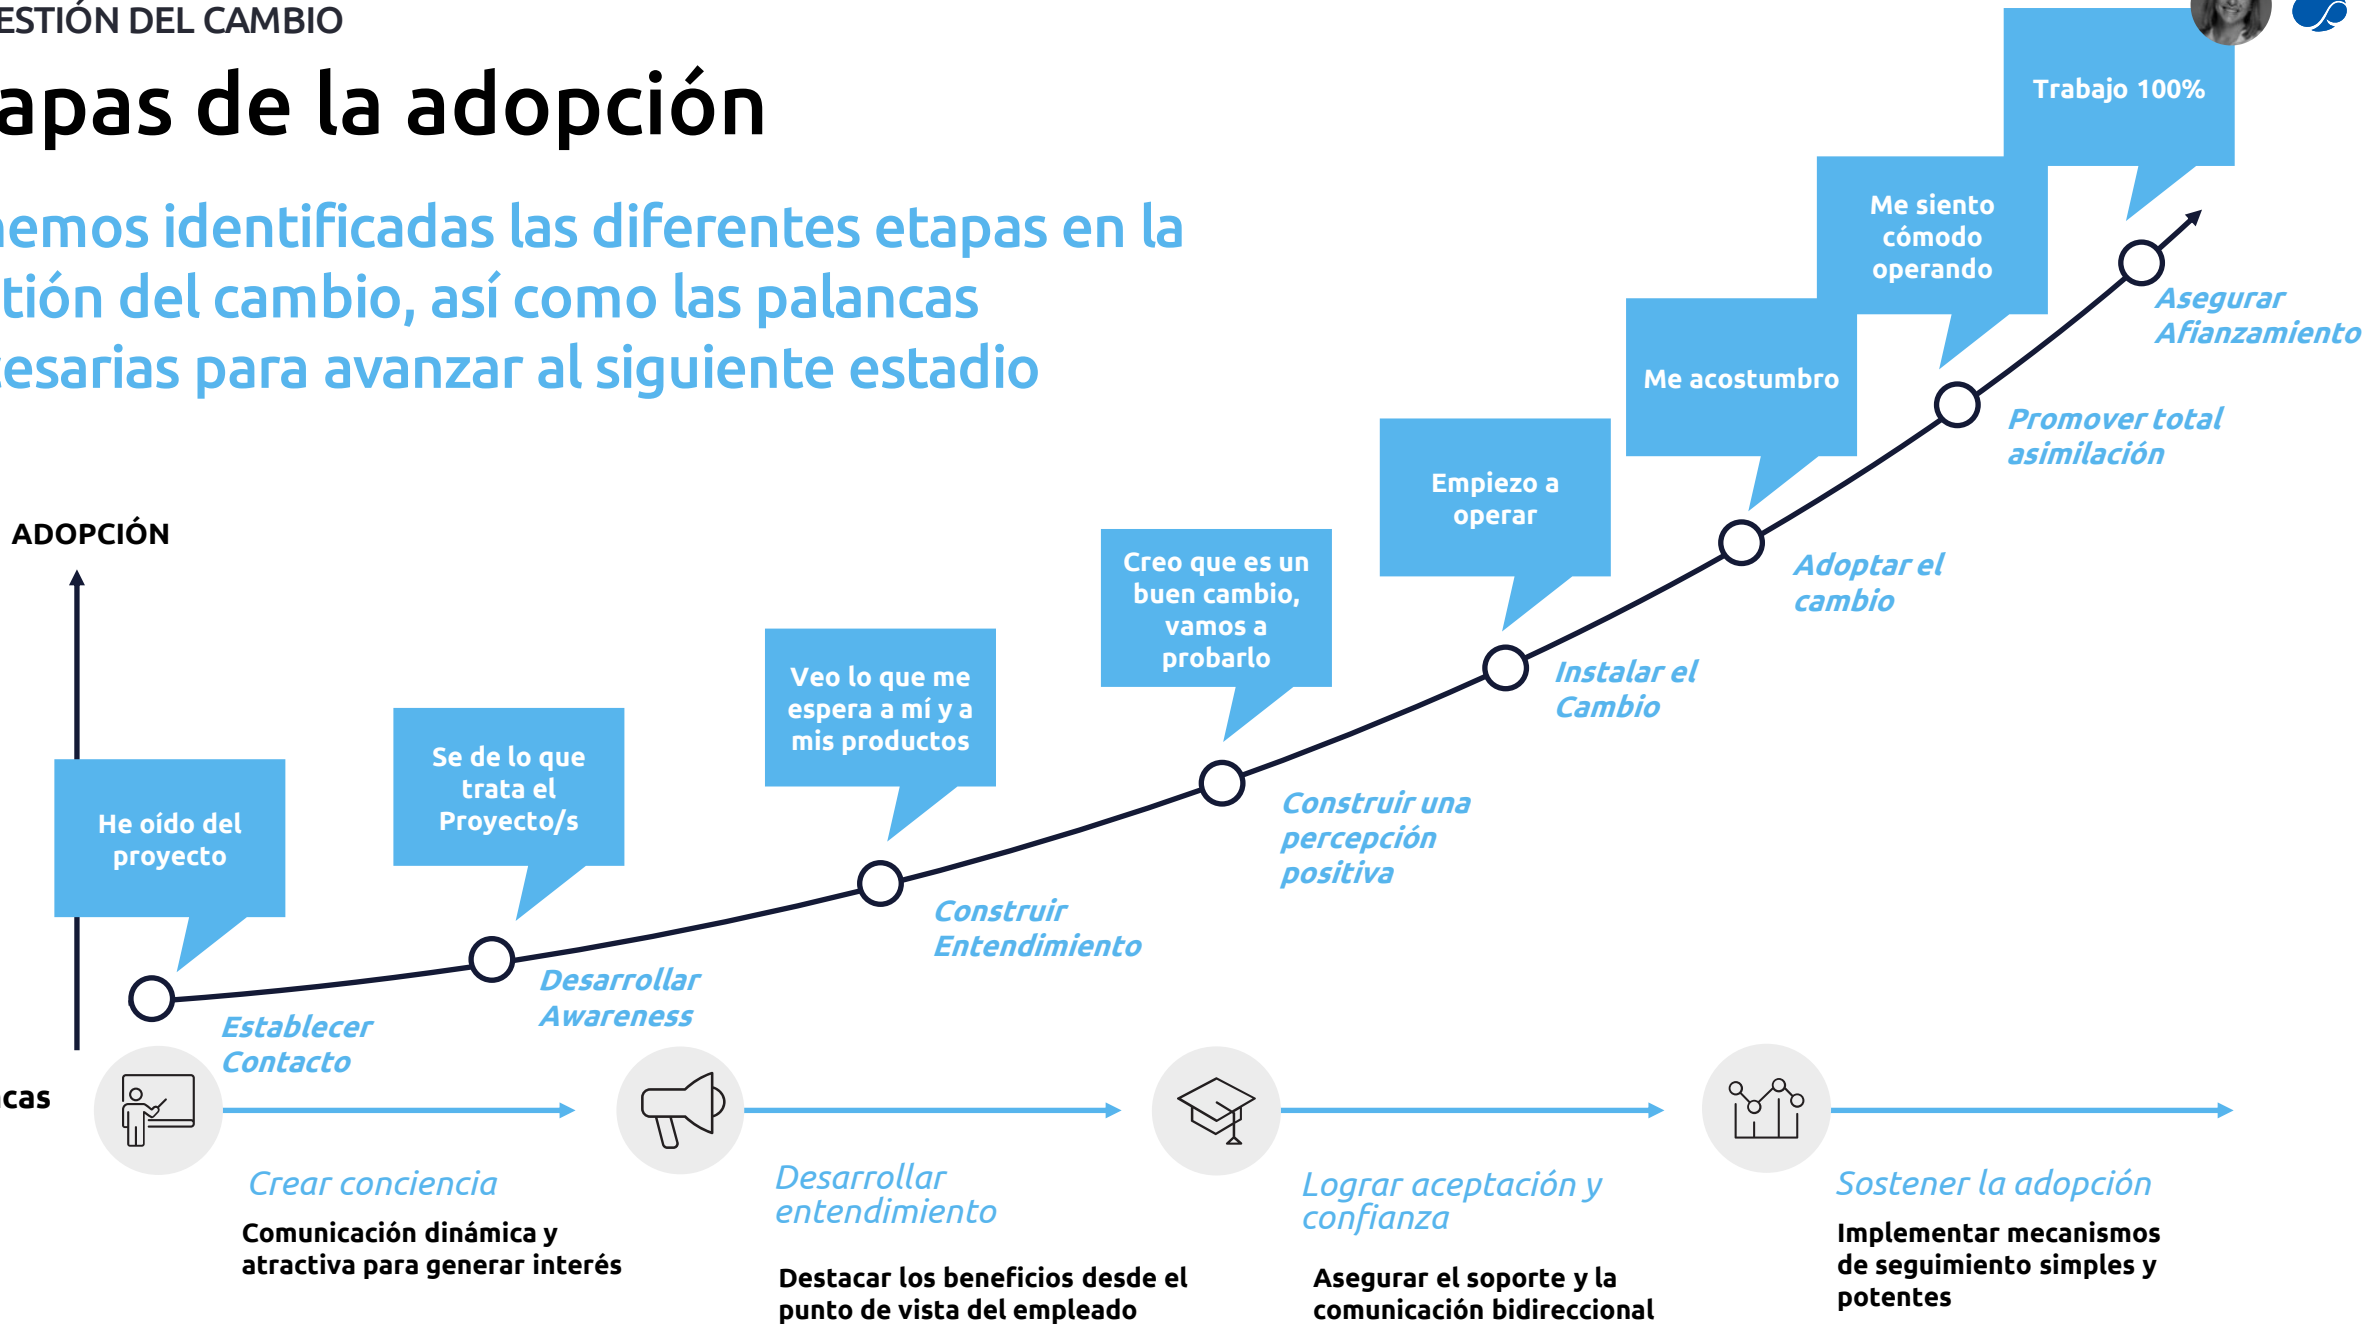



Estructuramos la Gestión del Cambio en 4 ámbitos de actuación que cubren las diferentes etapas de la adopción

Objetivos

ANÁLISIS Y VISIÓN DEL CAMBIO

Crear conciencia

Definición y alineación de una visión compartida del cambio, identificando stakeholders, gaps y modelo futuro para impulsar una estrategia integral del nuevo modelo CRM.

COMUNICACIÓN

Desarrollar entendimiento

Impulsar una gestión del cambio efectiva, alineando roles, comunicación y liderazgo para generar compromiso, engagement y momentum en toda la organización.

FORMACIÓN

Lograr aceptación y confianza

Asegurar la adopción del nuevo modelo mediante formación efectiva, desarrollo de capacidades, cambio de mindset hacia el cliente y un soporte estructurado alineado con el modelo de Hypercare.

MONITORIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Sostener la adopción

Medir y gobernar la adopción del cambio mediante KPIs, seguimiento continuo, feedback estructurado y priorización de acciones para asegurar impacto y mejora continua.



Análisis de impacto del Cambio | Matriz SHOC

Se muestra la metodología de la Matriz SHOC que se ha utilizado para llevar a cabo las entrevistas a los stakeholders clave del proyecto.

Matriz SHOC

Sistemas y Herramientas

3.1 ¿Cómo le modifican/impactan el nuevo modelo en sus sistemas y herramientas diarias?


3.2 ¿Cómo de diferentes son las herramientas que debe utilizar para cada negocio?

Competencias

1.1 ¿Requiere su rol **habilidades categorizadas como soft skills** (trabajo en equipo, comunicación, gestión del tiempo…) no desarrolladas hasta el momento?

1.2 ¿Requiere su rol **conocimientos sobre el nuevo modelo** *(por ejemplo nuevos conceptos, etc.)?*

1.3 ¿Son necesarios **conocimientos en herramientas o sistemas nuevos** *(por ejemplo Microsoft Dynamics, Salesforce Sales, Service, modificaciones en otras herramientas, etc.) ?*

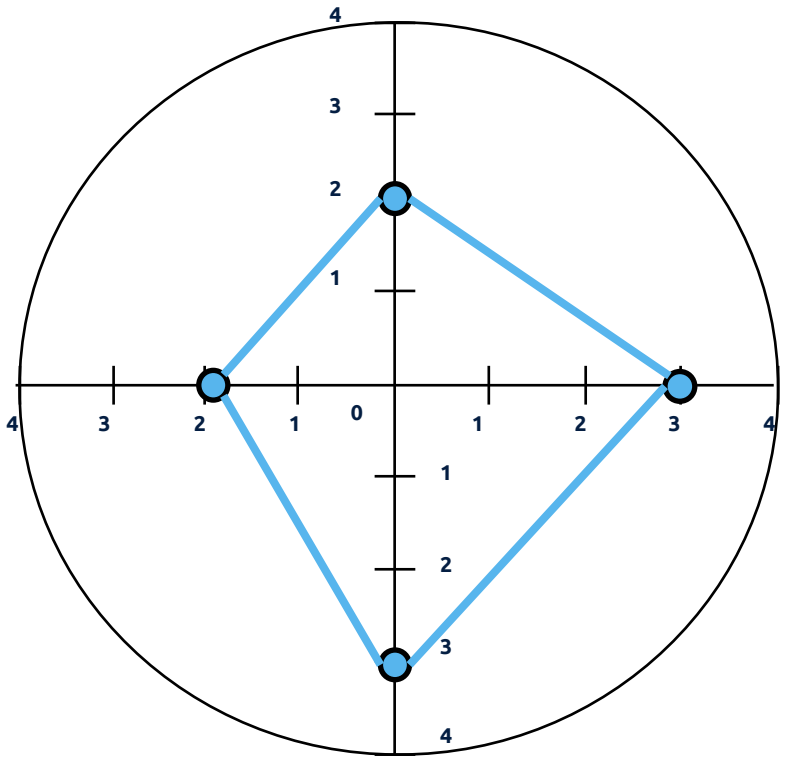

Hábitos y Cultura

4.1 ¿Hasta qué punto tendrá que cambiar la **mentalidad de los Stakeholders?**

4.2 ¿Requerirá un cambio en las formas de trabajar o en la **cultura del área de negocio**?

4.3 Los comerciales funcionan por objetivos. **¿Cuánto afecta el cambio al modelo de retribución por objetivos?**

Organización y Procesos

2.1 ¿Implica un cambio en cuanto **estructura organizativa de la que depende?**

2.2 ¿Contempláis un **nuevo modelo de relación** (ej: nuevos interlocutores)?

2.3 ¿Qué grado de **cambio de los procesos** supone el nuevo modelo?

2.4 ¿Son necesarias **incorporar nuevas tareas o actividades** en su día a día?

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1: No Impacta **2: Bajo** **3: Medio** **4: Alto**



Definición de roles del Cambio

Definimos las habilidades, rasgos, disponibilidad y responsabilidades que conforman cada uno de los perfiles necesarios para una Gestión del Cambio existosa

09. GESTIÓN DEL CAMBIO Y ADOPCIÓN

Red de Embajadores |Líneas Estratégicas

Definimos las habilidades, rasgos, disponibilidad y responsabilidades que conforman el perfil del embajador del cambio.

Comunicación

Ilustrativo



Habilidades

Liderazgo	8	Conocimiento Técnico	
Comunicación	9	Colaboración transvers	
Habilidades pedagógicas	7	Gestión del Cambio	

Disponibilidad

Los embajadores deberán contar con el soporte de sus superiores para llevar a cabo las actividades que se planifiquen

- +/- 2 horas / semana dependiendo de su involucración en el proyecto CRM, otros proyectos y las acciones de detalle definidas

Responsabilidades

Comunicación con los pioneros
- Comparte información relevante, novedades, recor actualizaciones…

Recolectar Pain Points
- Comprende las necesidades y painpoints de los usu

CRM Implantación REQ0028484

09. GESTIÓN DEL CAMBIO Y ADOPCIÓN

Red de Pioneros|Líneas Estratégicas

Definimos las habilidades, rasgos, disponibilidad y responsabilidades que conforman el perfil del pionero del cambio.

Comunicación

Ilustrativo



Habilidades

Liderazgo	5	Conocimiento Técnico	6
Comunicación	9	Colaboración transversal	6
Habilidades pedagógicas	6	Gestión del Cambio	8

Rasgos

Gestor de conocimiento	Influencer
Proactivo	Orientado a personas
Tomador de acciones	Motivador

Disponibilidad

Los pioneros deberán contar con el soporte de sus superiores para llevar a cabo las actividades que se planifiquen

- +/- 2 horas / semana dependiendo de su involucración en el proyecto CRM, otros proyectos y las acciones de detalle definidas

Responsabilidades

Comunicación con los usuarios finales
- Comparte información, realizar trainings y sirve como contacto principal

Recolectar Pain Points
- Solicita, recoge y comprende las necesidades y painpoints de los usuarios y los comparte con sus superiores

Promoción del cambio
- Comprende los impactos del cambio y fomenta nuevas formas de trabajar, manteniendo la percepción de los usuarios positiva
- Forma a los usuarios finales en el uso de la herramienta

Generación de feedback informal
- Solicita y recopila comentarios de los usuarios finales para compartirlos con el equipo local

CRM Implantación REQ0028484

110

Plan de Comunicación por rol | Líneas Estratégicas



INFORMAR

- Soy Línea Directa
- Reunión de Seguimiento
- Email comunicación
- Flash News/Flyers
- Videos de Sponsors
- Comunicación en la herramienta
- Video agentes del cambio/pioneros
- Historia del cambio
- Comité de Dirección



UNIR

- Comunidad CRM (Teams)
- Sesiones de update del avance
- Fotos y videos
- Eventos (alineados al plan general):
  - Go-Live (tbd)
  - Celebración fin Release (tbd)



CAPACITAR

- Encuentros en persona
- Onboarding y Kick-Off
- Comunicación de la formación
- Sesiones de training en capacidades, gestión del cambio y soporte
- Formación de la herramienta



TOMAR EL PULSO

- Temperature Check
- Encuestas post-formación



Preparación de formaciones, modelo de bonificación y gamificación



ONBOARDING Y PREPARACIÓN

Preparación de la formación


- Sesión inicial con usuarios piloto para explicar el plan de comunicación del cambio
- Verificación de acceso y login previo para evitar incidencias en la formación



MANUALES Y SESIONES FORMATIVAS

Formación

- Formación práctica sobre la nueva solución por rol
- Recorrido guiado por los casos de uso clave y primeras tareas guiadas
- Modelo de bonificación y gamificación (a validar con Línea Directa)
- Manual de formación y recursos de autoaprendizaje.



SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO

Soporte post Go-Live

- Kioskos de apoyo para resolver dudas
- Acompañamiento en la operativa real
- Banco de Preguntas Frecuentes
- Canal de soporte dedicado para incidencias y consultas



Monitorización|Líneas Estratégicas

Sistemas de gestión. Se debe establecer un mecanismo de gestión que facilite el análisis de los indicadores y la toma de decisiones.

Dashboard

Definir desde el inicio KPIs claros y plasmarlos en cuadros de mando visuales permite detectar desviaciones a tiempo y convertir los datos en decisiones.


Semanal/ Quincenal



Gobierno

Establecer reuniones periódicas con Gestión del Cambio permite revisar KPIs clave, detectar mejoras y activar acciones concretas con pilotos y usuarios de forma continua.

Mensual

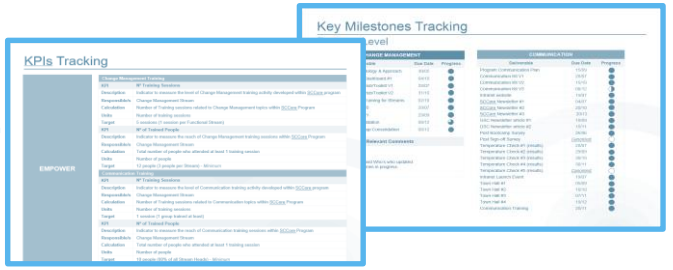

Oportunidades

Activar sesiones colaborativas puntuales permite desbloquear problemas complejos, generar soluciones innovadoras y sumar a las áreas necesarias cuando las acciones no son evidentes.

A demanda según necesidad





05. SOPORTE / TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO



Alicia Maria Martínez
Senior Manager Experta en CRM y Adopción




Ricardo Leal
CX - Responsable de la práctica CRM






Proponemos una salida controlada del Piloto con un traspaso de conocimiento a los formadores de los rollouts

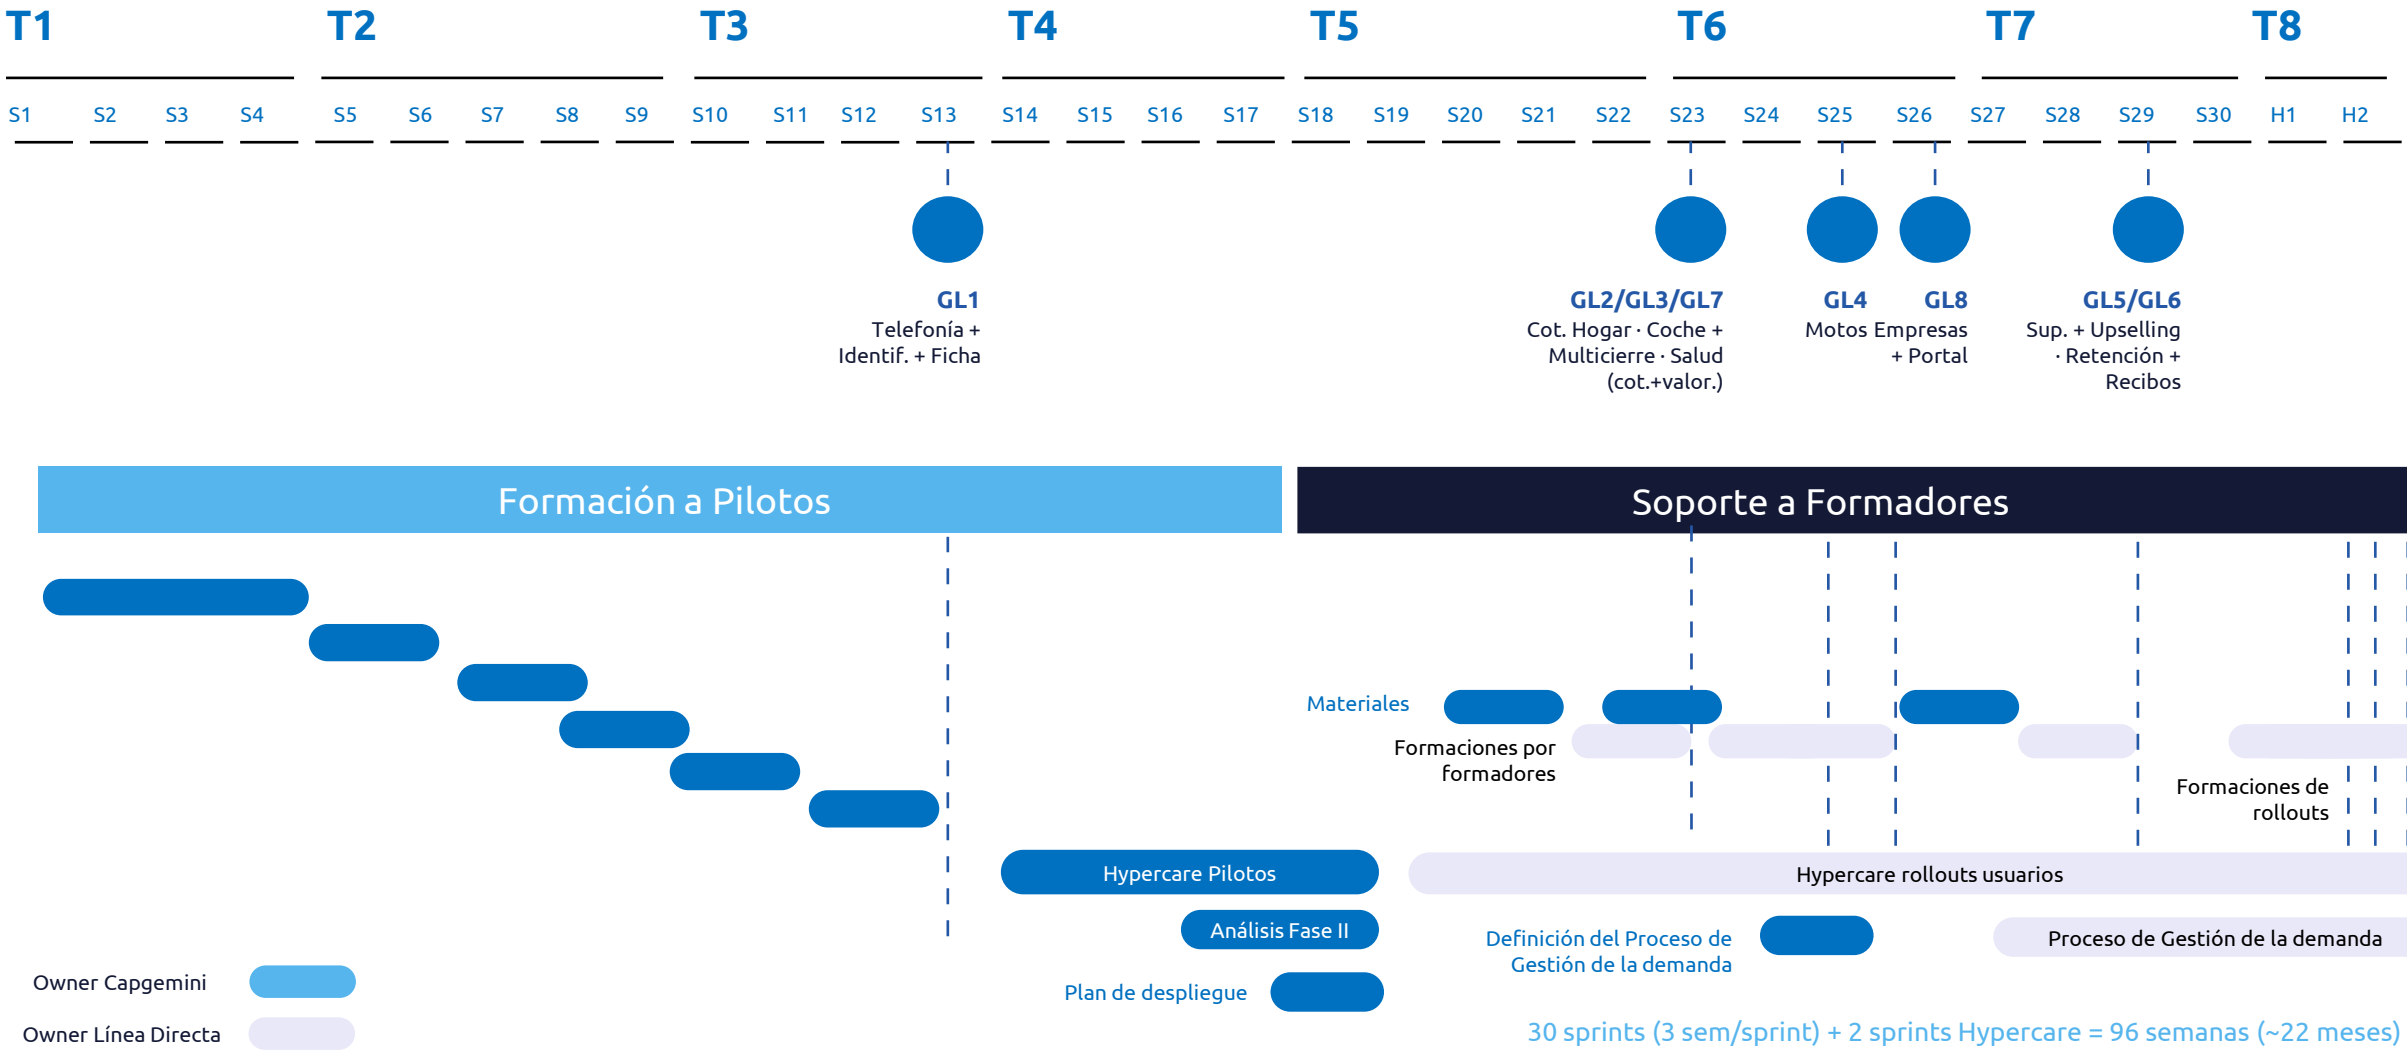

Definimos e implantamos un modelo de Hypercare con 4 niveles de soporte desde el día 1 del Go-live



1. Asistente virtual basado en IA

Chatbot de IA donde el usuario de CC podrá realizar preguntas básicas y que predice incidencias, abriendo emails/tickets al helpdesk.

2. Email de soporte “Helpdesk”

Centralizar la gestión de dudas, bugs y evolutivos mediante un modelo de niveles y herramientas como JIRA garantiza una resolución ágil, ordenada y trazable de cada petición.

3. Resolución de bugs

Integrar la gestión de incidencias en el sprint backlog y priorizar los bugs bloqueantes garantiza una resolución urgente y un delivery continuo sin fricciones.


4. Desarrollo funcional

Canalizar las solicitudes de los usuarios hacia nuevas funcionalidades, formalizadas por los BAs y priorizadas en el sprint backlog, asegura una evolución continua alineada con el negocio.



Definimos también el proceso de soporte a largo plazo, incluyendo una metodología industrializada de monitoreo y coordinación


Proceso de gestión de demanda (Proceso de post-implantación)

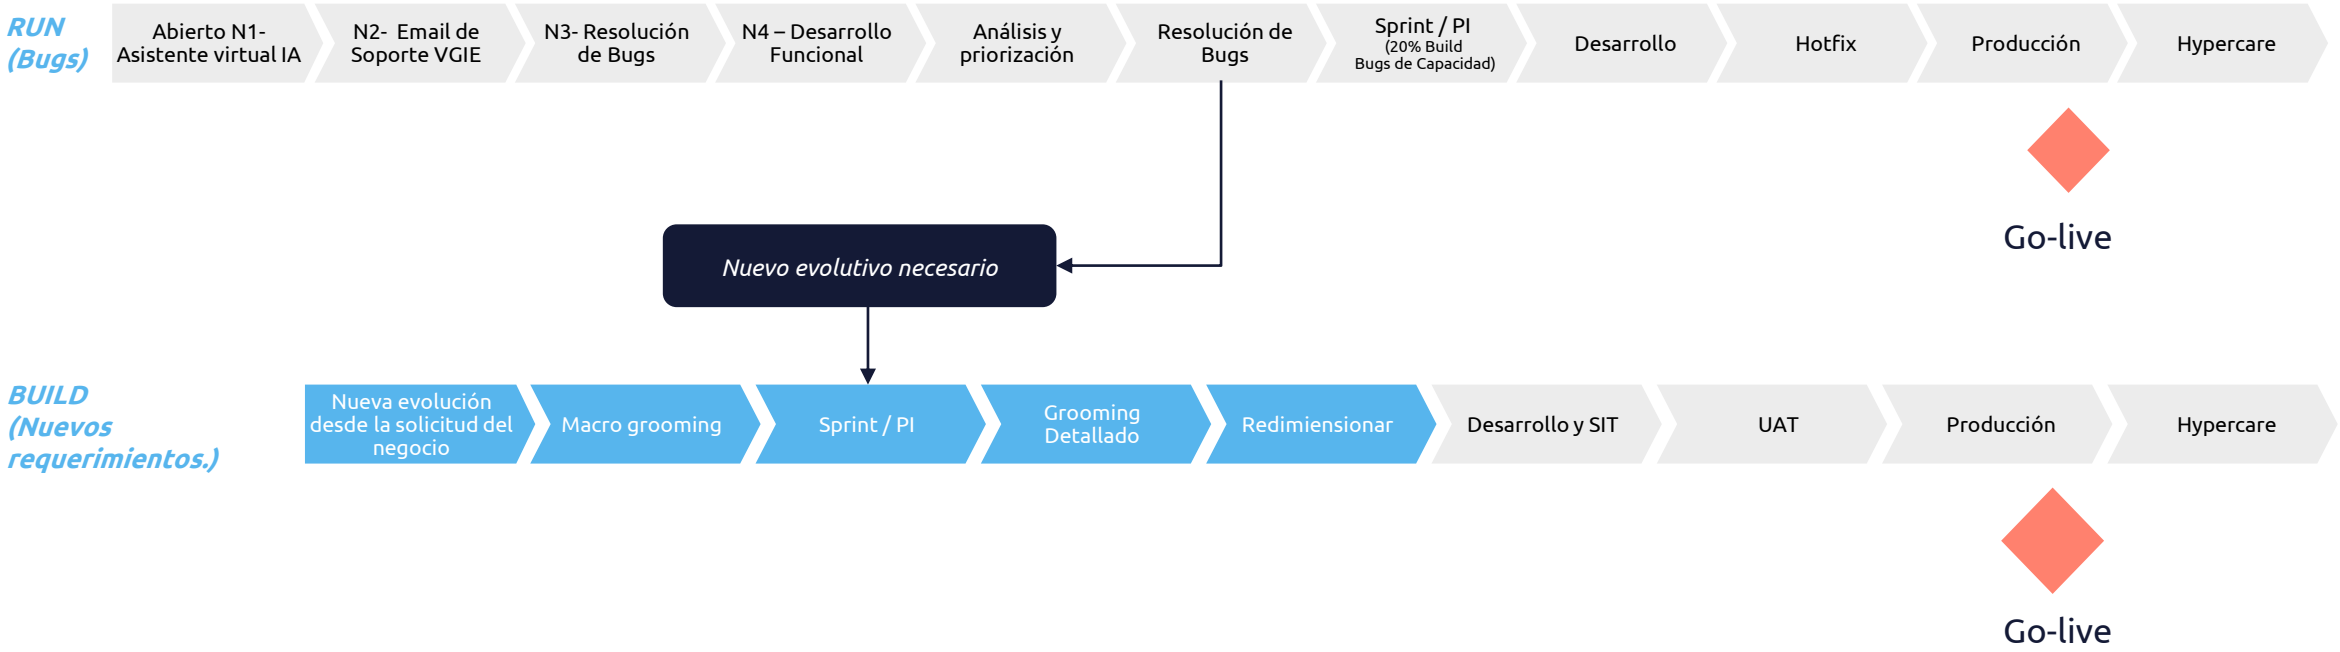

Proceso de gestion de demanda › **Niveles de soporte** › **Priorización de incidentes** › **Monitoreo y reporting**

Transmisión del conocimiento técnico

La importancia de una adquisición de conocimientos efectiva y eficiente

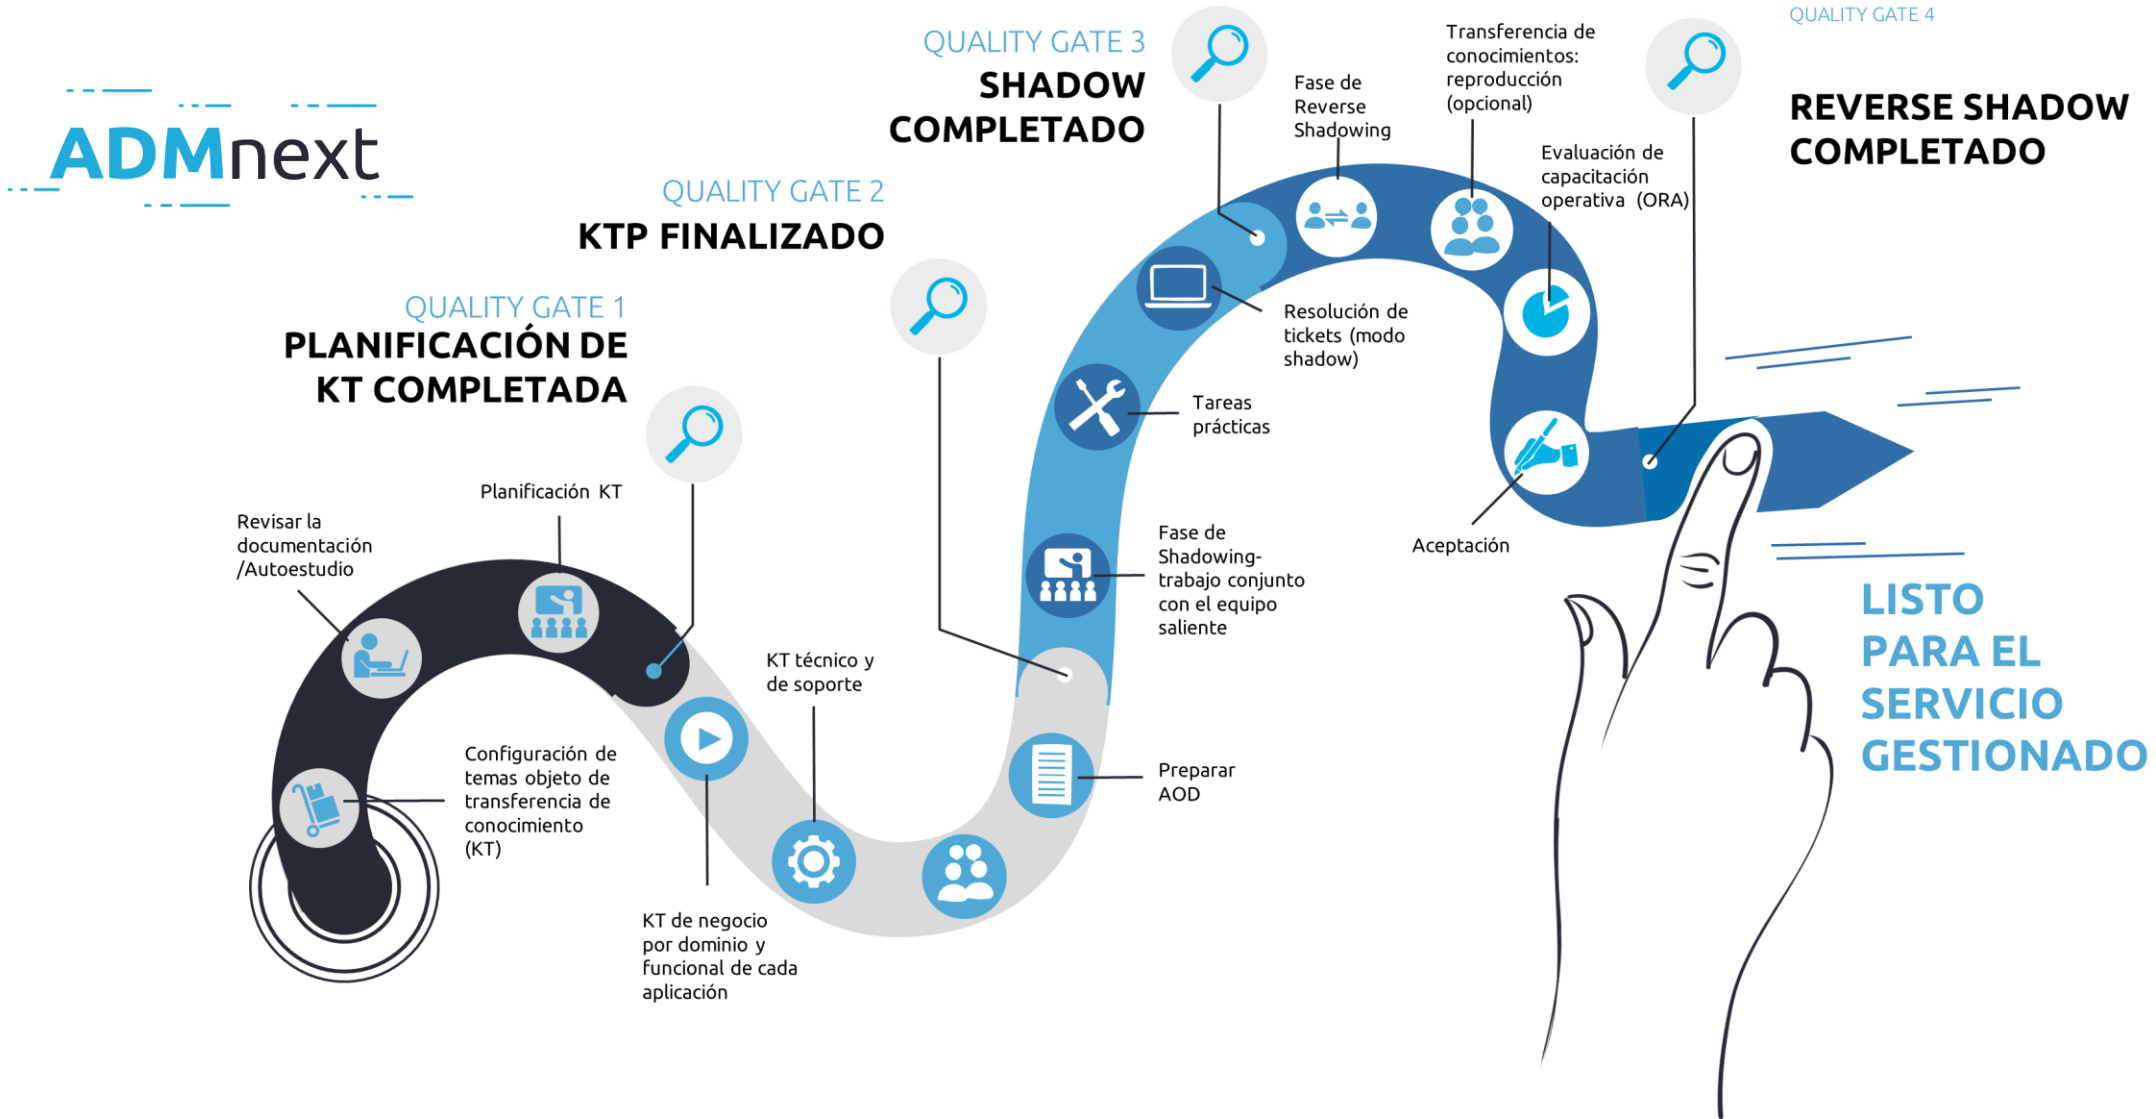

06.

FASES DEL PROYECTO




Ricardo Leal

CX - Responsable de la práctica CRM



Planificación global programa CRM

30 sprints (3 sem/sprint) + 2 sprints Hypercare = 96 semanas (~22 meses)

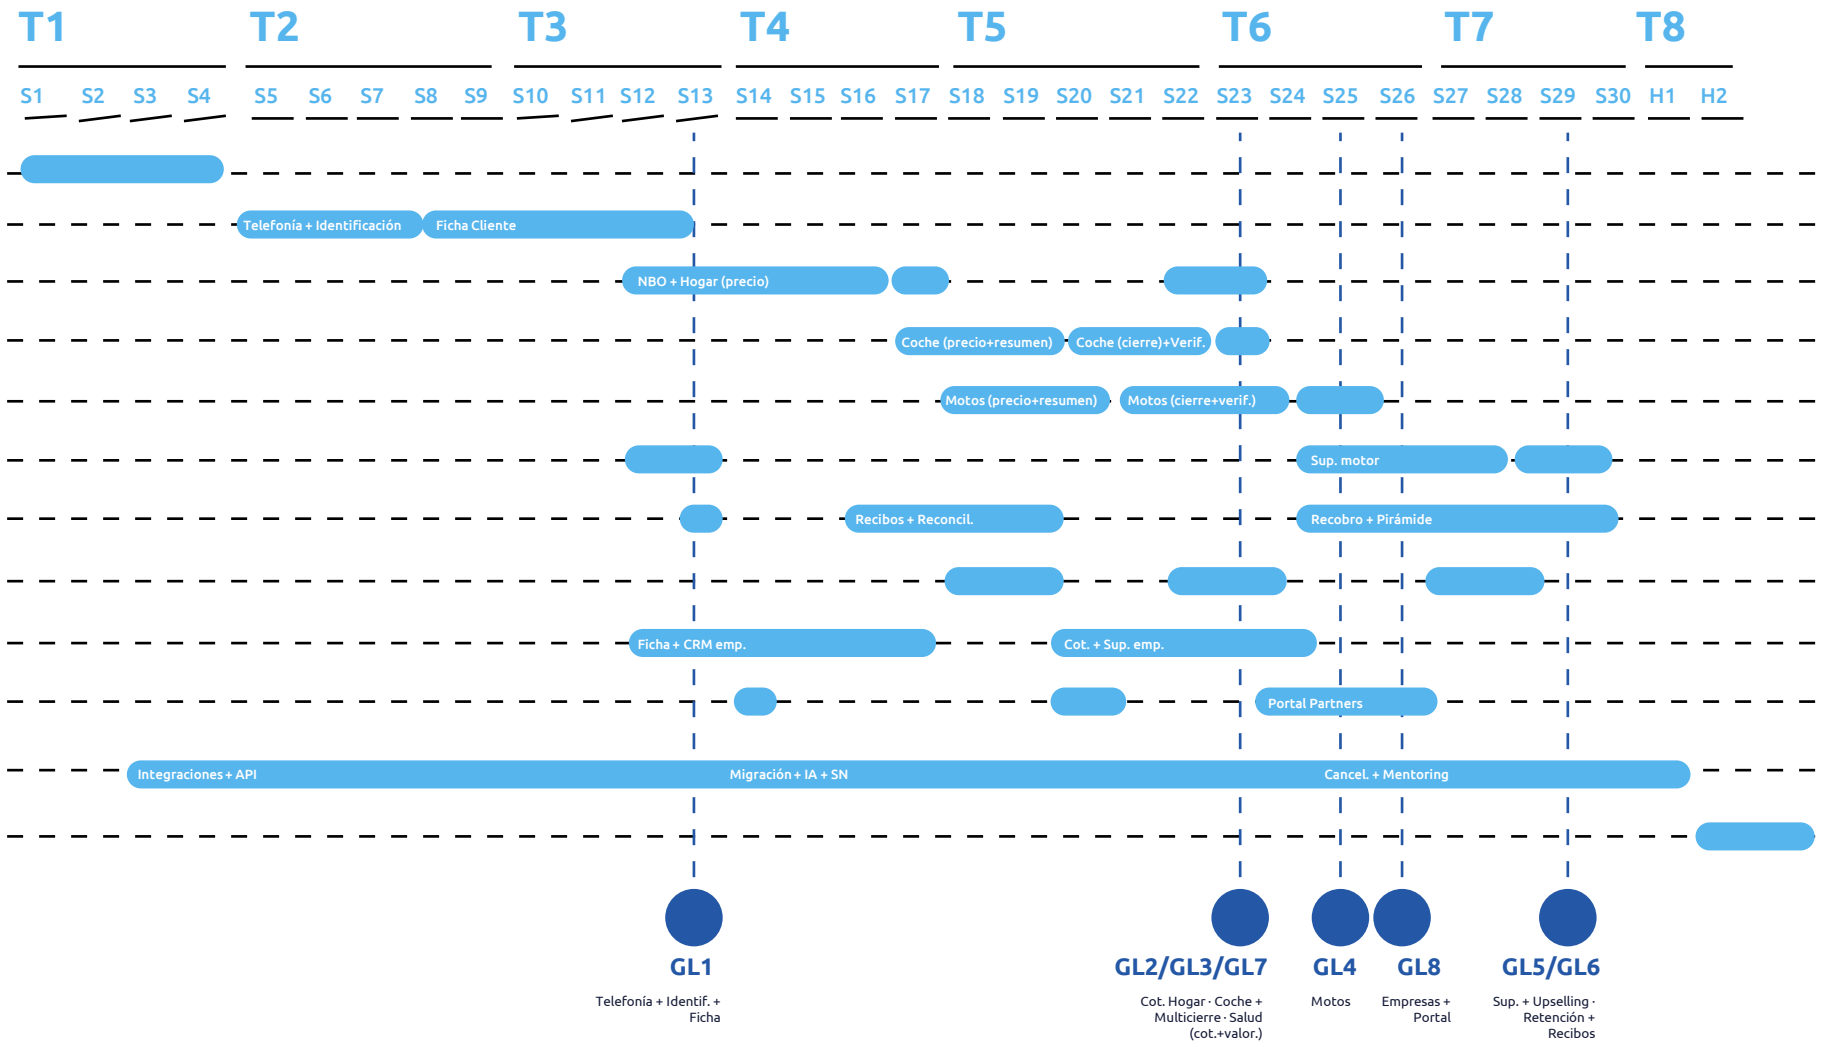




Calendario detallado, hitos, dependencias, cargas de trabajo y rutas críticas

Fases de proyecto e hitos de lanzamiento

Nuestro proyecto está organizado en 10 fases no secuenciales y que optimizan la implementación y despliegue gradual de las distintas funcionalidades, con hitos de puesta en producción autónomos entre si.



GL1

Sprint 13 · Fase 1

Telefonía + Identificación + Ficha Cliente

~Mes 9

GL2/3/7

Sprint 23 · Fases 2, 3, 7

Cot. Hogar + Coche + Multicierre + Salud (cot.+valor.)

~Mes 16

GL4

Sprint 25 · Fase 4

Motos completa (cotización + verificación)

~Mes 17

GL8

Sprint 26 · Fases 8, 9

Empresas + Portal Partners

~Mes 18

GL5/6

Sprint 29 · Fases 5, 6

Suplementos + Upselling + Retención + Recibos + Recobro

~Mes 20

8 Go-Lives progresivos · Entrega incremental de valor · Hypercare dedicado tras cada hito



COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

DIRECCIÓN — X4

- Project Management
- Arquitecto Solución CRM
- Arq. Integraciones / API
- Expertos Negocio CRM

DISCOVERY + GdC — X5

- Consultor Sr. Negocio
- Business Analyst 1 + GdC
- Business Analyst 2 + GdC
- Diseñador UX
- Research & Test Usuario (puntual)

DESARROLLO (España) — X8

- Tech Lead CRM
- 3x Dev. CRM Senior
- 4x Desarrollador CRM

DESARROLLO (right-shore) — X8

- India PMO
- Tech Lead India CRM
- 2x Dev. CRM Senior
- 4x Desarrollador CRM

INTEGRACIÓN (España) — X3

- Tech Lead Integraciones
- Dev Integrador 1
- Dev Integrador 2

DATOS (España) — X2

- Especialista IA / Data
- Data Engineer (Migración)


QA / TESTING (right-shore) — X3

- Tester Senior
- Tester 1
- Tester 2

HYPERCARE (right-shore) — X2

- PRO Support 1 (Hypercare)
- PRO Support 2 (Hypercare)

Planificación, equipo de proyecto y gobierno

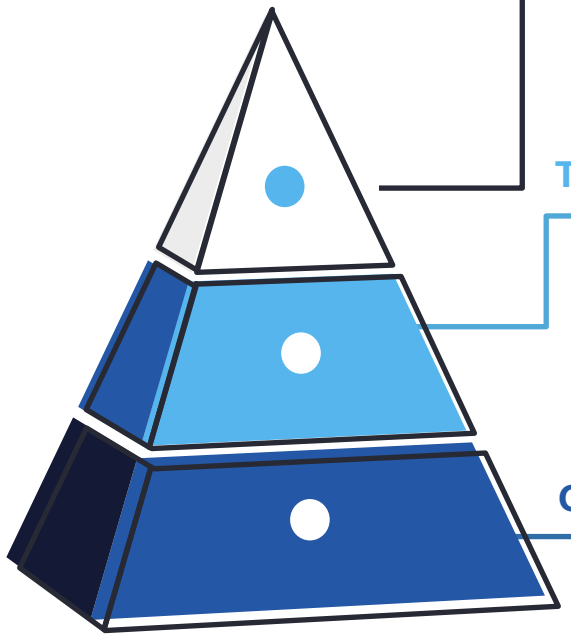

Estratégico (Mensual)

linea directa

- Sponsors del proyecto
- Product Owner (IT Lead)
- Business Leads (Negocio/ Contact Center)

Capgemini

- Responsable PMO

- Revisar los resultados estratégicos del servicio y las propuestas elevadas desde el nivel táctico.
- Tomar decisiones en el caso de discrepancias.
- Revisar la marcha del servicio en el periodo y las posibles propuestas con impacto en el mismo.

Táctico (Semanal)

linea directa

- Product Owner (IT Lead)
- Business Leads (Negocio/ Contact Center)

Capgemini

- Responsable PMO
- Business Analyst
- Líder técnico
- Líder Testing
- Líder integraciones

- Realizar el seguimiento del servicio en base a los niveles acordados.
- Gestionar la demanda y la capacidad del servicio.
- Realizar el análisis y seguimiento económico.

Operativo (Diario)

linea directa

- Product Owner (IT Lead)
- Key User

Capgemini

- Equipo de proyecto

- Coordinar y realizar el seguimiento de las tareas diarias del servicio y de los evolutivos y proyectos en marcha
- Priorizar las tareas.
- Anticipar necesidades y mitigar riesgos.

07.

CASOS DE ÉXITO



Javier Bordetas

VP Head of frog Spain



Alfonso Santolalla

CX - CTO España



Vicent Rico

CX - Head & CTO of Microsoft Spain



Somos expertos en transformación de CRM y Seguros

MUTUAMADRILEÑA



Allianz



SegurCaixa Adeslas



Santander



BBVA




B/S/H/



Mutua madrileña: Selección CRM

Ayudamos a mutua madrileña a elegir a su mejor proveedor de CRM

- Levantamiento de procesos y requisitos
- Gestión y Gobierno de proyecto
- Benchmark “CRMs Best in class”
- Soporte contínuo en Negocio e IT

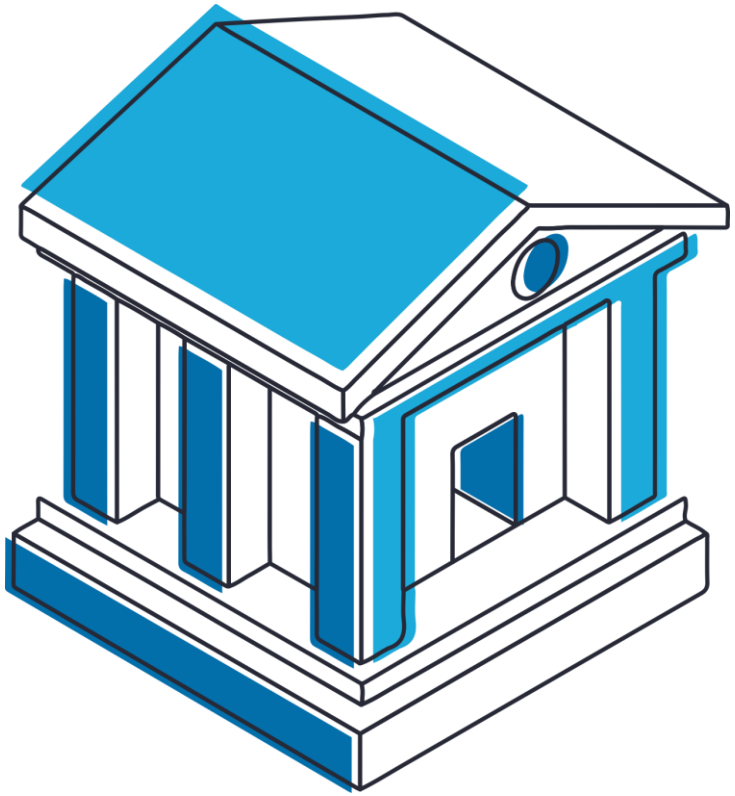

Allianz: Implantación Dynamics

Diseño e implantación de nuevo modelo comercial con Dynamics

+ de 1.000 usuarios red interna y mediada

Mejora operativa sincronización ecosistema Office 365 (Agenda, Correo, PBI, etc.)

Digitalización E2E dinámica comercial y proceso de ventas

Capacidades a futuro de forecasting comercial



SegurCaixa: Implantación Salesforce

Rediseño, Implantación y Adopción del nuevo CRM


SegurCaixa Adeslas

+300 usuarios en Ventas y CC

Adopción del CRM a los procesos de Negocio

Sales, Service & MKT Cloud

Adopción de los usuarios en menos de 6 meses

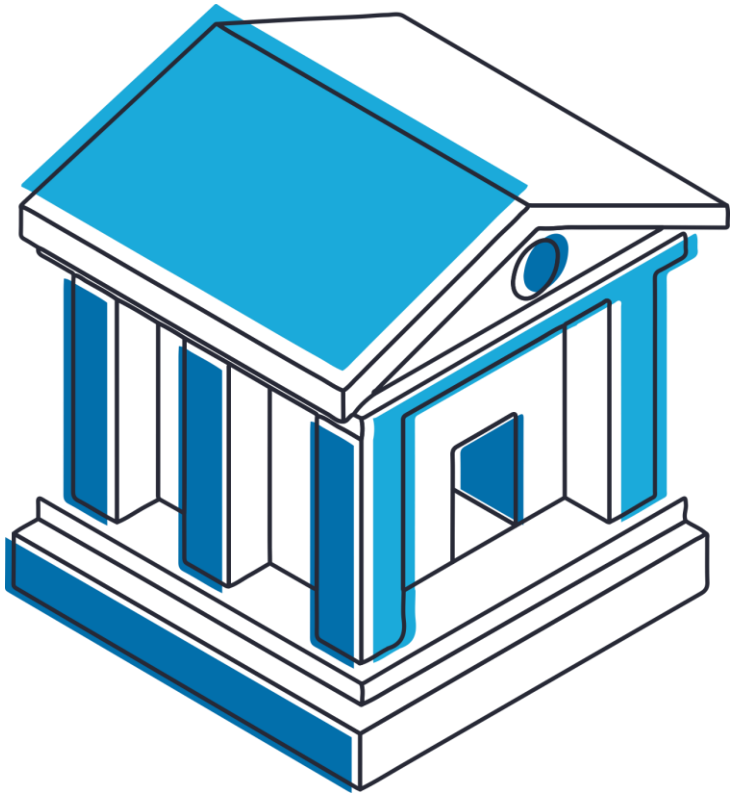

BBVA: Diseño Estratégico

Diseño de CRM para gestores comerciales

Research intensivo con gestores para detectar pain points y prioridades reales.

Adopción rápida de Salesforce estándar, maximizando valor sin sobrepersonalizar.

User stories y prototipos validados con negocio y usuarios, asegurando alineación y usabilidad

Solución útil y eficiente, integrada en el día a día de los gestores y con alto nivel de uso.



Covea: Implantación Dynamics

Única plataforma internacional de Contact Center de clientes

Modernizamos la atención al cliente sustituyendo el legacy por Microsoft Dynamics Service Workspace, logrando una experiencia de agente 100% unificada, multipaís, totalmente integrada con Genesys como CTI.

Integración CTI Genesys

3 países, misma base

+27% productividad del agente

-12% AHT

Santander



BSH: Implantación Dynamics

Única plataforma internacional de Contact Center de clientes y Técnicos de Campo

Implantación de Dynamics 365, unificando la gestión de casos, planificación de servicios y procesos logísticos en un modelo operativo común, mejorando la eficiencia del centro de contacto y servicio de campo mediante automatización, integración omnicanal y visibilidad extremo a extremo, incluyendo integración con CTI.


+30 Países

+100 integraciones con sistemas Legado

+10.000 usuarios CC + Instaladores

Arquitectura 4MM de interacciones al año en cada país.

B/S/H/

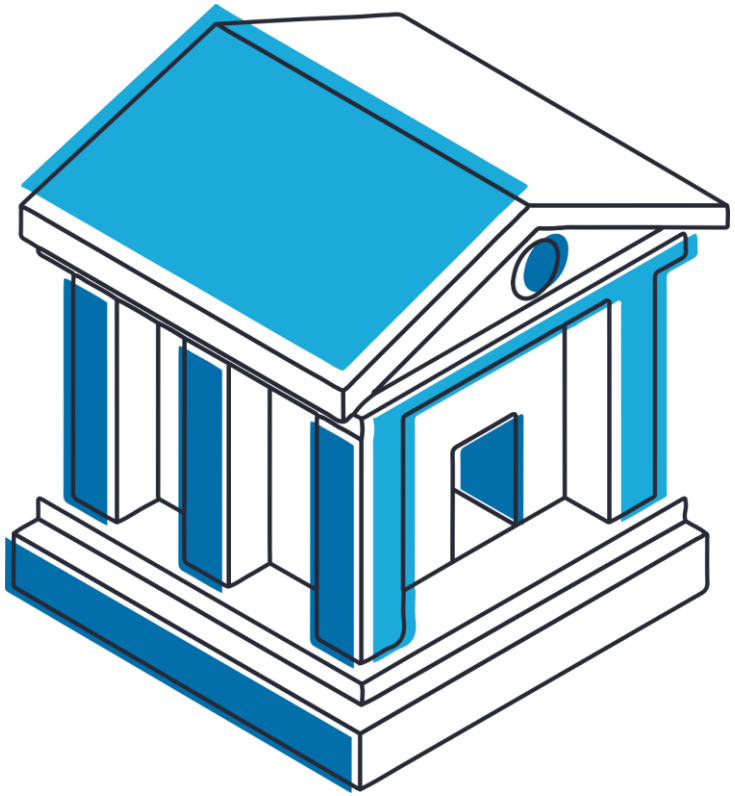

08.

POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN



Mario Aguilar

VP Banking & Insurance



09.

PREGUNTAS



Grado de customización con MS Dynamics

Más estándar, menos custom: máximo valor desde Dynamics

Microsoft Dynamics 365

ESTÁNDAR (OOTB)

6 Componentes

9% % total

CONFIGURACIÓN (Power Platform)

14 Componentes

21% % total

CONFIGURACIÓN IA (Copilot)

5 Componentes

8% % total

CUSTOM DEV (Plugin C# / PCF)

22 Componentes

33% % total

INTEGRACIÓN (Azure Services)

12 Componentes

18% % total

MIXTO (Config + Custom)

7 Componentes

11% % total

Grado de customización con Salesforce

Funcionalidad nativa primero; desarrollo solo donde aporta valor.

ESTÁNDAR (OOTB)

6 Componentes

7% % total

CONFIGURACIÓN (Declarativa)

17 Componentes

19% % total

CONFIGURACIÓN IA (Einstein/Agentforce)

6 Componentes

7% % total

CUSTOM DEV (LWC / Apex)

33 Componentes

38% % total

INTEGRACIÓN (Named Cred + Apex)

13 Componentes

15% % total

MIXTO (Config + Custom)

13 Componentes

15% % total

Grado de customización con Salesforce Financial Services Cloud

Funcionalidad nativa aseguradora como base del proyecto

salesforce

financial services cloud

ESTÁNDAR (OOTB)

5 Componentes

17% % total

CONFIGURACIÓN (Declarativa)

14 Componentes

47% % total

CONFIGURACIÓN IA (Einstein FSC)

4 Componentes

13% % total

CUSTOM DEV (LWC / Apex)

2 Componentes

7% % total

INTEGRACIÓN (Named Cred + Apex)

2 Componentes

7% % total

MIXTO (Config + Custom)

3 Componentes

10% % total

Modelo de trabajo	1.1	Pag 91	¿Por que se precisa una fase tan detallada de assesment tanto para el AS IS - TO BE?	La fase de Discovery es especialmente relevante para entender, alienar y diseñar el modelo futuro teniendo en cuenta tanto el prisma operativo como el tecnológico, es importante que sea robusta la fase de modo que lleguemos al máximo nivel de detalle. Esta metodología es la que usamos en todos los clientes del sector asegurador
Alcance	1.2	Pag 79	¿ Por que no se incluye dentro del alcance el diseño de Digital Experience dentro del proyecto?	La parte de Diseño de la Digital Experience esta incluido en la fase de Discovery, diseñaremos la experiencia futura asegurando que es digital y omnicanal construyendo pantallas futuras con FIGMA. En la parte de Implantación del CRM hemos previsto tiempo para hacer los ajustes y refinamientos que sean necesarios.
	1.3	Pag 97	¿Diferencia entre la fase de Discover y la fase de INCEPTION?	Son términos análogos, se trata de una errata
	1.4		¿Si se requiere reajustes de la fase de Discovery, se cierra solo a las 4 primeras semanas? o si durante las fases de implantación existe un cambio de alcance / prioridad) como se ajusta?	Por nuestra parte la máxima flexibilidad y predisposición para realizar ajustes, refinamientos o cambios de prioridades que serán convenientemente gestionados con los stakeholders del proyecto En la slide 46 se detalla la gestión del alcance
	1.5	Pag 66	¿La fase de Discovery solo se contempla al inicio?	Formalmente reservamos tiempo al principio del proyecto, esto no es óbice para la máxima flexibilidad si en otra fase del proyecto hay que revisar funcionalidades, diseños o prioridades. Para ello proponemos equipo multidisciplinar experto Seguros y CRM durante todo el proyecto. En la página 15 explicamos que el planteamiendo de solución y validación de funcionalidades se extenderán a lo largo de la fase 3.2 Implantación del CRM, con el objetivo de refinar las historias de usuario y validar los mockups en Figma previo al inicio de desarrollos en cada Sprint.
	1.6	• La gestión completa de siniestros permanece en Galgo/ mainframe. El CRM muestra información de siniestros en modo lectura (Ficha 360°).	¿Hasta donde lleva la gestión de siniestros?	Solo se contempla la apertura del siniestro (FNOL)

Equipo de trabajo	1.7	Pag 101	¿Como contemplan la gestión , gobierno y cooridinación con el equipo de India?	El modelo right-shore está ampliamente utilizado dentro de Capgemini Global como grupo y en España tenemos mucha experiencia en grandes implantaciones como Stellantis, Telefonica y Caixa y nos permite contar con el expertis necesario y la capacidad de escalado requerida. El modelo consite en una capa de equipo senior funcional, técnico y de gestión en Madrid en este caso que hace de interlocución con LDA de manera que la comunicación siempre es en español y con la presencialidad y cercanía necesaria. Esta capa de equipo hace de intermediación con nuestro equipo remoto para coordinar las tareas y validación de los trabajos sin que LDA tenga contacto directo con el eqiupo remoto, si así lo desea
		Página 100 y 102	Perfiles del proyecto: 1. Se solicita confirmación sobre si los perfiles que y los CVs que aparecen en la propuesta son los definitivos que participarían en el proyecto (mismo expertise, conocimientos, etc.) 2. Se solicita información sobre nivel de participación de cada uno de los perfiles (distribución de la participación a lo largo del proyecto, distinguiendo por fases) 3. Se solicita información sobre el grado de soporte y modelo de trabajo con la ubicación en India.	La capa de arquitectura y gobierno del proyecto se mantienen ya que somos los responsables máximos de la tecnología, operación y funcionalidad. El resto del equipo se determinará cuando se conozcan las fechas de adjudicación y por supuesto dispondrán de conocimientos y experiencias adecuadas al proyecto tal y como se reflejan en los perfiles tipo que hemos incluido en la oferta El equipo de desarrollo España estará hasta el sprint 13 que es el primer GoLive en el que retoma el equipo de India previo una incoporación previa de 2 sprints para el onboarding. Nuestro equipo de gestión, arquitectura, solución, tech lead y desarrollador senior están asignados durante todo el proyecto para realizar estas labores de gestión y coordinación con el equipo remoto
Coste implantación	1.8	Pag 8 La fase de Inception se ofrece con precio cerrado y vinculante, mientras que la implantación se acota con una horquilla transparente que se fija únicamente tras validar juntos el alcance real. Este enfoque evita infraestimaciones artificiales, reduce la incertidumbre y garantiza que LDA paga por un alcance cierto, acordado y soportado por evidencias, no por hipótesis	Se requiere aclaración de este punto.	Para este proyecto se han propuesto 3 precios: - Un único precio para la fase de Discovery inicial, vinculante. - Dos precios para la implantación del proyecto, uno para Dynamics y otro para Salesforce, sujeto a una serie de supuestos de alcance, que delimitan los esfuerzos requeridos. Nuestro espíritu y objetivo es ser socios tecnológicos de máxima confianza de LDA, y por ello creemos que lo responsable es, durante la fase de Discovery y de manera muy transparente, visitar y confirmar todos los supuestos de alcance para que podamos co-confirmar o ajustar (al alza o a la baja), los esfuerzos requeridos y los planes de proyecto asociados.
	1.9	Pag 103	¿Como se va a desarollar esto? Esto reuiere de un coste añadido a LDA - Se precisa aclaración	No tiene costes asociados para LDA. Usaremos herramientas de mercado como GITHUB Copilot con distintos motores (Claude, Open AI, etc.) y algunos agentes propios que aceleran y sustentan nuestros esfuerzos y plan de proyecto. Sólo hay un agente propuesto, que es propio de Capgemini, denominamo "Asistente virtual IA", que sí tendría un coste asociado por uso, y revisaremos durante la fase de Inception su

KPIS & SLA	1.10	12 sesiones de 90-120 min para cubrir cada bloque funcional , definir las necesidades y priorizar según el nivel de estandarización en la solución, incluyendo los indicadores de la operativa (KPIs y SLAs)	¿ Se pretende definir en conjunto los KPIS & SLA? ¿o se tiene alguna propuesta?	Se pretende utilizar los KPIS y SLAs de la operativa diaria, por eso es importante entenderlos bien para incluirlos en la solución CRM. Además, se espera en el modelo to be encontrar nuevos KPIS/SLAs que mejoren el gobierno y monitorización de la operativa a futuro (las soluciones CRM candidatas además ofrecen multitud de opciones para este aspecto de caja). Incluimos KPIs y SLAs para medir el engagement durante la fase de gestión del cambio. Algunos de los indicadores típicos que se utlizan para este tipo de proyectos serian: FCR, Tiempo Medio de Respuesta, Volumen de Casos, TMO, Tasa de conversión de leads, Indicadores de cross/up Selling, Tasa de renovación, Churn, CLV, etc.
			KPIs contractuales y SLAs: ¿Cómo vamos a considerar que se ha cumplido un KPI y un SLA? ¿Existirá una propuesta detallada que acordar?	Los KPIs y SLAs propuestos se han detallado en el documento de propuesta económica, página 6, título: "3. Propuesta de penalizaciones por incumplimiento de los plazos comprometidos por parte del proveedor". Los ANS que se han valorado en esta Oferta son ANS de Calidad y ANS de demora.". Estamos plenamente abiertos, y es lo usual hacerlo así, a detallar, ajustar y/o incorporar KPI's y/o ANS's y sus mecanismos de medición, en la fase de elaboración de contrato e incluso ajustarlos durante la fase de Discovery.

GDC		Página 41 y 116 en adelante	Cómo se gestiona el detalle del traspaso de conocimiento una vez se da por finalizado el proyecto. Se solicita una explicación del detalle del apartado 3.4: ¿Cómo se gestiona el modelo descrito en la mpágina 41? ¿Cómo se disponibiliza el asistente de IA? ¿Cómo se realiza el proceso de tarificción del coste de evolutivos y cambios de alcance??	Nuestro modelo ADMNext tiene definida una metodología muy precisa y ampliamente probada de transferencia de conocimiento basada en cuatro etapas y sus correspondiente puntos de control y aceptación de cada una de ellas: planificación, KT, Shadowing y Reverse Shadowing El modelo de la página 41 se basa en una capacidad fija destinada a la ejecución de trabajos previamente acordados y priorizados de forma conjunta entre LDA y Capgemini, mediante la gestión de un Service Manager y la gestión de la demanda. En caso de necesitar ampliar la fuerza de trabajo disponible, se planifica una capacidad extra denominada linea variable durante el tiempo o la carga que sea necesaria y así no afectar a los trabajos ya comprometidos. La gestión del alcance durante el proyecto se detalla en la página 46 y se realiza mediante la identificación del cambio o nuevo requisito, la evaluación del impacto en esfuerzo, tiempo y en otras partes del alcance del proyecto y el acuerdo entre ambas partes sobre cuándo y cómo realizar ese cambio. En cuanto a la disponibilidad del asistente de IA: La implantación de este Asistente actualmente se encuentra fuera de alcance de la propuesta de implantación de Capgemini. En caso de confirmarse el interés por el mismo de Línea Directa, se requiere una fase inicial de assesment para la revisión de arquitectura, datos y accesos. Proponemos implantar una PoC inicial en el primer Go-live con los usuarios del piloto, para poder industrializarse en el despliegue final de usuarios.
	1.13	GDC	¿Cómo asegurará Capgemini una adopción consistente y sostenida del CRM a lo largo de todos los go-lives, evitando saturación y pérdida de tracción?	A través de un plan detallado de comunicación y touchpoints por rol; al inicio entenderemos también la disponibilidad y approach más óptimo por rol (ej.: habrá perfiles que prefieran ser contactados para temas puntuales además de la formación para no saturar, habrá perfiles que requieran más apoyo..)
	1.14	GDC	Qué papel, dedicación y responsabilidades esperan de LDA (negocio, líderes, Contact Center, Pers_Com…) para que el plan de cambio funcione?	Lo definiremos conjuntamente en la definición de roles, alineado con la disponibilidad de los perfiles. Nosotros proponemos que negocio y el CC tenga un responsable para este proyecto (dedicación estimada de 1/2 horas-20% al día por cada uno, dependiendo de las fases),para refinamiento de requerimientos, validación de UX y de desarrollos, participación activa en sesiones con usuarios finales, validación de los entregables en la gestión del cambio, reportes de monitoring, etc. Para IT estimamos un perfil de LD con una dedicación dle 50% como IT lead, con el objetivo de asegurar que el proyecto está alineado con la estrategia de transformación de la compañía, coordinar los politics y escalar los temas y aprobaciones necesarios
	1.15	GDC	¿Qué enfoque práctico utilizarán para gestionar resistencias, motivación y engagement de los usuarios en cada fase del proyecto?	Entender las resistencias y motivaciones desde el principio para modular los discursos. Hacer un seguimiento muy detallado del engagement para activar acciones cuando salte alguna alarma en los KPIS. Hacer un piloto de menos de 20 personas para poder tener un trato muy personal con ellos.
METODOLOGIA			Metodología de trabajo de la fase de discovery Se solicitar aclarar el modelo de trabajo y qué beneficios aporta este modelo de trabajo.	Esta metodología de trabajo permite un entendimiento de la situación de partida, un alineamiento y diseño detallado de la solución futura y sentar unas bases sólidas para la construcción del futuro CRM. Esta metodología es la que utilizamos en otras empresas aseguradoras en programas CRM de cara a asegurar que se contempla todo el alcance del proyecto y se diseña al máximo nivel de detalle tanto el diseño funcional como técnico.
		Página 34	Metodología de trabajo: Se menciona agentes de IA como acelerador. ¿Es una metodología de trabajo testada y cuyo modelo de adopción por los equipos es factible?	Es una metodolgoía sobradamente testada en diversos proyectos actuales y nuestro modelo de operación y delivery para nuevos proyectos. Nuestros equipos de desarrollo están ampliamente acostumbrados a esta forma de trabajar: - Acelerador Figma: usado en proyectos como Verisure, Mapfre, Caixa, SegurCaixa, Loewe - Acelerador Github-Claude: usado en proyectos como Naturgy, Santalucia, Roche - Acelerador de pruebas: usado en proyectos como ADIF, Loewe, Roche, Santalucia - Acelerador hypercare: VGED, Cupra, Grupo Volkswagen

Make It Real

Capgemini
