MINSAIT | linea directa



Implantación CRM

REQ0028484

Documento de Defensa

Marzo 2026

MINSAIT

Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partner, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el "Propósito").

La información aquí presentada es propiedad de la sociedad del grupo controlado por Indra Holding TI, S.L.U. que suscribe el presente documento (en lo sucesivo, "Minsait"), y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito de Minsait.

Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de aquellos terceros a los que Minsait haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación. Una vez finalizado o concluido el Propósito, el cliente debe restituir a Minsait toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo utilizar de ninguna manera, ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait salvo que haya sido autorizado para ello previa y expresamente por escrito por Minsait.

El destinatario de la información confidencial, después de finalizado el Propósito, no podrá utilizar de ninguna manera ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait.

Copyright © 2026 Minsait. Todos los derechos reservados. España

¿Quiénes somos?

Dirección Global Seguros



Xavier Jaumandreu del Toro

Director global Seguros

Responsable de Cuenta



José Luis Martínez García de Lara

Senior Manager Seguros

Consultoría - GdC



Héctor Mora González

Senior Manager Consultoría

Práctica Salesforce



Ángel Moratel Real

Director global Customer Experience



David Blanco Pinedo

Responsable Operaciones Salesforce



Salvador Méndez Cortés

Responsable Desarrollo de Negocio Salesforce



Alberto Ruiz Orejudo

Responsable Apificación e integración

Nespon Solutions



Iván Hassig

Managing Director Nespon Solutions



David Buján

VP EMEA Nespon Solutions

01 RACIONAL DE LA PROPUESTA

02 FASES DE LA PROPUESTA

03 DISCOVERING / IMPLANTACIÓN / METODOLOGÍA

04 INTEGRACIONES – ASPECTOS CLAVES TECNOLÓGICOS

05 GESTIÓN DEL CAMBIO

06 SOPORTE / TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

07 CASOS DE ÉXITO

08 CIERRE Y RONDA DE PREGUNTAS

MINSAIT

Racional de la propuesta

01



MINSAIT

Indra Group – Nuestra oferta prioritaria Customer First

MBC → XTudio → C. TECH → FLAT 101 Digital Business

Definición estrategia comercial y ATC	Diseño estrategia digital	Implementación técnica	Captación en medios digitales	Conversión en canal digital
Consultoría de negocio	Consultoría Digital	Portales, CRM, Canales, etc.	Paid media, SEO y contenidos	CRO & digital analytics
Elaboración de planes de distribución comercial, modelos de atención con cada vez mayor peso de los canales digitales	Diseño de experiencias y journeys de clientes con foco en las relaciones digitales	Diseño técnico y construcción de soluciones CRM, CC, plataformas de venta online, Apps y estrategias de fidelización	"Inversión" en publicidad de pago, buscadores y contenidos para atraer potenciales clientes	Análisis del performance de los canales digitales y ajustes para aumentar la efectividad

+5000 profesionales


Algunos de nuestros **clientes en el Sector Seguros**

Liberty Seguros · Zurich Seguros · Mutua Madrileña · AXA · helvetia

Nuestros **partners** principales

salesforce · GENESYS · Microsoft · Adobe · Liferay

Indra Group – Nuestras capacidades en Salesforce

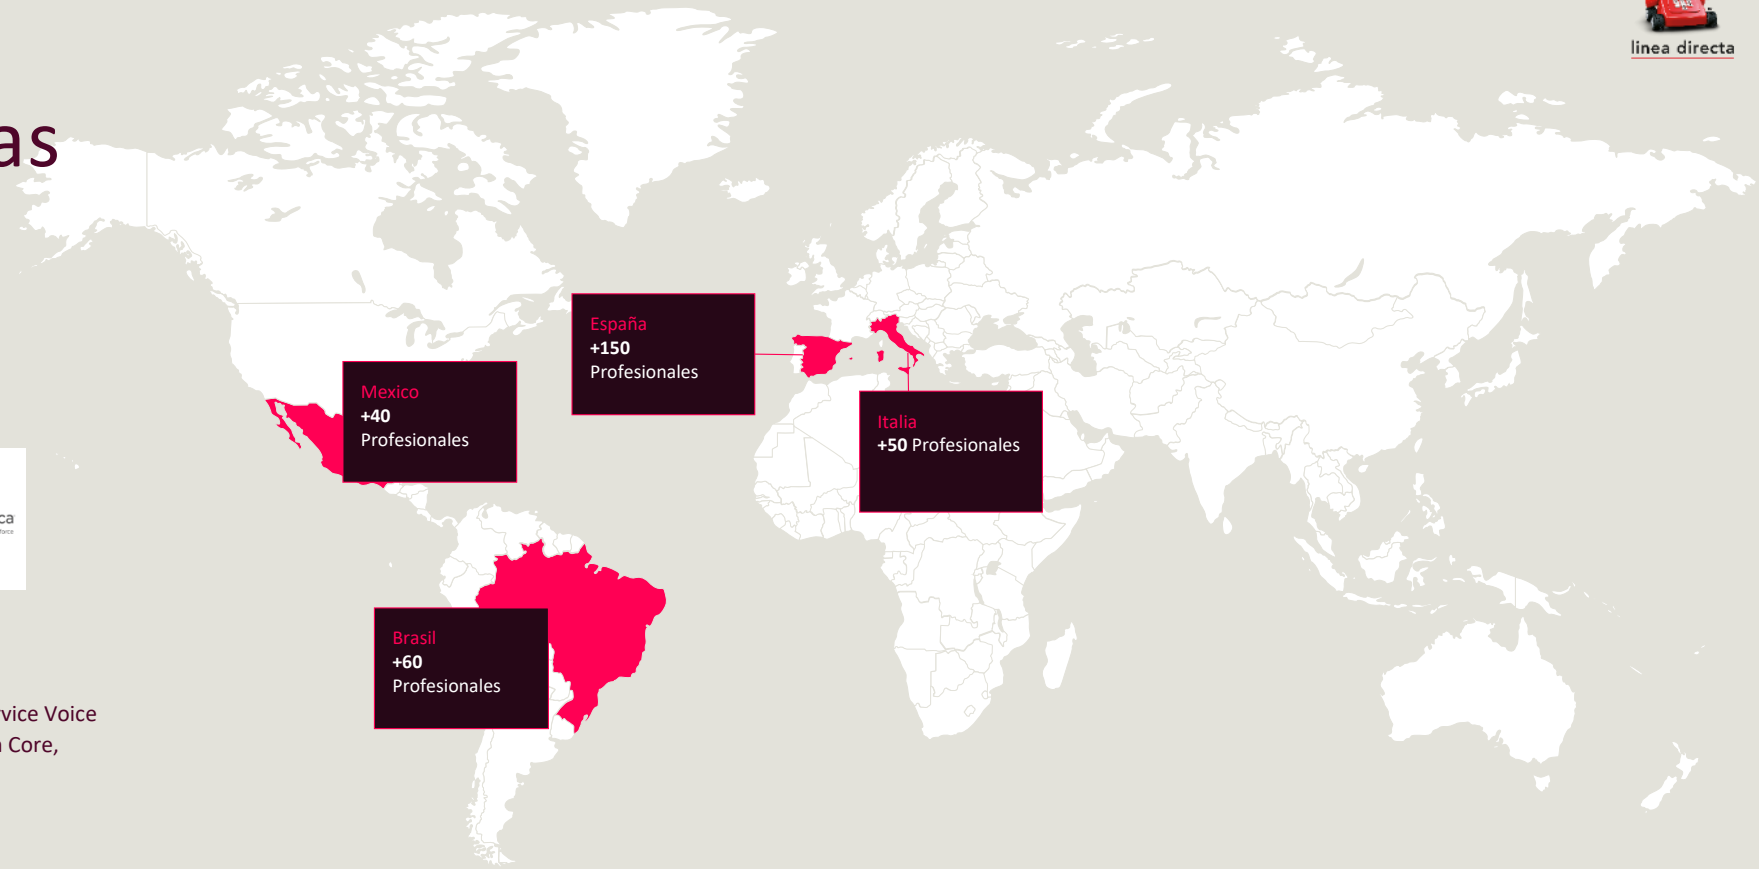

- **Alta especialización en las principales soluciones cross:**
  - Platform
  - Sales Cloud - SPIFF
  - Revenue Management
  - Service Cloud, Field Service, Service Voice
  - Marketing Cloud, Marketing On Core, Commerce Cloud
  - Experience Cloud
  - Agentforce. Data 360
  - Mulesoft, Tableau, Informática
- **Soluciones sectoriales:**
  - Telecom
  - Energy&Utilities
  - Financial Services
  - Public Sector Solutions
  - Consumer Goods
  - Life Sciences

+600 Certificaciones y acreditaciones

+300 Profesionales

- **IA (Einstein/AgentForce):** Foco en incorporación de la IA en las diferentes nubes
- **Innovación:** Laboratorio interno en el que testeamos y nos formamos en las nuevas soluciones de Salesforce.

SUMMIT PARTNER

SPAIN CONSULTING PARTNER RECOGNITION
New Logo Partner of the Year FY24

nespon SOLUTIONS

Perfil Corporativo

Firma global de servicios tecnológicos con presencia en **América, EMEA y Asia** . Como **Summit Partner de Salesforce** —el máximo nivel de partnership— formamos parte del grupo reducido de compañías con mayor certificación, capacidad de entrega y experiencia sectorial.

Credenciales Relevantes

+600 Certificaciones Salesforce	+100 Credenciales FSC
+10 Clientes Sector Asegurador	+50 Proyectos Internacionales
+20 países	Desde 2016
+120 sistemas legacy integrados	



Experiencia Sectorial en Seguros

Trayectoria probada en modernización de core asegurador, implementación de Insurance Cloud y lanzamiento acelerado de productos digitales:

Sura Seguros
Transformación digital y desarrollo de nuevos productos sobre arquitectura **Salesforce Insurance**

APS Bank
Implementación de **Financial Services Cloud (FSC)** para el proceso de Digital Onboarding

Banorte Seguros (México)
Prototipo productivo basado en **Financial Services Cloud (FSC)** con múltiples coberturas y APIs en 12 semanas

Global Seguros / Seguros del Estado / Andina ART
Modernización de procesos de cotización, portales y administración de pólizas

sura · BancoEstado · Andina ART · BANORTE · APS bank values you can bank on · MAS SEGUROS

Capacidades Diferenciales

- **Implementación estructural** de FSC (no adaptación genérica de CRM)
- **Arquitectura sectorial** sostenible a largo plazo
- **Integraciones complejas** (Contact Centers, motores de pricing, data platforms)
- **Eficiencia operativa** , escalabilidad y preparación para IA (Agentforce)
- **Modelo de entrega global** con gobierno robusto y metodologías ágiles

Enfoque Estratégico

Nespon no implementa únicamente una solución tecnológica

Diseña e implementa la arquitectura aseguradora

Soporta el negocio en el largo plazo

Reduce deuda técnica y acelera valor

Nespon Solutions es pionera en la implementación de IA y Agentforce y experta en la **implantación de Financial Services Cloud (FSC)**

1+1=3

… porque no siempre 1+1 suman 2

Minsait aportará su experiencia en **consultoría tecnológica**, **integración** de sistemas, **gestión de proyectos complejos** y **profundo conocimiento del entorno de LDA**, con el objetivo de garantizar una ejecución sólida del proyecto y su plena alineación con las necesidades del negocio.

Sobre esta base, complementamos nuestras capacidades con el conocimiento y la experiencia de **Nespon Solutions, una de las compañías líderes en la implantación de Salesforce Financial Services Cloud** con experiencias reales en aseguradoras.

Dos equipos con una misma visión, trabajando juntos por un objetivo común

salesforce

MINSAIT + nespon SOLUTIONS



Planteamiento de la Solución

Core Stack

Modelo de arquitectura de 3 capas desacoplado que elimina deuda técnica y asegura sostenibilidad a largo plazo


Capa de Experiencia:
Salesforce FSC +Omnistudio
Interfaz Omnicanal unificada para el agente

Capa de Inteligencia:
Data 360, Agentforce y Einstein AI
Lógica de negocio sectorial y NBA

Capa de Integración:
Mulesoft + Kafka (Event Streaming)
Desacoplamiento total y protección absoluta del core asegurador

The path: Modelo de implantación progresivo multicapa

Estrategia de Despliegue: Implantación por fases funcionales en 18 meses



Nota estratégica: Cada bloque funcional se activa de forma independiente, garantizando la continuidad del negocio y anulando el riesgo sistémico

Pilar de Éxito: Gestión del Cambio y Adopción

Diseño de “journeys de adopción” desde el día 1, identificación de impulsores del cambio (“champions”) y medición activa del impacto para asegurar una transición fluida centrada en el usuario.

Aspectos diferenciales de nuestra propuesta

Cinco claves para el éxito



Alianza experta

Unimos la capacidad transformadora de Minsait en la operativa aseguradora con la hiper-especialización de Nespon en implentaciones nativas de FSC para Seguros.

Sinergia CX total

Integración nativa de los equipos de Contact Center (Genesys) y Salesforce. Decisiones ágiles.

Enfoque sectorial

Capacidades out-of-the-box de FSC para seguros, minimizando el desarrollo a medida y optimizando el TCO. Reduce deuda técnica, mejora el TTM y abarata el mantenimiento. **Motor de cotización multirramo**, con una capa común separada de las particularidades.

Conocimiento de LDA


Conocemos la compañía, conocemos la situación en canales, modelo organizativo y peculiaridades tecnológicas. ¿Validación vs Discovery?

Despliegue sin riesgo

9 fases consolidadas en go-lives lógicos para proteger al usuario. Acompañamiento post-implantación para minimizar impacto.

Fases de la propuesta

02

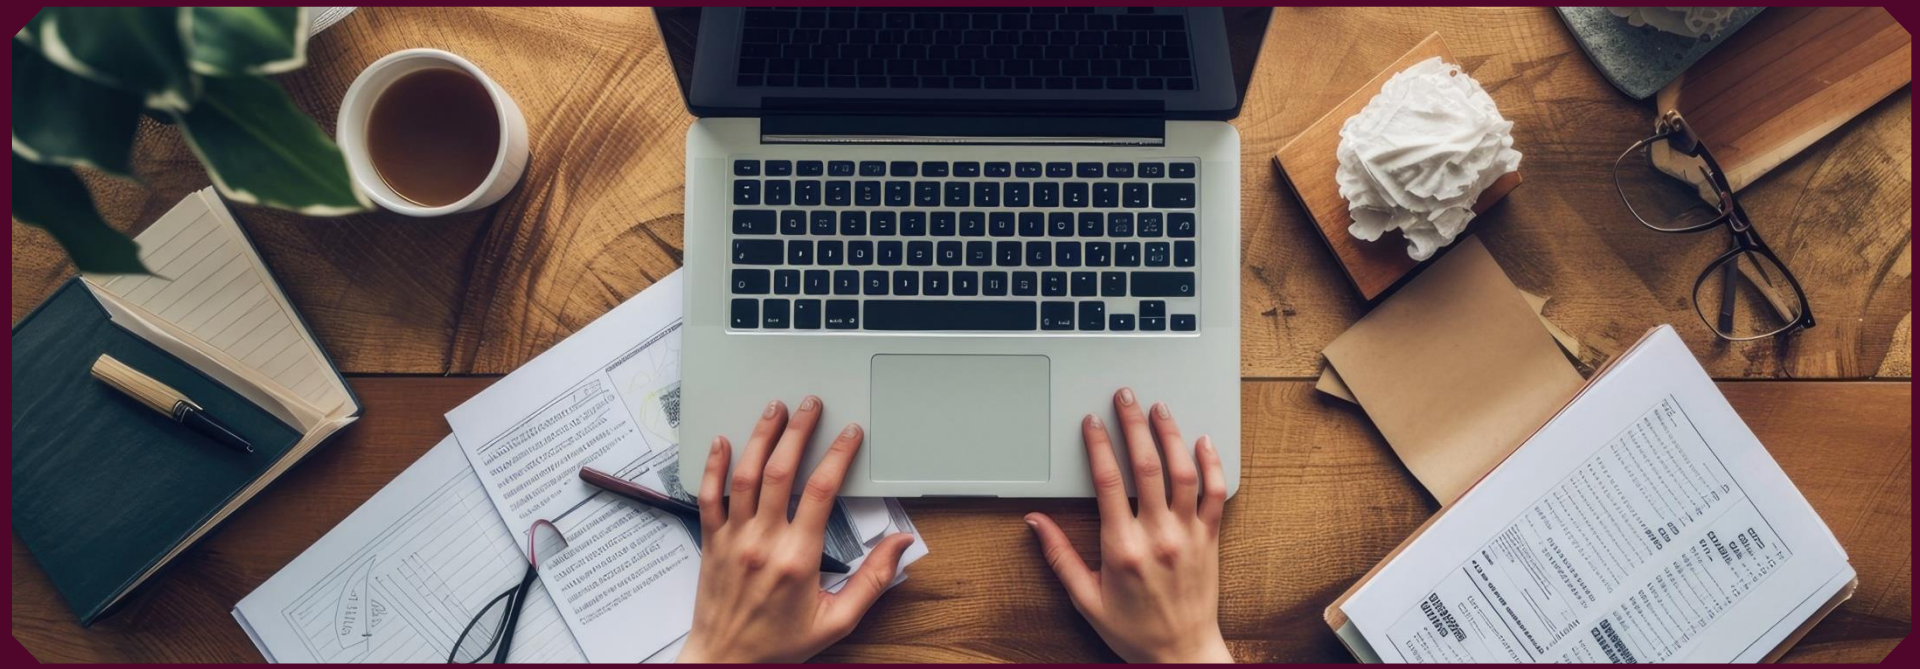

MINSAIT

Basándonos en el assessment realizado y la información compartida por LDA, identificamos seis factores clave para asegurar el éxito de la implantación CRM

1.



Instaurar gobierno y asegurar dedicaciones

- Disponer de un **gobierno integral** que involucre con **altos niveles de dedicación a los equipos de CRM, negocio, procesos, tecnología, usuarios y soporte**. El CRM conlleva una transformación operativa y cultural que requiere alineamiento de todos los actores clave

2.



Flexibilidad para adoptar el vertical de Financial Services Cloud

- Realizar una **revisión de los requisitos** junto con el equipo especialista de Minsait para adoptar la solución de Salesforce y respetar las Best Practises que permitirán reducir la deuda técnica y facilitarán la adopción de mejoras.

3.



Alinear y coordinar la transformación global

- Velar porque las **iniciativas que tienen impacto directo sobre la implantación del CRM se ejecuten en tiempo y forma, asegurando la disponibilidad para evitar replanificaciones o retrabajos** (como el mapa de contactos actualizado, la evolución del Contact Center a una solución Cloud, implantación CDP, entre otros)

4.



Despliegue gradual de funciones y usuarios

- **Desplegar las funcionalidades CRM de forma progresiva con fases controladas**, y un plan de **ramp-up de usuarios,** comenzando **con pilotos funcionales** y validando resultados antes de escalar. **Evitar implantaciones masivas** sin estabilización previa que puedan comprometer la operación o la adopción

5.



Evitar la hiper-personalización

- **Adaptar la organización / procesos a la solución y no al revés**, para aprovechar al máximo la **adherencia al estándar** y evitar tener una herramienta hiperpersonalizada que conllevaría mayores costes de mantenimiento y mayor time to market de las actualizaciones en funcionalidades

6.




No subestimar el cambio y formar “champions”

- Diseñar un **plan de formación y acompañamiento con “champions” internos**, que facilite la adopción, el handover **y minimice resistencias. Monitorizar la transición** para detectar bloqueos o ajustes necesarios, asegurando una adopción fluida y sostenible del nuevo modelo de trabajo

Fuente: análisis Minsait

Sobre la base de estos factores clave, diseñamos un plan de proyecto apoyado en dos principios: generación de valor incremental desde el mes 6 y minimización del impacto operativo en los distintos colectivos de usuarios

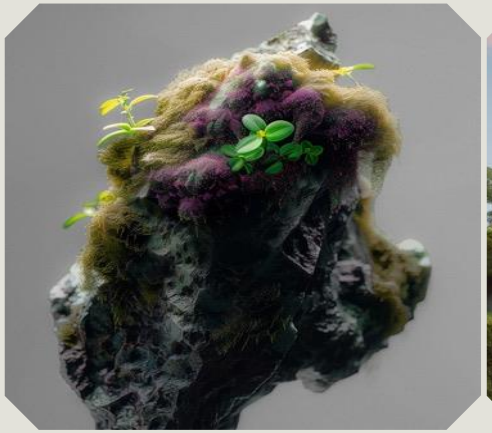


Respeta las 9 fases y el orden de priorización definido por LDA.

9 Fases



Reduce las transiciones operativas de cada colectivo de usuarios al mínimo necesario.

6 Go-Lives

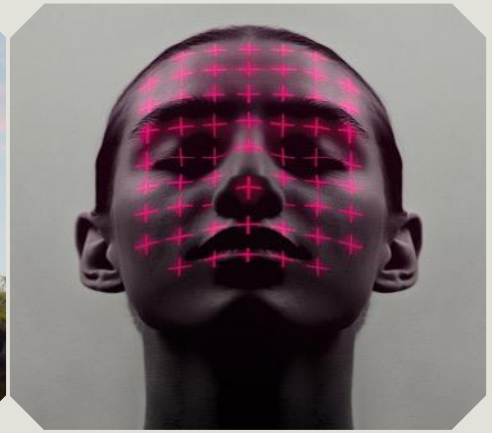


Genera valor de negocio desde el mes 5-6 (Ficha 360 + CTI), sin esperar al año 2.

6 meses



Permite sincronizar la primera entrega con el proyecto de Genesys, evitando duplicidad para los agentes.

Genesys

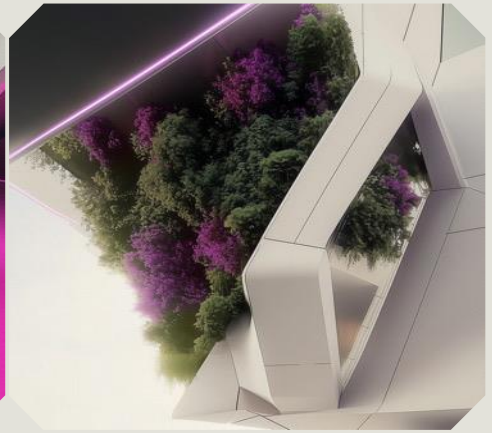


Agrupa las fases con dependencias técnicas compartidas, reduciendo costes y tiempos de integración.

Framework

Con el objetivo de priorizar la adopción por parte de los usuarios, proponemos un plan de implementación gradual a lo largo de 18 meses

- Plan inicial de **18 meses de proyecto** para completar una implementación gradual por grupos de usuarios
- **La Fase 0 de Discovery** tendrá una duración de **3 meses** y permitirá definir y cerrar el **alcance completo del proyecto**, así como sus **dependencias,** dentro del marco temporal establecido y con un acuerdo formal por parte de LDA.

  Este trabajo tendrá continuidad mediante **sesiones de refinamiento** que se llevarán a cabo en las semanas previas al inicio de cada una de las 9 fases, con el objetivo de profundizar en el nivel de detalle necesario para su correcta ejecución.
- A la finalización de primer Go Live, arrancaremos en paralelo con un **soporte post – implementación** iterativo. A la finalización, arrancará un **soporte y mantenimiento de 12 meses**

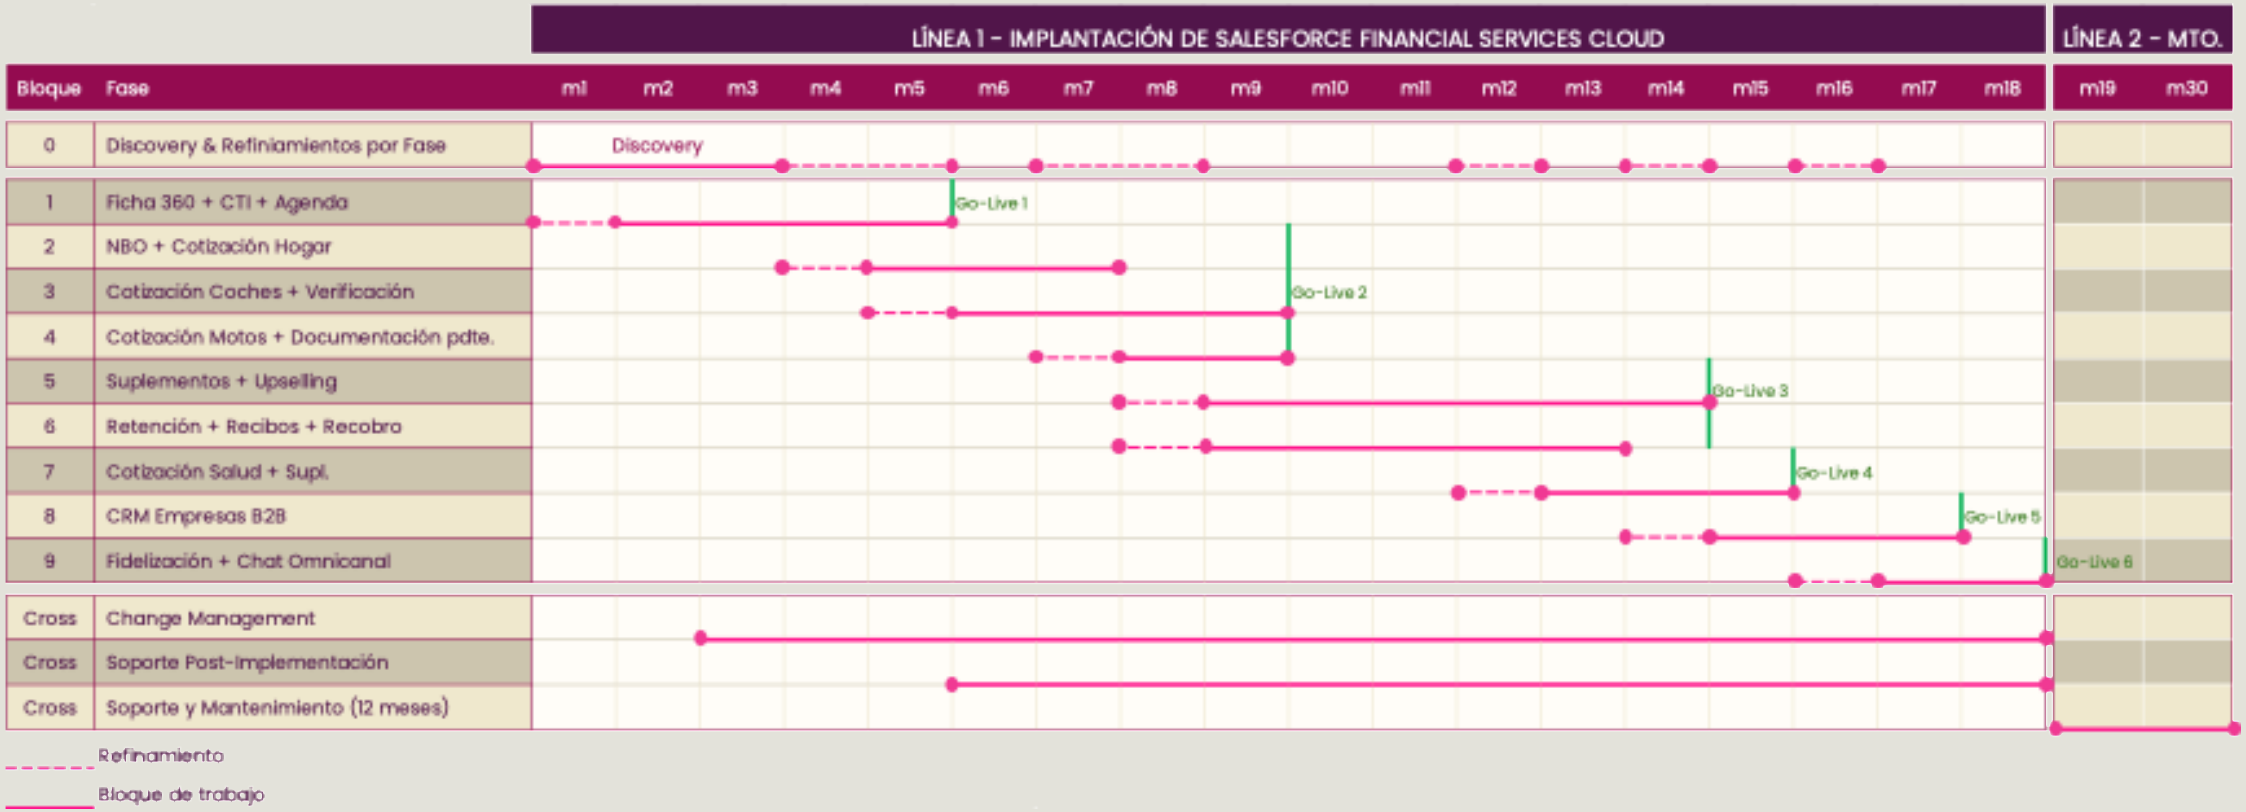

Con un equipo de trabajo, que combina la excelencia en el ecosistema Salesforce con una sólida experiencia en el sector asegurador

Gestión

Director de proyecto

Lidera la coordinación y el gobierno del proyecto durante toda la implantación, asegurando la correcta ejecución del plan, la alineación con los objetivos de Línea Directa y la coherencia entre los distintos workstreams. Supervisa la planificación, el roadmap funcional y técnico y la gestión de dependencias entre los diferentes equipos (Salesforce, Genesys, Integraciones, Datos, QA, Canales y Change), actuando además como punto de contacto principal con el cliente. Asimismo, impulsa la gobernanza, consolida el reporting ejecutivo, prioriza el backlog y coordina a los equipos multidisciplinares bajo un modelo híbrido de trabajo, garantizando una implantación controlada, alineada y orientada a valor

Sponsor, PM, Exec. Team y CoE

Equipos por Work stream

Discovery + Definición + UX

Experto funcional Seguros + 1 Implementación + 2 Pruebas y Calidad

Asegura que los requisitos y procesos del negocio se traduzcan al modelo y capacidades de la vertical de SF.

Colaborar con el experto funcional para definir una solución que refleje fielmente la operativa y garantice consistencia con requisitos

Líderes negocio, IT, Key users ~75%

1 Implementación y migración de datos

- Líder de implementación
  - Especialistas FSC
    - Arquitecto técnico FSC
    - Líder Técnico FSC
      - Desarrolladores FSC
      - Ingeniero DevOps
    - Experto funcional FSC
  - Integraciones
    - Arquitecto Integraciones
      - Desarrolladores Integraciones
      - Experto Integración CC

Lidera la configuración y parametrización de la solución, así como la definición y construcción de las integraciones con los sistemas externos. El equipo se organiza en dos líneas de trabajo — especialistas en FSC e integraciones— coordinadas por un jefe de proyecto y respaldadas por arquitectos técnicos y líderes especializados, garantizando coherencia técnica, alineación con el negocio y una implantación robusta adaptada al sector asegurador

Líderes negocio, IT, Key users ~50%

2 Pruebas y Calidad

- Líder QA
  - Analista QA

El equipo de QA se centra en pruebas transversales, E2E y de negocio, necesarias para un proyecto con múltiples integraciones y para asegurar un UAT eficiente y sin regresiones.

Soporte & Mantenimiento

- Service Manager
  - Experto funcional FSC
  - Desarrollador FSC
  - Desarrollador Integraciones

Garantizar la continuidad operativa del servicio tras la implantación, coordinando las actividades de soporte, supervisando niveles de servicio, priorizando incidencias y asegurando una comunicación entre negocio y equipo técnico

IT

Equipos gestión del cambio

Change management team

- Responsable de Gestión del Cambio
  - Consultor de negocio
  - Consultor de diseño

Lidera la gestión del cambio asociada a la implantación del CRM, coordinando las iniciativas de comunicación, formación y adopción para facilitar la transición de los usuarios al nuevo sistema. El responsable coordina y asegura la ejecución del plan, El consultor de negociodefine la estrategia de adopción alineada con los procesos y necesidades de los usuarios, mientras que el consultor de diseño transforma estos contenidos en materiales claros, visuales y estructurados que facilitan la comprensión y el aprendizaje

Líderes negocio, IT, Key users, Personas y comunicaciones

Discovering / implantación / metodología

03



MINSAIT

Estructuramos el Discovery en 3 fases secuenciales e iterativas a fin de transformar los requisitos funcionales en artefactos accionables para implantar

Enfoque metodológico

Se plantean **3 fases secuenciales** que garantizan la **trazabilidad completa desde el requisito funcional hasta la experiencia de usuario validada**


Cada fase genera entregables que alimentan la siguiente, asegurando que no se pierde información crítica en la transición y que cada decisión es aprobada por los interlocutores de LDA.

El objetivo es **maximizar el aprovechamiento de las capacidades estándar de la solución CRM**, evitando personalizaciones innecesarias y proponiendo, cuando proceda, reenfoque de procesos que simplifiquen la implementación sin perder valor funcional

Fases	1. Discovery de requisitos	2. Definición de historias de usuario	3. Diseño UX y prototipados
Actividades	• **Análisis documental inicial**: Revisión de requisitos antes de su validación con negocio *(en RFQ, propuesta previa)* • **Sesiones de inmersión por dominio**: Validación guiada de requisitos y confirmación de flujos E2E, reglas, etc. • **Gap analysis y reglas de negocio**: Evaluación frente al estándar CRM para maximizar configuración OOTB • **Consolidación y validación**: Formalización de clasificación funcional y validación como base para historias de usuario	• **Descomposición inicial**: Traducción de requisitos en historias de usuario manteniendo traza con el origen • **Definición de reglas de negocio y criterios de aceptación:** formalización de validaciones y escenarios Given-When-Then • **Refinamiento colaborativo y Definition of Ready**: Sesiones iterativas con Product Owners de alineamiento • **Análisis de dependencias y priorización :** Identificación de impactos cruzados, y ordenación del backlog	• **Definición de flujos de interacción**: Traducción de historias en flujos E2E y arquitectura de información • **Diseño HI FI en CRM (o Figma)**: Creación de pantallas alineadas con historias y criterios de aceptación (campos, validaciones, estados, mensajes) • **Prototipado navegable:** Simulación interactiva de flujos principales. • **Validación de stakeholders y usuarios**: visión funcional y de usabilidad / experiencia
Entregables	• Matriz de requisitos final • Catálogo de reglas de negocio • Procesos validados E2E • Backlog preliminar cualificado	• Historias de usuario completas, y priorizadas (alineado a fases de implantación) • Matriz dependencias e impactos	• Diseño HI FI / prototipos navegables • Diseño visual aprobado (blueprint UX)
Equipo	• Experto Funcional Seguros • Líder de implementación • Arquitecto técnico FSC	• Experto funcional FSC • Desarrollador Senior FSC • Líder QA	

Iniciamos con el TO BE - Best Practices Industrias – Listos para Usar AI. - Listo para Escalar

Ejemplo de pantalla de Salesforce FSC compuesta por varias secciones y elementos prediseñados para atender las necesidades de agentes de Seguros

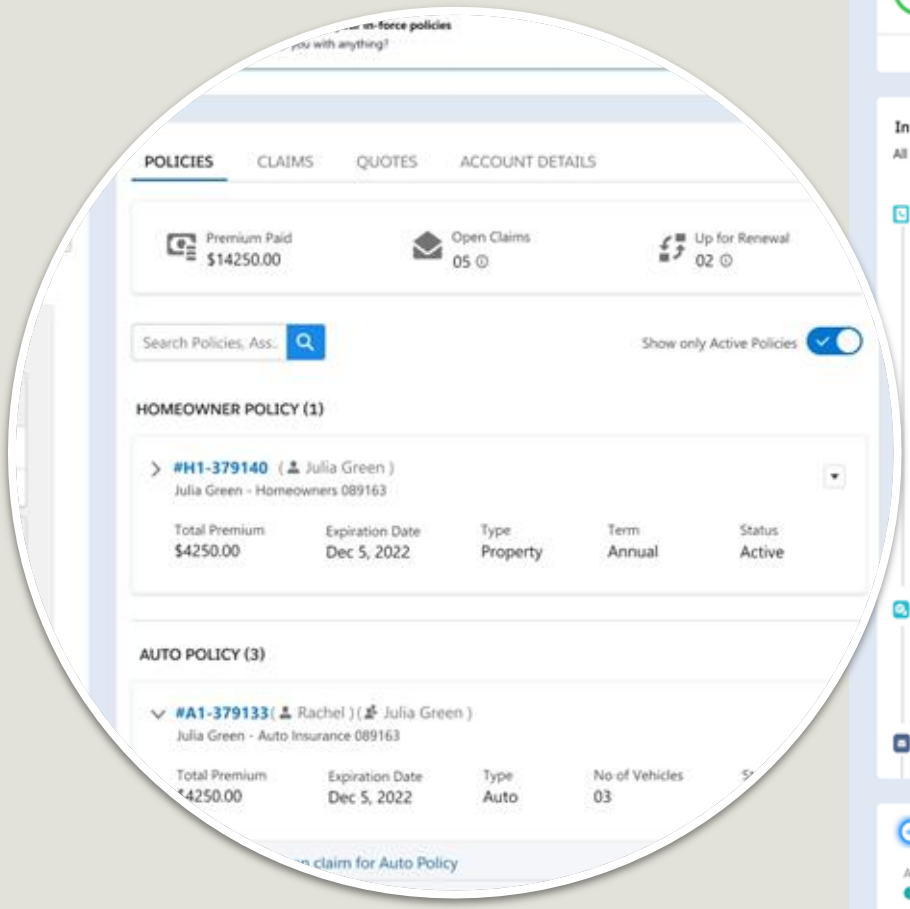

Como punto de partida para abordar la implementación, compartimos con LDA las premisas que guiarán una ejecución rigurosa y habilitarán una solución flexible y escalable

EFICIENCIA OPERATIVA:


Menos pasos manuales, menos tiempo por llamada y más capacidad operativa sin aumentar el equipo.

ARQUITECTURA ESCALABLE:

Nuevos ramos, productos y canales se incorporan como extensiones del sistema existente, sin rediseñar la arquitectura base.


REDUCCIÓN DE DEUDA TÉCNICA:

TDD desde el Sprint 1 garantiza un sistema mantenible y auditable sin acumular el coste oculto que genera el desarrollo sin disciplina de calidad.

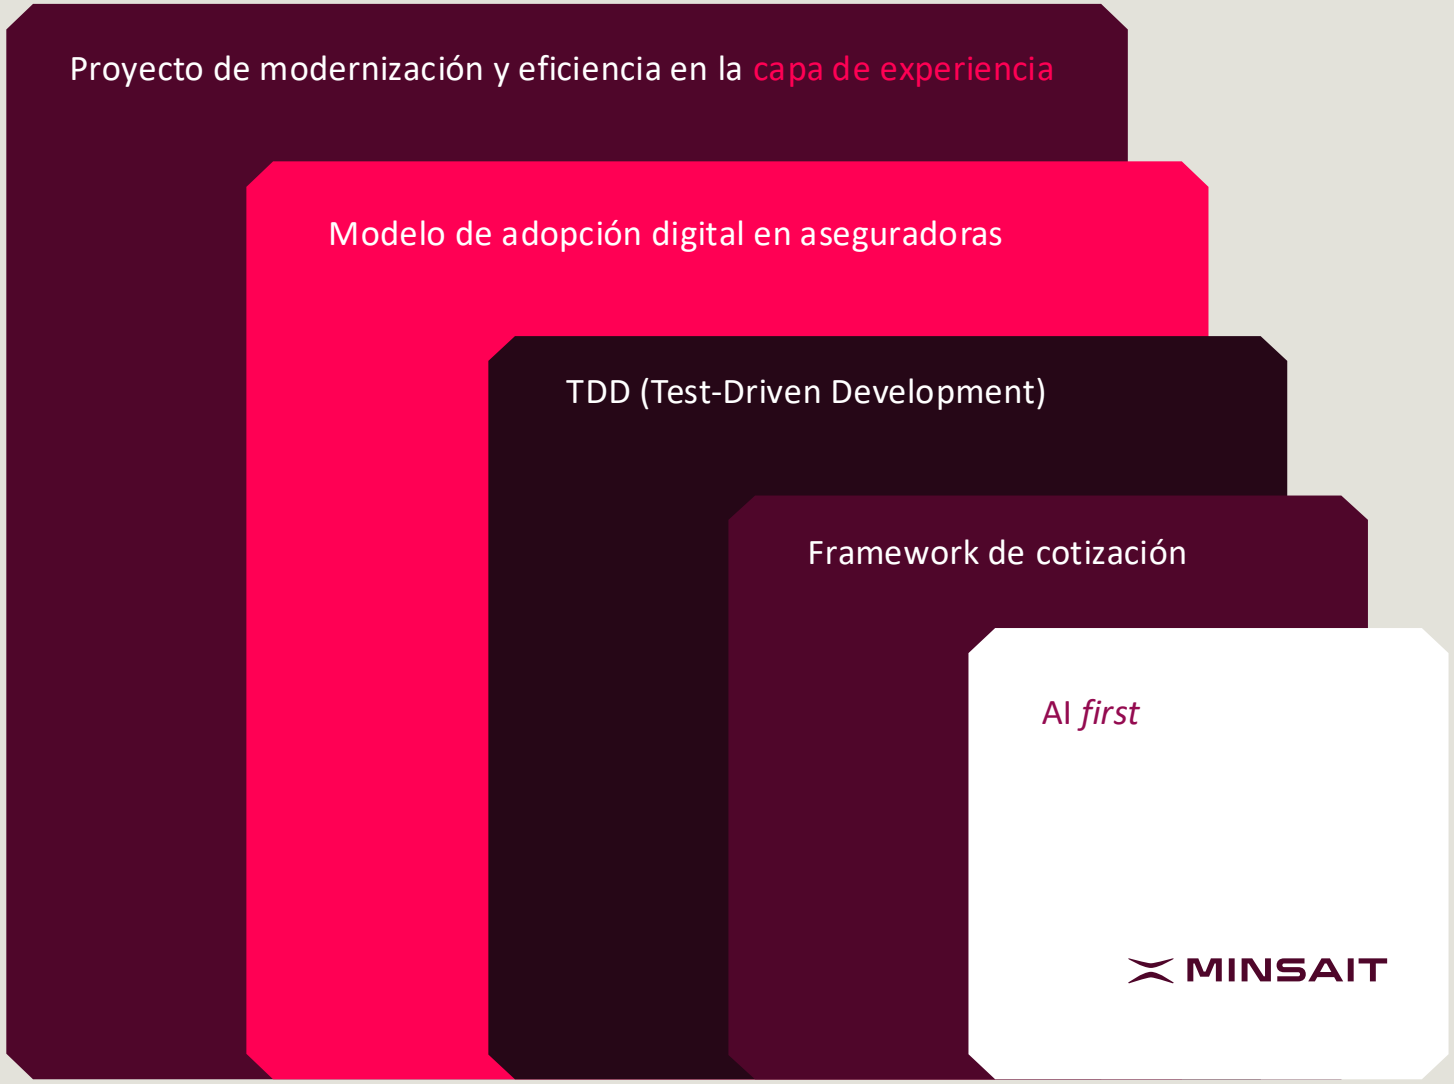

y el ejercicio de análisis exhaustivo realizado sobre los requerimientos de la RFQ, que nos ha permitido decidir con certeza cual es la mejor opción para LDA

- El **núcleo funcional del CRM** cubre los requisitos generales con un **90% de cobertura OOTB/Config**
- La **identificación y ficha 360º** alcanza un **75% de cobertura OOTB/Config**. Los desarrollos se concentran en la replicación near-real-time y las consultas históricas a Galgo.
- El **dominio de leads y oportunidades** presenta un **80% de cobertura OOTB/Config,** aprovechando al máximo las capacidades nativas de Salesforce para la gestión comercial.
- La **cotización** es el dominio más extenso con 12 requisitos Must. El **50% de cobertura OOTB/Config** se explica porque la lógica de tarificación reside en Galgo; el desarrollo se concentra en Integration Procedures y conectores MuleSoft.
- La **retención y gestión de cartera** alcanza un **67% de cobertura OOTB/Config**, con desarrollos orientados a la integración con pasarelas de pago y la sincronización de estados de recibos con Galgo.
- Los **suplementos y la fidelización** presentan un **50% de cobertura OOTB/Config.** Los desarrollos se centran en la escritura de modificaciones de póliza en Galgo y reglas de elegibilidad médica para Salud.
- La **atención al cliente y reclamaciones** obtiene un **85% de cobertura OOTB/Config**, siendo el área con mayor madurez nativa en Salesforce FSC.

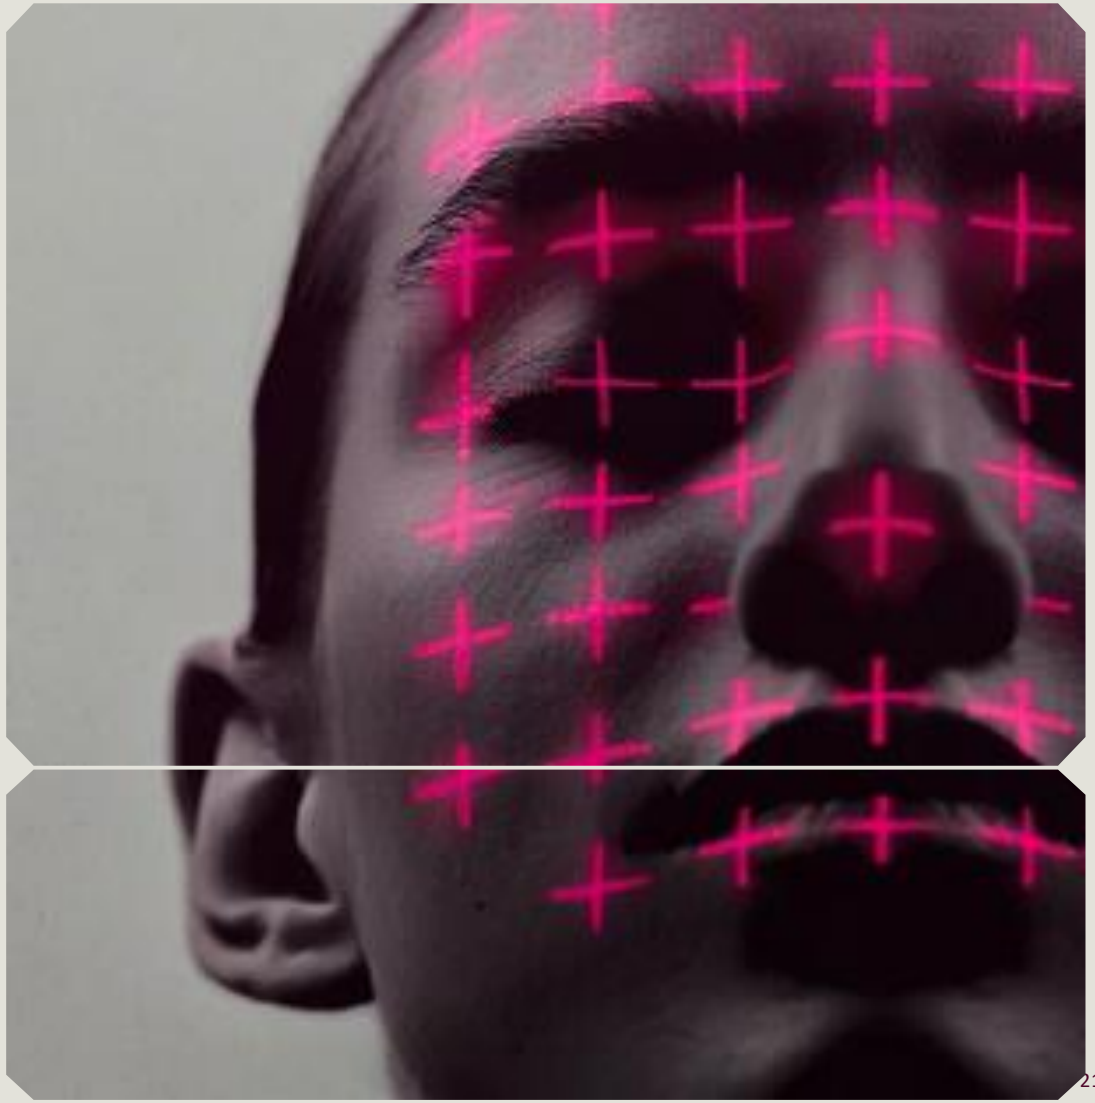

Proponemos Financial Services Cloud, una plataforma diseñada para el sector asegurador y que mejor potencia el modelo de venta directa de LDA

Solución Vertical Especializada

Financial Services Cloud **no es un CRM generalista** configurado para seguros. Es una solución vertical diseñada específicamente para la industria financiera y aseguradora, construida sobre décadas de mejores prácticas globales y evolución sectorial.

Beneficios

linea directa

- Adoptar una **arquitectura probada** en aseguradoras líderes globalmente
- **Reducir drásticamente** desarrollos personalizados estructurales
- **Acelerar la transformación digital** con implementación ágil
- **Evitar deuda técnica futura** con arquitectura escalable
- **Incorporar innovación continua** sin re-implementaciones costosas

Evolución de la Arquitectura

Arquitectura Fragmentada

Múltiples sistemas desconectados, datos aislados, procesos manuales, alta complejidad de integración

Plataforma Unificada FSC

Sistema único integrado, Customer 360 real, procesos automatizados, arquitectura escalable

FSC permite a Línea Directa evolucionar de una arquitectura fragmentada hacia una plataforma unificada, inteligente y escalable.

Apalancados en sus capacidades de IA nativas, para mejorar productividad y la calidad de cada interacción con el cliente, sin necesidad de configuración adicional ni costes de implantación

Caso de uso	Motor IA	Descripción	KPI esperado
NBA Cotización Multiproducto	Einstein NBA + Rules Engine	Recomienda la mejor oferta multiproducto para maximizar conversión.	+12% conversión
Lead Scoring — Propensión compra	Einstein Lead Scoring	Prioriza leads con mayor probabilidad de compra.	+18% leads Walmeric
Clasificación automática siniestros	Einstein Classification (NLP)	Clasifica siniestros por tipo y severidad automáticamente.	-60% tiempo clasificación
Predictive Case — Riesgo litigio	Einstein Prediction Builder	Estima probabilidad de litigio y dispara mitigaciones.	-20% derivación litigio
Predictive Case — Riesgo litigio	Einstein Prediction Builder	Predice riesgo de abandono para activar acciones preventivas.	-15% cancelaciones
NBA Retención — Argumentario dinámico	Einstein NBA (retención)	Sugiere argumentario de retención adaptado al perfil.	+25% retención Riesgo Alto
Scoring propensión al pago	Einstein Scoring	Predice propensión de pago para optimizar recobro.	+20% cobro 1er intento

Capacidades de IA embebidas de serie en FSC para que los agentes pueden utilizar de forma natural en su trabajo diario

Como valor añadido, compartimos con LDA casos de uso reales de IA que ya están transformando a nuestros clientes del sector seguros

El sector asegurador enfrenta un cambio donde la eficiencia y la experiencia del cliente ya no dependen solo de procesos manuales o bots rígidos. Casos de éxito muestran cómo aseguradoras han mejorado con agentes inteligentes que razonan, acceden a datos en tiempo real y actúan con precisión.

Empresa	Desafío	Solución
Aseguradora Genérica	Declaración de siniestros, envío de fotos y solicitud de grúa de forma manual y lenta.	Reducción del 30% en el tiempo de declaración de siniestros mediante IA autónoma.
Aseguradora Genérica	Alta carga en consultas de coberturas, descarga de certificados y estado de pagos.	Automatización del 70% de las consultas frecuentes sin intervención de agentes.
Andina ART	4 personas coordinando 12,000 traslados al mes. Tiempo de asignación: 29 horas.	Tiempo de asignación bajó a 40 min. Agentforce gestiona el 69% de los casos por WhatsApp.
Más Seguros	Localizar información en carteras de +1,000 pólizas era lento y frustrante para el usuario.	Respuesta en < 5 minutos (antes 1-2 días). Libera 1/3 del tiempo de los asesores.
Hipotecario Seguros	Bot de WhatsApp (Einstein) rígido, limitado para escalar y con diálogos poco naturales.	Migración a Agentforce para conversaciones fluidas y escalabilidad total del roadmap digital.



Experiencias reales y lecciones aprendidas que servirán de guía en la evolución de LDA

Integraciones – aspectos claves tecnológicos

04



MINSAIT


Minsait propone Mulesoft como solución de Integración para cubrir los requisitos planteados por Línea Directa en esta RFP


A través de Mulesoft, Linea Directa contará con una plataforma que le permitirá evolucionar su ecosistema tecnológico gracias a las siguientes capacidades:

- Gestión del ciclo de vida completo de las APIs mediante una plataforma unificada.
- Implementar cualquier patrón de integración, incluyendo API Management, ESB, SOA, ETL/ELT, Batch, streaming y Publicación / Suscripción.
- Permite la ejecución tanto on-premise, iPaas, nube privada o en instalaciones híbridas.
- Permite conectar cualquier aplicación, dato o dispositivo, ya sea en la nube u on-premise.
- Enfoque de entrega único, permitiendo a los clientes crear el modelo operativo óptimo para favorecer la reutilización y el autoservicio de las APIs.

Mulesoft es una plataforma COMPLETA de integración…







Con esta solución, se proporcionará un entorno de integración y gestión de APIs escalable y seguro que permitirá acelerar la transformación digital

Los **principios fundamentales** del diseño de la solución son los siguientes:



Plataforma unificada

- La solución proporciona una **única plataforma**: la plataforma MuleSoft Anypoint.
- Las API desarrolladas pueden reutilizarse fácilmente en diferentes entornos de ejecución, agilizando el de implementación de las APIs manteniendo la coherencia entre entornos
- Centralización de la gestión del ciclo de vida completo de la API, accesible tanto para los desarrolladores como los operadores.
- Capacidades de monitorización en tiempo real de la ejecución de las APIs gestionadas por la plataforma, así como la visualización del impacto entre las APIs

Capacidades iPaaS

- Control Plane alojado en AWS y gestionado por Mulesoft, lo que permite contar con las últimas capacidades de la solución.
- Disponibilidad de Runtime Plane completamente gestionado, lo que permite contar con un entorno de alta disponibilidad sin necesidad de llevar a cabo el mantenimiento de la plataforma
- El Runtime Plane puede desplegarse tanto en Cloud Hub (entorno SaaS) como en nubes públicas, privadas o incluso on-premise, lo que proporciona máxima flexibilidad en el despliegue de la solución


Escalabilidad


- La plataforma favorece la escalabilidad tanto horizontal como vertical.
- Esta arquitectura mejora el rendimiento y la fiabilidad, garantizando que el sistema pueda adaptarse a los cambiantes requisitos empresariales.
- La integración stateless garantiza el rendimiento de la plataforma incluso en periodos de alta demanda.

Proponemos una arquitectura de integración orientada a APIs para conectar Salesforce con el ecosistema tecnológico de LDA

La arquitectura propuesta cuenta con **3 elementos principales**:

- **Control Plane** que incluye API Exchange, Design Center y Management Center que permite llevar a cabo la gestión del ciclo completo de las APIs
- **Flex Gateway** que será el API Gateway donde se ejecutarán las políticas de seguridad del consumo de las APIs.
- **Mule Runtime** donde se podrán albergar los flujos de integración con los diferentes sistemas (Galgo, ASNEF, SINCO,…) que permitirá llevar a cabo la orquestación de servicios y se comunicará mediante un conector nativo con el **Salesforce**

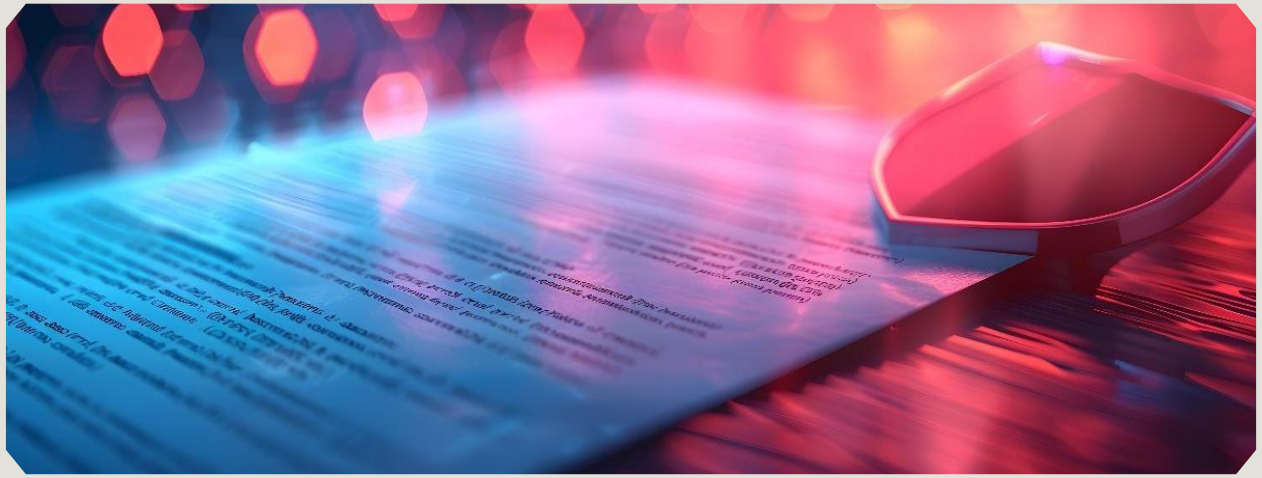

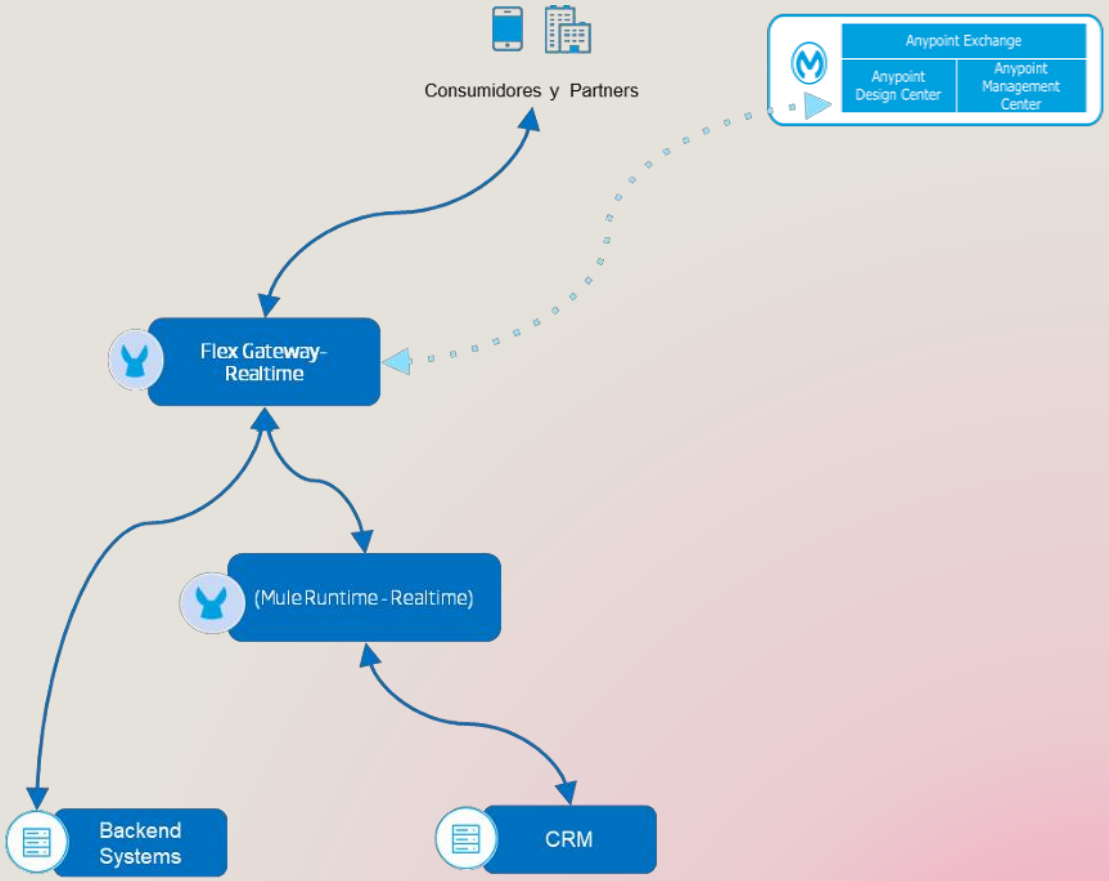

Teniendo en cuenta todas las Integraciones identificadas en el modelo TO-BE del assessment….

Ecosistema de integraciones del CRM Salesforce FSC

Plataformas analíticas

- DWH y sistemas analíticos – reporting y análisis estratégico
- Modelos predictivos – Next Best Action / Next Best Offer

Canales de relación con cliente

- Web y App – interacción digital con el cliente
- Canales digitales – email, SMS, push y notificaciones
- Experiencia omnicanal integrada con el CRM
- Gestión de interacciones y segu

Sistemas corporativos

- Gestor documental – consulta y gestión de documentación
- Mapa de contactos – histórico de interacciones con cliente
- Centro de notificaciones – en

Core Asegurador

Galgo
- Consulta y gestión de clientes y pólizas
- Acceso contextual desde CRM a funcionalidades operativas del core
- Intercambio de información para la visión 360º del cliente

CRM – Salesforce FSC

- DWH y sistemas analíticos – reporting y análisis estratégico
- Modelos predictivos – Next Best Action / Next Best Offer

Contact Center – Genesys Cloud

- Gestión de interacciones con cliente
- Integración CTI con Salesforce FSC (Open CTI)
- Screen-pop y contextualización de cliente
- Registro automático de interacciones

Genesys CTI Connector

Plataforma de Integración

Mulesoft Anypoint Platform
API Management y orquestación de servicios
- Capa de integración para desacoplar sistemas del ecosistema
- Exposición y consumo de APIs entre CRM, core y sistemas corporativos
- Orquestación de procesos y transformación de datos
- Gobierno, seguridad y monitorización de integraciones

Fuentes externas

- SINCO
- ASNEF
- Catastro
- HomeServe
- Otros servicios externos de contexto cliente

Plataforma de Eventos

Kafka - Event Streaming Platform
- Plataforma de publicación y distribución de eventos del ecosistema
- Captura de cambios del core (CDC) y publicación de eventos de negocio
- Consumo de eventos por CRM y sistemas corporativos
- Integración asíncrona y desacoplada

(Responsabilidad de LDA)

Las integraciones del ecosistema se gestionan a través de una capa de integración basada en **MuleSoft**, complementada con una **plataforma de eventos (Kafka)** que permite desacoplar sistemas y evolucionar el ecosistema sin impactar en el core.

… y con la siguiente hoja de ruta de transición hacia Salesforce FSC..

FASE 1

- CRM y frontal de Galgo conviven temporalmente
- Integraciones iniciales mediante APIs del Core
- Sin impacto en la operativa actual

Convivencia Inicial

FASE 2

- Nuevas funcionalidades implementadas en CRM
- Integraciones desacopladas mediante MuleSoft
- Eventos del Core publicados a través de Kafka

Migración progresiva de capacidades

FASE 3

- CRM centraliza la operativa del negocio
- Reducción progresiva del uso del frontal de Galgo
- Integraciones estabilizadas y monitorizadas

CRM como canal principal (Modelo objetivo)

kafka **Plataforma de Eventos**

MuleSoft **Plataforma de Integración**

La transición se realizará de forma progresiva, minimizando el riesgo operativo y garantizando la continuidad del negocio durante todo el proceso

...aplicando las mejores prácticas recomendadas por Mulesoft...

La aproximación API-led connectivity es un estilo de arquitectura de integración que prioriza las API y las asigna a tres niveles


Es una forma metódica de conectar los datos a las aplicaciones a través de una serie de APIs reutilizables y con un propósito determinado, cada uno desarrollado para desempeñar un papel específico:


- Desbloquear datos de los sistemas
- Componer los datos
- Entregar una experiencia

System APIs: Desbloquea los datos de los sistemas backend y permite descentralizar el acceso a los mismos aislando de las especificaciones técnicas de cada uno de ellos.

Process APIs: Permite la orquestación y composición de información aumentando la reutilización de los Experience APIs.


Experience APIs: Orientados al consumo de la información requerida por las aplicaciones que consumen los datos.

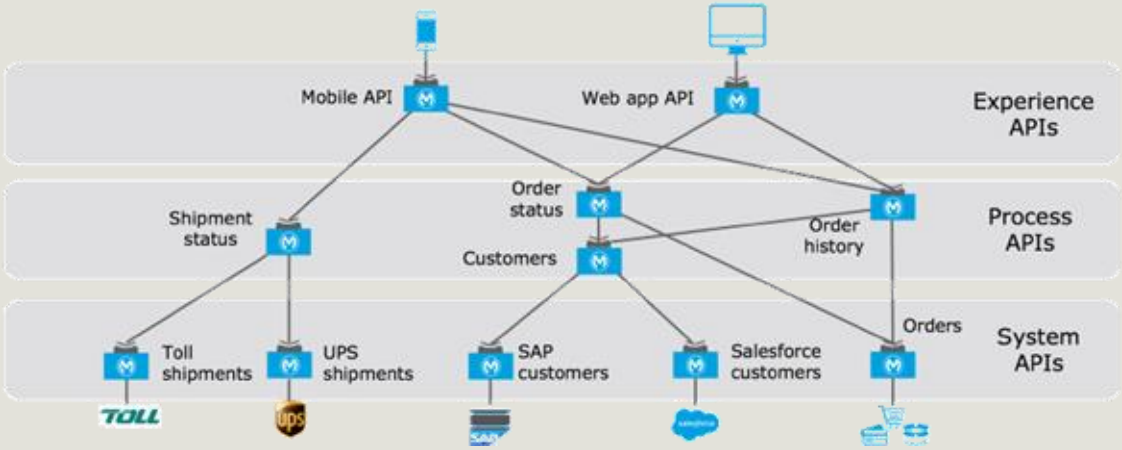

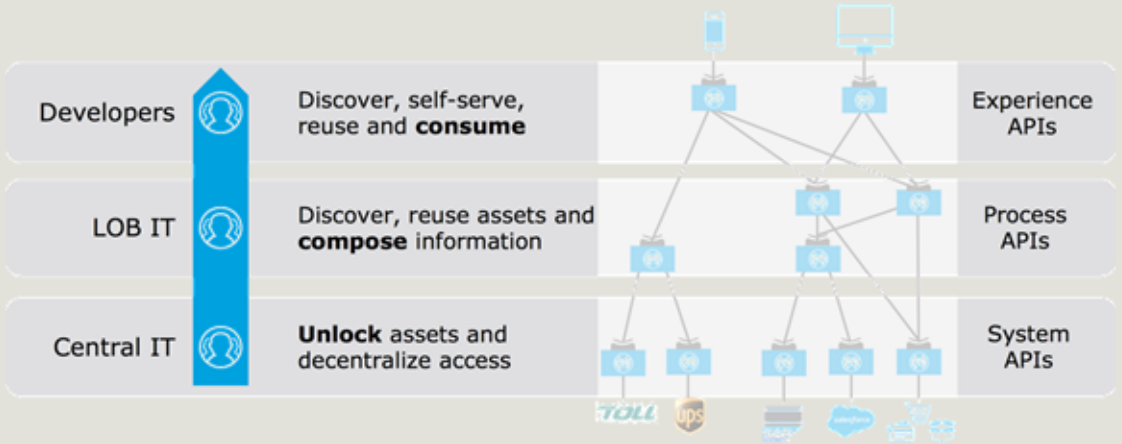

… para crear una arquitectura de integración "componible"

Siguiendo la aproximación API-Led Connectivity que nos permitirá aumentar la reutilización de los activos construidos durante la ejecución del proyecto mejorando el time-to-market de los flujos de integración y basado en la información obtenida durante la fase de assessment se han identificado un conjunto de integraciones que se representan de manera ilustrativa en el diagrama adjunto

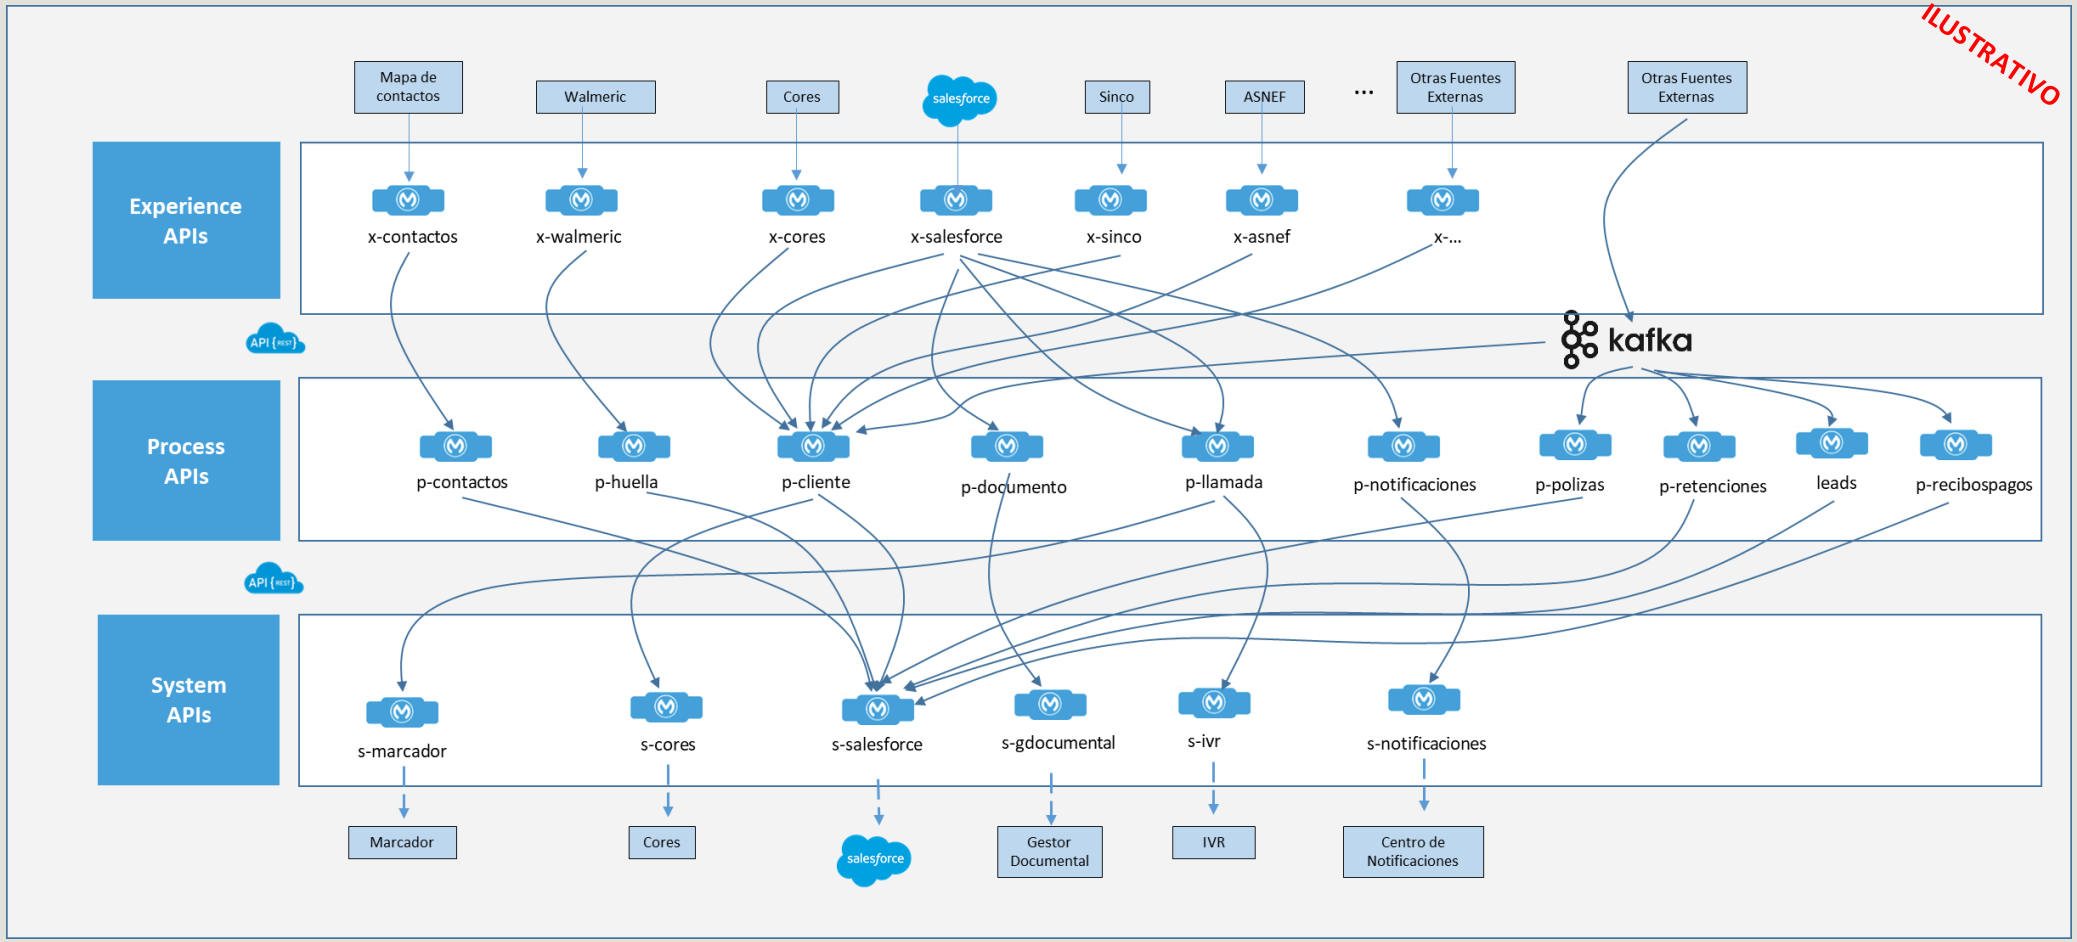

Durante la fase de Discovery se realizará un análisis detallado de las integraciones junto con LDA para refinar el diagrama API-Led

Modelo de integración – responsabilidades de implementación

Responsabilidades MINSAIT

- Diseño de **APIs de integración** en MuleSoft
- Implementación de **flujos de integración y orquestación de servicios**
- Integración con la **plataforma de eventos Kafka**
- Definición de **eventos de negocio y consumo desde el CRM**
- Gobierno, seguridad y **monitorización de integraciones**

Dependencias línea directa

- Disponibilidad de **APIs del core asegurador Galgo**
- Acceso a **sistemas corporativos y servicios de integración**
- Publicación o acceso a eventos del core (CDC / eventos de negocio)
- Definición conjunta de **contratos de datos de integración**
- Participación en la **validación funcional end-to-end**

Responsabilidades en el modelo de integración

- Minsait lidera la implantación de la capa de integración (MuleSoft) y la definición de APIs y eventos del ecosistema.
- LDA proporciona acceso a los sistemas core y corporativos y participa en la definición de contratos de integración y validación funcional.

Este modelo nos permite implantar las integraciones de forma controlada, desacoplando el CRM del core y facilitando la evolución progresiva del ecosistema

Gestión del cambio

05




MINSAIT

La ejecución de un assessment inicial, fijará las bases del plan de gestión del cambio que se aterrizará y ejecutará de forma acompasada a cada release

Framework de la Gestión del Cambio

I *Assessment* inicial de preparación del del Cambio



- Analizar el **punto de partida** (procesos, cultura, competencias, niveles de resistencia, etc.)
- Identificar y clasificar los **grupos de usuarios / stakeholders** y entender su operativa actual
- Definir cómo ejecutar **comunicación y formación** en el proceso de gestión del cambio
- Establecer la metodología de las **acciones de adopción**
- Resultará un **journey de acciones** (formaciones y comunicaciones) **por grupo de usuario**
- Definir **modelo de acompañamiento, seguimiento y refuerzo**

4 semanas

A ejecutar de forma previa a la preparación de la primera release

II Gestión del cambio ligada a cada *release*



- **Revisión y refinamiento del enfoque preliminar definido en el assessment** que deberá ajustarse y personalizarse.
- Se **elaborarán los materiales seleccionados** en base a las características de cada release funcional
- Se ejecutarán las **acciones de gestión del cambio** a **asociadas a cada release**
  - **Acciones de comunicación y motivación** antes de la certificación intermedia o ejecución de releases parciales
  - **Acciones de formación** tras la certificación intermedia de la release y antes de implantación
  - **Acciones seguimiento y control** continuas**, y de refuerzo**


8 semanas por release (4 de preparación y 4 de ejecución)

A ejecutar en paralelo a cada release funcional y posteriormente para seguimiento y control

El assessment inicial debe contemplar el mapa de audiencia impactada, la estrategia de comunicación y formación, las acciones y journeys de adopción…

Assessment inicial – Detalle del plan (1/2)

1. Mapa de stakeholders y gobierno del cambio

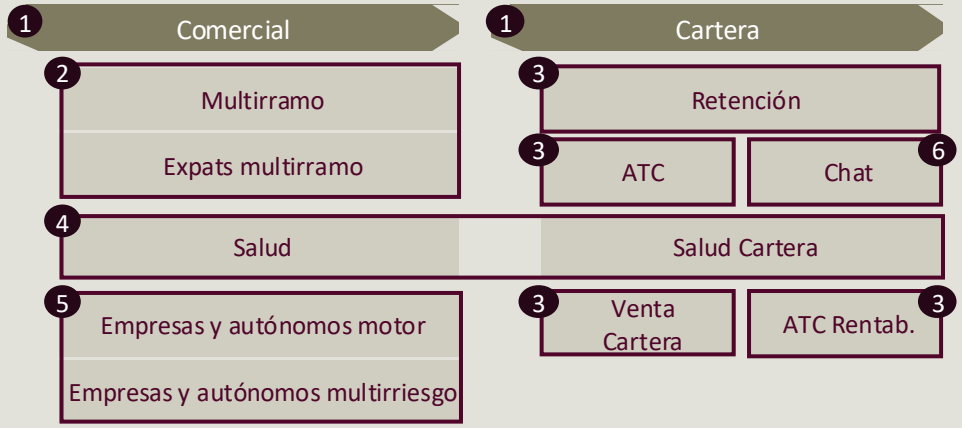

Plan de afectación usuarios, alineado con releases *(ver detalle en sección de implantación CRM)*

Para cada release será clave identificar impactados: gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclam.

1. *MVP*
2. *Cotización integral:*
   - (A) *Hogar, antiokupa, mascotas*
   - (B) *Coche, patinetes y bicis*
   - (C) *Motos*
   - (D) *Expats, todos sin antiokupa*
3. *Suplementos (ATC+ATC rent.) y cross-sell (venta cartera)*
   Retención, recibos y pagos, y recobros (retención)
4. *Salud comercial y cartera*
5. *Empresas*
6. *Chat*

2. Estrategia de comunicación y de formación

Debe definir elementos que estructuren el plan a ejecutar, con **comunicaciones informativas y motivacionales** (p.e. beneficios del cambio, usuarios sean formadores "champions", reconocimiento de logros, etc.)

Objetivos de comunicación	Mensaje de comunicación	Canales de comunicación	Planificación de comunicación

Contempla necesidades de los **usuarios y guía el diseño de acciones formativas** de cada release

Objetivos de la formación	Contenido de la formación	Métodos de formación	Planificación de la formación

3. Acciones de adopción

Desarrollaremos diferentes acciones de adopción, en función de la estrategia definida, para lograr el mayor impacto e involucración



4. Journeys de adopción

Una vez todo definido, se establecen los journeys de adopción para cada grupo



… y también un primer marco de KPIs que permitirá medir la adopción de las funcionalidades implementadas en cada release

Assessment inicial – Detalle del plan (2/2)

5. Elaboración de KPIs, plan de seguimiento y control

- Se identificará la **información e indicadores disponibles** en Salesforce para las funcionalidades implementadas….

Indicadores de uso (nivel de uso por colectivo)	• Número de cotizaciones con pricing dinámico generadas al día por usuario • Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario • Uso de la funcionalidad de volcado de recibos • Número de solicitudes de abono procesadas
Indicadores de soporte	• Número de incidencias generadas en funcionalidad de actualización de datos en póliza • Número de registros de error generado por día • Número de consultas al apartado FAQ • Incidencias funcionales repetitivas • Tiempo medio de incidencia abierta en el sistema
Otros indicadores	• Grado de satisfacción de los usuarios • Curva de aprendizaje y rendimiento, • Número de visitas a los cursos subidos a la plataforma • Puntuaciones medias de los tests ejecutados por usuarios

- … y se planteará la fijación de umbrales y alertas en cuadros de mando de adopción a cada release…

Seguimiento de conexiones al CRM



Seguimiento de emisiones realizadas

- … y se definirá la **estrategia de refuerzo y control**, que deberán activarse ante desviaciones en los KPIs definidos

Recopilación de Feedback | Plan de seguimiento | Acciones correctivas | Beneficios vs plan

Tras el assessment inicial y previo al GO LIVE de cada release, refinaremos el plan e iniciaremos la ejecución de las actividades de gestión del cambio

Framework de Gestión del cambio ligada a cada *release*

Definición | Desarrollo | Pruebas | Despliegue

1. Refinamiento del assesment inicial y preparación

Para cada reléase del proyecto de implantación, se refinarán las tareas realizadas en el assesment inicial y se revisarán y ajustarán de forma detallada los **usuarios impactados, se acordará definitivamente las acciones de adopción** (formación comunicación) y se **elaborarán los materiales** que les darán soporte en base a la estrategia del assessment inicial

- Selección de grupos de usuario impactados
- Configuración de acciones de adopción (comunicación y formación)
- Elaboración de materiales de formación / comunicación
- Definición de journeys de adopción (refinamiento de la fase de assessment inicial)

2. Ejecución

Se ejecutan las **acciones de formación, adopción y comunicación** en línea con la estrategia del assessment inicial

- Impartir sesiones de formación
- Ejecución de otras acciones de adopción
- Lanzamiento de comunicaciones

3. Refuerzo y acompañamiento

Se recoge el **feedback de usuarios**, se **refuerza ante desviaciones** en indicadores y se acompaña al usuario

- Recopilación del feedback
- Ejecución del refuerzo
- Acompañamiento (junto con “usuarios champions”) en GO LIVE para evitar pérdida de tracción

4. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación se realizará en función del **plan de seguimiento, control y refuerzo** definido durante el assessment inicial, que determinará los **indicadores a monitorizar**, los **umbrales** para la fijación de alertas y las **acciones de refuerzo** a ejecutar ante desviaciones

En fase de preparación, aprox. 2 meses antes del GO LIVE de cada release, refinaremos el plan del assessment y prepararemos los materiales necesarios

1. Refinamiento del *assesment* inicial y preparación



Grupos de usuarios	Confirmar usuarios impactados por la reléase, el grado de afectación en su día a día y clasificar para determinar las acciones más adecuadas
Formación y materiales	Elaboración de las formaciones acordes al plan para poder realizar el diseño de materiales correspondientes
Comunicación	Adaptar las comunicaciones previstas a los contenidos específicos de la release y a las características de los usuarios impactados
Acciones de adopción	En base al assessment inicial y las características de los usuarios seleccionar las acciones de adopción para cada grupo y plantear el calendario detallado
Journeys de adopción	Revisar los journeys establecidos en el assessment inicial para garantizar que se realizan las acciones planteadas y ajustar en función de las necesidades específicas de la release

Entregables a construir

- **Manuales de la operativa completa de la release** que se construirá de forma **modular** y **específico a cada rol** (coordinador, supervisor, agente y formador)
- **Materiales de apoyo para las acciones de gestión del cambio** (formativo, comunicación, adopción, motivación, etc.):
  - Vídeos
  - Píldoras formativas
  - Infografías
  - Cartelería
  - Cursos (SCORM)
  - ...

En esta etapa es clave revisar el plan definido durante el assessment inicial, y aterrizarlo / personalizarlo a las características concretas y exactas de la reléase: grupo de usuario impactado, formación y material, comunicación, acciones de adopción, journey, etc….

… y una vez, esté claramente aterrizado diseñaremos los contenidos y elaboraremos los materiales en el formato definido (físico / digital) para potenciar la adopción

- Contamos con **elementos de diseño y plantillas propias** que ponemos a disposición del proyecto, pudiendo **adaptarnos al lenguaje de diseño y guía de estilo** de la organización
- Se propone la **personalización de los materiales de formación y comunicación** en función del grupo de usuarios para lograr mayor impacto y adopción aunque seguiremos las líneas corporativas
- Se priorizarán y definirán los **componentes reutilizables para generar un lenguaje común en las acciones formativas** reduciendo de este modo las curvas de aprendizaje y costes

Materiales en función del canal:

- **A través de personas**: Workshops y sesiones grupales para formadores, directores y gerentes
- **Canales internos digitales**: Difusión mediante email, teams, forms ,intranet y blog de empresa
- **Canales internos físicos**: Organización de eventos, rollups e infografías y campañas físicas
- **Canales externos**: Diseño y creación de reels y formaciones interactivas

Reels de formación



Formación mediante Form



Formación iteractiva



Difusión mediante email




Nos adaptaremos a la guía de diseño y estilo de Línea Directa para la elaboración de los materiales y proponemos **consensuar los materiales** a elaborar **en función del impacto y contenidos**

En las semanas previas al GO LIVE se ejecutarán las acciones de comunicación y formación, incorporando mecanismos para evaluar la adopción

2. Ejecución de comunicaciones y formaciones

En base a la estrategia de comunicación definida en el diseño se personalizarán las acciones de comunicación a lanzar

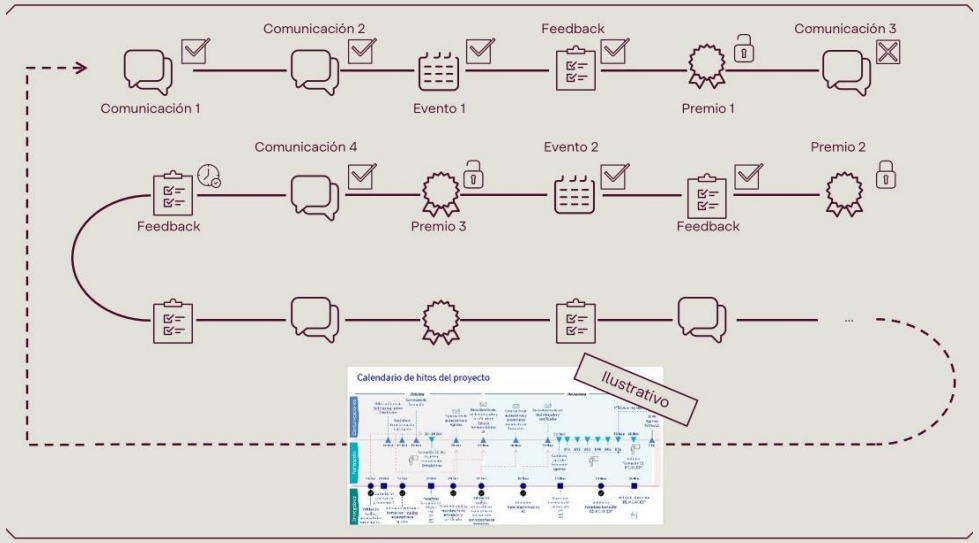

- El **envío de comunicaciones** debe realizarse desde canales que garanticen el impacto en función el grupo de usuarios (teams, eventos corporativos, etc.)
- El **envío de comunicaciones** debe realizarse tanto **antes de la acción de adopción** para generar interés como **después para generar continuidad** y **recoger feedback**

Y considerando la estrategia de formación y el diseño de materiales, ejecutaremos la formación

Ilustrativo

Por volumen de usuarios	0 - 30	30 - 50	50 - 100	+100
Roles	Directivos, responsables y formadores	Supervisores y coordinadores	Agentes seleccionados como impulsores	Grupos de agentes en función de operativas
Dinámicas contempladas	One-to-one, coffee corner, entrevistas personales, etc.	Sesiones grupales, eventos, espacios de conexión, etc.	Demos en remoto, sesiones en vivo, etc.	Sesiones grabadas, píldoras, vídeos, etc.
Formato de la formación	Presencial	Presencial / Remoto	Remoto	Remoto

Por número de sesiones

Preliminar

Con la información de la que disponemos y bajo las premisas de:

- Formar a un colectivo de 1.000 agentes de Contact Center
- Release funcional tipo de 5 meses de duración
- Preparación previa de las sesiones de 1 mes
- Ejecución de las acciones formativas durante 1 mes
- Sesiones formativas de 20 usuarios en total

Estimamos las sesiones y perfiles involucrados:

50 sesiones en total
1000 agentes / 20 agentes por sesión

2-3 sesiones diarias
50 sesiones / 20 días laborables

3 perfiles del equipo de proyecto involucrados
Reparto de la formación diaria en 2-3 franjas horarias durante la jornada para evitar impactar a la operación de los Contact Center

El **assessment inicial de la gestión del cambio** permitirá identificar la **composición de los equipos involucrados** y su operativa actual con el objetivo de identificar el **gap funcional** asociado a cada release, los **colectivos impactados** y la **estrategia óptima de formación**


- El modelo planteado es de formación de formadores en base al **itinerario formativo establecido en el journey de adopción para cada grupo y posteriormente estaremos de apoyo en las sesiones de formación a usuarios**
- Es clave que se definan **mecanismos de verificación de la transferencia mediante evaluaciones, certificaciones internas o equivalente**

Tras la comunicación y formación se recogerá feedback mediante encuestas y, junto con los datos de adopción, se definirán y ejecutarán acciones de refuerzo

3. Refuerzo

Ejecución del feedback

Tras la realización de las dinámicas de formación recogeremos el feedback y aspectos de mejora a aplicar en las próximas sesiones

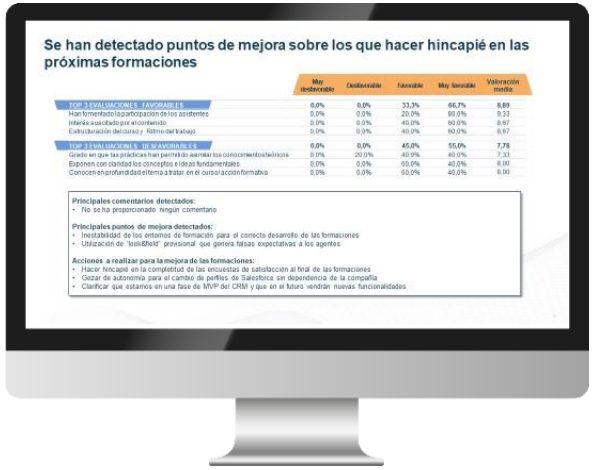

- Una vez realizada la formación se distribuirán **encuestas para valorar las sesiones** y de esta forma incorporar en los siguientes ciclos formativos las mejoras identificadas
- Adicionalmente podemos **realizar la monitorización de toda la actividad online** para detectar los problemas que se encuentran los usuarios y que no se verbalizan en las encuestas

Ejecución de acciones de refuerzo

Mediante el feedback y el seguimiento de las acciones determinaremos acciones de refuerzo a aplicar sobre los colectivos identificados



- El seguimiento del **impacto de las acciones de adopción y la recogida de feedback** de usuarios y formadores permitirá **enriquecer el diseño de las acciones de refuerzo**
- El **refuerzo se ejecuta** en base:
  - **Feedback** de usuarios y formadores
  - **Lecciones aprendidas**
  - **Monitorización realizada** a través de indicadores

Acompañamiento Minsait junto a usuarios “champion”

- Activaremos “usuarios champions”, preferiblemente aquellos que hayan participado en la fase de testing, para que actúen como referentes dentro de sus equipos. Su papel será apoyar a sus compañeros en la adopción del cambio y servir como punto de referencia cercano ante posibles dudas o dificultades en el uso de la herramienta
- Adicionalmente, desde Minsait proporcionaremos soporte operativo a supervisores, coordinadores y usuarios de sala para resolver dudas relacionadas con la operativa y asegurar una transición fluida durante la adopción del nuevo CRM

Finalmente, se construirán los KPIs que medirán el uso y el éxito de la herramienta de CRM, que se monitorizarán a través de cuadros de mando

4. Seguimiento y evaluación

A Modelo de seguimiento: Construcción de indicadores

- Se identificará la **información e indicadores disponibles** en la propia herramienta o funcionalidad implementada
- Se propondrán **nuevos indicadores** que permitan medir:
  - **Uso de la herramienta**
  - **Utilización de funcionalidades implementadas**
  - **Satisfacción** del usuario
  - **Fiabilidad** de las nuevas funcionalidades implementadas
- Los indicadores se clasificarán en tres grupos:

No exhaustivo

Indicadores de uso
- % de usuarios que acceden al CRM
- Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario

Indicadores de soporte
- Incidencias funcionales repetitivas
- % de empleados que completan acciones de formación

Otros indicadores
- Grado de satisfacción de los usuarios
- Curva de aprendizaje y rendimiento,

B Seguimiento de la adopción: cuados de mando

- Se reportan los **resultados periódicamente según los KPIs** establecidas y con acompañamiento experto
- Es clave la **monitorización del despliegue**
- La **definición de umbrales y controles** permite configurar alertas ante desviaciones no contempladas
- Los indicadores acordados podrán ser agregados en **un cuadro de mando de gestión del cambio** para facilitar su visualización
- Una **comunicación fluida con las diferentes áreas** implicadas es una palanca óptima para el transcurso del proyecto

Seguimiento de emisiones realizadas con nuevo portal



Seguimiento de conexiones a la herramienta



Ilustrativo

En todo el proceso de gestión del cambio es clave la colaboración activa entre el equipo de proyecto y las distintas áreas de LDA

Responsabilidades y grado de dedicación de LDA en la Gestión del Cambio

Rol	Funciones principales	Dedicación estimada tentativa (1)		
		Assessment inicial	Refin. y preparación	Ejecución
Project Manager CRM	• Coordinar a los actores de GdC y punto de referencia • Facilitar toma de decisión y validar enfoque global de adoptación, asegurando coherencia	• Coordinación de actores y validación del enfoque	• Reporting global y figuras de referencia del proyecto • Punto de entrada de peticiones, junto con equipo de proyecto	
Negocio y procesos	• Revisar assesment inicial, validar que el cambio refleja la operativa y alinear herramienta con formas de trabajo • Validar contenido de formación y comunicaciones	• Mapa stakeholders y estrategia de com. y forma.	• Validar materiales y contenidos	• Asegurar traspaso y acompañamiento
Líderes operativos y "champions"	• Identificar resistencias, dudas o dificultades en adopción • Acompañar a usuarios en la transición de operativa • Trasladar feedback operativo al equipo de proyecto	• Sin implicación directa	• Identificar aspectos clave para formaciones y común.	• Actuar como embajadores en la gestión del cambio
Usuarios y agentes	• Participar en sesiones de formación y la adopción • Compartir feedback sobre experiencia de uso • Acompañamiento a usuarios mediante los "champions"	• Sin implicación directa	• Identificar aspectos clave para formaciones y común.	• Asistencia a formaciones, dar feedback, etc.
Tecnología	• Apoyar la preparación de entornos de pruebas o formación cuando sea necesario • Colaborar en la resolución de incidencias detectadas	• Sin implicación directa	• Apoyo a preparar el entorno de pruebas	• Apoyo en la resolución de incidencias técnicas
Personas y comunicación	• Apoyo organizativo y alinear las comunicaciones y apoyo en su difusión por canales corporativos • Logística de acciones formativas (formación de formadores) e impartición a usuarios	• Soporte sobre los medios de comunicación dispon.	• Alineamiento de comunicaciones	• Asistir a formaciones de formad. • Impartir formaciones a users

(1) De forma aproximada: 1) Implicación puntual (1-2h / semana); 2) apoyo ocasional (4-6h/semana); 3) Colaboración recurrente (8-12h / semana); 4) Participación activa (12-20h/semana); 5) Rol clave (dedicación completa)

Soporte / transmisión del conocimiento

06




MINSAIT

La creación del CoE de Salesforce en LDA, da respuesta interna a necesidades de gobernanza y evolución ordenada de la plataforma


Responsabilidades del CoE Salesforce LDA

1. Definir y evaluar el roadmap de la plataforma
2. Garantizar la definición, validación y custodia de la arquitectura y estándares técnicos
3. Gestión, control y priorización de la demanda
4. Garante de calidad, sostenibilidad y escalabilidad de las soluciones
5. Establecer el alineamiento entre Negocio y Tecnología para la optimización del uso de plataforma y la construcción de soluciones user friendly

Organigrama Propuesto

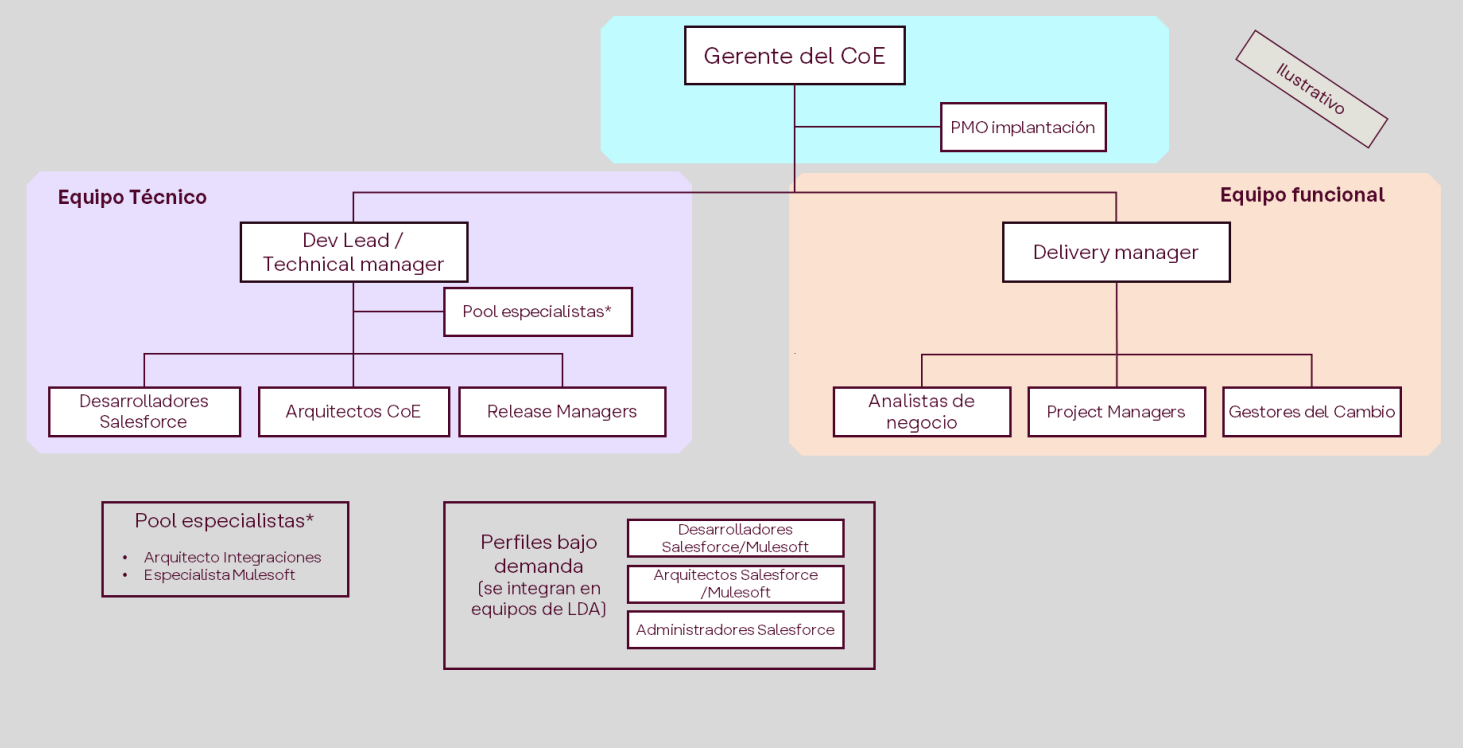

La constitución del CoE se aborda en paralelo al proyecto, permitiendo que el equipo de LDA evolucione progresivamente desde un rol de acompañamiento hacia un rol de gobierno y liderazgo de la plataforma, asegurando autonomía, control arquitectónico y capacidad de evolución futura

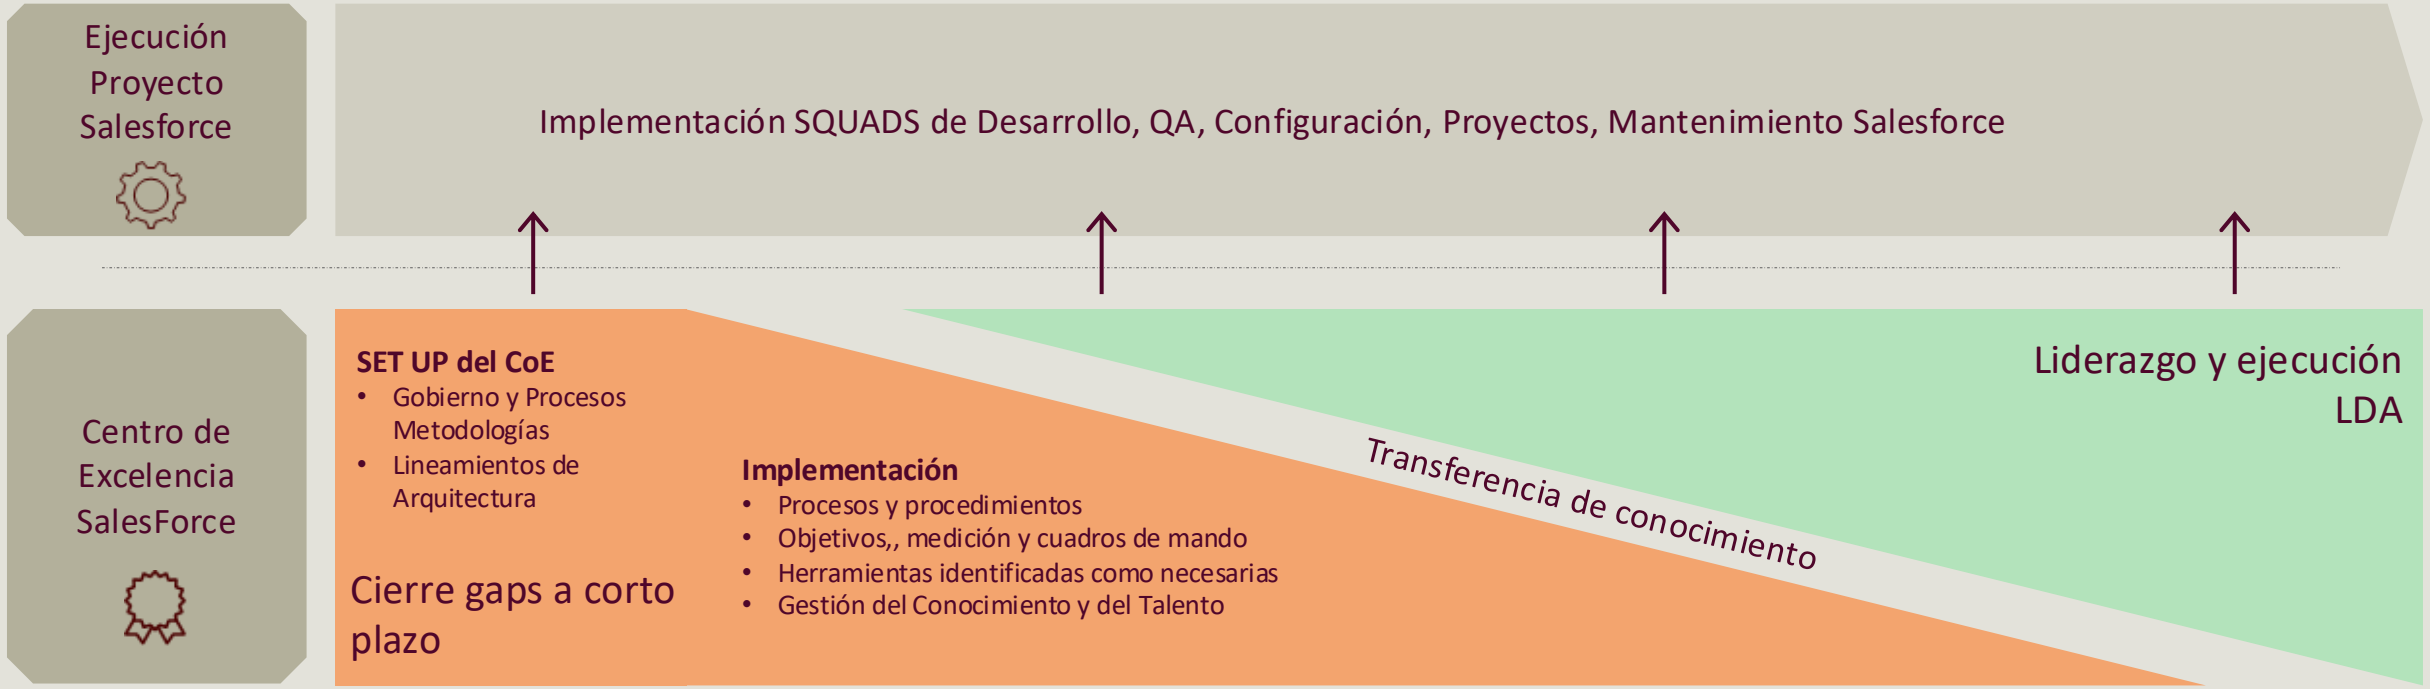

En paralelo se iniciarán las labores de consolidación e implementación de los procesos de gobierno, arquitectura, autoridad de diseño y gestión del conocimiento a través de métricas y KPIs, transfiriendo gradualmente capacidades y conocimiento desde el proyecto a LDA en un proceso gradual y guiado

Este enfoque se articula en un modelo por fases que define, para cada etapa, los objetivos y la evolución de responsabilidades entre el proyecto y el CoE

Fase	Objetivo	Rol de Proyecto	Rol de CoE
Fase 1. SET UP del CoE	Definir y poner en marcha el modelo de gobierno del CoE desde el inicio del proyecto.	Liderar la definición inicial del marco de gobierno, metodologías de trabajo y lineamientos de arquitectura, integrándolos en la ejecución del proyecto.	Constituirse como órgano de referencia, validando el modelo de gobierno, los procesos definidos y los principios arquitectónicos propuestos.
Fase 2. Implementación del CoE (en paralelo al proyecto)	Implantar los procesos operativos del CoE y cerrar gaps a corto plazo necesarios para su funcionamiento.	Ejecutar el proyecto mediante squads (desarrollo, QA, configuración, mantenimiento), incorporando los procesos del CoE en la operativa diaria.	Adoptar progresivamente los procesos del CoE: gestión de la demanda, seguimiento de objetivos y KPIs, uso de herramientas, y gestión del conocimiento y del talento.
Fase 3. Transferencia progresiva de conocimiento	Transferir de forma estructurada conocimiento funcional, técnico y de gobierno desde el proyecto al CoE.	Acompañar y tutorizar al CoE en decisiones de diseño, arquitectura, calidad y priorización, reduciendo progresivamente la dependencia del proyecto.	Asumir un rol activo en la validación de soluciones, revisión arquitectónica, control de calidad y priorización de iniciativas.
Fase 4. Liderazgo y ejecución del CoE (LDA)	Alcanzar la autonomía del CoE en el gobierno y evolución de la plataforma Salesforce.	Actuar como soporte experto puntual y asesor estratégico en iniciativas de especial complejidad.	Liderar la evolución de Salesforce: definición del roadmap, gobierno de la arquitectura y estándares, control de la demanda y garantía de calidad.

Actividades clave que materializan la transferencia de conocimiento y responsabilidades al CoE

1 Mediante decisiones reales del proyecto

- Participación en Diseño funcional y técnico
- Acompañamiento en toma de decisiones clave
- Revisión de HUs y aceptación

2 Criterios de arquitectura y gobierno

- Revisión de arquitectura y validaciones técnicas
- Participación activa en comités de seguimiento y priorización




3 Calidad y Sostenibilidad

- Revisión de calidad y validación de entregables
- Definición de criterios de escalabilidad

El soporte propuesto se articula en dos fases del proyecto: Durante la ejecución (post-implantación) y a la finalización del mismo, durante 12 meses (soporte y mantenimiento)

El soporte post-implantación se inicia con la puesta en producción del MVP, garantizando la estabilidad operativa y la adopción de la solución desde el primer uso real, y evolucionando posteriormente hacia un modelo de soporte y mantenimiento tras la finalización del proyecto.

La transición hacia este modelo de **soporte y mantenimiento** se realiza de forma progresiva y transparente, asegurando la continuidad del servicio y minimizando la curva de aprendizaje mediante la preservación del conocimiento, los procesos y los equipos de referencia.

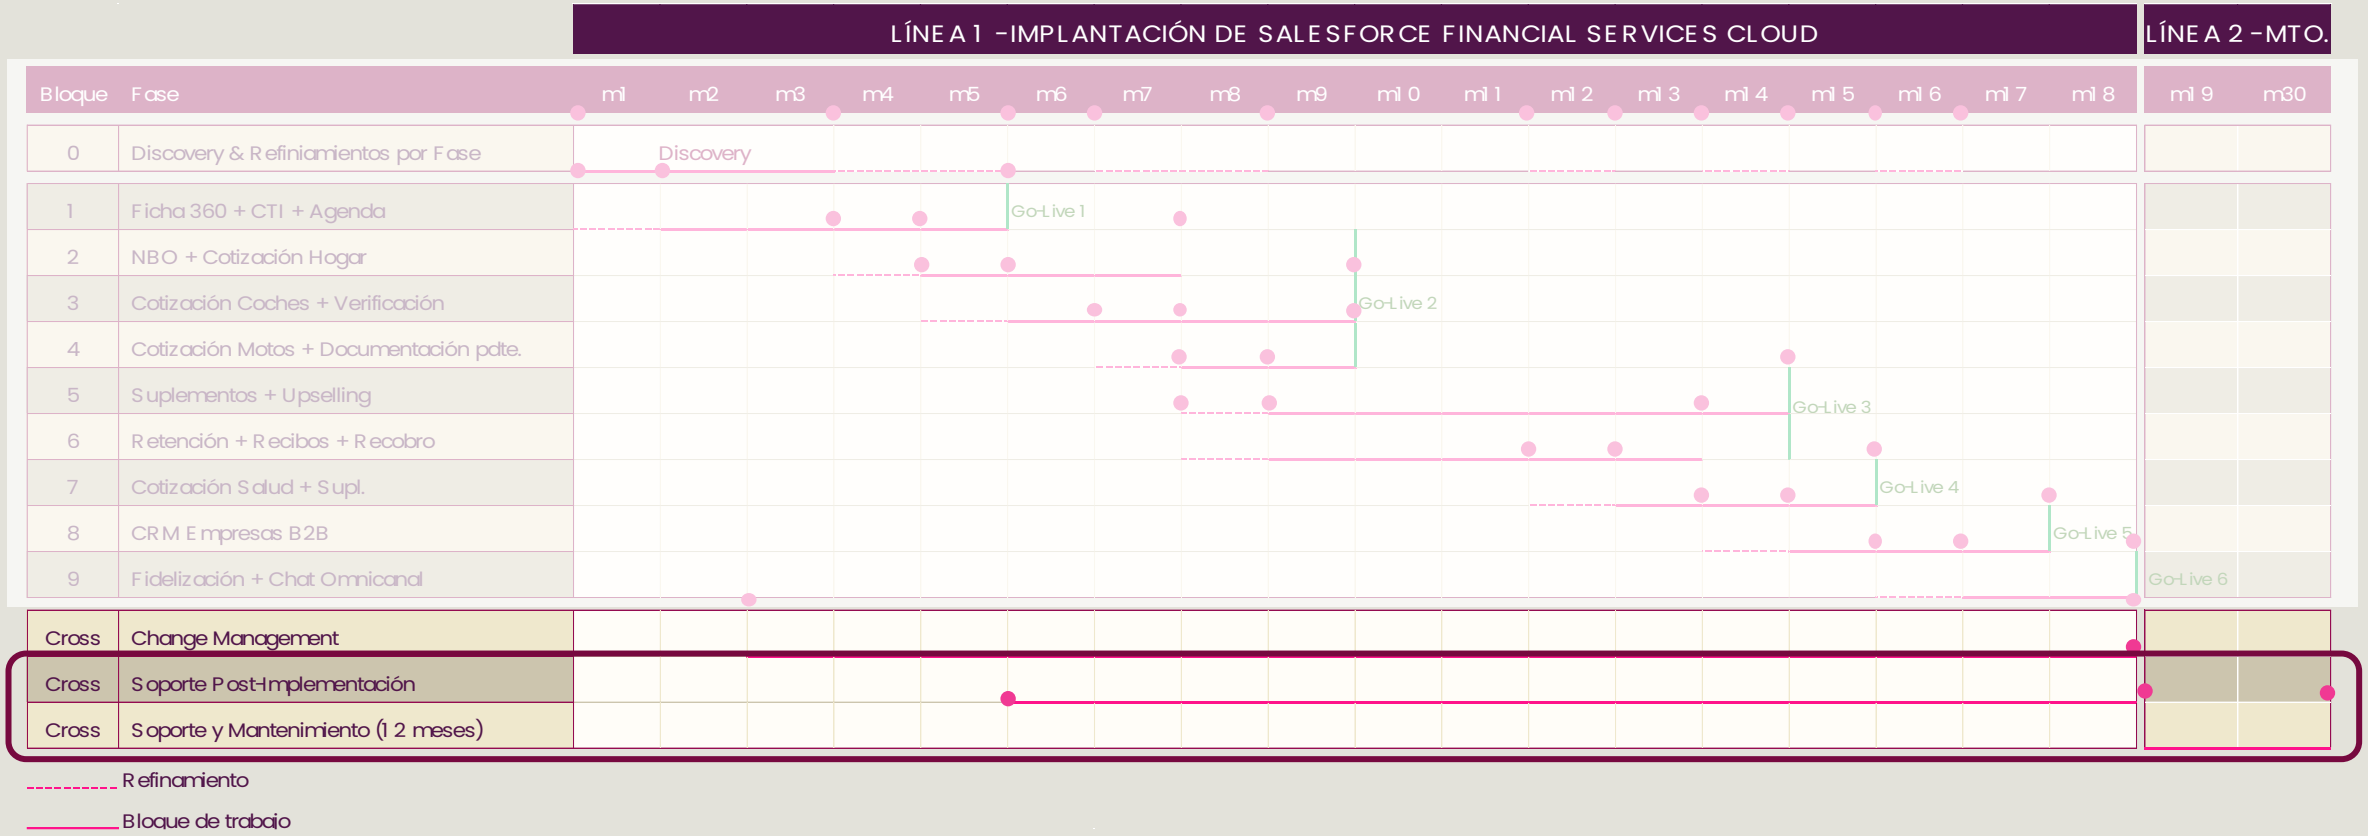

Proporcionaremos a LDA el soporte post-implantación iterativo para la estabilidad y uso de la plataforma desde la implantación del MVP

El periodo posterior al Go-Live del MVP y de los releases incrementales es una fase crítica del proyecto y será gestionada con especial atención

- Participan los equipos de proyecto de manera coordinada: gestión de cambio, funcionales y técnicos
- Priorización la resolución temprana de incidencias
- Detección de usos no previstos, lagunas funcionales, necesidades de ajuste fino



Soporte presencial en oficinas de LDA durante las 4 semanas posteriores a la puesta en producción de cada Release



Triaje y resolución de incidencias y Shadowing del uso de la herramienta

Actividades en el soporte post-implantación

Soporte estructurado y orientado a diferentes objetivos

Identificación de necesidades formativas

- Shadowing con usuarios para soporte
- Apoyo en píldoras de formación para reforzar el buen uso

Mejora operativa

- Planteamiento de mejoras
- Seguimiento de mejoras

Cuadros de Mando e Informes de Control (sistema)

- Cuadro de Mando de incidencias
- Seguimiento de mejoras
- Listados e Informes de Control operativo

- Resumen actuaciones y status

Informe de conclusiones y plan de estabilización

Formación

Gestión de Personas

Incidentes

Anomalías

Principales objetivos del Soporte:

- ✓ Acelerar la **adopción** tras el despliegue
- ✓ **Disminuir la aparición** de incidencias **y resolver** anticipadamente
- ✓ Proporcionar información agregada y de detalle para permitir evaluar la situación del despliegue
- ✓ Dotar a LDA de la **información necesaria** para que pueda realizar un seguimiento lo más detallado posible del estado general del servicio.
- ✓ **Gestión de conocimiento** en base a los informes realizados en el conjunto de la prestación de servicio.

Minsait presenta una propuesta integral que cubre el alcance del servicio de soporte y mantenimiento demandado

1. Alcance temporal

El servicio se extenderá durante 12 meses y se iniciará al finalizar el último golive del proyecto de implantación, si bien durante el mismo se ejecutarán tareas de Post-Implantación (hypercare) por parte del equipo de proyecto para garantizar el éxito del despliegue.



4. Niveles de soporte ofrecidos

El servicio se adaptará al modelo de servicio definido por LDA



2. Horario y equipo dedicado al servicio


Minsait ofrece un horario de atención en 8x5 de lunes a viernes. Atendiendo a la demanda de LDA sobre picos de incidencias fuera de este horario es posible generar una propuesta que asegure los KPIs de atención en todo momento.

Minsait prestará el servicio en remoto y con todos los recursos situados **dentro del territorio Español**, lo que permitirá garantizar el crecimiento humano necesario.


El equipo de Minsait estará formado mayoritariamente por **perfiles involucrados en el proyecto con el fin de disminuir la curva de aprendizaje**

3. Canales de soporte

Los canales de soporte para la comunicación de incidencias



5. Equipo de soporte

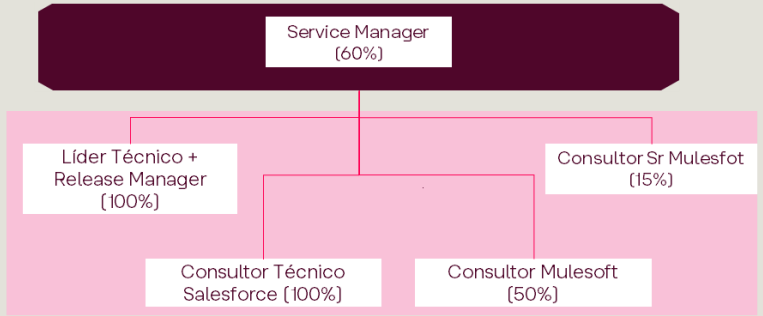

Equipo Correctivo & Soporte & Pequeño evolutivo

Propuesta sujeta a discusión


Proponemos un modelo de gobernanza flexible estructurado en 3 niveles para agilizar la toma de decisiones y asegurar la correcta interlocución

Se aconseja la participación del CoE de Salesforce de LDA en todos los niveles

	Comité de Dirección (Nivel Estratégico)	Comité Operativo (Nivel Ejecutivo)	Comités Técnicos (Nivel Operacional)
Periodicidad	Mensual	Quincenal/Semanal	
Funciones	• Validar la **evolución estratégica del servicio** y su alineación con los objetivos de LDA • **Revisar indicadores clave** de rendimiento (KPIs) y cumplimiento de **SLAs** • Escalar temas críticos y **resolver bloqueos** de alto impacto • Aprobar **cambios relevantes en alcance** y priorización del roadmap Salesforce	• Supervisar la ejecución y **avance de la demanda priorizada** por LDA • Controlar la capacidad de ejecución del servicio **(planificación y recursos)** • Garantizar la **calidad de entregables** técnicos y funcionales • Identificar y gestionar **riesgos operativos** • Ajustar **dependencias** y tiempos	Se definirán los comités específicos necesarios para garantizar todos los ámbitos del servicio: • **Comité de Arquitectura** – para alinear estándares y mejores prácticas • **Comité de Innovación** – para analizar y validar iniciativas y soluciones de mejora y optimización, además asesoramiento de adopción de la IA en los procesos de negocio • **Comité de competencias** – realizará el seguimiento de la gestión del conocimiento, planes de capacitación, transferencia de conocimiento… • **Comité de gestión de la demanda** – realizará el seguimiento de la calidad de los recursos, planes de capacitación, transferencia • **Comité de gobierno modelo de datos** – para velar por la integridad, coherencia y eficiencia del modelo • **Comité de priorización de deuda técnica** – para priorizar el backlog de deuda También se podrán convocar comités adicionales para cubrir necesidades adicionales
Participantes	• Sponsor Ejecutivo (LDA) • Steering Committee (LDA) • Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait)	• Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait) • Product Owners (LDA)	
Coordinación con LDA	• El Service Manager informa a LDA del avance, obstáculos y necesidad de ajuste de prioridades • En los comités estratégicos y operativos se pueden incluir responsables del Negocio LDA		

Diseñamos un servicio con cuatro capas que garantiza el día a día, elimina causa raíz y reduce progresivamente hasta un 20% anual el volumen de incidencias y/o soporte

El modelo se apoya en 4 pilares:

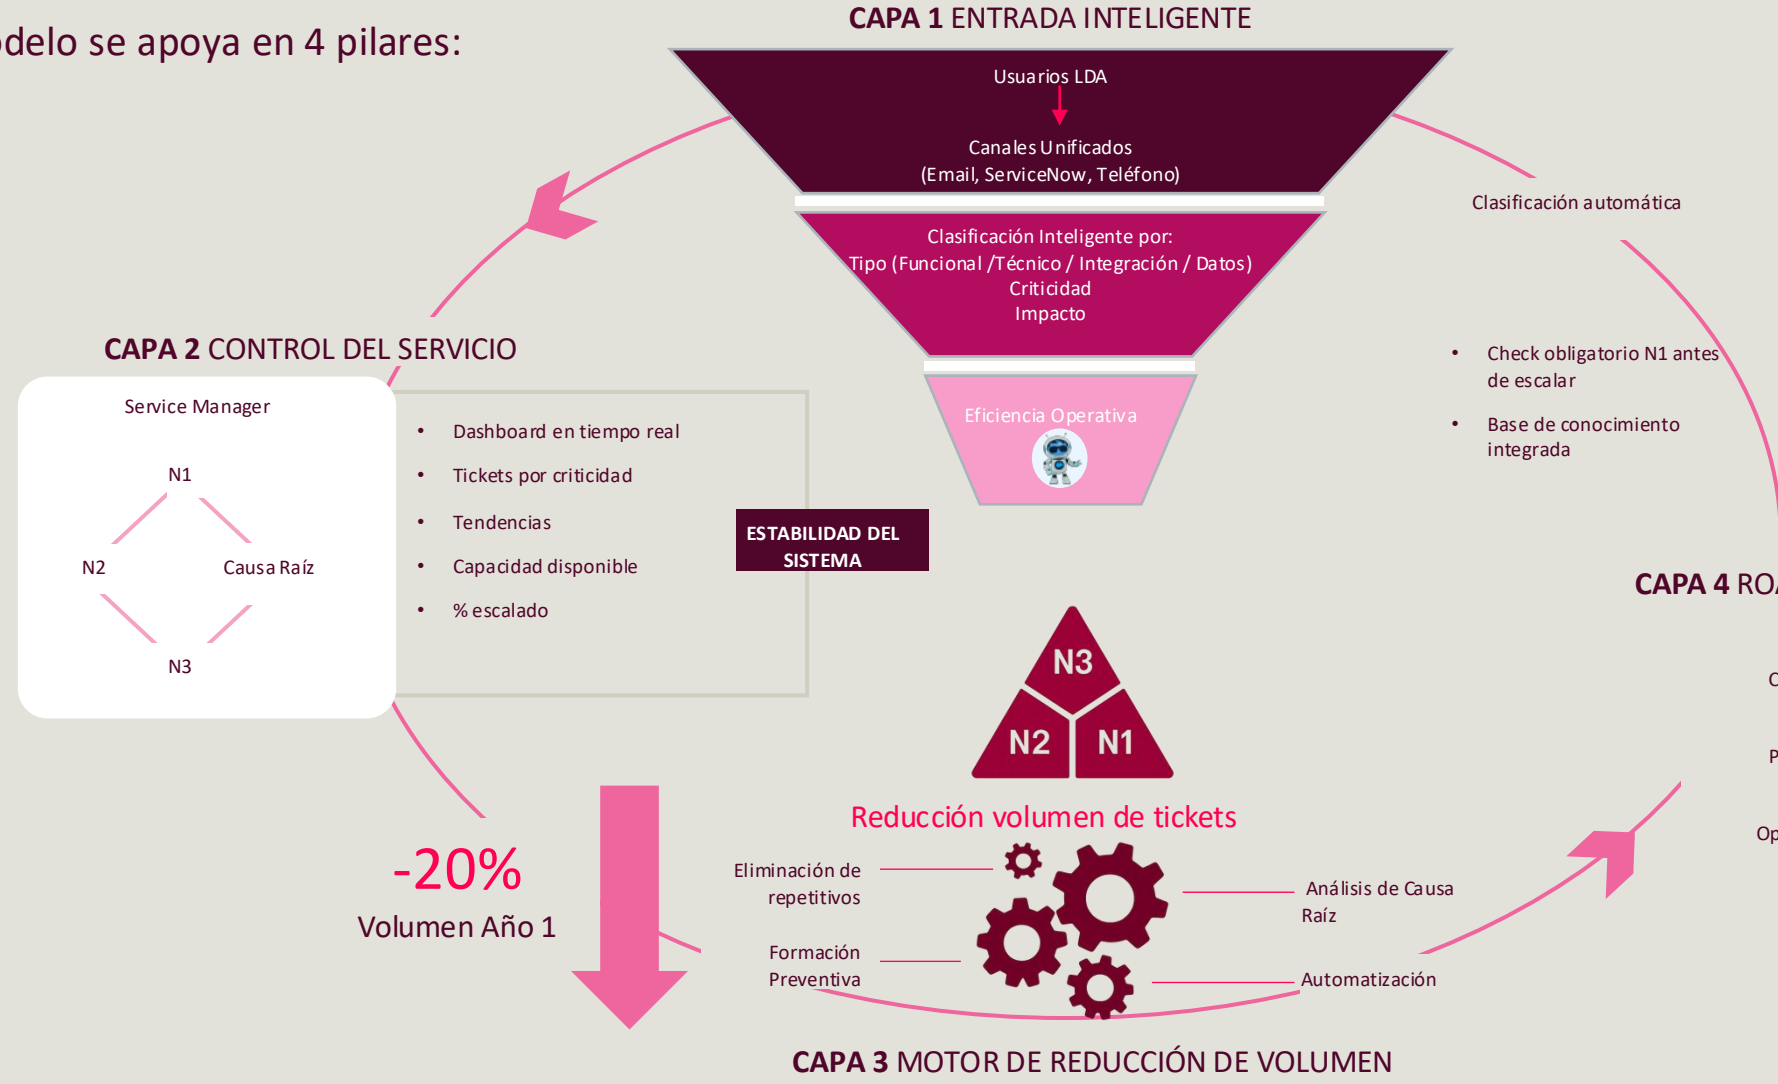

Modelo probado en entornos Salesforce Maduros


Este diseño de servicio en cuatro capas ha sido **aplicado en clientes con plataformas Salesforce maduras** y criticidad operativa similar a LDA.

En estos contextos, la implantación del modelo **ha permitido alcanzar reducciones progresivas de hasta un 20%** del volumen de tickets en el primer año, mediante control de la demanda, análisis de causa raíz y automatización selectiva.

Los resultados dependen de la situación de partida, el grado de adopción y la disciplina de ejecución, pero nuestra experiencia demuestra que el enfoque genera eficiencias sostenibles y mejora estructural del servicio.

Evolucionamos a un modelo correctivo inteligente que no solo resuelve incidencias, sino que identifica patrones, elimina causa raíz y mejora progresivamente la estabilidad y eficiencia del sistema

Visión del Modelo Correctivo Inteligente

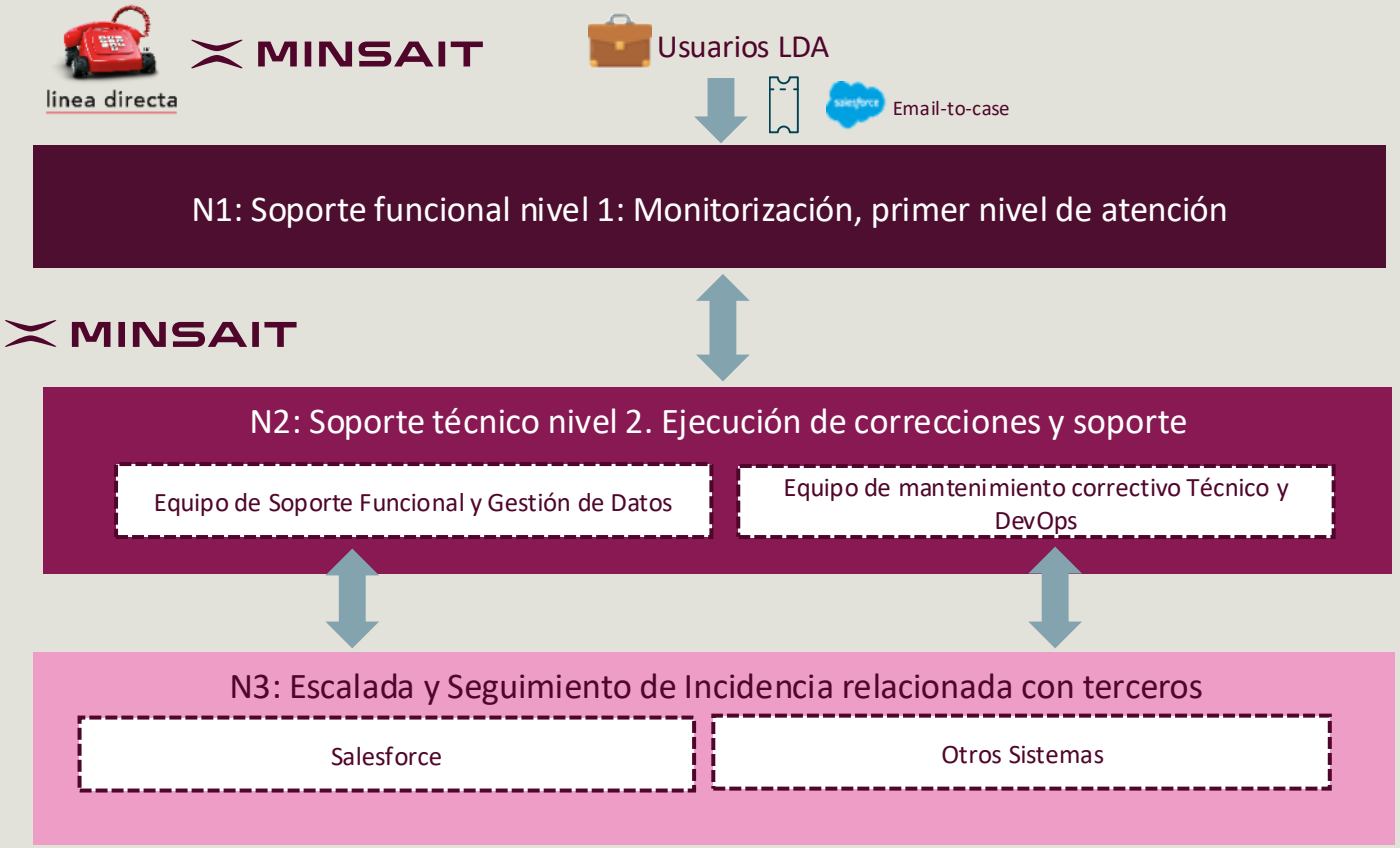

Soporte N1: Equipo multidisciplinar horizontal responsable de resolver peticiones, dudas funcionales e incidencias de menor complejidad, ejecutar las tareas preventivas y planificadas, así como las de operación, elaborar y ejecutar procedimientos operativos sobre las peticiones.

Objetivo 2º Año: 40% de resolución el primer contacto

Incorporación progresiva de herramientas IA (AgentoForce) de apoyo que permitan mejorar eficiencia sin perder control y calidad en la atención

N2 Funcional: Configuración avanzada, gestión de datos masivos y soporte al portal de clientes.

N2 Técnico: Resolución de errores en APEX, integridad de integraciones

N3: Seguimiento y coordinación proactiva de incidencias que afecten a Salesforce pero dependan de otros sistemas

Operación del Día a Día

- **Health Check Diario**: Cada mañana revisamos los logs de integración (Salesforce – Sistemas LCA) y los procesos críticos antes del inicio de la actividad del usuario.
- **Gestión Ágil de Incidencias**: Trabajamos con tableros visuales tipo Kanban para controlar el flujo de tickets en tiempo real, priorizar correctamente y evitar acumulaciones o bloqueos en N2.
- **Priorización por Impacto Real**: Las incidencias se gestionan según su impacto en negocio, no solo por orden de llegada.
- **Comunicación Clara y Continua:** El usuario recibe actualizaciones automáticas y periódicas sobre el estado de su caso.
- **Seguimiento Diario Interno**: Revisamos los tickets abiertos, los SLA comprometidos y los posibles riesgos operativos.

Nos comprometemos a garantizar la calidad del Servicio bajo los Acuerdos de Nivel de Servicio propuestos

Fase 1: Revisión

Durante la **fase de prestación** del servicio, serán revisados los SLA por parte de LDA y Minsait para determinar el valor comprometido de ambas partes.

Fase 2: Validación

- ✓ Validar que los plazos de gestión de las diferentes actividades se ajustan a los procedimientos de trabajo en vigor en cada momento.
- ✓ Garantizar que los Niveles de Calidad están correctamente definidos.

Fase 3: Adaptación

Los SLA deberán adaptarse en caso de modificación del alcance del servicio, y su actualización debe ser consensuada entre LDA y Minsait.





Medición / Seguimiento de SLA

Incumplimiento SLA



Análisis de Incidencias

Motivos Internos

Implantación Medidas Correctoras

Motivos Externos

- Cambio Proceso
- Impacto de Terceros



Presentación Evolución Nivel de Cumplimiento SLA



Revisión Análisis de Incumplimiento SLA (Motivos Externos)



Los Acuerdos de Nivel de Servicio, se basan en los siguientes parámetros, los cuales se definen en base a los condicionantes específicos de cada servicio:

 Cumplimiento

 Plazo

 Calidad

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de posibles SLAs acordados por LDA y Minsait y minimizar cualquier riesgo de penalización, implantamos un modelo de gestión por criticidad estructurado, con control continuo y mecanismos preventivos de escalado

El procedimiento por Criticidad y Control de SLA se articula en tres niveles: respuesta, resolución y control preventivo.

High

Caída del CRM o fallo en proceso crítico de negocio

- Activación inmediata tras registro en Service Now
- Revisión prioritaria por N1 en menos de 30 minutos.
- Escalado automático a N2/N3 si no se resuelve en primera intervención.
- Comunicación activa cada 60 minutos hasta estabilización.
- Seguimiento directo por el Responsable del Servicio.
- Registro de causa raíz obligatorio en caso de impacto significativo.

Medium

Funcionalidad core degradada

- Priorización en la cola operativa.
- Análisis en N2 dentro del SLA comprometido.
- Monitorización diaria hasta cierre.
- Revisión semanal de incidencias repetitivas para prevención.

Low

Errores no bloqueantes o consultas de reporting

- Gestión planificada dentro de backlog priorizado.
- Agrupación de tareas cuando sea eficiente.
- Seguimiento en comité semanal de operación.

Minor

Incidencias o dudas menores

- Gestión en bloque.
- Optimización por eficiencia operativa.
- Revisión mensual de patrones repetitivos.

Casos de éxito

07



MINSAIT

linea directa

Principales referencias Salesforce

Implantaciones FSC

Banca y Seguros

BBVA · CaixaBank · bradesco · Liberty Seguros · ZURICH Seguros · MUTUAMADRILEÑA · AXA · helvetia · GlobalSeguros · BANORTE SEGUROS · Pinnacle Pet Group · APS bank values you can bank on

Sector Público

SeguridadSocial · INPS · Aeroporti di Roma · MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA · IDM SÜDTIROL ALTO ADIGE · trentino marketing SOCIETÀ PER IL TURISMO

Telco y Media

Telefónica · vivo · WINDTRE · sm

Energía

Naturgy · CPFL ENERGIA · COPEL Pura Energia · REPSOL · enel · acea · SOLGAS

Industria y Consumo

acciona · Clece · KERN PHARMA · Uriach · sodexo · DANONE · GRUPO PIÑERO · MELIÃ HOTELS & RESORTS · GRUPO LACTALIS · thyssenkrupp · TECNICAS REUNIDAS · YDUQS · MANGO · IKEA · Carrefour · CALIER · PERCASSI · AHORRAMAS · PortAventura · pullmantur

Contact Center InBound con Salesforce en MM



Octubre 2019
Actualidad

+500 Agentes
+13M Clientes
+250K Transacciones diarias

El Reto

Disponibilizar una plataforma comercial integrada y centralizada en las soluciones Salesforce que permita a Mutua Madrileña llevar a cabo la Transformación tecnológica de su área comercial. La solución debe dar servicio a los diferentes ramos de pólizas de la compañía.

Objetivos

- Mejora de la atención al cliente
- Incremento de los ratios de conversión de la venta
- Trazabilidad de los procesos
- Monitorización de procesos
- Implantación de Service Cloud y Marketing Cloud integrado con los cores de la aseguradora, facilitando el end-to-end de la gestión de nuevos productos/servicios de la aseguradora
- Integración con Contact Center AVAYA

Soporte al Ciudadano con Salesforce en GISS



Diciembre 2023
Diciembre 2025

+1.000 Agentes
+2M Llamadas/año
+800K Casos/Semana
+450K Transacciones diarias

SeguridadSocial

El Reto

Transformación estructural del modelo de atención al ciudadano implantando una plataforma tecnológica centrada en componentes Salesforce e integrada con otros sistemas de la Seguridad Social de alta complejidad y magnitud. El modelo conlleva transformación en la organización y el uso de la tecnología

Objetivos

- Mejora de la atención al ciudadano, la experiencia del funcionario
- Reducción de los tiempos de atención de llamadas
- Visión única del ciudadano
- Monitorización del rendimiento del Contact Center
- Gestionar el cambio organizacional
- Utilización extensiva de Mulesoft como capa de integración
- Implantación de Salesforce PSS y Marketing Cloud, así como otras plataformas de atención (videoatención, acortadores de URLs etc)
- Integración con Contact Center CISCO
- Omnicanalidad
- Ayuda basada en IA

Innovación en el desarrollo de nuevos productos de seguros basados en Salesforce en Seguros Sura



financial services cloud

Octubre 2021
Actualidad

9 Países en Latam
4 Aseguradora más grande en Latam
Suratech – Insurtech Sura
Cubre segmentos desatentidos

El Reto

SURATECH enfrentaba tres obstáculos estructurales que limitaban su capacidad competitiva frente a insurtechs y fintechs emergentes:

- Tiempos de lanzamiento de 12+ meses por producto, incompatibles con la velocidad del mercado digital.
- Rigidez operativa ante cambios regulatorios y nuevas coberturas, con arquitectura de core monolítica.
- Presión creciente de insurtechs nativas digitales con go-to-market en semanas, no meses.

Solución

- **ARQUITECTURA FULL CORE:** Implantación de Salesforce FSC con Product Administration, Policy Admin y Claims Management como capa de engagement E2E. MuleSoft como ESB para integración con sistemas legados y fuentes externas. Path de adopción Full Core Digital desde el primer sprint.
- **MODELO MVP + EVOLUTIVOS:** Arranque con 8 soluciones en Colombia (autos, motos, bicicletas, hogar, salud) bajo visión de MVP iterable. Equipos multidisciplinarios Salesforce + implementadores especializados con cultura DevOps integrada desde el inicio del proyecto.

Implantación de Salesforce FSC para Seguros Ligados a Créditos en Banorte Seguros



salesforce financial services cloud

Octubre 2019
Actualidad

+500 Agentes
+13M Clientes
+250K Transacciones diarias

BANORTE | SEGUROS

El Reto

Banorte Seguros quería instrumentalizar la creación deseguros ligados a créditos usando Salesforce FSC para modernizar su oferta y facilitar su exposición en canales digitales. El objetivo era evaluar la velocidad de creación de productos, procesos y adopción tecnológica.

Objetivos

- Durante 12 semanas, diseñamos e implementamos un prototipo usando Salesforce Financial Services Cloud y Insurance Product Administration (Digital Insurance).
- La célula de trabajo integrada permitió crear 72 coberturas, 9 productos, y 6 APIs, superando los objetivos originales. Se alinearon las visiones de negocio y se aplicó una metodología ágil para asegurar el éxito. El prototipo se convirtió en la base para el desarrollo del MVP, acelerando la entrada en el mercado y mostrando la capacidad de adaptación tecnológica de Banorte.

Cierre y ronda de preguntas

08



MINSAIT

Valores diferenciales que hacen de Minsait el mejor compañero para Línea Directa



Conocimiento Línea Directa



Equipo experto y enfoque de proyecto

MINSAIT nespon SOLUTIONS



Minsait responsable transformación CX

GENESYS

Conocimiento, confianza e impacto ¿Evolucionamos juntos?

MINSAIT



linea directa

MINSAIT

Tech for impact
