

LINEA DIRECTA

2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484

PROPUESTA TÉCNICA – SOLUCION SALESFORCE (2ª entrega)

13 ABRIL 2026

LEGAL DISCLAIMER

Esta Propuesta es confidencial y propiedad de Accenture, S.L. (“Accenture”). Los materiales, ideas y conceptos contenidos en la Propuesta deben ser usados exclusivamente para valorar las capacidades de Accenture en prestar a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. (el “Cliente”) los servicios solicitados por la misma y su contenido no puede ser revelado o comunicado a nadie que no sea un empleado del Cliente directamente implicado en la valoración de la Propuesta y que se haya comprometido a mantener confidenciales los contenidos de la misma y a no divulgarlos a terceros u otros proveedores así como a no reproducirlos sin el consentimiento expreso de Accenture.

Accenture asume que la información, datos etc. que, en su caso, sean facilitados por el Cliente y que hayan servido como base para la elaboración de los Productos, son ciertos y veraces, no entrando a contrastarlos con ninguna otra fuente ni asumiendo responsabilidad alguna sobre los mismos. El Cliente asume la responsabilidad del empleo, o no, de los Productos y de que éstos se adecuen a los requisitos por éste establecidos. Los Productos se entregan para el uso interno por parte del Cliente, cualquier otro uso o exhibición de los mismos deberá ser previamente autorizado por escrito por Accenture. Las decisiones que el Cliente adopte con base en los Productos se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad del Cliente.

Se entiende que todas las aportaciones sugeridas por Accenture en relación con este proyecto son sólo recomendaciones / apoyo desde una perspectiva comercial y/o técnica y no constituyen en modo alguno asesoramientos legales o fiscales. Así se confirma que Accenture no es un bufete de abogados ni un asesor fiscal y no puede emitir opiniones legales ni garantizar el cumplimiento de ninguna normativa. En tal medida, el Cliente es el único responsable del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de su negocio.

Todos los productos, metodologías, assets, inteligencia artificial y/o herramientas preexistentes titularidad de Accenture, utilizadas durante la ejecución de los trabajos objeto de contratación, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Accenture y en ningún caso serán transferidos al Cliente en virtud de la presente Propuesta. El Cliente no tendrá u obtendrá ningún derecho sobre tales Activos Propios (o sobre cualquier modificación o mejora) que no sean de conformidad con la licencia estándar de Accenture para dichos Activos Propios o, en el caso de Activos propiedad de terceros, de conformidad con términos aceptables para el tercero aplicable. Si los Activos Propios fueran puestos a disposición del Cliente, estarán disponibles "AS IS" y sin garantías expresas o implícitas de ningún tipo, y estarán sujetos únicamente a los términos aplicables del contrato de licencia o los términos y condiciones aplicables.

En la medida en que una Parte identifique productos de open source, el receptor podrá utilizarlos únicamente de conformidad con los términos de la licencia aplicables a dichos productos. La puesta a disposición de dichos productos se efectuará "as is" y sin garantía de ningún tipo.

Se hace constar que, si las personas indicadas en la presente Propuesta no pudieran formar parte del equipo por causas ajenas a Accenture (esto es, de modo enunciativo y no limitativo: baja por enfermedad, baja como trabajador de Accenture, etcétera), serán sustituidos por personas de similar categoría profesional.

En la presente Propuesta Accenture utiliza palabras y frases en la forma indicada: "maximizar", "optimizar" y "óptima" significan mejorar con un grado comercialmente razonable; "minimizar" significa reducir con un grado comercialmente razonable; "Mejore/s" se entiende por alto nivel; "Socio" y "asociaciones" no significa una asociación legal, sino más bien una relación de colaboración; "correcto" allí donde se usa como adjetivo correspondiente a un nivel adecuado; y "garantizar" y "permitir" se refieren a la realización de s comerciales razonables para implementar.

Esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

La presente propuesta no tiene carácter vinculante y está sujeta a las aprobaciones internas por parte de Accenture. Accenture no acepta condiciones y/o cláusulas respecto de las cuales no ha manifestado expresamente su conformidad. Lo previsto en esta propuesta prevalecerá respecto de lo dispuesto en la RFP . Las partes convienen que en caso de aceptación de la Propuesta emitida por Accenture las Partes negociarán un contrato específico sobre la base del modelo que se adjunta por Accenture con el envío de la propuesta cuyos cambios se han basado en precedentes negociados entre las Partes. El establecimiento por el Cliente en su Pedido de cualesquiera términos y condiciones diferentes a los de la presente Propuesta, se tendrán por no puestos.

El alcance de los servicios de Accenture excluye expresamente los servicios de seguridad, incluidos, entre otros, la gestión de los servicios de seguridad, los servicios de ciberdefensa (como las pruebas de penetración, los servicios de evaluación de vulnerabilidades, la búsqueda de amenazas y los servicios de respuesta a incidentes, o cualquier evaluación de monitorización, escaneo y evaluación. o soluciones para vulnerabilidades de seguridad en los entornos del Cliente. El Cliente proporcionará todo el software necesario para que Accenture pueda prestar los servicios, y será responsable de obtener, sin costo alguno para Accenture, los consentimientos y autorizaciones necesarias para el uso de Accenture de cualquier producto de terceros, incluyendo, pero no limitado a, software, necesario para prestar los servicios

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

Esta propuesta hace referencia a marcas que pueden ser titularidad de terceros. El uso de esas marcas no es una afirmación de propiedad de las dichas marcas por Accenture y no pretende representar o implicar la existencia de una asociación entre Accenture y los legítimos propietarios de esas marcas.

La validez de la Propuesta es de 90 días a partir de su fecha de presentación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Tabla de contenidos

0 Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

1 Propuesta técnica

2 Gestión del cambio y Adopción

3 Plan de trabajo y Equipo

4 Gestión del mantenimiento

5 Metodología y Gobierno

6 Listado de entregables

7 Consideraciones

8 Anexos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


1. Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es **presentar nuestra propuesta de colaboración de Accenture para proporcionar los servicios solicitados por LDA en el ámbito de su CRM sobre Salesforce**. Actualmente LDA dispone de la herramienta GALGO como portal o herramienta de gestión de sus clientes. El portal Galgo, de desarrollo interno en LDA, cubre gran parte de las operativas o procesos de la compañía como: Cotizaciones, suplementos, retención, cancelaciones, etc

En este contexto, el ámbito de la presente licitación se centra en la implementación de la solución principalmente sobre **Salesforce FSC, Experience cloud y Mulesoft (además de Data Cloud y agentforce para los casos de uso de IA)**, así como los activos tecnológicos adyacentes de integración y otros productos nuevos, que den cobertura a los procesos de atención/ventas.

Nuestra propuesta de solución se basa en una serie de procesos para el servicio de atención de clientes y ventas del negocio asegurador de LDA

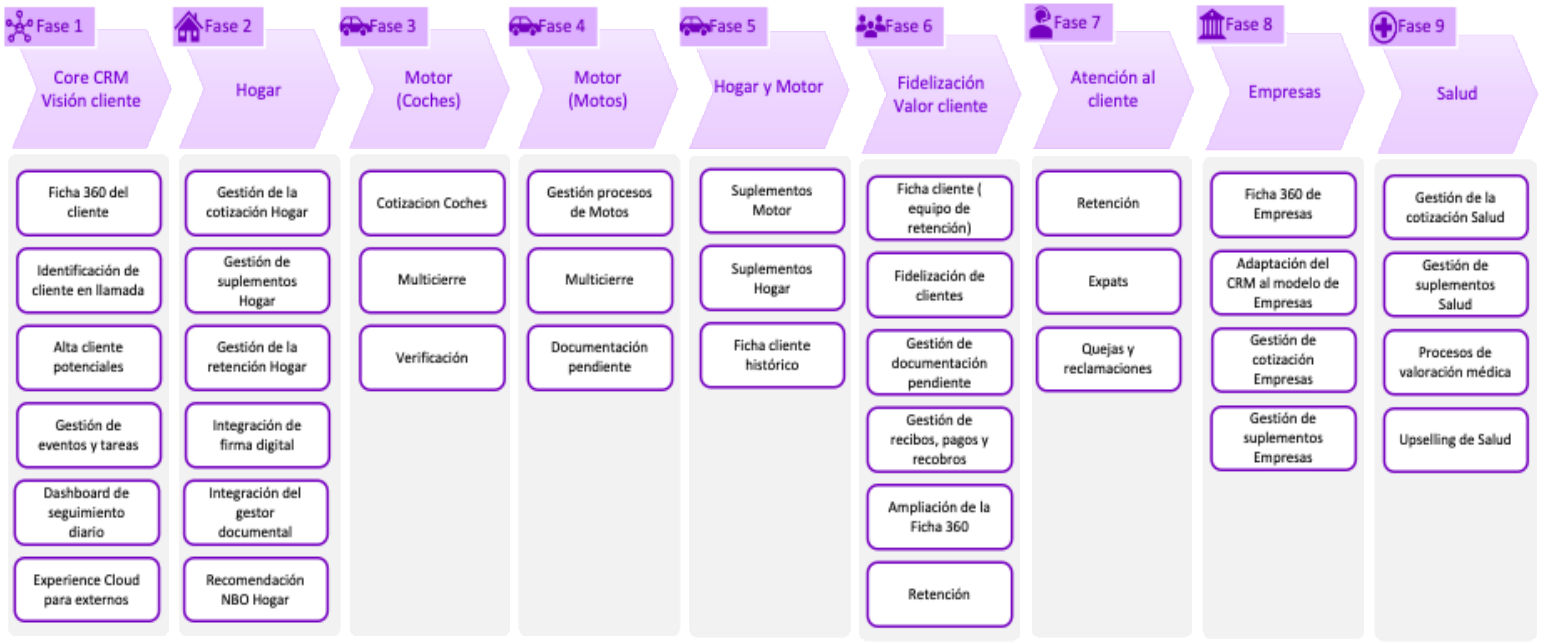

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

El faseado que proponemos es el indicado a continuación en base a la petición de LDA:

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7	Fase 8	Fase 9
Core CRM Visión cliente	**Hogar**	**Motor (Coches)**	**Motor (Motos)**	**Suplementos Hogar y Motor**	**Fidelización Valor cliente**	**Atención al cliente**	**Empresas**	**Salud**
Ficha 360 del cliente	Gestión de la cotización Hogar	Cotizacion Coches	Gestión procesos de Motos	Suplementos Motor	Ficha cliente (equipo de retención)	Retención	Ficha 360 de Empresas	Gestión de la cotización Salud
Identificación de cliente en llamada	Gestión de suplementos Hogar	Multicierre	Multicierre	Suplementos Hogar	Fidelización de clientes	Expats	Adaptación del CRM al modelo de Empresas	Gestión de suplementos Salud
Alta cliente potenciales	Gestión de la retención Hogar	Verificación	Documentación pendiente	Ficha cliente histórico	Gestión de documentación pendiente	Quejas y reclamaciones	Gestión de cotización Empresas	Procesos de valoración médica
Gestión de eventos y tareas	Integración de firma digital				Gestión de recibos, pagos y recobros		Gestión de suplementos Empresas	Upselling de Salud
Dashboard de seguimiento diario	Integración del gestor documental				Ampliación de la Ficha 360			
Experience Cloud para externos	Recomendación NBO Hogar				Retención			

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

1. Propuesta técnica

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. GENERAL

La solución propuesta de Salesforce contiene los siguientes módulos:

FSC

- Gestión de oportunidades, casos y clientes en una única vista 360º.
- Automatización de procesos comerciales y de servicio.
- Gestión y seguimiento de oportunidades. aprobaciones y validaciones operativas.
- Trazabilidad completa del proceso de extremo a extremo.
- Atención al cliente
- Ficha consolidada de cliente.
- Reporting de seguimiento comercial y operativo.

Experience cloud

- Capa de acceso para usuarios externos y colaboradores
- Colaboradores encargados de la gestión y alta de oportunidades.
- Portal con acceso segmentado según perfil.
- Registro y seguimiento de oportunidades.
- Consulta de estado y comunicación con el equipo interno.

Data cloud + agentforce

- Unificación de información procedente de múltiples sistemas para usarse en la definición de los casos de uso de IA propuestos

Mulesoft

- Integración con core y sistemas legacy.
- Sincronización de datos de clientes, pólizas/productos, cotizaciones y estados operativos.
- Exposición y consumo de APIs Arquitectura desacoplada que permite escalabilidad futura.
- Gobernabilidad de procesos.
- Transformación de datos entre sistemas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Definición funcional y diseño UX

ALCANCE

Dentro de este bloque se realizará el diseño funcional de la solución incluyendo el diseño UX de las pantallas que permita al usuario tener una visión de como será el aplicativo futuro.

En esta solución to-be se considerarán todas las capacidades técnicas a tener en cuenta para implementar la solución (arquitectura técnica, informacional, datos, integraciones, etc.)

ENFOQUE


- Se elaborará un documento por cada funcionalidad. Estos documentos deben ser validados por el Cliente.
- Se definirán los aprobadores requeridos (Negocio / Tecnología) en función de la tipología del requerimiento que cubren y se consensuarán con el responsable del proyecto.
- Cuando se estime necesario, se realizarán reuniones de validación de funcionalidades para la explicación a los distintos aprobadores de la solución definida.

Entrega de valor:

- Mapa de la solución final a construir
- Documentación funcional validada

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Mapa funcional

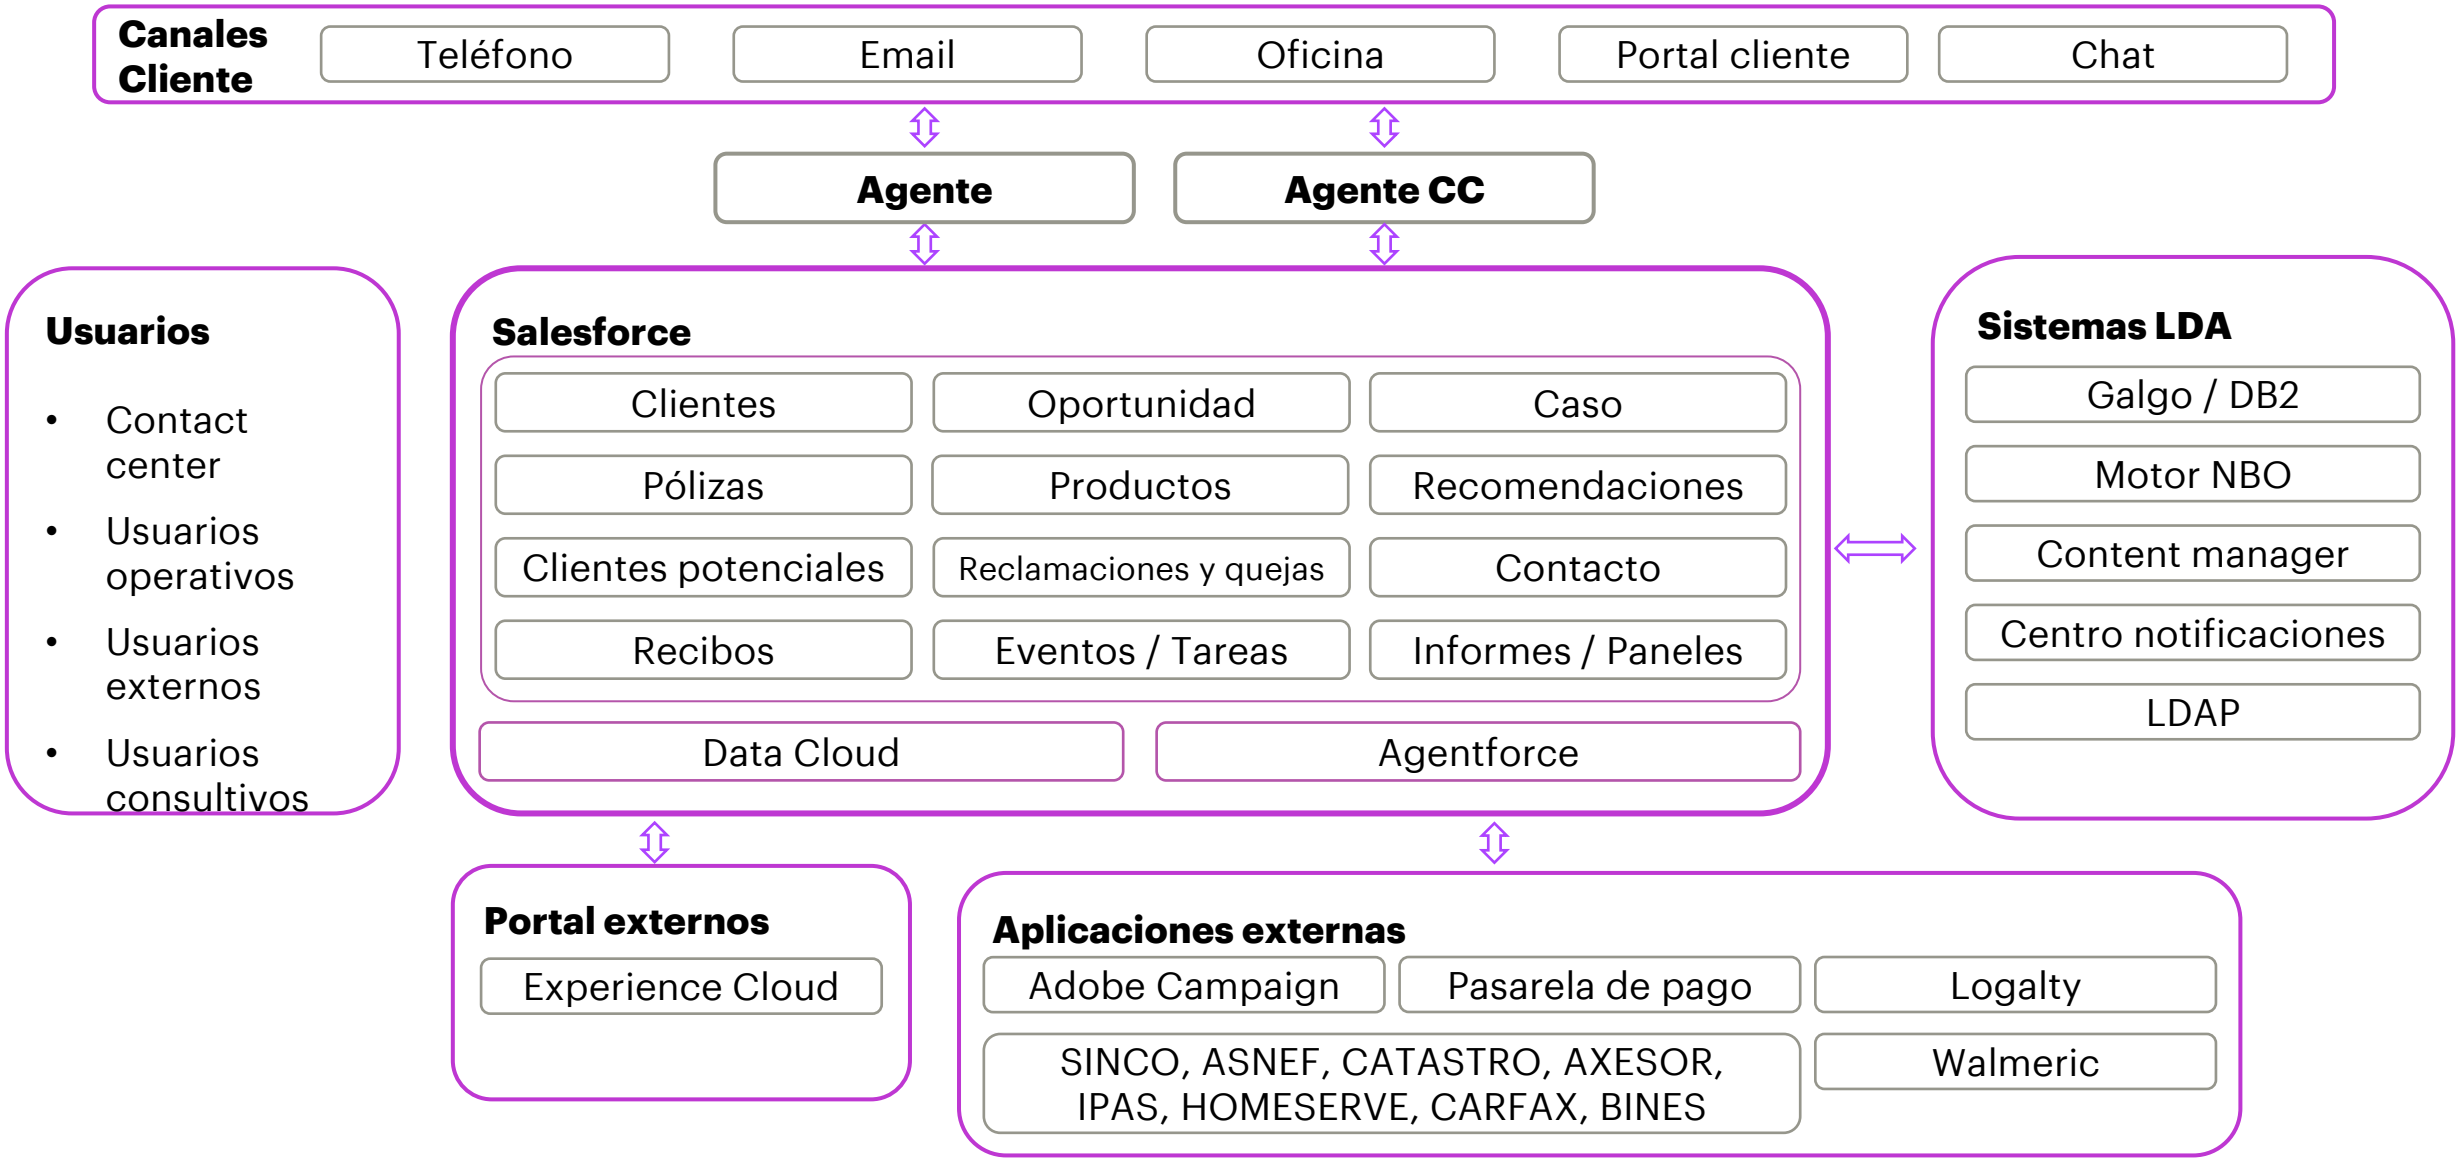

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Mapa de componentes y Principios de la Arquitectura

La solución planteada propone un ecosistema digital robusto y escalable, diseñado para optimizar la interoperabilidad entre Salesforce y los sistemas core de la aseguradora mediante MuleSoft Anypoint Platform. Los components son los especificados a continuación:

Salesforce CRM

Relación cliente, interacción , orquestación comercial y persistencia de actividad

Api Manager

Exposición segura, control de acceso , versionado y políticas de seguridad

Mulesoft

Orquestación, transformación , implementación de Apis system y process y gestión de errores

Kafka


Eje de mensajería para desacoplamiento y resiliencia



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA. Visión de arquitectura técnica

La arquitectura to be propuesta combina integración síncrona para operaciones críticas y eventos para desacoplamiento y resiliencia.

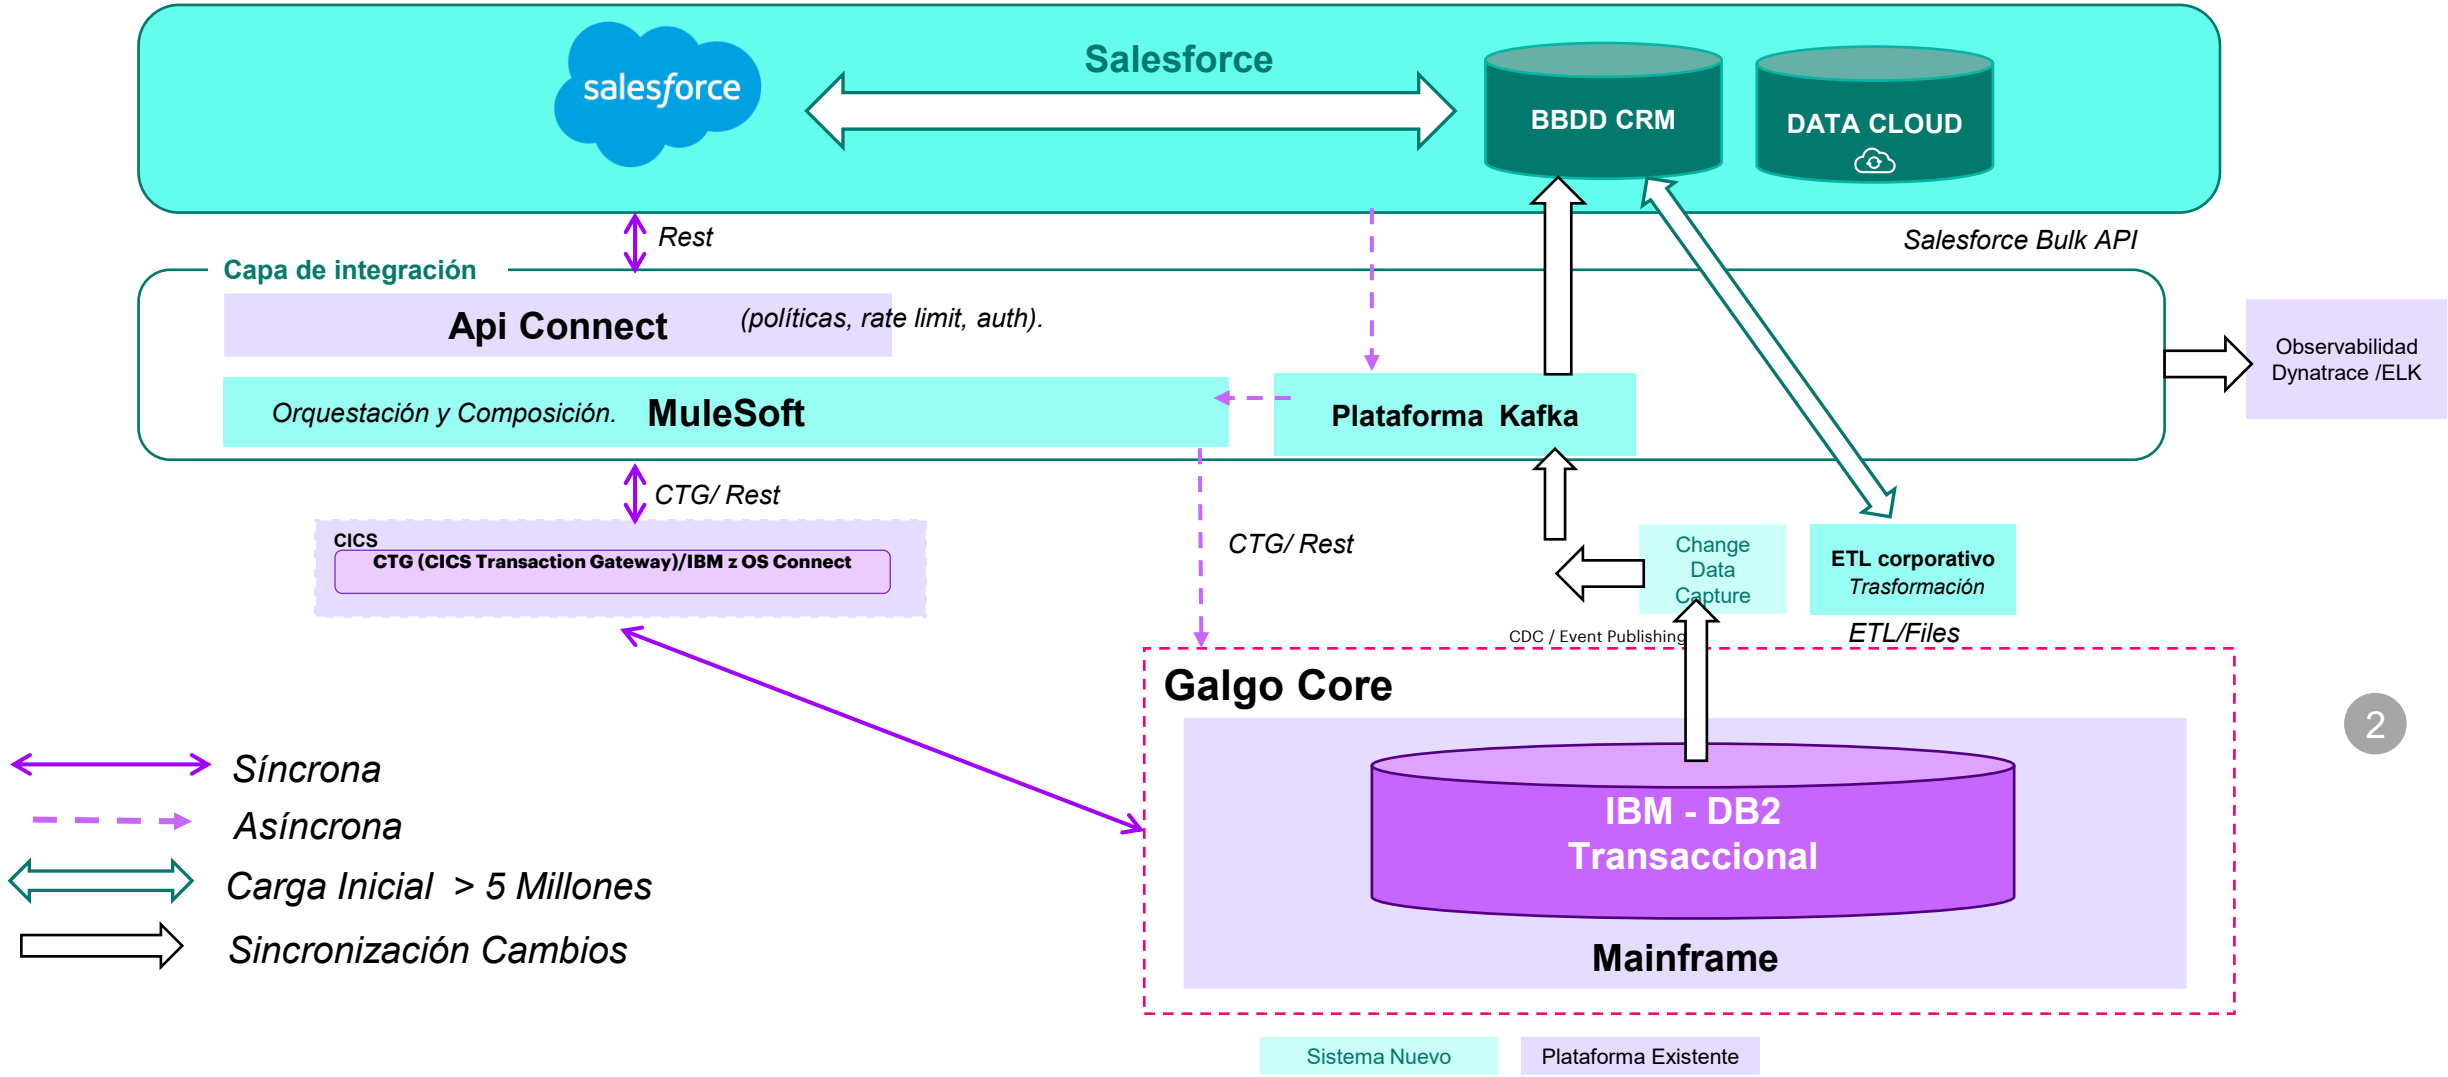

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA

Como elemento diferencial de la propuesta, Accenture propone incorporar una **línea de innovación** orientada a la automatización inteligente de procesos de atención al cliente y gestión de siniestros, apoyándose en las capacidades de:

- Salesforce
- Agentforce
- Salesforce Data Cloud

El objetivo de esta iniciativa es generar impacto operativo tangible para LDA desde las primeras fases de adopción, mediante la automatización de tareas recurrentes y el uso de capacidades de inteligencia artificial que permitan mejorar la eficiencia de los equipos operativos.

En este sentido, la automatización no se plantea como una iniciativa futura posterior a la implantación, sino como un **piloto estructurado y acotado que se desarrollará durante el propio proyecto**, con el objetivo de validar de forma temprana el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la operativa del Contact Center y a los procesos de gestión de clientes y siniestros.

Este piloto contemplará hasta un máximo de **dos (2) casos de uso concretos basados en Agentforce**, orientados a automatizaciones que puedan aportar valor inmediato al negocio.

A modo ilustrativo, **algunos ejemplos de casos de uso podrían incluir**:

- Agentes de IA capaces de generar resúmenes inteligentes del cliente, consolidando información relevante y proporcionando contexto a los agentes antes de una interacción.
- Agentes conversacionales de soporte a la operativa, capaces de responder a preguntas frecuentes o ayudar a resolver incidencias sencillas, facilitando el trabajo diario de los agentes.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PROPUESTA TÉCNICA

IA para el delivery

Ademas del Agentforce como se ha comentado anteriormente, es importante la aplicación de la IA para el Desarrollo. A partir del **marco completo del ciclo del Proyecto en Accenture** hemos identificado las **áreas más destacadas donde la IA puede impulsar la eficiencia del delivery.** Durante el delivery aplicaremos las herramientas de IA acordadas con LDA que faciliten el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

En base a otras experiencias a continuación se muestra un resumen de la aplicabilidad de distintas herramientas en partes del ciclo de desarrollo

Design	Build	Test	Deploy	Hyper care
• Accelerated drafting of epics and user stories (DoR/DoD)	• Apex/LWC Code Generation	• Generate functional test cases		
• Create Design Document • (FDD & TDD)	• Unit Test Generation for Apex/LWC	• Generate test scripts		
	• Code Analyzer / Quality Code	• Generate test data		
	• Code Explanation			
• Automatic email and meeting summaries, assisted response in Outlook and Teams				
• Quick access to information and recommendations relevant to the project				

Agentforce Vibes

Accenture Pre-built prompts available– Prepare to refine

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

2. Gestión del cambio y Adopción

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (1/2)

En la activación inicial del enfoque, evaluamos la **preparación al cambio** e **impacto por colectivos**.

Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos:

- **Análisis de la documentación** existente* (mapas de procesos, estudios, encuestas, ...) relativa a procesos, cultura, competencias digitales, niveles de resistencia, relacionados con los cuatro grandes grupos de trabajo identificados: usuarios Contact Center, operativos, externos y consultivos.
- **Realización de 4 entrevistas** con uno/dos representantes de cada grupo impactado para analizar procesos actuales, cultura, madurez y competencias digitales, así como principales resistencias al cambio de sus principales colectivos.
- **Segmentación de colectivos en roles** (gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones).

Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE):

- **Recopilación del diseño objetivo** del CRM definido por el equipo técnico (procesos futuros, funcionalidades clave, roles y responsabilidades).**
- Traducción de ese diseño técnico a un **modelo objetivo de adopción**, enfocado en personas (comportamientos (cultura), competencias digitales clave requeridas y posibles resistencias).
- **Validación** del modelo objetivo con negocio para asegurar su viabilidad operativa.


Identificación de gaps, colectivos impactados y nivel de impacto

- Contraste estructurado entre el estado actual (AS-IS) y el modelo objetivo de adopción (TO-BE) para cada colectivo identificado para **identificar hasta 5 brechas** en cada una de las siguientes categorías: procesos, comportamientos (cultura), competencias digitales y posibles resistencias.
- Clasificación del **nivel de impacto** por colectivo (alto / medio / bajo).
- **Priorización** de los gaps según su criticidad para el éxito del la implantación del CRM y el riesgo de no adopción.

ENTREGABLES

- Change impact analysis (incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto)

ILUSTRATIVOS



Change Impact Analysis (CIA)

** Línea Directa proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.*

*** Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, ...) quedando su elaboración fuera de alcance.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (2/2)

En base a la evaluación inicial, definimos una **gobernanza** clara, **visión** compartida y una **red activa de embajadores** para impulsar la adopción.

Gobernanza y activación temprana de stakeholders

- **Identificación de los stakeholders clave** mediante **una sesión de trabajo** con los líderes del programa, para identificar los grupos, sus principales responsabilidades y nivel de impacto.
- Definir del **modelo de gobernanza** del cambio con la **involucración temprana** de los stakeholders clave, para asegurar su rol como palanca de adopción durante todo el proyecto.

Visión compartida y estrategia de cambio

- Definición y validación de la **estrategia de Gestión del cambio** y **roadmap** alineado con los hitos del programa y la participación explícita de las áreas de **Personas y Comunicación**.


Red de embajadores del cambio

- **Identificar a los embajadores** seleccionados en una lista de *.
- Definir un **plan de activación** para mantener a los embajadores activos y comprometidos durante todo el proyecto.

ENTREGABLES

- Mapa de stakeholders y sponsors y plan de activación de la red de cambio
- Roadmap de adopción

ILUSTRATIVOS



Mapa de stakeholders



Roadmap de Adopción

*La selección de los embajadores es responsabilidad de LDA.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | COMPROMISO Y SENTIMIENTO (1/1)

Activamos el **liderazgo y una comunicación estructurada** para **alinear a los colectivos clave y acelerar la adopción** del cambio a lo largo del proyecto.

Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio

- Puesta en marcha del **modelo de relación**, incluyendo la cadencia de reuniones, para recoger feedback continuo y asegurar el alineamiento de los mensajes clave.

Plan de comunicación del cambio

- Definición de la **estrategia y el plan de comunicación**, junto con el equipo del programa y las áreas de Personas y Comunicación.
  - Alineamiento sobre **la narrativa del proyecto, los mensajes clave y el branding interno**, asegurando una comunicación segmentada **según el perfil del usuario**, definiendo emisores, calendarios y audiencias, usando los siguientes canales: email/ Iseazy/ Microsoft Teams.
  - Diseño de un **plan de comunicación**, definiendo acciones, formatos, calendario, grupos de trabajo objetivo e indicadores objetivo.
- **Despliegue de campañas de comunicación** adaptadas, orientadas a generar conocimiento y comprensión de los cambios en sistemas, procesos y cultura, mediante un enfoque multicanal.*
- **Adaptación de materiales de comunicación** corporativos a los distintos contextos de cada grupos de trabajo impactado.

ENTREGABLES

- Narrativa del cambio y kit de identidad visual (branding)
- Estrategia, plan y materiales de comunicación

ILUSTRATIVOS



Plan de comunicación



Comunicación

**Quedan fuera de alcance las comunicaciones a externos. Las comunicaciones a internos se realizarán en coordinación con Comunicación y, únicamente, si se habilitan los permisos correspondientes en los canales existentes (canal de email, Iseazy (exclusiva para internos),Teams).*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (1/3)

Profundizamos en cómo **capacitamos y impulsamos la adopción** de Línea Directa.

Dado el número de usuarios implicados, proponemos ofrecer la formación en el modelo Train the Trainers alineada con las necesidades de cada audiencia.

ENFOQUE DE FORMACIÓN:

Involucrar a los usuarios clave desde el principio permitirá a Línea Directa mantener el **conocimiento internamente**, permitiendo operar de forma más autónoma en el futuro. Además, Línea Directa dependerá de **agentes de cambio** internos para facilitar la adopción de **nuevas formas de trabajo** y la **cultura** generada por esta transformación comercial.

AUDIENCIA



01 **Operadores**



02 **Supervisores**



03 **Back office**



04 **Perfiles mixtos**

- **El número de trainers (formadores)** considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 trainer por cada 40-50 usuarios finales, con perfil mixto conocimiento técnico y skills (comunicación, liderazgo, ...).

FOCO

Por Releases de producto por ejemplo: Ficha cliente, Hogar, Coches, Motos, Salud, Empresas, Fidelización....

APPROACH

- Enfoque de formación de **Train The Trainers (TTT)* en oleadas**, con fechas cercanas al Go-Live, para elevar el conocimiento de los formadores.
- **Sesiones TTT** (en español)**:** diseñadas para asegurar una comprensión óptima de la nueva herramienta por producto y colectivo. La formación se organiza por **oleadas**, garantizando que en cada release se imparta como **máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos con necesidades formativas equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
  - ✓ Oleada 1: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleada 2: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleadas 3,4,5,6: hasta 1 sesión TTT por colectivo por (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos) por release.
  - ✓ Cada sesión durará como máximo 3 horas para cubrir actividades generales con ejercicios prácticos y presentaciones de apoyo.
  - ✓ Actividades de simulaciones con gamificación como juegos de rol y concursos se incluirán en las sesiones.

MATERIALES

- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol y vídeos** (en español) sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
  - Máximo 2 vídeos por herramienta realizados con grabación de pantalla y PPT.
  - Los manuales desarrollados en PPT.

** Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc.)*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (2/3)

Capacitamos a los usuarios por **rol y oleadas** para asegurar una **adopción efectiva** del nuevo CRM.

Estrategia de formación y transferencia de conocimiento

- **Diseño del plan de formación y transferencia** orientado a garantizar la adopción efectiva del nuevo CRM por rol y alineado a cada release.
- **Identificación de itinerarios formativos** y su diseño a alto nivel para los roles de operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos.
    - **Audiencia**: El número de superusuarios (formadores) considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 superusuario por cada 40 usuarios finales.

Modelo de formación por oleadas

- **Sesiones TTT (en español):** diseñadas para promover una comprensión óptima de la nueva herramienta por **producto y colectivo**, incluyendo aprendizaje téorico y práctico. La formación se organiza **por oleadas**, garantizando que en cada release se imparta **como máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos** con necesidades formativas **equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
    - **Oleada 1:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
    - **Oleada 2:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
    - **Oleadas 3,4,5,6:** hasta 1 sesión TTT por colectivo por (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos) por release.
- Las sesiones se impartirán de forma **presencial** en Madrid y, cuando sea necesario, en formato híbrido, ajustándonos a los horarios que más convengan al negocio.
- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol** y **vídeos (en español)** sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
    - Máximo 2 vídeos por herramienta y se harán con grabación de pantalla y PPT.
    - Los manuales se harán en PPT.


ENTREGABLES

- Estrategia y plan de formación
- Presentaciones, sesiones Train the Trainers, videos por herramienta y manuales formativos

ILUSTRATIVOS



Plan y sesiones de formación

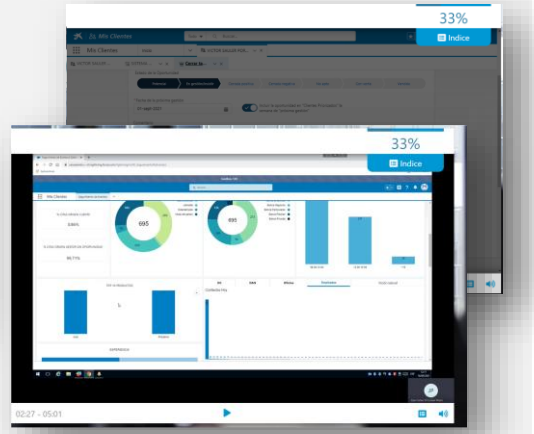

Demo Vídeos

**Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (3/3)

Cómo **acompañamos** a los usuarios para promover la **estabilidad operativa** en el Go-Live.

Coaching operativo y acompañamiento en campo

- **Acompañamiento** intensivo durante el primer mes uso real tras cada release, con la creación de canales en Teams que aborden los distintos pilares de adopción, por ejemplo:
  - **Canal de coaching**: segmentado por los 4 roles (operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos). Incluye toda la documentación relacionada con la formación, gamificación y retos para las sesiones de formación.
  - **Canal de apoyo:** canal de preguntas frecuentes para formadores.
  - **Canal de feedback:** envío de encuestas para entender cómo los empleados se sienten durante el programa respecto a la comunicación, la formación y las formas de trabajar, permitiéndonos entender sus necesidades y ajustar la estrategia de adopción cuando sea necesario.
- Desarrollo de un **agente* de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini** para resolver las preguntas de los usuarios. Para facilitar respuestas precisas, el agente deberá alimentarse con materiales relacionados con el proyecto (como los manuales operativos).
- Las cuestiones planteadas se resuelven principalmente en estos canales, escalándose a las reuniones de gobierno pertinentes únicamente las cuestiones más críticas.


Mecanismos formales de verificación de la transferencia

- **Evaluación /certificación** teórico-práctica obligatoria al finalizar la formación. El % de % superación / recertificación y la actuación en los supuestos de no recertificación se decide durante el proyecto conjuntamente con LDA.

ENTREGABLES

- Canales de acompañamiento (MS Teams)
- Agente de IA para soporte y adopción del CRM
- Informe de estabilización post Go-Live

ILUSTRATIVOS



Informe de estabilización

**Para el caso de este agente, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | ENTREGAR RESULTADOS Y AJUSTAR (1/1)

Medimos la adopción, aseguramos la **sostenibilidad y transferimos capacidades** para una operación CRM **estable y autónoma**.

Métricas de adopción y reporting

- Las siguientes métricas se obtendrán a partir de **encuestas** y de la información proporcionada por la **herramienta CRM**.
- **Definición de métricas de adopción y uso** por colectivo para medir nivel de uso del CRM por rol, grado de utilización de funcionalidades clave y comparativa entre colectivos.
- **Definición y seguimiento de KPIs de eficiencia operativa**, utilizando como baseline los KPIs actuales, definidos en base a la eficiencia y la gestión comercial, para medir reducción de tiempos operativos y mejora en rendimiento tras la implantación.
- **Seguimiento de curva de aprendizaje** para analizar evolución del desempeño durante las primeras semanas y detectar necesidades de refuerzo.
- **Medición de satisfacción del usuario** para evaluar percepción de utilidad, facilidad de uso y nivel de adopción mediante encuestas breves.
- **Análisis de incidencias funcionales repetitivas** para identificar fricciones en procesos o gaps formativos y **activar acciones correctivas.**
- **Reporte periódico de adopción** (semanal durante el primer mes de la release y mensual a continuación) para promover el seguimiento continuo y toma de decisiones basada en datos.
- **Informe de estabilización** al cierre del primer mes, con análisis de feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora.


Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM

- 1 sesión **final de transferencia de conocimiento** con los stakeholders clave identificados.
- **Definición de roles y responsabilidades** para la operación futura con una **matriz RACI** incluida en la sesión final.*
- **Entrega de materiales finales** como parte de la sesión final para garantizar que el CoE dispone de la información necesaria para operar y dar soporte al CRM.
- **Recomendaciones de mejora continua** documentadas como parte de la sesión final para facilitar una adopción sostenible al largo plazo.

ENTREGABLES

- Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint
- Documento de sesión de transferencia final

ILUSTRATIVOS




Reporte de métricas de adopción

**Modelo Operativo definido por LDA.*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

3. Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO: Fases, Hitos y Entregables

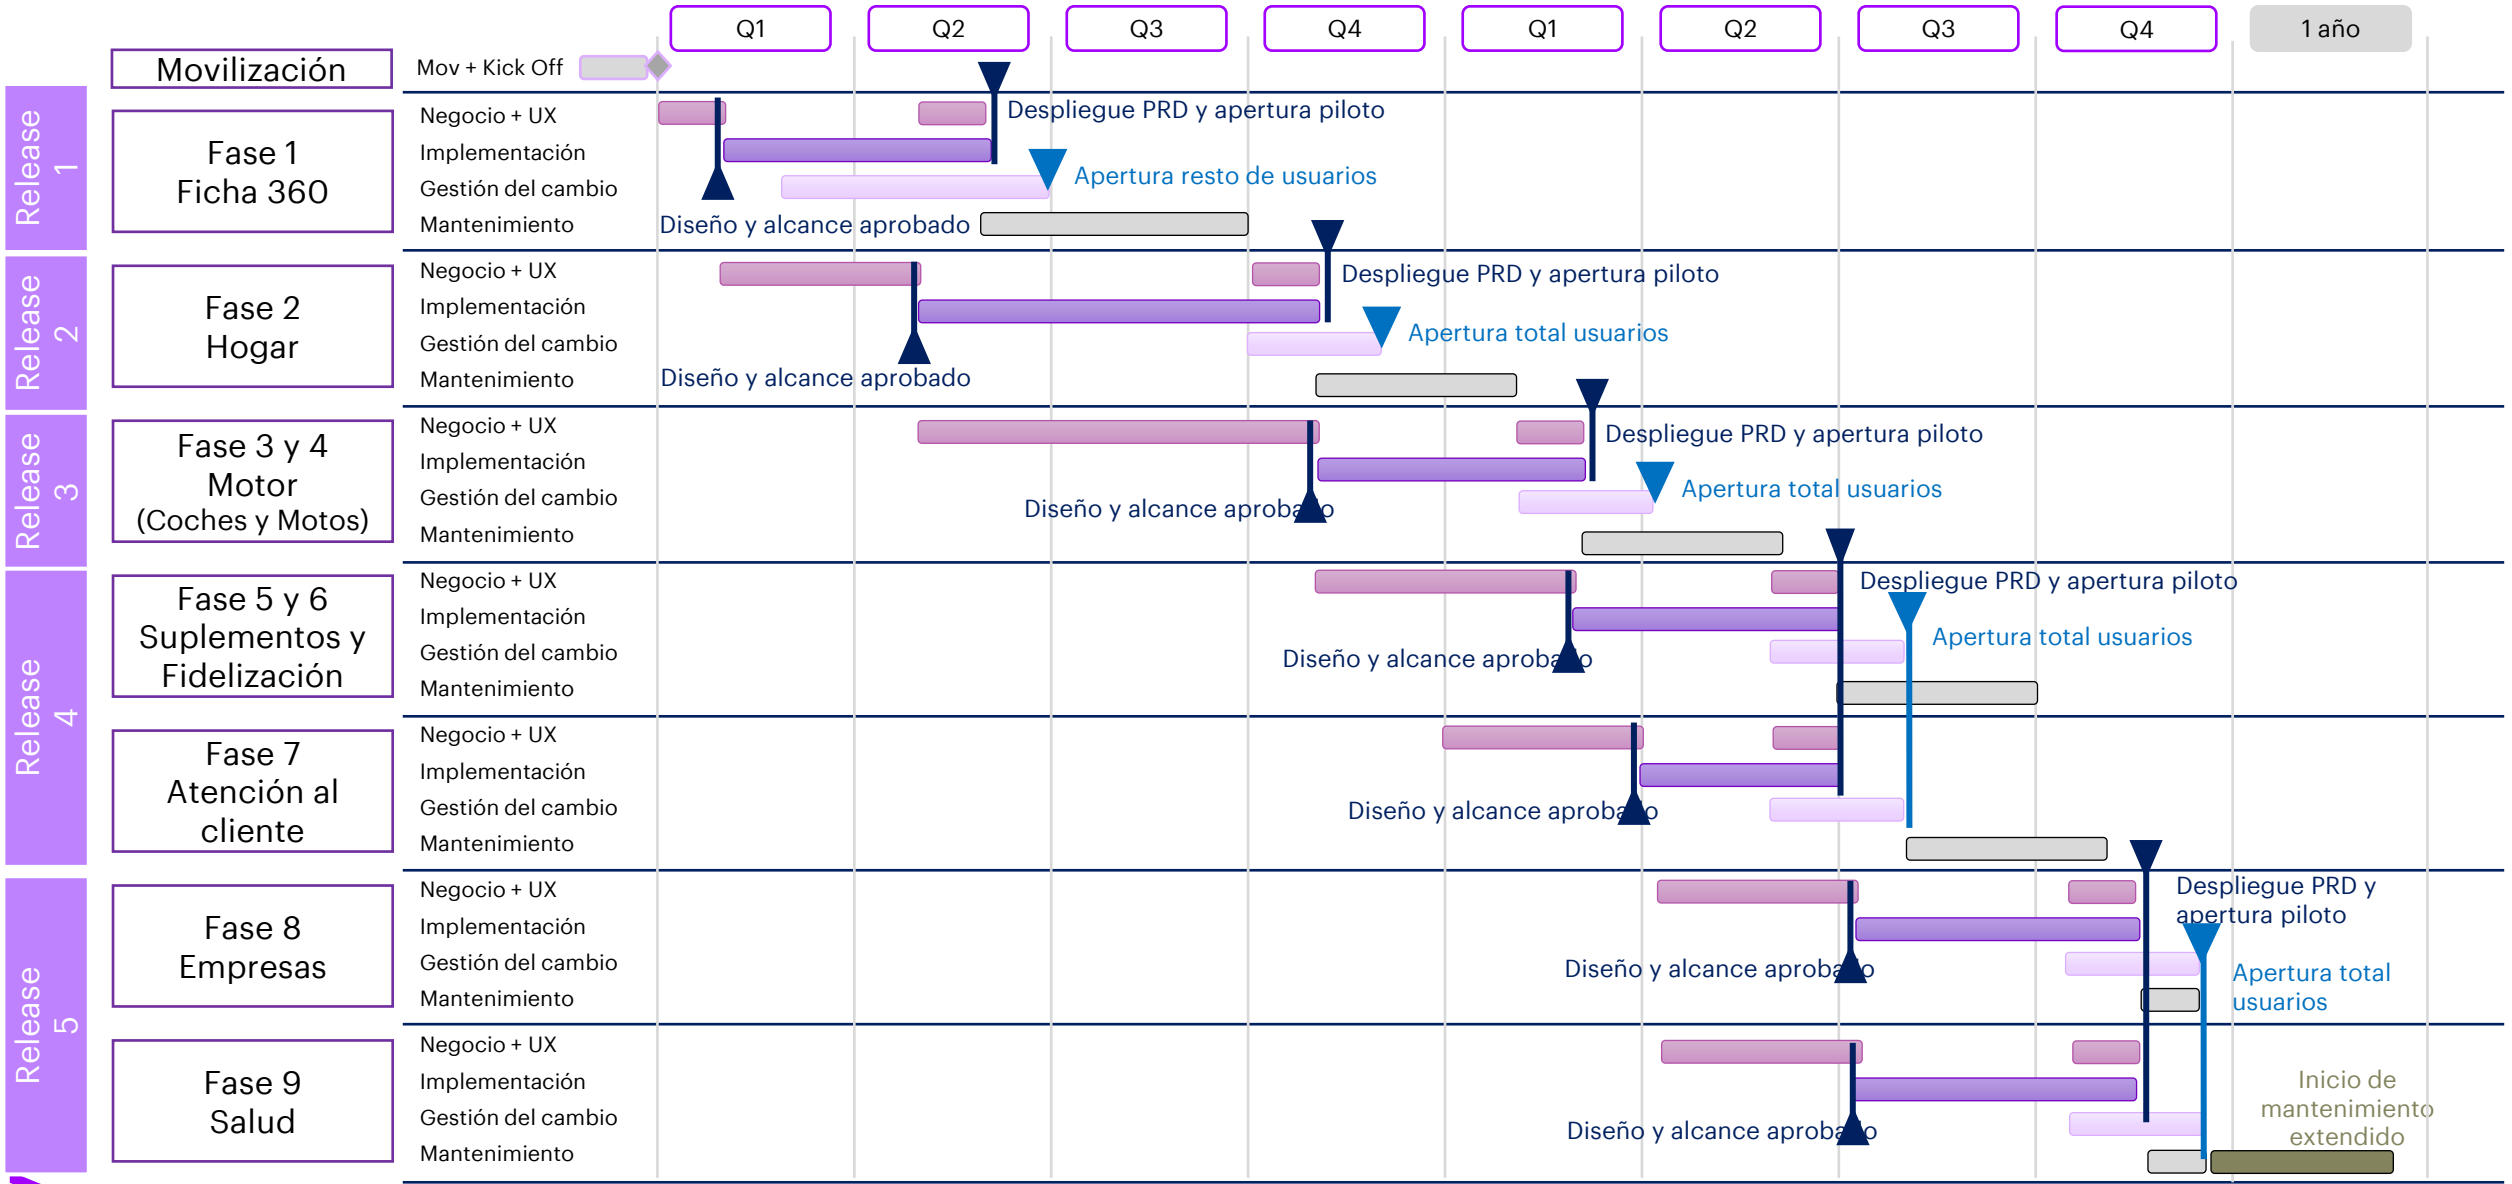

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se detalla el equipo que consideramos debería participar en el proyecto por parte de LDA:

GESTIÓN DEL PROYECTO

- SPONSOR DEL PROYECTO (CDO)

EQUIPO NEGOCIO

- RESPONSABLE
- PRODUCT OWNER
- KEY USERS

EQUIPO IT

- RESPONSABLE IT
- JEFE PROYECTO
- RELEASE MANAGER
- RESPONSABLE SISTEMAS LEGACIES

EQUIPO ARQUITECTURA

- RESPONSABLE ARQ-
- SEGURIDAD

EQUIPO ARQUITECTURA

- RESPONSABLE IT
- JEFE PROYECTO

EQUIPO CALL CENTER

- RESPONSABLE
- KEY USERS

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Siendo este un proyecto relevante para LDA y por tanto también para Accenture, consideramos que recursos altamente cualificados en base a los requerimientos han liderar este proyecto

Nuestros profesionales y especialistas cubren:

- Conocimiento de los procesos de negocio de Seguros y con experiencia en UX durante los periodos de definición y diseño visual de análisis (Discovery).
- Recursos de integraciones que han participado previamente en la implantación de proyectos de seguros y, por lo tanto, con conocimiento de arquitecturas similares.
- Expertos en Gestión del cambio con amplia experiencia en grandes transformaciones como esta
- Especialistas en FSC, Sales Cloud y Service Cloud y Experience cloud.
- Equipo experto en Gestión de mantenimiento

Además, se ha activado la **red de Subject Matter Experts** tanto nacionales como internacionales de Accenture, los cuales tendrán una dedicación parcial en el proyecto y orientada a consensuar las decisiones técnicas más relevantes basándose en su experiencia y conocimiento, así como para realizar peer reviews o QAs.


Modelo de trabajo:

Respecto a modelo de trabajo se propone un híbrido, en particular para las líneas de trabajo de Funcional y Gestión del cambio, compaginando presencialidad en las oficinas de Línea Directa cuando sea necesario con trabajo remoto.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES - IMPLEMENTACIÓN


A continuación, se detalla el equipo de proyecto propuesto:

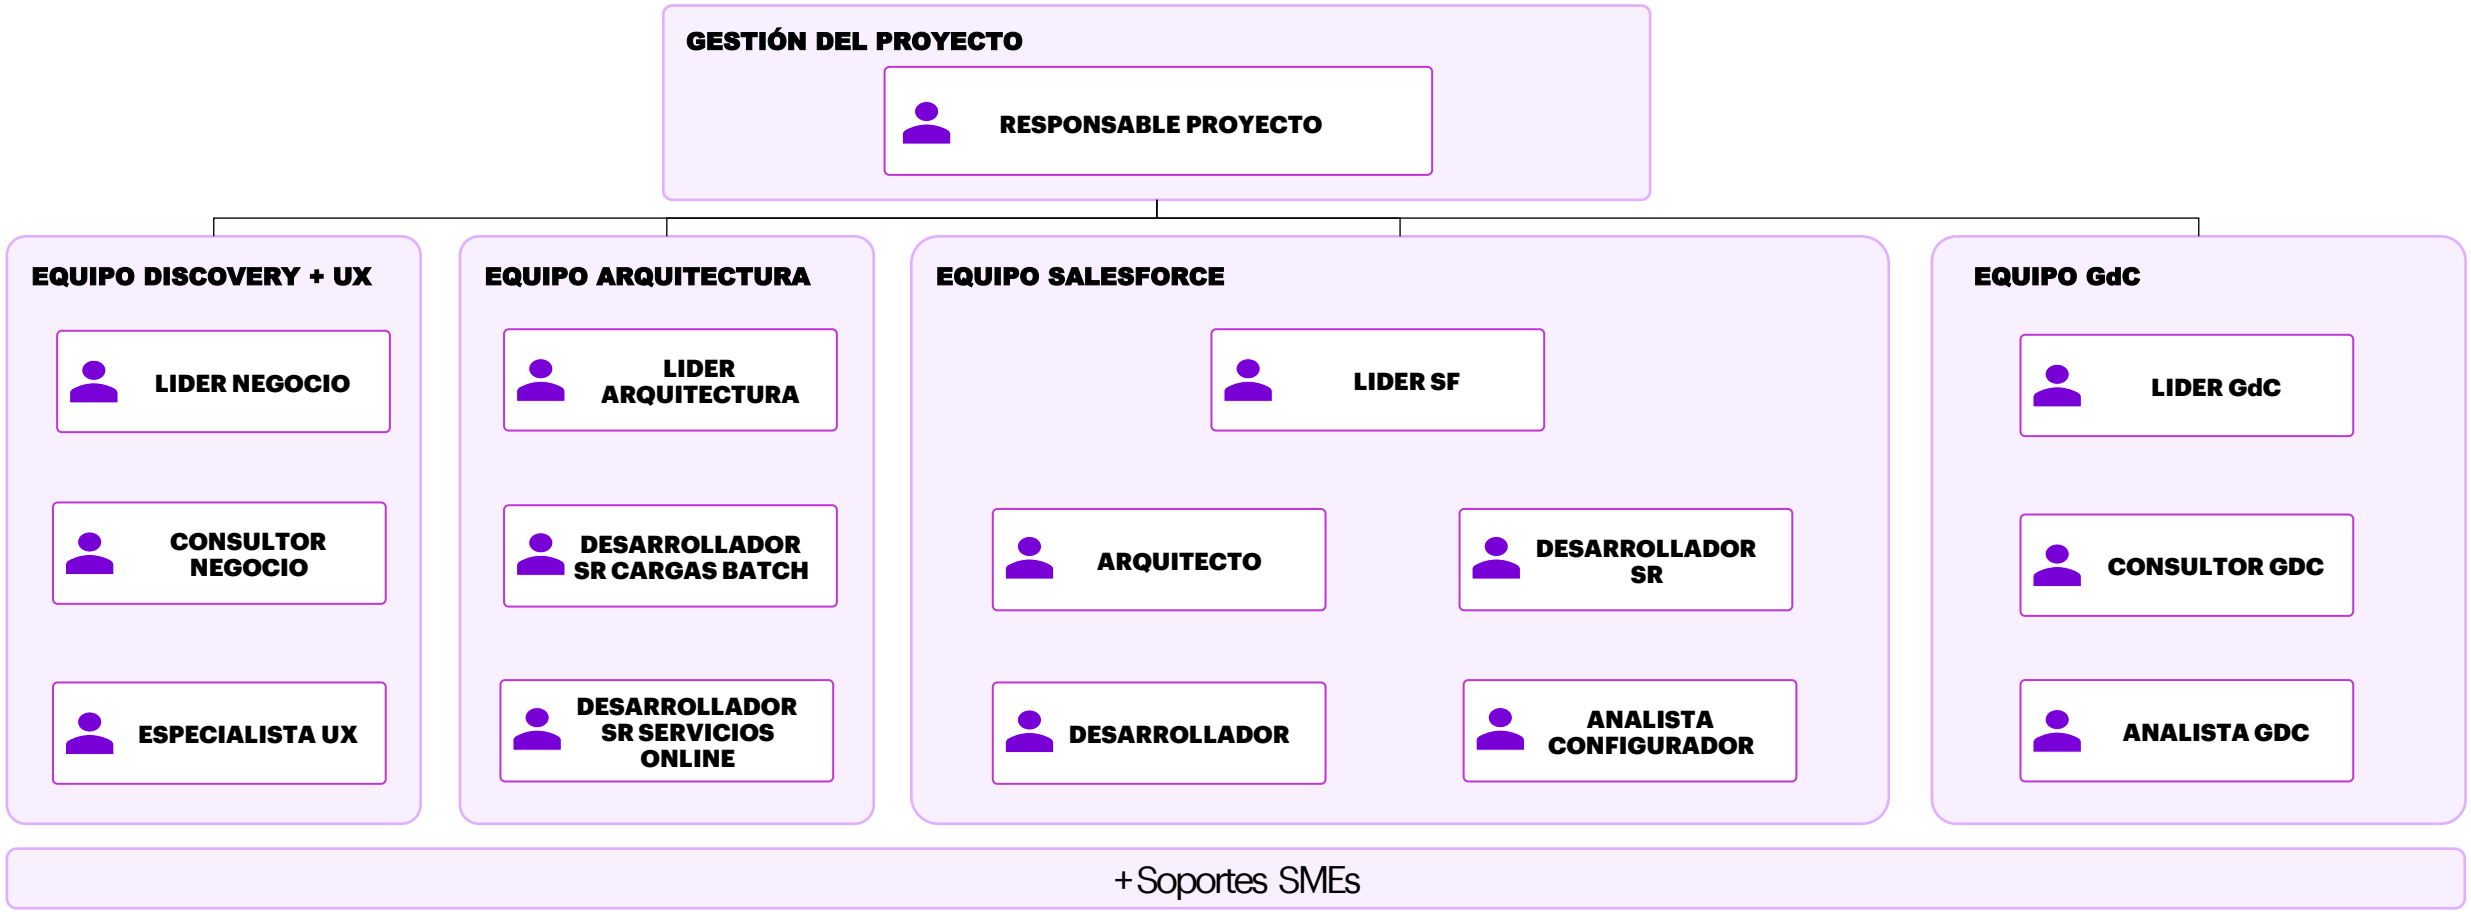

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES – IMPLEMENTACIÓN + MANTENIMIENTO EN CURSO


A continuación, se detalla el equipo propuesto a partir de la primera puesta en PROD:

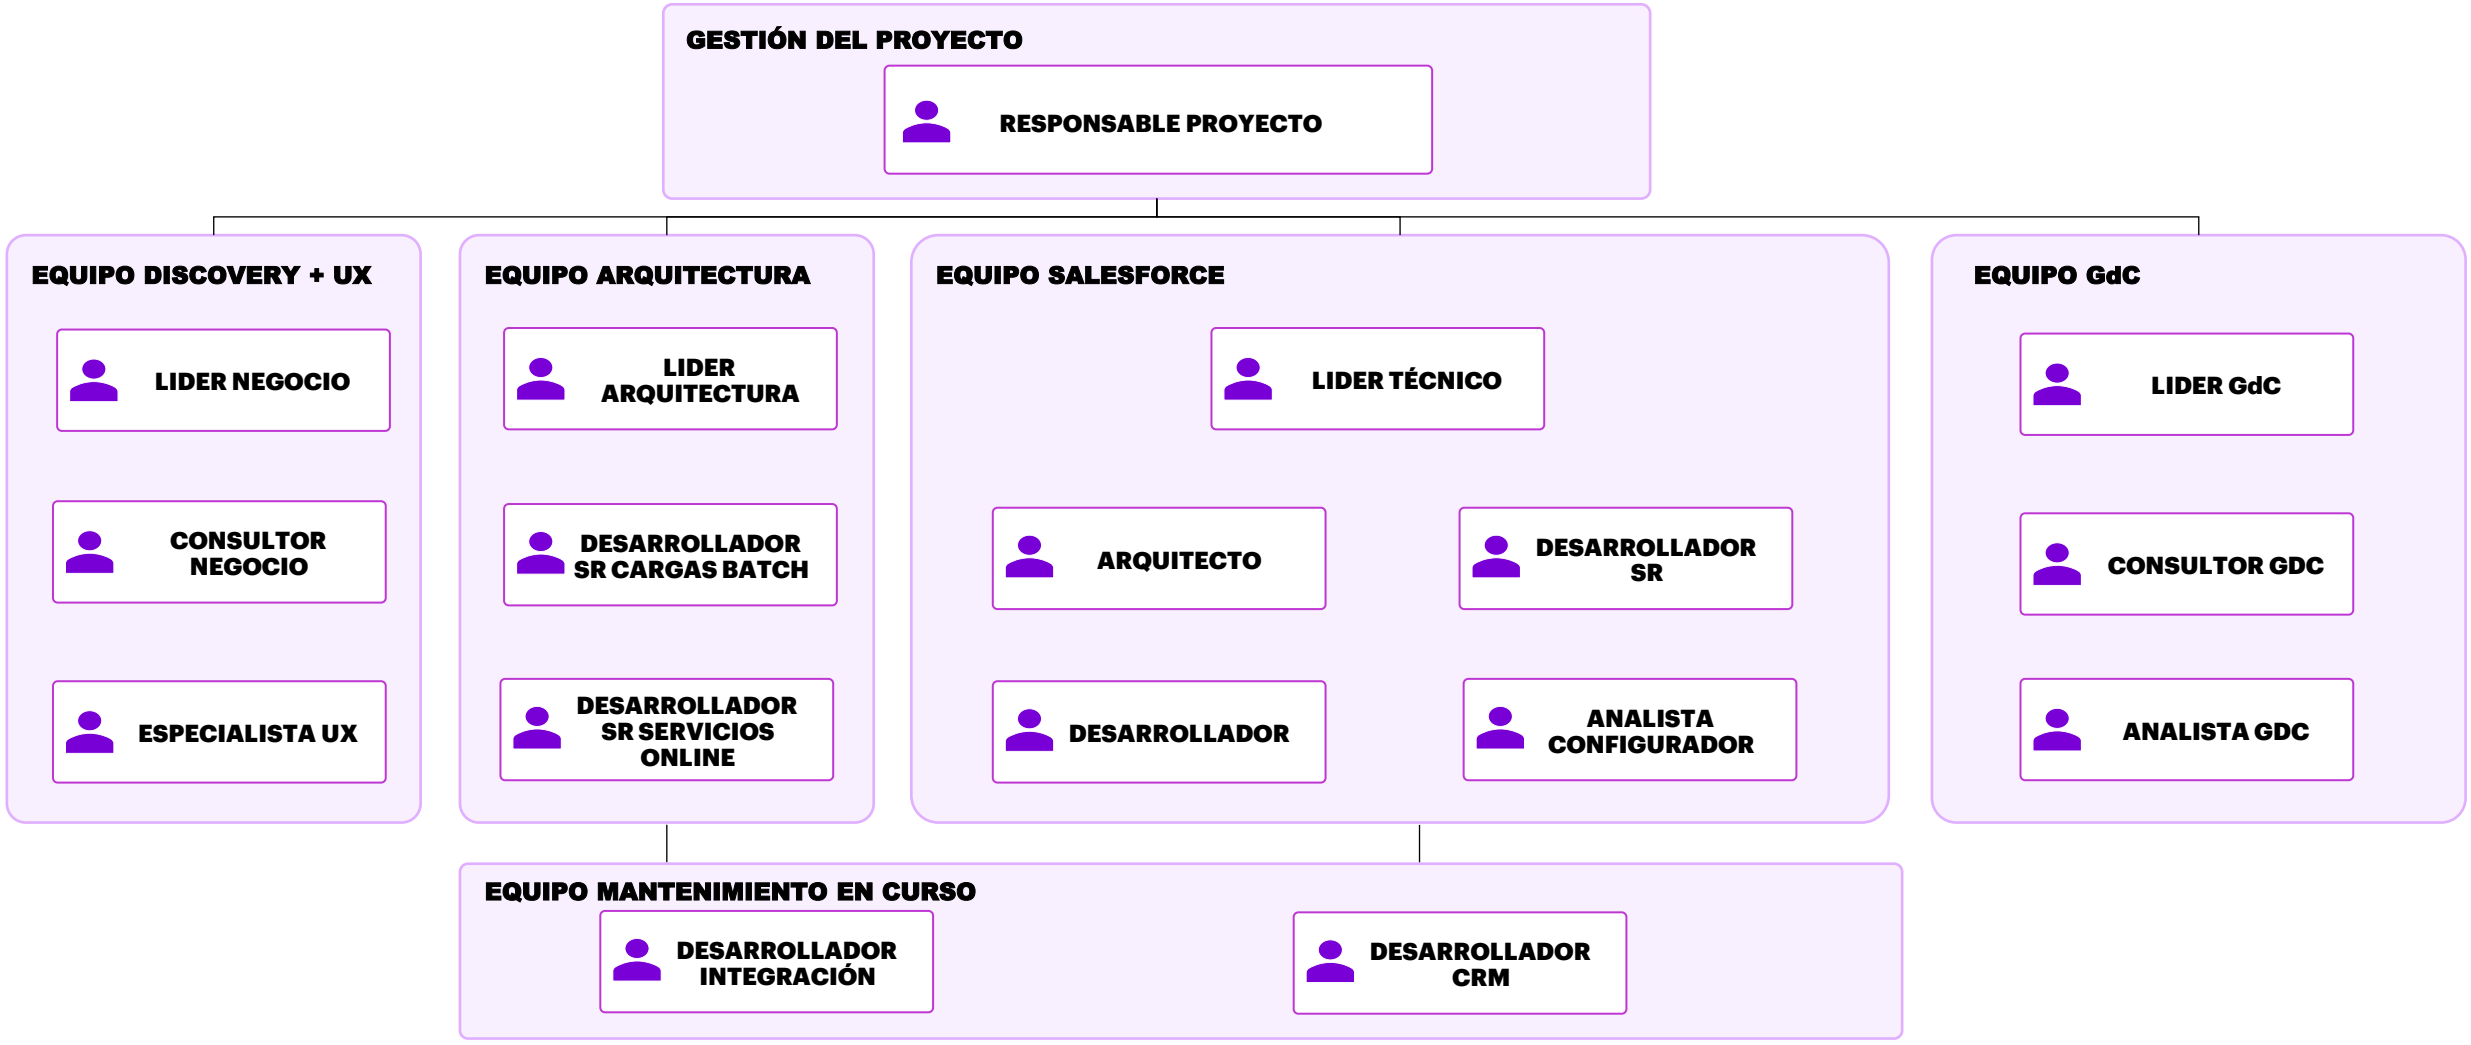

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES – MANTENIMIENTO EXTENDIDO

A continuación, se detalla el equipo propuesto para los 12 meses de mantenimiento extendido:

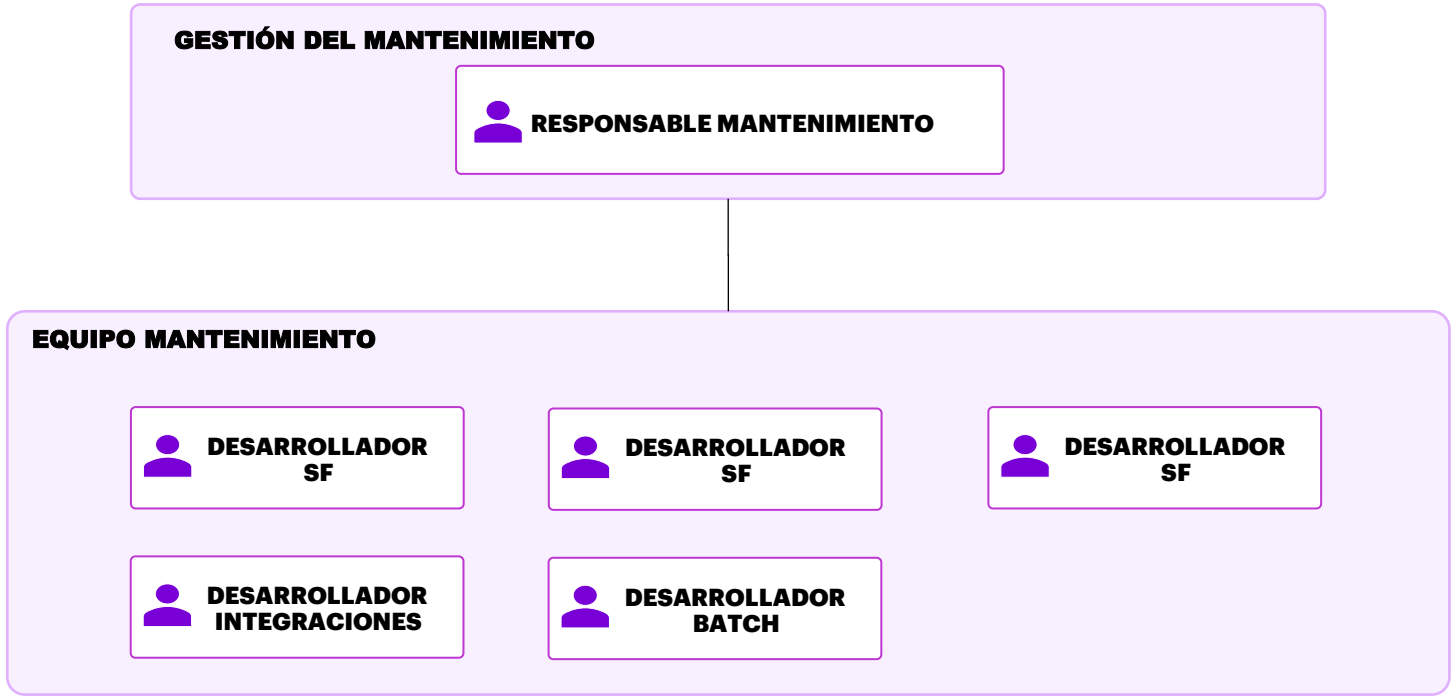

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Pre-Work y Kick-Off		
Incorporar las actividades de todas las partes interesadas en un plan general de ejecución siguiendo el calendario de esta propuesta	A	R
Informar a todas las partes interesadas sobre el calendario de entrega y el alcance (kick-off)	I	R, A
Obtención, seguimiento sobre las entregas del alcance de las terceras partes de acuerdo con los plazos de la propuesta	R, A	I
Preparación de los entornos (Dev, INT, UAT, PROD)	R, A	I
Negocio y UX		
Planificación, programación y ejecución de workshops para el alcance		R, A
Priorización de requerimientos con Negocio	R, A	C
Creación de un diseño funcional y técnico para el alcance		R, A
Prototipado UX de la solución	A, C	R
Mejoras del alcance transferidas a las solicitudes de cambio	A, R	A,R (*)

* Ambas partes podrás proponer cambios de alcance y deberán acordar el contenido de éstas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Implementación		
Completar el ciclo de desarrollo y pruebas (SIT(INT), Regression (UAT)) sobre la base del diseño funcional y técnico aprobado para el alcance de los servicios contratados con Accenture		R, A
Ejecución de las pruebas en sistemas terceros de LDA que afecten a la solución implementada por Accenture	R	I
Creación de matriz de pruebas de UAT	R	C
Preparación de set de datos para la UAT para la solución implementada por Accenture	I	R
Ofuscación o anonimización de datos para el testing	R	I
Realización de las pruebas UAT y ok al entorno de UAT	R,A	I
Definición de entidades y datos a migrar	R,A	C
Diseño técnico de migración	A,C	R
Extracción de datos del sistema origen	R,A	C,I
Ejecución de la migración	C,A	R
Validación funcional de datos migrados	R	I
Despliegue		
Despliegue desde Dev hasta UAT de la funcionalidad desarrollada por Accenture	I	R, A
Despliegue de UAT a Prod de la funcionalidad desarrollada por Accenture	A,R	C
Desarrollo del ciclo de pruebas Smoke Test y Regresión	A,T	I
Actualización de versión en los entornos de Salesforce/actualizaciones de versión	R,A	I
Creación de usuarios en entonos no productivos	A	R
Creación de usuarios en entonos productivos	R,A	C,I

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

RACI

TAREA	Línea Directa	Accenture
Gestión del cambio y adopción		
Entrega documentación AS-IS del CRM actual y TO-BE de sistemática comercial. Selección de embajadores. Definición del modelo operativo	R	I
Entrega documento de análisis de impactos	C	R
Mapa de stakeholders y sponsors y Roadmap de adopción	I	R
Planificación y definición estrategia de comunicación	A	R
Comunicación a externos	R	I
Definición de los usuarios a formar (modelo formación a formadores) y su disponibilidad	R,A	I
Calendarización de los workshops de formación	A	R
Ejecución de los workshops de formación	I	R,A
Acompañamiento en la fase de adopción de la herramienta – Informe de métricas y reporte de adopción	A	R
Metodología y Gobierno		
Gestión de riesgos	A	R
Gestión de dependencias	R	I
Seguimiento de hitos y entregables		R,A
Gestión del plan maestro y reporting ejecutivo	A	R
Gestión de decisiones y escalados	A	R


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

4. Gestión del mantenimiento

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live

A partir de la subida a Producción de la **Fase I**, se activará un **equipo adicional de Mantenimiento y Evolución** que acompañará el resto del programa hasta su finalización. Este equipo operará en paralelo a las siguientes fases de implementación. Al finalizar la implementación comenzará el mantenimiento extendido de 12 meses como se indicaba en la planificación

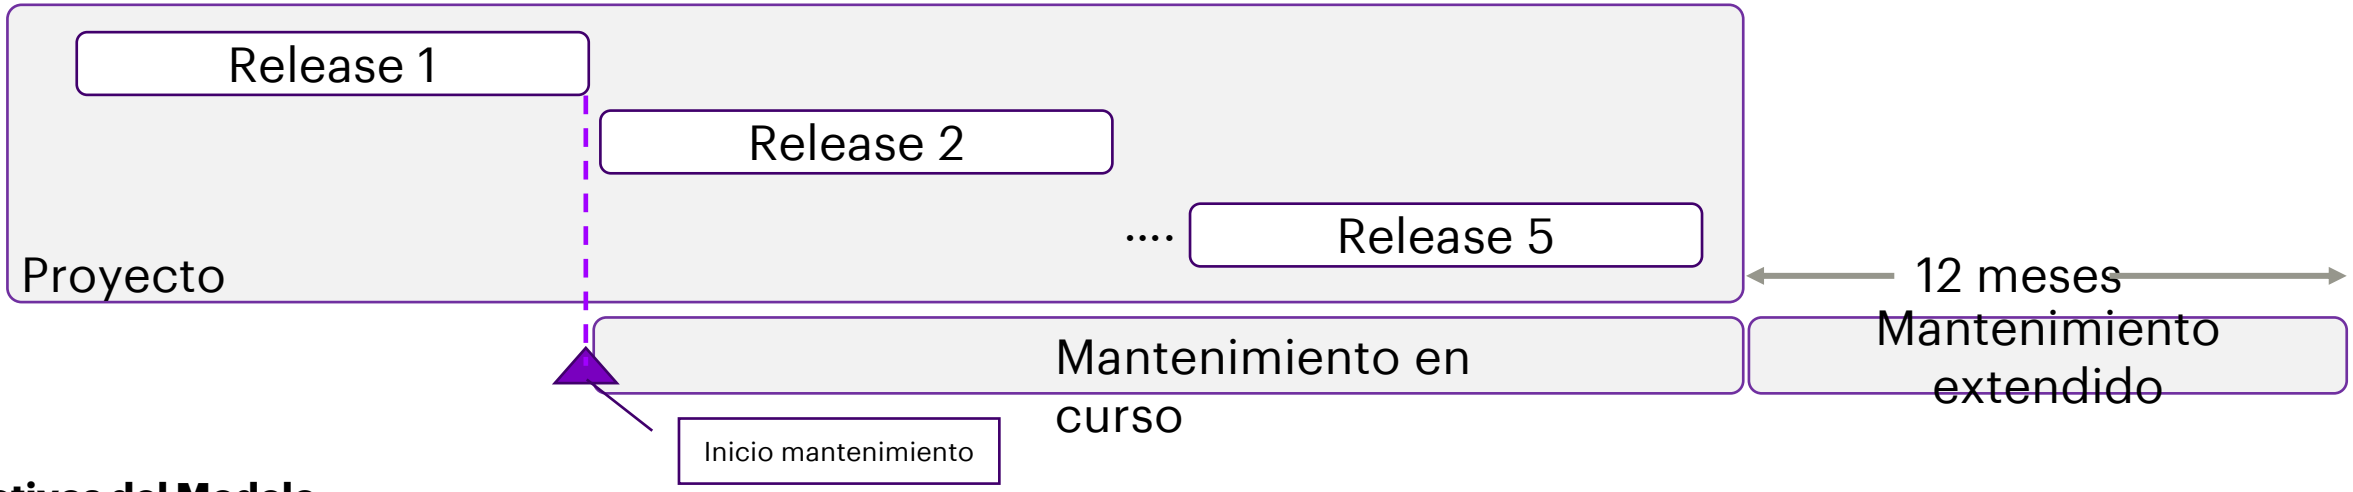

Objetivos del Modelo

- ✓ Promover la estabilidad tras cada Go-Live
- ✓ Gestionar incidencias funcionales y técnicas
- ✓ Promover la continuidad operativa del negocio
- ✓ Incorporar pequeños evolutivos de bajo impacto
- ✓ Preparar el sistema para siguientes releases

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live. Traspaso

A partir del despliegue de la primera fase se propone hacer el traspaso al equipo de mantenimiento o bien al equipo de LDA en caso de que no se contrate el mantenimiento

Cada una de las **reuniones tendrá una duración aproximada de 2 horas** donde participarán todas las áreas implicadas en referencia al módulo o módulos a tratar durante la sesión.

Se proponen las siguientes **reuniones para la cobertura del traspaso** de todas las funcionalidades impactadas:

- Sesión para explicar la documentación generada para el proyecto
- Sesión de funcionalidad implementada (Historias de usuario y diseños visuales)
- Sesión de integraciones y arquitectura global (pruebas de carga de datos,...)
- Sesión de Gestión del cambio para explicar documentación y procedimientos implantados
- Sesión de administración de la herramienta e incidencias en curso
- Una sesión adicional de aclaración de dudas

Se propone realizar una transferencia de servicio las dos últimas semanas previas a cada despliegue, la transferencia del servicio donde debe asegurar el traspaso efectivo del conocimiento al equipo de mantenimiento

PLANIFICACIÓN



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Documentación generada		Funcionalidad		aplicación
Arquitectura	GdC		Administración e incidencias en curso	Aclaración de dudas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El alcance para la solución CRM de Salesforce de LDA se basa en un modelo de servicio que contempla las siguientes tareas de:

- **Correctivos**
- **Soporte de Mantenimiento**
- **Evolutivos y Tareas**
- **Release Management a entornos previos a Producción**

El servicio a LDA dará soporte a:

- **Plataforma Salesforce: FSC**
- **Experience cloud**
- **Agentforce**

Integraciones:

- **Mulesoft**

1 CORRECTIVO

- Resolución de incidencias de la solución Salesforce de LDA
- Análisis, de forma coordinada con el resto de los equipos, de la solución más adecuada según la tipología de la incidencia y su afectación al negocio.

2 SOPORTE

- Monitorización diaria del sistema, en conjunción con los arquitectos de Salesforce del equipo.
- Revisión de los indicadores en el proyecto para el mantenimiento. (Data Storage, Objeto Histórico, Audit Log, Revisión de Licencias de Salesforce Disponibles)
- Seguimiento de Incidencias y Tareas.
- Confección de la documentación técnica necesaria y almacenamiento en los repositorios correspondientes de las herramientas
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados

3 EVOLUTIVOS

- Implementar nuevas iniciativas o funcionalidades o adaptación/modificación de las ya existentes para la **evolución de la solución de LDA** conforme a los requerimientos acordados con negocio.

- Ejecución de pequeños evolutivos y tareas de hasta 40 horas el ciclo completo de ejecución (desde el desarrollo hasta la subida a PROD).

4 RELEASE MANAGEMENT

- Responsable de promociones entre entornos previos a PROD.
- Mantenimiento de ramas.
- Realización de informes de calidad del código y deuda técnica.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tareas y entregables



Objetivo

- Resolución de incidencias detectadas en producción de la plataforma Salesforce, incluyendo errores de código o configuraciones de la aplicación.
- El servicio cubrirá las actividades para solventar la incidencia y restaurar tan pronto como sea posible la normalidad del servicio y operación, desde el análisis inicial y diagnostico hasta la resolución en los sistemas dentro del alcance que estén impactados.
- Soporte a los procesos de la plataforma



Tareas Accenture

- Análisis y resolución de las incidencias detectadas en el funcionamiento del CRM Salesforce, con sus evidencias asociadas
- Escalado de las incidencias producidas en los procesos de integración con terceros sistemas al grupo responsable.
- Actualización estado incidencia en ServiceNow en tiempo y forma.



Tareas LDA

- Registro de tickets con detalles del incidente en la Servicenow aportando los datos de prueba y pasos necesarios para reproducir la incidencia y las condiciones en las que se ha producido.
- Tipificación y priorización de tickets.
- Nivel 1 de servicio de mantenimiento.
- Pruebas de usuario.
- Soporte al escalado de incidencias críticas.
- Actualización estado incidencia en Servicenow en tiempo y forma.



Entregables

- Actualización de la documentación técnica de la aplicación.
- Documentación de la resolución de incidencia en la Servicenow tanto de soluciones como de workaround lo que contribuirá a tener un repositorio de conocimiento que ayude a mejorar la resolución de futuras incidencias.
- Actualización en repositorio de los elementos modificados.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tipificación de incidencias

La tipificación de incidencias que proponemos es la detallada a continuación:

Tipología	Prioridad	Descripción
Incidencias Correctivo	1.- Crítica	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Impide totalmente la ejecución de un Proceso Crítico de Negocio* definido en el Documento de Alcance. ➢ Afecta a más del 50% de los usuarios activos del sistema o a la totalidad de un colectivo operativo esencial. ➢ No existe workaround técnico ni operativo razonable. ➢ Genera al menos uno de los siguientes impactos: • Incumplimiento contractual frente a clientes finales. • Incumplimiento regulatorio o riesgo sancionador. • Imposibilidad de facturación o ejecución económica de operaciones. • Caída total del servicio.
	2.- Alta	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Afecta de forma severa a un Proceso Crítico de Negocio o a más del 25% de usuarios activos. ➢ Permite la continuidad operativa mediante workaround temporal. ➢ No implica caída total del sistema. ➢ Puede generar impacto financiero o operativo relevante, pero no paraliza completamente la actividad.
	3.- Media	➢ No impide la ejecución de Procesos Críticos de Negocio. ➢ Afecta a menos del 25% de los usuarios activos. ➢ Existe workaround razonable. ➢ No genera incumplimiento contractual ni regulatorio. ➢ No impide la facturación ni la ejecución económica de operaciones.
	4.- Baja	➢ No impacta en procesos de negocio. ➢ No afecta a datos transaccionales. ➢ No genera impacto financiero ni regulatorio. ➢ Se limita a aspectos visuals o parametrizaciones menores

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

* Las partes deberán acordar los procesos críticos de negocio

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: ANSs de incidencias

Los ANSs que proponemos a aplicar durante el mantenimiento son los siguientes:

Tipología	Prioridad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias Correctivo	1. Crítica	30 min	5 horas labor.	Mensual	≥90%
	2. Alta	30 min	8 horas labor.	Mensual	>90%
	3. Media	6 horas	3 días labor.	Mensual	>90%
	4. Baja	12 horas	10 días labor.	Mensual	>90%

Definición	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias repetitivas	Mensual	≤5%
Tickets reabiertos tres o más veces	Mensual	≤2% (12 meses)
Retrasos en la entrega de AD	Puntual	0 semanas

Consideraciones:

- Los tiempos deben medirse con la herramienta para la gestión de incidencias (ServiceNow) proporcionada por LDA, y estos deben computarse conforme las ventanas de servicio descritas en la presente propuesta. Cuando un ticket está bajo la responsabilidad de algún equipo NO Accenture, los tiempos no se considerarán.
- Si como consecuencia de un despliegue, se produce un aumento de las incidencias por problemas en la calidad de los desarrollos no realizados por Accenture, el no cumplimiento de los ANSs no será de aplicación para los desarrollos que lo provocan, asumiendo que dichas desviaciones serán cubiertas por la garantía de las empresas responsables de realizar dichos desarrollos
- La asignación de prioridades se realizará por parte de Accenture conforme un patrón normal a acordar de buena fe.
- Solo se podrán computar ANS si se recibe una muestra de valores que permita hacer el cálculo de forma representativa. Accenture y LDA acordarán de buena fe los vectores de determinación de la naturaleza representativa de cada muestra.
- Se contempla la posibilidad de revisar y modificar los ANSs de mutuo acuerdo, cuando las circunstancias lo aconsejen

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Soporte: Tareas y entregables

Objetivo

- Seguir realizando acciones de carácter perfectivo y gestión de tareas administrativas que surjan de forma proactiva desde el propio Servicio, o bien a demanda a través de peticiones de los usuarios.
- Comprobaciones manuales y desarrollo de procesos enfocados a mejorar la operación y disponibilidad de Salesforce.

Tareas Accenture

- Chequeo periódico del estado de la aplicación para la identificación proactiva de posibles incidencias o degradación del sistema.
- Revisión de movimientos diarios en las integraciones con terceros, relanzamiento de los procesos automáticos en casos de ser necesario o creación de tickets de soporte en caso de errores/incidentes.
- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en Servicenow
- Actualización estado de las solicitudes de servicio en ServiceNow en tiempo y forma.
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados, que permitan potenciar la operación de la aplicación y la reducción progresiva de incidencias.
- Monitorización de volumetrías y rendimiento.

Tareas LDA

- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en Servicenow.
- Tipificación y priorización de la solicitud de servicio en base al criterio especificado mas adelante.

Entregables

- Informes de posibles riesgos y problemas junto con propuestas de mejora.
- Documentación de las tareas de soporte realizadas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

LDA

Negocio

Requerimientos
- Identificación evolutivos

Product Owner

Seguimiento y gestión del servicio de evolutivos
- Toma de requisitos
- Anticipación de necesidad de capacidad
- Seguimiento y gestión del backlog
- Priorización y confección de las historias de usuario
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación de evolutivos
- Información a usuarios

ServiceNow

SERVICIO ACCENTURE

Project Manager

Gestión del servicio
- Gestión y planificación de la capacidad del equipo

Equipo Evolutivos

Desarrollo y pruebas de nuevos requerimientos
- Realización de estimaciones en base a requerimientos recibidos.
- Desarrollo y pruebas acorde al backlog definido.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.
- Soporte a la validación de los desarrollos e implementación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

Objetivo

- Evolución con pequeños evolutivos de la plataforma Salesforce conforme a las necesidades de negocio de LDA .

Tareas Accenture

- Coordinación del equipo e iniciativas a desarrollar.
- Estimación y planificación del desarrollo.
- Análisis funcional y técnico.
- Realización de estimaciones en base a requerimientos.
- Desarrollo.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de regresión.
- Soporte a pruebas de integración de sistemas.
- Resolución de defectos detectados en las pruebas.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.

Tareas LDA

- Aprobación estimación y planificación del desarrollo.
- Comunicación con negocio y otros equipos / sistemas para la toma de requisitos.
- Definición detallada de las historias de usuario describiendo el *definition of ready* y *done* (cubriendo según aplique flujo del caso de uso, lógica de negocio, respuestas, pruebas integradas o rendimiento, etc.).
- Gestión del backlog priorizado teniendo en cuenta la planificación y estrategia interna de LDA .
- Participación en los workshops de descripción funcional de las historias de usuario.
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación del entregable del sprint review.
- Pruebas de usuario.

Entregables

- Código fuente en repositorio de cliente.
- Pruebas unitarias creadas/actualizadas.
- Pruebas funcionales creadas/actualizadas.
- Pruebas regresión creadas/actualizadas.
- Documentación técnica correspondiente a cada evolutivo.
- Informe mensual de seguimiento del servicio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Release manager: Tareas y entregables

LDA

Proveedores LDA

Nuevos desarrollos e integraciones
- Creación de petición de despliegue.

Product Owner

Seguimiento y gestión del servicio de evolutivos
- Aprobación de los nuevos desarrollos y evolutivos para su despliegue a los entornos.

Responsable servicio de Mantenimiento

Seguimiento servicio
- Priorización del backlog de despliegues.
- Aprobación de despliegues.

ServiceNow

SERVICIO ACCENTURE

Release Manager

Mantenimiento de entornos
- Refresco y mantenimiento de los entornos sandbox de desarrollo y UAT.
- Realización y validación de despliegues.
- Mantenimiento de ramas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Release manager: Tareas y entregables

Objetivo

- Mantenimiento de entorno.

Tareas Accenture

- Refresco y mantenimiento de los entornos sandbox de desarrollo y UAT.
- Revisión y aprobación de pull requests. La revisión se realizará usando las herramientas proporcionadas por LDA así como una checklist definida junto con LDA.
- Ejecución de validaciones de la subida al entorno.
- Realización de despliegues a los entornos de INTEGRACIÓN, UAT,
- Ejecución de test en los entornos de desplegados para asegurar que la subida ha sido correcta.
- Alineación de entornos, refresco de entornos tras las subidas a producción programadas (correctivos y/o evolutivos) y nuevas releases.

Tareas LDA

- Definición junto con Accenture de checklist de revisión de pull request
- Definición del backlog de despliegues.

Entregables


- Informes de despliegues.
- Actualización del estado de los despliegues en el dashboard de despliegues.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

5. Metodología y Gobierno

METODOLOGÍA

Se propone la ejecución del Desarrollo mediante un **modelo de desarrollo incremental** basado en las características del modelo que consideramos que mejor aplica a este tipo de proyectos en base al faseado propuesto

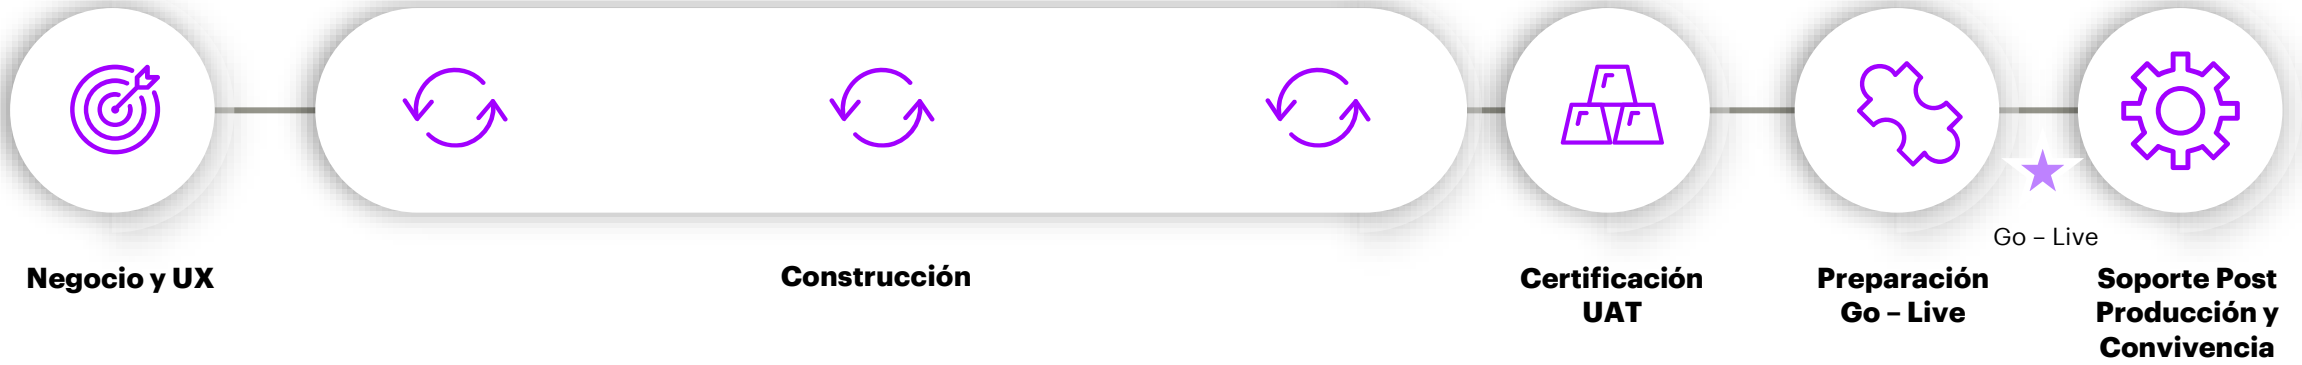


Para ello se propone una metodología basada en los siguientes pasos:

- Confirmar y cerrar el alcance de los trabajos durante las sesiones de refinamiento (revisión y estimación) de la Fase de Negocio y UX
- Ejecutar en un modelo de trabajo orientado a la entrega mediante Sprints
- Certificación previa al despliegue, con una fase inicial de pruebas de producto anterior a las pruebas de usuario
- Preparación del Go – Live y despliegue en base al calendario y periodicidad acordada para desplegar a PROD en MM (Releases)
- Garantía post producción

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Características sprints de Desarrollo: La fase de desarrollo se realizará en base a Sprint por cada Release

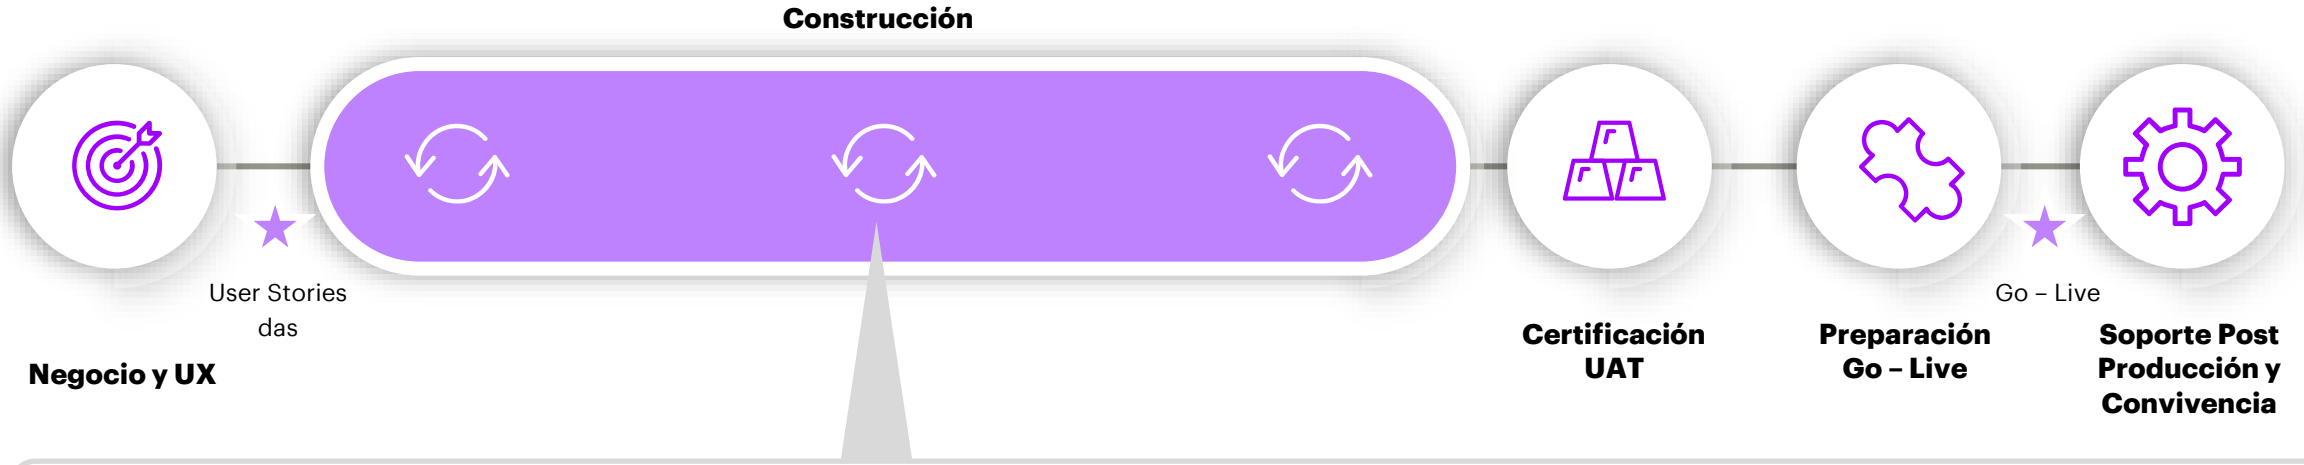

Desarrollo incremental

- Fomentar la colaboración, comunicación y transparencia en todo momento
- Dedicación por parte de los stakeholders (key users) de LDA para resolver las dudas que el equipo pueda tener.
- Respetar la planificación y alcance acordada por todos los equipos en la fase previa
- No descuidar la documentación de cada User Story que vaya a ser necesaria para fases posteriores.

Sesiones de revisión continuas (Sprints)

- La interacción conjunta e intensa permite focalizarse en el valor de negocio y visualizar cualquier posible riesgo o desviación.
- El permitir ir viendo la evolución de la herramienta permite una mejor adaptación para los usuarios finales

Consolidación del producto

- Este enfoque facilitará los sprints de fases posteriores permitiendo desplegar el producto rápidamente en orgs de test, certificación producción.
- Se dispondrá de la solución devOps de LDA permitiendo automatismos (integración continua, tests (unitarios, integrados, regresión), análisis de calidad del código, despliegue de componentes) y gestión colaborativa de los metadatos del producto (datos que componen la configuración de una org).

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

A continuación, se propone la siguiente configuración de entornos:


Entorno	Tipo de Sandbox	Descripción y uso
DEV	Developer	Entorno donde los desarrolladores desarrollan y prueban sus desarrollos y pasan los tests unitarios.
DEV CONSOLIDADO	Developer	*Opcional*. Entorno donde los desarrolladores prueban sus desarrollos y pasan los tests unitarios sin modificaciones de código, siendo este un entorno más estable. Puede no usarse utilizando el entorno de consolidación el de INT
INT	Developer	Entorno de integraciones para para pruebas integradas
UAT	Partial Copy	Entorno para las pruebas funcionales y de aceptación
STG	Full copy	Entorno de staging clon de producción. Será el último paso antes de llegar a producción. Será el entorno donde se probarán los hotfixes.
PRO	Producción	Entorno productivo

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Se propone la siguiente metodología para la gestión de los despliegues. En base al escenario mono-org de LDA. Es por ello por lo que se requiere aplicar una metodología coordinada (líneas de desarrollo y mantenimiento) y que sirva como base para poder escalarlo a LDA

El modelo de trabajo para los despliegues se centralizará en equipo interno de LDA asumirá la función de Release Management de Producto para promover la consistencia y calidad de los despliegues de los distintos proyectos en curso

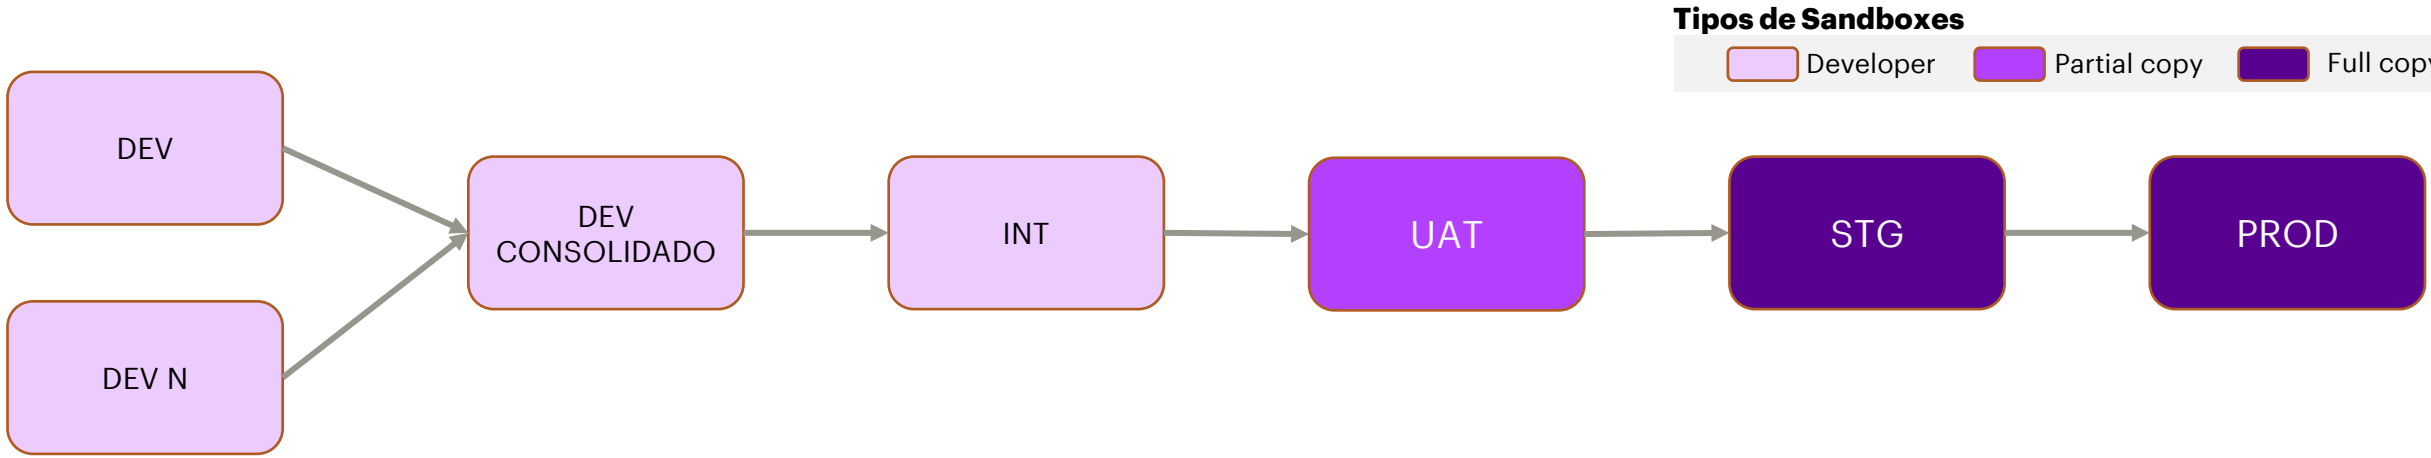

ACCENTURE

Accenture será responsable de realizar las subidas desde los entornos de Desarrollo hasta el entorno de UATs

COE de LDA

A partir de los entornos de consolidación por proyecto, será el Release manager de producto de MM el responsable de realizar las subidas a los siguientes entornos.

Se asume que actualmente solo existirá este proyecto en Salesforce. Si a futuro se incluyesen nuevos proyectos y proveedores en paralelo habría que revisar la metodología de despliegue para que los despliegues del CoE de LDA fuesen desde entornos comunes desde INT en adelante

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA

Se propone la siguiente metodología para la ejecución de pruebas:

Pruebas	Fase	Enfoque	Objetivo	Datos usados en las pruebas	Liderado por	Núm. ciclos
Pruebas unitarias	Construcción	Probar la funcionalidad de los componentes	Confirmar el cumplimiento de los componentes mediante la funcionalidad definida	Datos demo	Accenture	N/A se valida por componente
Pruebas de integración de la solución (SIT)	Construcción	Probar extensiones, interfaces, flujos de trabajo personalizados e informes personalizados	Confirmar el cumplimiento de los requisitos de GAPs dentro del alcance mediante la solución personalizada	Datos de ejemplo del cliente	Accenture	1 Ciclo de 1 semana por fase
Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Pruebas de usuario	Pruebas de la solución con roles de seguridad de usuario asignados	Confirmar que se cumplen los requisitos aprobados	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 Ciclo de 2 semanas por fase
Test de migración de datos (DMT)	Construcción	Probar herramientas y procesos de migración de datos	Validaciones de datos numéricas a alto nivel, orientadas a comprobar la coherencia global de la migración (volúmenes, totales y ratios relevantes) adicionalmente una cata aleatoria de registros con el objetivo de verificar la correcta migración de datos representativos.	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 Ciclo
Regresion Test	N/A	Se realizará una prueba de regresión después de cada despliegue de una nueva fase, es decir Fase 2 y Fase 3	Confirmar el impacto de la actualización del sistema en los requisitos “Probados”.	Datos de ejemplo del cliente	LDA	1 por fase de 1 semana

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Accenture proporcionará un modelo de gobierno integrado con el objetivo de promover una gestión eficaz de las relaciones y una presentación de informes transparente centrada en aportar una profunda visibilidad en la ejecución del proyecto.

Nivel Estratégico

Nivel de gestión ejecutiva que permite mantener y desarrollar la colaboración, resolver problemas importantes, establecer la dirección y aprobar cambios estratégicos, lo cual concierne a la función del gobierno y el liderazgo. La participación consistirá en niveles elevados de sponsorship ejecutivo pertinente. Para esta reunión se contará con la colaboración y soporte de la Oficina de Transformación de TI de LDA

Nivel Táctico

Nivel de relación clave que se caracteriza por frecuentes reuniones de revisión para la confirmación de progresos, de acuerdo con los objetivos globales del acuerdo. Este equipo también se centra en la gestión de escalado, la gestión de la demanda (disponibilidad de recursos) y proporciona el marco para la comunicación, sin interferencias.
Los interlocutores serán el coordinador del proyecto del proveedor y el responsable de Oficina de Transformación de LDA

Nivel Operativo


Nivel de trabajo diario orientado a la prestación de un servicio y a la respuesta de peticiones, problemas y consultas, conforme al acuerdo/prestación establecida. Las funciones de prestación las gestiona el equipo formado en el nivel operativo. Este equipo se centra en las actividades operativas diarias y se esfuerza por mejorar las métricas.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO

Procesos del modelo de gobierno

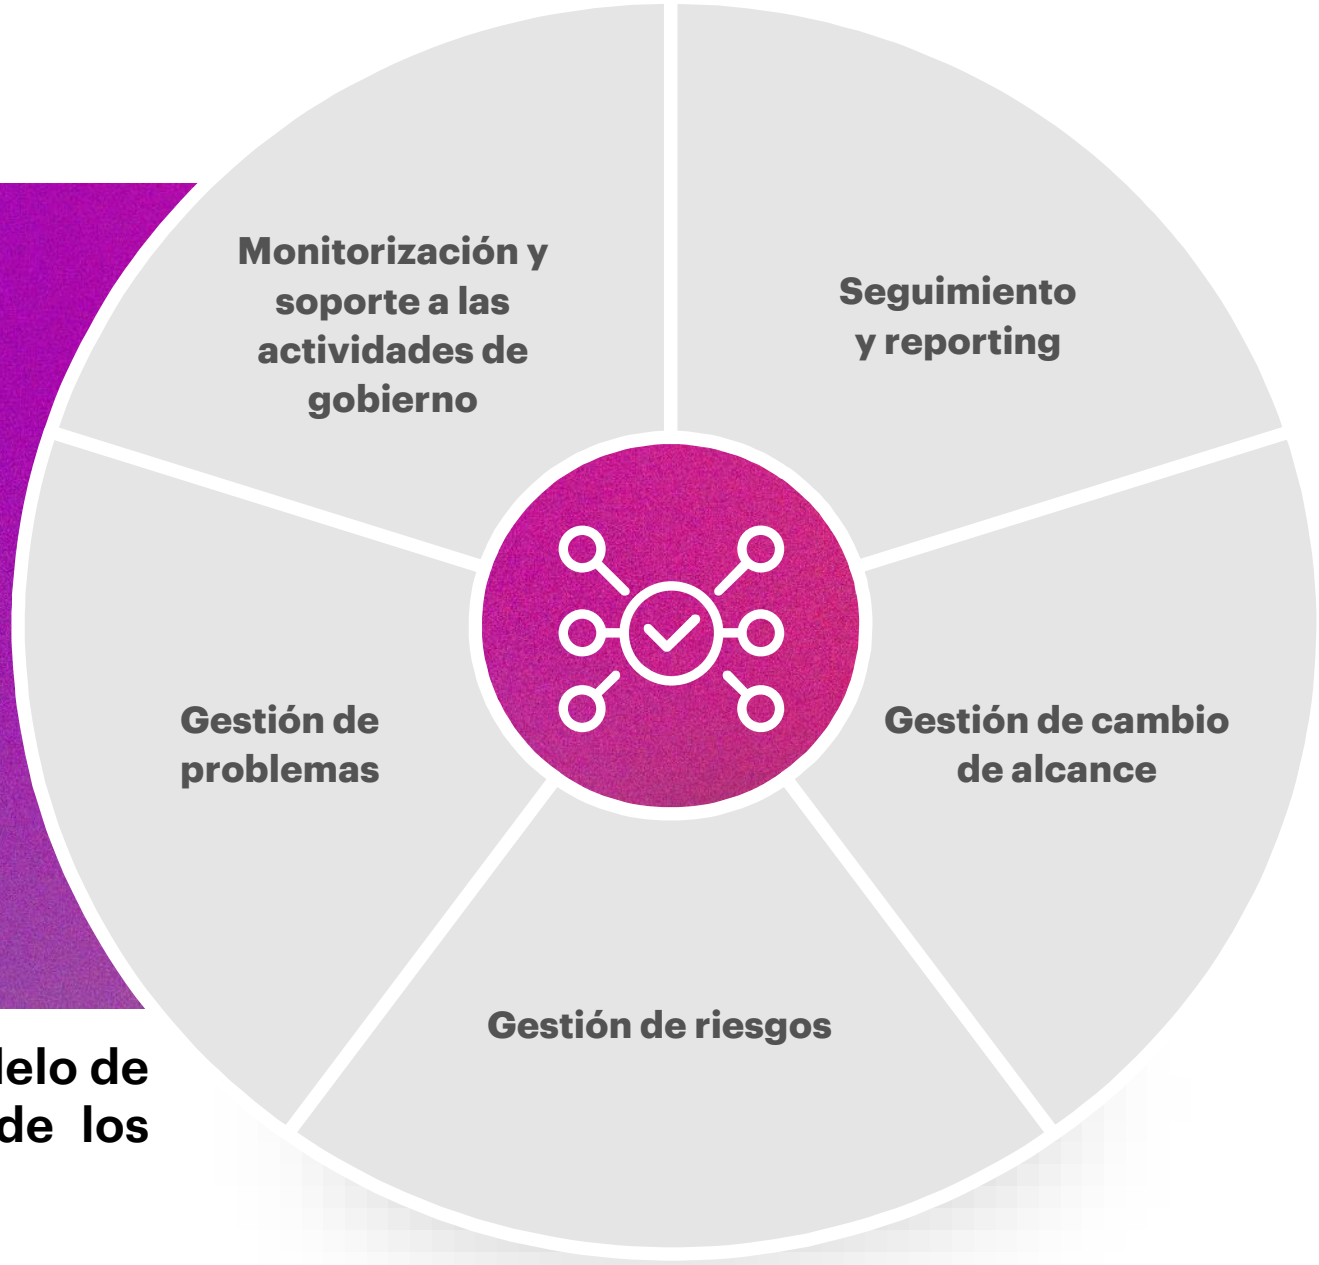

En el documento de anexos se explica el modelo de gobierno de forma detallada a cada uno de los puntos aquí indicados

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO - Detalle



Cambios de alcance

Cambio de alcance

Identificar cambio de alcance	El equipo de trabajo, con la participación del Product Owner, documentará el cambio, realizando una evaluación inicial de la solicitud de cambio de alcance y establecerá su prioridad, así como el impacto en el programa en relación con el alcance, planificación, el riesgo etc.
Documentar el cambio	Accenture realizará una evaluación del impacto en esfuerzo, que será revisada por LD.
Analizar el cambio de alcance	LD y Accenture revisarán cada una de estas solicitudes en las reuniones de seguimiento del nivel operativo y una vez revisadas serán escaladas, si procede, al comité de dirección (nivel táctico) para su revisión/aprobación. En caso de no ser escalado a dicho comité, podrán ser congelado o rechazado.
Documentar el cambio	Una vez en el comité de dirección se decidirá si es necesario llevarse a cabo un análisis detallado del mismo. Una vez realizado el análisis detallado, el comité de dirección aceptará o rechazará la solicitud.
Implementación del cambio de alcance	Si se acepta el cambio de alcance, se incluirá en el backlog del proyecto, estableciendo el impacto en los recursos, el horario, esfuerzo y la actualización del plan de proyecto en consecuencia para su implementación.


En el documento de anexos se explica el modelo de gobierno de forma detallada.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MODELO DE GOBIERNO - Detalle

Gestión de riesgos

A continuación, se indican los riesgos que puede presentar el proyecto, ofreciéndonos a revisar los mismos con los responsables del proyecto al comienzo de los trabajos para preparar las acciones de mitigación necesarias que colaboren con la iniciativa:

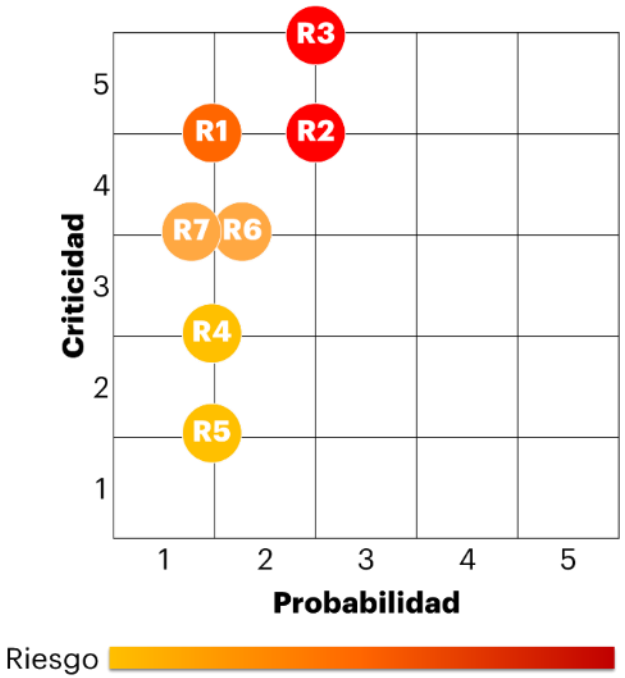

ID	Riesgo	C	P	R	Acciones de Mitigación	Responsable Acción
R1	No involucración o baja participación del área de sistemas	4	1	4	Se propone revisar la planificación durante la primera semana y confirmar la asistencia de todas las reuniones y los responsables	LDA
R2	Retraso en la aprobación de la documentación y toma de decisiones pueden provocar re-work	4	2	8	Involucración desde el inicio del equipo Negocio/Sistemas de LDA, en las distintas tareas de cara a poder ejecutar una rápida aprobación de los entregables	LDA/ Accenture
R3	Modificaciones o cambios de alcance	5	2	10	Consenso entre Accenture y Línea Directa para ampliar la colaboración conforme a un plan, alcance y coste consensuado	LDA/ Accenture
R4	Retrasos en el arranque de proyecto por retrasos administrativos/ logísticos.	2	1	2	Seguimiento de tareas necesarias e involucración responsables de las áreas afectadas en caso necesario	LDA/ Accenture
R5	Cambios en el entorno del proyecto: disponibilidad de entornos, accesos a sistemas, disponibilidad de licencias (Salesforce, otros sistemas,...)	2	1	2	Anticipar en la medida de lo posible análisis de impacto y toma de decisiones por parte del Comité de Dirección	LDA/ Accenture
R6	Incorrecta gestión de los entornos de Salesforce y problemas en los pases de peticiones entre entornos	3	1	3	Aplicación de una correcta metodología de DevOps	LDA (Oficina técnica)
R7	Retrasos en algún desarrollo en los sistemas actuales de LDA que suponga un retraso para el resto de desarrollos del proyecto	3	1	3	Anticipar en la medida de lo posible análisis de impacto y toma de decisiones por parte del Comité de Dirección	Accenture

En el documento de anexos se explica el modelo de gobierno de forma detallada.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

6. Listado de entregables

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (1/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Planificación	Movilización	Plan detallado de proyecto de entregables técnicos por lote o iteración que sirva de planificación general durante el proyecto	Gestión
Kick-Off	Movilización	Define el alcance inicial, stakeholders, cronograma preliminar	Gestión
Diseño funcional + UX	Análisis y diseño	Documentos donde se tendrá el detalle necesario para que el equipo encargado del desarrollo pueda realizar sus tareas dando respuesta a los requisitos identificados formulados como user stories por negocio y diseños realizados por parte del equipo de UX.	Definición + UX
Planificación de sprints	Análisis y diseño	Planificación de las HU por sprint.	Implementación
Diseño técnico aplicación	Análisis y diseño / Desarrollo	Documento dirigido al equipo técnico con arquitectura, integraciones, estructuras de datos, interfaces, etc. Que contiene los componentes técnicos necesarios para el desarrollo del requisito. Se realizará por HU y se realizará con antelación al inicio del sprint de desarrollo de dicha HU	Implementación
Modelo de datos	Análisis y diseño / Desarrollo	Documento describe de forma estructurada las entidades, atributos y relaciones de la información de un sistema, definiendo cómo se organiza, almacena y conecta el dato.	Arquitectura
Seguimientos periódicos	Gestión del cambio	Documento de seguimiento para las sesiones de los comités donde se evaluarán las distintas líneas de trabajo	Gestión
Arquitectura de Solución	Análisis y diseño	Documento de definición a alto nivel de arquitectura end-to-end (CRM, MuleSoft, API Connect, Kafka, CORE), flujos síncronos y asíncronos, principios de diseño.	Arq.Integración
Diseño de las Integraciónes	Análisis y diseño	Documento de diseño detallado de las integraciones	Arq.Integración
Catálogo de Integraciones	Análisis	Inventario consolidado de APIs, eventos, batch, modificaciones, clasificación por tipo y criticidad	Arq.Integración

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (2/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Documento de Mapeos y Transformaciones	Análisis y diseño	Definición de Mapeos, reglas de negocio aplicadas, gestión de extrernals ID y dependencias	Arq.Integración
Modelo de Gestión de Errores	Diseño técnico	Estrategia de reintentos, DLQ, idempotencia, orden por entidad, consistencia eventual	Arq.Integración
Modelo de Observabilidad	Diseño técnico	Integración ELK, Dynatrace, correlation ID, métricas técnicas, trazabilidad end-to-end	Arq.Integración
Diseño de Reconciliación	Diseño técnico	Definición de entidades críticas (máx. 2), periodicidad, batch técnico, reporting divergencias, remediación	Arq.Integración
Estrategia de Migración y Carga Inicial	Estrategia de Migración y Carga Inicial	Modelo ETL, alto volumen (>5M), ventanas de ejecución, validaciones post-carga	Arq.Integración + Datos
Testing	Testing	Unit test, integración, performance de integraciónes, soporte UAT	Integración + QA
Paso a Producción	Planificación técnica	Secuencia de despliegue, dependencias y validaciones	Integración + Gestión
Change impact analysis	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto por grupo de trabajo en .	Gestión del cambio
Mapa de stakeholders y sponsors	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye un mapeo de stakeholders clave en PPT, análisis de influencia de impacto, definición de sponsors y estrategia de involucración.	Gestión del cambio
Roadmap de adopción	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye una hoja de ruta de Gestión del cambio alineada al programa, hitos clave, palancas de adopción y plan de seguimiento en formato PPT.	Gestión del cambio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES (3/5)

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Narrativa del cambio	Compromiso y sentimiento	Narrativa del cambio con mensajes claros, propuesta de valor del cambio y kit de identidad visual (branding) en formato PPT.	Gestión del cambio
Estrategia, plan y materiales de comunicación	Compromiso y sentimiento	Incluye estrategia segmentada por colectivos, plan editorial y calendario en formato PPT, definición de canales y desarrollo de materiales de comunicación.	Gestión del cambio
Estrategia y plan de formación	Nuevas Formas de Trabajar	Plan formativo por rol y releases con modelo Train the Trainers (TTT) que define itinerarios formativos, oleadas alineadas al Go-Live, criterios de agrupación de colectivos con necesidades equiparables y mecanismos de transferencia de conocimiento para asegurar la adopción y autonomía interna en formato PPT.	Gestión del cambio
Train the Trainers y vídeos	Nuevas Formas de Trabajar	Presentaciones y sesiones TTT en español por rol y oleadas, con un máximo de sesión por tipo de colectivo y release. Incluye la creación de manuales operativos por rol y vídeos formativos desarrollados en PPT y grabación de pantalla, alineados a las funcionalidades del CRM.	Gestión del cambio
Canales de acompañamiento	Nuevas Formas de Trabajar	Canales en MS Teams segmentados por rol para coaching, soporte continuo y gestión de feedback y acceso a materiales de formación durante el post Go-Live en PPT.	Gestión del cambio
Agente de IA para soporte y adopción CRM	Nuevas Formas de Trabajar	Agente conversacional de IA para soporte al usuario, integrado en el entorno de trabajo, entrenado con materiales del proyecto (manuales, FAQs, guías operativas) para resolver dudas funcionales y apoyar la adopción del CRM durante el uso diario.	Gestión del cambio
Informe de estabilización	Nuevas Formas de Trabajar	Informe post Go-Live con análisis de adopción, feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora en PPT.	Gestión del cambio
Informe de métricas y Reporte	Entregar Resultados y Ajustar	Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint periódico para seguimiento y toma de decisiones en formato PPT.	Gestión del cambio
Documento final de transferencia	Entregar Resultados y Ajustar	Documento de sesión final con transferencia al CoE, RACI definido y recomendaciones de mejora continua en formato PPT.	Gestión del cambio

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

9. Consideraciones

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES:

- **Reunión de Inicio (Kick-Off):** Celebración de una reunión de inicio del proyecto (Kick-Off) con una antelación mínima de dos semanas respecto a la fecha prevista de arranque:
  - En dicha sesión participarán los responsables designados por LDA y por Accenture, y tendrá como objetivo:
  - Confirmar los interlocutores del área de IT y de Negocio que participarán en el proyecto.
  - Definir el calendario de trabajo. Establecer las necesidades de dedicación y participación de los distintos equipos.
- **Modelo de Gobierno y Toma de Decisiones:** LDA centralizará la toma de decisiones y validaciones en una o dos personas designadas como responsables del proyecto, con el fin de agilizar los procesos de aprobación y el cierre de fases.
- **Idioma de la Documentación:** Toda la documentación generada durante el proyecto se elaborará en castellano.
- **Disponibilidad de Recursos Clave:** LDA garantizará la participación activa y disponibilidad de las personas clave del área de Negocio y de los equipos del área de Sistemas que resulten necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.
- **Ubicación de los Trabajos** La ejecución del proyecto se realizará principalmente en las oficinas de Accenture. En caso necesario, se contemplarán desplazamientos puntuales a las oficinas de LDA en Madrid.
- **Sistemas Externos a Salesforce:** Todos aquellos desarrollos, adaptaciones o configuraciones requeridas en sistemas distintos de la plataforma Salesforce (incluyendo, entre otros, Galgo y otros sistemas legacy) serán gestionados y ejecutados por LDA. Asimismo, LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas correspondientes en dichos sistemas, en coordinación con las pruebas de integración definidas en el marco de este proyecto.
- **Seguridad y Protección de Datos:** LDA deberá comunicar a Accenture sus políticas de seguridad y protección de datos aplicables al proyecto.
  En particular, deberá identificar los datos considerados sensibles y definir los criterios de ofuscación, disociación o anonimización que deberán aplicarse en los entornos de prueba.
- **Proceso de Validación de Entregables:** LDA dispondrá de un plazo máximo de una semana desde la entrega formal de cada entregable para comunicar observaciones o solicitudes de modificación. En ausencia de comunicación dentro de dicho plazo, el entregable se considerará tácitamente aprobado.
- **Licencias y Herramientas del Proyecto:** El coste y la gestión comercial de las licencias necesarias para la ejecución del proyecto (incluyendo, entre otras, Salesforce, Jira, servicenow, herramientas de gestión documental o UX, herramienta de IA entre otras) serán responsabilidad de LDA.
- **Asignación de Equipo Accenture:** La intención de Accenture es asignar al proyecto los perfiles profesionales o similares previamente detallados (según CVs aportados). No obstante, la asignación definitiva estará sujeta a la fecha efectiva de inicio del proyecto y a la disponibilidad de los recursos en dicho momento.
- **Alcance**: El alcance de esta propuesta se define de manera integral por el presente documento y su Anexo Técnico [RFP_Linea Directa - 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484 - Anexos - Solucion SF]. Ambos documentos son complementarios y constituyen la descripción total de los entregables y servicios incluidos. El Anexo proporciona el detalle granular de las funcionalidades, por lo cual debe ser considerado parte esencial del alcance aquí descrito.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **La aceptación del software** se realizará exclusivamente con referencia a la última especificación aprobada formalmente por las Partes al finalizar la fase de UAT (User Acceptance Testing). Cualquier especificación más detallada y aprobada reemplazará por completo el alcance base definido por especificaciones y requerimientos anteriores. Si no existe diseño (p. ej., funcionalidad estándar del producto), se realizarán pruebas, pero quedarán excluidas del procedimiento de aceptación del trabajo de Accenture.
- **Estándares de Desarrollo y Calidad del Código:** La codificación se llevará a cabo siguiendo las prácticas y recomendaciones establecidas por Salesforce. Asimismo, se garantizará un *code coverage* mínimo del 85% en los desarrollos realizados, conforme a los estándares de calidad exigidos por la plataforma.
- **Accesos y Documentación Inicial:** Durante la semana de movilización del proyecto, LDA proporcionará al equipo de Accenture todos los accesos necesarios a los sistemas implicados, así como la documentación técnica y funcional requerida para el correcto inicio de los trabajos.
- **Modelo de Integración Continua y DevOps:** Se asume que el modelo actual de integración continua, basado en prácticas DevOps e implantado por LDA, se encuentra operativo y funcionando de manera estable al inicio del proyecto para poder realizar los despliegues de los desarrollos
  El proyecto se apoyará en dicho modelo para la gestión de despliegues y control de versiones.
- **Dependencias de Infraestructura y Accesos:** Cualquier retraso en la provisión de infraestructura, accesos o información necesaria podrá impactar en los plazos comprometidos del proyecto.
- **Pruebas de Usuario (UAT)**: Será responsabilidad de LDA garantizar la participación y disponibilidad de los usuarios clave en las sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT), necesarias para la validación funcional y aprobación del paso a Producción.
- **Aprobación de Casos de Uso para UAT:** La aprobación de los casos de uso y escenarios de prueba correspondientes a la fase de UAT será responsabilidad de LDA.
- **Datos para Pruebas Integradas:** Para la correcta ejecución de pruebas integradas y pruebas de usuario en escenarios de integración entre sistemas, LDA garantizará la disponibilidad de juegos de datos adecuados y suficientes en todos los sistemas involucrados.
- **Pruebas de Regresión en Sistemas Externos:** LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas de regresión en aquellos sistemas que puedan verse afectados por modificaciones o con Salesforce.
  Asimismo, será responsable de la gestión del esfuerzo e incidencias derivadas de dichas pruebas cuando afecten a procesos o desarrollos no incluidos en el alcance de la presente propuesta.
- **Uso de Funcionalidad Estándar:** En línea con las prácticas recomendadas por Salesforce, se priorizará el uso de funcionalidad estándar proporcionada por la plataforma frente a desarrollos a medida, con el objetivo de promover mantenibilidad, escalabilidad y alineación con futuras evoluciones del producto.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **Modelo de trabajo**:
  - Al ser un Precio Fijo basado en resultados no será aplicable el uso de metodologías ágiles o iterativas, dada la naturaleza evolutiva y adaptativa de dichos enfoques
  - Las especificaciones más detalladas que sean posteriormente definidas y aprobadas formalmente por las Partes sustituirán en su totalidad al alcance base previamente establecido en las especificaciones o requisitos iniciales.

- **Gobernanza de cambios**: El alcance base, la planificación y las hipótesis contractuales del proyecto estarán sujetos al proceso formal de gestión de cambios (Change Control) con el fin de analizar, acordar y aprobar los posibles impactos en alcance, calendario y precio. Las actividades de análisis y estimación asociadas a una solicitud de cambio (CR – Change Request) se considerarán igualmente parte de dicha solicitud y serán facturables.

- **Validación al inicio del desarrollo**: Cada Release incluirá una fase inicial de análisis y diseño visual de pantallas (UX) cuyo objetivo será detallar los requisitos, validar dependencias y confirmar la viabilidad de la solución planteada. A la finalización de dicha fase de definición en cada release, Accenture elaborará una revisión de alcance detallado y una estimación revisada de esfuerzo.
- En caso de que, como resultado del análisis realizado, se identifique que el alcance funcional difiere del inicialmente considerado en la presente propuesta, existen nuevas dependencias técnicas o integraciones no contempladas, o la complejidad técnica implique un esfuerzo superior al estimado inicialmente con base en las consideraciones de este documento, las Partes analizarán y acordarán conjuntamente el impacto en planificación y presupuesto y/o los siguientes pasos respecto a la Release afectada antes del inicio de la fase de construcción.

- No se consideran en el presente alcance **integraciones con el portal (web)** de LDA
- Se considera que la operativa de los usuarios que van a gestionar a los clientes desde Salesforce es la misma independientemente del canal por el que sean tratados (Chat, Teléfono, presencial) y no hay diferencias funcionalidades
- Se asume que es **Logalty** el que envía el documento a los clientes. Es el que almacena también el documento
- **Gestor documental**: Se asume que existe un gestor documental “Content manager” y que toda la documentación necesaria será subida a dicho gestor documental
- **Estandaridación de procesos**: Se asume que los procesos que forman parte de la operativa de gestión entre los diferentes ramos presentan un alto grado de similitud, siendo necesarias únicamente adaptaciones puntuales para su adecuación a cada ramo, sin que ello suponga un rediseño completo de los mismos.
- **Modelo de datos**: La definición final del modelo de datos se realizará durante la fase de diseño asociada a cada requisito, pudiendo verse modificados los objetos necesarios para cada fase en función de las conclusiones alcanzadas para cada uno de ellos.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **Dependencias**: Todas las adaptaciones, desarrollos, configuraciones o modificaciones necesarias en sistemas propios de LDA distintos de la plataforma Salesforce — incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, Galgo, Genesys, gestores documentales u otros sistemas legacy — serán responsabilidad exclusiva de LDA. LDA asumirá la planificación, ejecución, pruebas y puesta a disposición en plazo de dichas adaptaciones, garantizando su alineación con el calendario general del proyecto. El cumplimiento de los hitos y plazos del proyecto estará condicionado a que dichas adaptaciones en sistemas propios del cliente se encuentren disponibles en tiempo y forma conforme al plan acordado. Cualquier retraso en su ejecución podrá implicar un impacto en el cronograma, hitos y/o costes del proyecto, que deberá ser analizado y gestionado a través de los mecanismos de gobierno establecidos. Las Partes deberán acordar al inicio de cada Fase las fechas en que deberán cumplirse las dependencias del Cliente.
- **Aceptación de las pruebas**: La aceptación de las pruebas no requerirá que todas las funcionalidades estén completadas al 100%. Se permitirá un número limitado de defectos (incidencias de criticidad media y baja) y transacciones que no cumplan totalmente los objetivos. Un error solo se considerará como tal si contradice la última especificación aprobada y es reproducible por Accenture en el entorno de pruebas.
- **Puesta en Producción del software**: La puesta en producción del software se considera como aceptado
- Durante la fase de implementación del proyecto, **no se aplicarán niveles de servicio (SLA) ni penalizaciones**, ya que el objetivo principal es garantizar la correcta entrega y despliegue de la solución. Los niveles de servicio y cualquier penalización se definirán y acordarán por ambas partes **al inicio de la fase de mantenimiento extendido**, una vez finalizada la implementación y el Proyecto esté operativo y en condiciones de soporte, considerando el alcance y la calibración necesarios para esta etapa.
- **Casos de uso de agentforce:** Los casos de uso se seleccionarán conjuntamente entre las partes durante el proyecto y deberán cumplir las siguientes características:
    - Estar limitados en alcance y complejidad, orientados a automatizaciones de apoyo a la operativa de los agentes.
    - Basarse principalmente en capacidades estándar de Salesforce, Agentforce y Data Cloud, evitando desarrollos complejos o integraciones adicionales no contempladas en el alcance del proyecto.
    - Utilizar información disponible en los sistemas actuales de LDA, sin requerir transformaciones estructurales de datos o desarrollos de integración adicionales.

  Cualquier caso de uso que requiera desarrollos adicionales significativos, nuevas integraciones, ampliaciones de alcance o capacidades no contempladas en la presente propuesta deberá ser evaluado y gestionado mediante el proceso de gestión de cambios del proyecto.
- **Horario**: El horario estándar del servicio será el establecido por Accenture: De 08:00 a 18:00 horas de lunes a jueves, De 08:00 a 14:30 horas los viernes y De 08:00 a 15:00 horas desde el 1 de julio al 15 de septiembre.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES:

- Las **integraciones síncronas** se estiman hasta la respuesta del CORE; las asíncronas desde la lectura del mensaje en cola/tópico.
- Las **modificaciones son evolutivos** sobre APIs existentes, no rediseños completos.
- **Arquitectura híbrida**: REST/CTG (síncrono) y Kafka (asíncrono), con MuleSoft como orquestador y API Connect como gateway de seguridad.
- Las **cargas iniciales** se realizarán vía batch/ETL; se considera alto volumen >5M registros por entidad y se ejecutarán en ventanas controladas. La migración de datos al CRM se realizará mediante procesos batch/ETL sobre las entidades identificadas, considerando los volúmenes facilitados (clientes, pólizas, leads y oportunidades). No se incluyen transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos, asumiéndose que la información proveniente de los sistemas origen está previamente validada y preparada para su carga.
- Las **estimaciones de carga de datos** se han realizado considerando las volumetrías indicadas por LDA. Variaciones significativas en volumen de datos, número de entidades o número de interacciones podrán requerir revisión de arquitectura y reestimación de esfuerzo según la siguiente tabla:

Entidad	Volumen
Clientes	**3.6M**
Pólizas	**6M**
Leads	**1.7M**
Oportunidades	**7M**

- La **captura CDC no está incluida**; se asume publicación previa de eventos en cola/tópico.
- **Seguridad** gestionada mediante API Connect y cifrado TLS extremo a extremo.
- Se contemplan tres entornos: INT / PRE / PROD, que deberán estar disponibles y operativos antes del inicio del desarrollo.
- La **configuración de redes, accesos, firewall y certificados** será responsabilidad del cliente.
- **API Manager, MuleSoft, Kafka y la herramienta de ETL** deberán estar previamente aprovisionados, instalados y configurados, incluyendo conectores y accesos necesarios.
- No se incluye la implantación base ni la **configuración inicial de estas plataformas**.
- Se asume **disponibilidad de accesos técnicos, certificados, usuarios de servicio y definición previa de colas/tópicos**.
- La **planificación, estimación y secuenciación por fases** se han realizado tomando como base el volumen de integraciones actualmente identificado, compuesto por 67 nuevas integraciones online/asincronas, 9 procesos batch y 33 modificaciones asociadas.
- A efectos de estimación se ha considerado una distribución de **complejidad de integraciones** del 35% baja, 45% media y 20% alta, basada en patrones habituales de integración en proyectos CRM con middleware y sistemas core.
- A efectos de **estimación, los procesos batch** se han distribuido en 20% de baja complejidad, 50% de complejidad media y 30% de complejidad alta, considerando el volumen de datos y la lógica de transformación habitual en procesos ETL y cargas masivas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES (Continuación):

- Para calcular la **complejidad de los procesos** se ha tenido en cuenta la siguiente tabla:

Complejidad	Número de Campos	Número de Sistemas a Orquestar	Transaccionalidad	Seguridad	Tipos de Sistemas de Backend
Simple	6-15	1-2	Baja	Media	JDBC, REST (autenticación básica), SOAP (simple)
Media	16-30	3-4	Media	Alta	JDBC, REST (OAuth2/JWT), SOAP, Kfka
Alta	31-50	5-6	Alta	Muy alta	JDBC, REST, SOAP, Kafka, FTP/SFTP

- La compañía proporcionará **estándares de logging, convenciones de naming y plantillas corporativas** de dashboards.
- Las **pruebas funcionales y UAT** serán responsabilidad compartida con Línea Directa.
- No se incluyen **pruebas de carga** sobre sistemas legacy salvo especificación expresa en alcance.
- El **proceso de reconciliación** se limita a un máximo de dos entidades críticas previamente acordadas y no incluye transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos (duplicados, inconsistencias o errores de formato), así como tampoco la corrección de calidad de datos en origen. Cualquier entidad adicional requerirá estimación y planificación independiente.
- **La gestión documental** permanecerá en el repositorio corporativo existente (Content Manager). El CRM se integrará mediante APIs para consultar y referenciar la documentación asociada a clientes y pólizas, limitándose a la gestión de metadatos y enlaces, sin contemplar la migración ni el almacenamiento de documentos dentro del CRM.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

Gestión del Cambio:

- Walkme y Mensajes en la herramienta son activos no cotizados en la presente oferta,. No obstante, recomendamos considerar su utilización para potenciar los niveles de adopción. En caso de no incluirse, las actividades se gestionarán mediante otras herramientas.
- Asumimos la autorización de Línea Directa para la utilización de las herramientas de GenAI y consecuente generación de eficiencias.
- Línea Directa proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.
- Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, ...) quedando su elaboración fuera de alcance.
- La selección de los embajadores es responsabilidad de LDA.
- Quedan fuera de alcance las comunicaciones a externos. Las comunicaciones a internos se realizarán en coordinación con Comunicación y, únicamente, si se habilitan los permisos correspondientes en los canales existentes (canal de email, Iseazy (exclusiva para internos), Teams).
- Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc.)
- Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.
- Para el caso del agente de acompañamiento, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.
- El modelo operativo será definido por LDA.

GARANTIA:

- Accenture garantiza durante un **período de seis (6) meses** desde la fecha de puesta en producción que los desarrollos realizados en el marco del presente proyecto funcionarán sustancialmente de acuerdo con las especificaciones funcionales y técnicas expresamente aprobadas por las Partes tras la superación de las pruebas de aceptación de usuario (UAT).
- Durante dicho período, Accenture se compromete a corregir, sin coste adicional, aquellos **defectos tipificados como Prioridad Crítica o Alta** que:
  - Sean reproducibles en entorno productivo,
  - Supongan una desviación respecto a las especificaciones aprobadas en UAT, y
  - Sean directamente imputables a defectos en el desarrollo realizado por Accenture.
- La aceptación de los desarrollos tras la superación de las UAT implicará la conformidad de LDA con el funcionamiento de la solución respecto de los requisitos validados, no pudiendo considerarse como defectos en garantía aquellas incidencias que hubieran sido detectables razonablemente durante dicha fase y no hubieran sido reportadas antes de la puesta en producción.
- Quedan expresamente excluidos:
  - Incidencias derivadas de cambios realizados por LDA o por terceros sobre el código o configuración entregada.
  - Incidencias derivadas de sistemas externos, integraciones o plataformas de terceros.
  - Cambios normativos o regulatorios posteriores a la puesta en producción.
  - Evolutivos, mejoras funcionales o cambios de alcance no contemplados en las especificaciones aprobadas.
  - Incidencias derivadas de uso inadecuado o distinto al definido en la documentación funcional.
  - Incidencias clasificadas como Media o Baja en base al criterio de tipificación anteriormente expuesto.
  - Necesidad de rediseño sustancial o reconstrucción de funcionalidades aceptadas en UAT.
- La validez de la garantía queda condicionada a que las modificaciones del software se realicen exclusivamente por Accenture. Cualquier modificación efectuada por LDA o por terceros supondrá la no aplicación de la garantía.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

MANTENIMIENTO:

- **Accesos y prerrequisitos:** Con carácter previo al inicio de la línea de Mantenimiento, LDA facilitará a Accenture todos los accesos, credenciales, licencias, entornos, documentación técnica y funcional, así como cualquier otra información necesaria para la correcta prestación del servicio. Cualquier retraso en la provisión de dichos elementos podrá implicar la replanificación de los servicios y el correspondiente ajuste en los plazos y precio comprometidos, sin que ello genere responsabilidad alguna para Accenture.
- **Dependencias y demoras imputables a LDA durante el mantenimiento**: Accenture no asumirá responsabilidad por retrasos, ineficiencias o incumplimientos derivados de:
  - Actuaciones u omisiones de LDA.
  - Retrasos de terceros proveedores de LDA.
  - Falta de disponibilidad de información, accesos o validaciones necesarias.
  - Incidencias en infraestructuras o sistemas fuera del alcance del servicio.

  Esto podría afectar al calendario de entregas
- **Licencias y herramientas del mantenimiento**:
  - LDA proporcionará, sin coste para Accenture, las licencias, accesos y herramientas necesarias para la prestación del servicio descrito en este documento. En ningún caso LDA repercutirá a Accenture costes asociados a herramientas, infraestructura o medios necesarios para la correcta ejecución del servicio. Los aceleradores, metodologías, frameworks y herramientas propias utilizadas por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad, no implicando su uso la cesión de derechos de propiedad intelectual ni la concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.
  - Los aceleradores, metodologías, frameworks, herramientas, componentes reutilizables y know-how propios utilizados por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad. Su utilización en el marco del proyecto no implica cesión de derechos de propiedad intelectual ni concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

MANTENIMIENTO (Continuación):

- **Organización del equipo:**
  - Accenture mantendrá plena autonomía organizativa en la asignación, dirección, coordinación y gestión de los recursos destinados a la prestación del servicio, sin perjuicio del cumplimiento de los niveles de servicio y compromisos contractualmente asumidos.
  - Accenture será responsable de la prestación de los servicios de soporte de Nivel 2 y Nivel 3, incluyendo la resolución técnica especializada y la coordinación con el proveedor de la tecnología para la gestión de incidencias complejas.
  - El servicio se prestará en modalidad remota desde cualquiera de las localizaciones de Accenture en España, utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos.
- **Tipificación de incidencias:** La clasificación y priorización de las incidencias reportadas será realizada por Accenture conforme a los criterios objetivos de tipificación previamente acordados entre las Partes y recogidos en el presente documento. LDA podrá proponer una prioridad inicial al registrar la incidencia; no obstante, la asignación definitiva de la tipología corresponderá a Accenture tras el análisis técnico correspondiente y de acuerdo con los criterios establecidos. En caso de discrepancia sobre la clasificación asignada, las Partes analizarán conjuntamente el impacto objetivo de la incidencia conforme a los criterios definidos, manteniéndose la clasificación asignada por Accenture hasta la resolución de dicha revisión.
- **Exclusiones del alcance**: Queda expresamente excluido del alcance del servicio de Mantenimiento y soporte:
  - La configuración, instalación, operación o mantenimiento de la infraestructura tecnológica del LDA.
  - La configuración o mantenimiento de sistemas no expresamente incluidos en la presente propuesta.
  - La resolución de incidencias imputables a productos o soluciones de terceros, cuya gestión corresponderá al LDA frente a sus respectivos proveedores.
  - Cualquier responsabilidad derivada del funcionamiento, actualización o soporte de productos de terceros.
- **Modelo de trabajo**: La prestación del servicio de Mantenimiento se realizará en modalidad remota, desde las instalaciones de Accenture utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos en el marco del presente proyecto.
- **Validación de entregables del Mantenimiento**: La documentación o entregables que requieran validación por parte de LDA deberán ser revisados en un plazo máximo de tres (3) días laborables desde su entrega. En ausencia de respuesta expresa dentro del plazo indicado, se considerarán tácitamente aprobados a todos los efectos. Cualquier retraso en la validación podrá implicar ajustes en la planificación sin responsabilidad para Accenture.
- **Cambios de alcance**:
  - Cualquier actividad fuera del alcance del proyecto que requiera capacidades adicionales a las ofertadas será considerada un cambio de alcance y deberá gestionarse conforme al procedimiento formal de gestión de cambios.
  - Asimismo, cualquier modificación significativa en herramientas, medios materiales, entornos o condiciones necesarias para la prestación del servicio será objeto del correspondiente análisis de impacto y ajuste contractual, en su caso.
- **Horario**: El horario estándar del servicio de Mantenimiento será el establecido por Accenture:
  - De 08:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves.
  - De 08:00 a 14:30 horas, los viernes.
  - De 08:00 a 15:00 horas desde el 1 de julio al 15 de septiembre.

  Cualquier necesidad de cobertura fuera del horario indicado deberá tratarse como servicio de guardia, conforme a las condiciones que se acuerden entre las Partes.

  Para la prestación de servicios en modalidad de guardia 24x7, LDA facilitará a Accenture el dispositivo móvil o medio de contacto necesario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

Se consideran en alcance de implantación por componente de la arquitectura tecnológica propuesta:

Componente	Incluido en propuesta Accenture	Excluido / Responsabilidad LDA
Salesforce FSC	Configuración, personalización (Apex, LWC, Flows), modelo de datos, perfiles, Permission Sets, automatizaciones, reporting, despliegue hasta UAT.	Licencias SF. Actualizaciones de versión (releases SF). Despliegue de UAT a PRO (Release Manager LDA).
Experience Cloud	Configuración del portal externo, diseño de páginas, permisos de acceso, Sharing Rules, componentes para colaboradores.	Licencias de portal. Gestión de usuarios externos (altas/bajas). Branding corporativo (logos, guía de estilo).
Data Cloud	Configuración de Data Streams, Data Model Objects, Identity Resolution para los 2 casos de uso de IA (Agentforce).	Licencias/créditos de Data Cloud. Calidad de datos(de duplicación y limpieza) en origen. Ampliación a casos de uso adicionales.
Agentforce	Diseño e implementación de hasta 2 casos de uso piloto basados en capacidades estándar. Configuración de prompts y acciones.	Licencias Agentforce. Casos de uso adicionales o con integraciones no contempladas (vía CR). Modelos propios de IA.
MuleSoft	Desarrollo de APIs (System, Process, Experience), transformaciones DataWeave, gestión de errores, DLQ, conectores, pruebas unitarias e integradas.	Provisión, instalación y configuración base de la plataforma Anypoint. Licencias MuleSoft. Infraestructura (servidores, redes).
API Connect	Definición de políticas de seguridad por API (OAuth2, rate limiting, mTLS). Registro de APIs en el catálogo.	Provisión e instalación del gateway. Configuración base de la plataforma. Gestión de certificados corporativos. Licencias.
Kafka	Definición de tópicos, schemas (Avro), consumer groups. Configuración de DLQ y políticas de retención por integración.	Provisión, instalación y operación del cluster Kafka. Infraestructura. Configuración de redes, firewall, mTLS entre brokers.
ETL Corporativo	Definición de mapeos y reglas de transformación para cargas batch. Validaciones post-carga y reconciliación (máx. 2 entidades).	Provisión y operación de la herramienta ETL. Extracción de datos desde DB2/Core. Ventanas de ejecución. Infraestructura.
Genesys (CTI/Chat)	Configuración del conector estándar Salesforce-Genesys (CTI, click-to-call, screen pop). Integración del chat en SF.	Licencias Genesys Cloud. Configuración de colas, IVR, routing. Adaptaciones en la plataforma Genesys.
LDAP / SSO	Configuración SSO (SAML) en SF contra Azure AD. Mapeo de roles corporativos a perfiles SF.	Configuración Azure AD (grupos, claims). Ciclo de vida de usuarios. Provisioning/deprovisioning.
Datalake / Lakehouse	Integración batch de extracción de datos SF hacia Datalake (Bulk API / MuleSoft).	Infraestructura Lakehouse. Modelo analítico destino. Ingesta y procesamiento post-extracción.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.
