LINEA DIRECTA

2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484

PROPUESTA TÉCNICA – SOLUCION DYNAMICS (2ª entrega)

13 ABRIL 2026



LEGAL DISCLAIMER

Esta Propuesta es confidencial y propiedad de Accenture, S.L. (“Accenture”). Los materiales, ideas y conceptos contenidos en la Propuesta deben ser usados exclusivamente para valorar las capacidades de Accenture en prestar a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. (el “Cliente”) los servicios solicitados por la misma y su contenido no puede ser revelado o comunicado a nadie que no sea un empleado del Cliente directamente implicado en la valoración de la Propuesta y que se haya comprometido a mantener confidenciales los contenidos de la misma y a no divulgarlos a terceros u otros proveedores así como a no reproducirlos sin el consentimiento expreso de Accenture.

Accenture asume que la información, datos etc.. que, en su caso, sean facilitados por el Cliente y que hayan servido como base para la elaboración de los Productos, son ciertos y veraces, no entrando a contrastarlos con ninguna otra fuente ni asumiendo responsabilidad alguna sobre los mismos. El Cliente asume la responsabilidad del empleo, o no, de los Productos y de que éstos se adecuen a los requisitos por éste establecidos. Los Productos se entregan para el uso interno por parte del Cliente, cualquier otro uso o exhibición de los mismos deberá ser previamente autorizado por escrito por Accenture. Las decisiones que el Cliente adopte con base en los Productos se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad del Cliente.

Se entiende que todas las aportaciones sugeridas por Accenture en relación con este proyecto son sólo recomendaciones / apoyo desde una perspectiva comercial y/o técnica y no constituyen en modo alguno asesoramientos legales o fiscales. Así se confirma que Accenture no es un bufete de abogados ni un asesor fiscal y no puede emitir opiniones legales ni garantizar el cumplimiento de ninguna normativa. En tal medida, el Cliente es el único responsable del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de su negocio.

Todos los productos, metodologías, assets, inteligencia artificial y/o herramientas preexistentes titularidad de Accenture, utilizadas durante la ejecución de los trabajos objeto de contratación, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Accenture y en ningún caso serán transferidos al Cliente en virtud de la presente Propuesta. El Cliente no tendrá u obtendrá ningún derecho sobre tales Activos Propios (o sobre cualquier modificación o mejora) que no sean de conformidad con la licencia estándar de Accenture para dichos Activos Propios o, en el caso de Activos propiedad de terceros, de conformidad con términos aceptables para el tercero aplicable. Si los Activos Propios fueran puestos a disposición del Cliente, estarán disponibles "AS IS" y sin garantías expresas o implícitas de ningún tipo, y estarán sujetos únicamente a los términos aplicables del contrato de licencia o los términos y condiciones aplicables.

En la medida en que una Parte identifique productos de open source, el receptor podrá utilizarlos únicamente de conformidad con los términos de la licencia aplicables a dichos productos. La puesta a disposición de dichos productos se efectuará "as is" y sin garantía de ningún tipo.

Se hace constar que, si las personas indicadas en la presente Propuesta no pudieran formar parte del equipo por causas ajenas a Accenture (esto es, de modo enunciativo y no limitativo: baja por enfermedad, baja como trabajador de Accenture, etcétera), serán sustituidos por personas de similar categoría profesional.

En la presente Propuesta Accenture utiliza palabras y frases en la forma indicada: "maximizar", "optimizar" y "óptima" significan mejorar con un grado comercialmente razonable; "minimizar" significa reducir con un grado comercialmente razonable; "Mejore/s" se entiende por alto nivel; "Socio" y "asociaciones" no significa una asociación legal, sino más bien una relación de colaboración; "correcto" allí donde se usa como adjetivo correspondiente a un nivel adecuado; y "garantizar" y "permitir" se refieren a la realización de s comerciales razonables para implementar.

Esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

Accenture no acepta condiciones y/o cláusulas respecto de las cuales no ha manifestado expresamente su conformidad. La presente propuesta prevalecerá respecto de lo previsto en la RFP. Las partes convienen que en caso de aceptación de la Propuesta emitida por Accenture las Partes negociarán un contrato específico sobre la base del modelo que se adjunta por Accenture con el envío de la propuesta cuyos cambios se han basado en precedentes negociados entre las Partes. El establecimiento por el Cliente en su Pedido de cualesquiera términos y condiciones diferentes a los de la presente Propuesta, se tendrán por no puestos.

El alcance de los servicios de Accenture excluye expresamente los servicios de seguridad, incluidos, entre otros, la gestión de los servicios de seguridad, los servicios de ciberdefensa (como las pruebas de penetración, los servicios de evaluación de vulnerabilidades, la búsqueda de amenazas y los servicios de respuesta a incidentes, o cualquier evaluación de monitorización, escaneo y evaluación. o soluciones para vulnerabilidades de seguridad en los entornos del Cliente. El Cliente proporcionará todo el software necesario para que Accenture pueda prestar los servicios, y será responsable de obtener, sin costo alguno para Accenture, los consentimientos y autorizaciones necesarias para el uso de Accenture de cualquier producto de terceros, incluyendo, pero no limitado a, software, necesario para prestar los servicios

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, esta propuesta ha sido preparada con base en el entendimiento de que el alcance del trabajo no requerirá que Accenture: (i) acceda o reciba cualquier producto, tecnología o servicio que requiera autorización gubernamental para usar, exportar o transferir de otra manera; o (ii) participar en actividades comerciales que involucren a las regiones de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia o Siria, o que de otro modo estarían prohibidas bajo cualquier control de exportación aplicable o leyes de sanciones económicas.

Esta propuesta hace referencia a marcas que pueden ser titularidad de terceros. El uso de esas marcas no es una afirmación de propiedad de las dichas marcas por Accenture y no pretende representar o implicar la existencia de una asociación entre Accenture y los legítimos propietarios de esas marcas.

La validez de la Propuesta es de 90 días a partir de su fecha de presentación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Gracias por la invitación dirigida por LDA a Accenture para la presentación de una propuesta bajo el alcance "**Implementación CRM**".

Creemos firmemente que nuestra propuesta cumple con las expectativas depositadas por LDA, aunque estamos a su completa disposición para discutir cualquier cambio que consideren apropiado, así como aclarar cualquier duda que pueda surgir tras la revisión de este documento.

Estamos plenamente comprometidos con la oportunidad de trabajar junto a LDA en este programa transformador, que creemos es un paso clave para evolucionar el modelo de relación con clientes adoptándolo a los nuevos retos que demandan los asegurados y alineándolos con la ambición del negocio.

Queremos mostrar que somos el socio adecuado para que LDA obtenga el máximo beneficio de esta iniciativa estratégica y creemos que estamos preparados para cumplir con sus expectativas:

- Creemos firmemente que somos el socio ideal para apoyar a LDA en esta iniciativa por nuestra **amplia experiencia en proyectos similares**, y porque somos el **Partner líder en implementaciones de soluciones Dynamics 365**.
- Nos comprometemos a **involucrar a profesionales específicamente cualificados para este proyecto** e **incorporar nuestro conocimiento y experiencia** en proyectos similares.
- Promovemos una **forma de trabajo colaborativa y transparente** entre LDA y Accenture.



Maria Garcia
Managing Director
Responsable de Song de Experiencia cliente



Laura Ferre
Managing Director
Responsable de la cuenta de LDA en España

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Tabla de contenidos

1 Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

2 Propuesta técnica

3 Cobertura de requisitos

4 Plan de Transformación

5 Gestión del cambio y Adopción

6 Plan de trabajo

7 Consideraciones

8 Anexos

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

1. Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

DIAGNÓSTICO Y ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO ACTUAL

Contexto de negocio

Hoy en día, el sector asegurador se enfrenta a un **contexto de cliente cada vez más exigente**, más digital y menos tolerante a fricciones. Los clientes esperan **interacciones coherentes** independientemente del canal, respuestas **personalizadas**, y una **relación coherente** con la compañía a lo largo de todo su ciclo de vida.

En este escenario, la capacidad de gestionar de forma unificada la relación con el cliente se convierte en un factor diferencial para competir, crecer y retener: **el CRM es una palanca estratégica** para la relación con clientes.


Hasta ahora, Línea Directa se apoya en un core asegurador robusto que concentra la lógica transaccional crítica del negocio y garantiza la estabilidad operativa. Este core ha permitido sostener el crecimiento y la eficiencia durante años, pero el modelo actual presenta **limitaciones a la hora de evolucionar la experiencia de cliente**, **ganar agilidad** comercial y ofrecer una **visión 360** de la relación.

Qué busca Línea Directa

En este marco, Línea Directa impulsa este proyecto con una ambición clara: evolucionar hacia un modelo en el que la **relación con el cliente esté centralizada**, gobernada y preparada para crecer apalancándose en un **CRM de mercado**. El objetivo no es únicamente implantar una nueva herramienta, sino **sentar las bases de una plataforma estratégica** que permita mejorar la experiencia del cliente y habilitar nuevos modelos comerciales de forma progresiva. Una plataforma que permita:

- ✓ Una **implantación progresiva**, segura y alineada a negocio
- ✓ La incorporación de capacidades avanzadas como la **automatización** o la **inteligencia artificial**
- ✓ **Adaptarse a la evolución del negocio** sin generar rigideces y minimizando dependencias

Cuáles son los retos



- ✓ Transformación controlada
- ✓ Escalar la solución manteniendo calidad y trazabilidad del dato
- ✓ Disponibilización de los datos en real time
- ✓ Gobierno de integraciones y evolución futura del ecosistema
- ✓ Continuidad del negocio durante la implantación
- ✓ Adopción real por parte de los usuarios

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE

Se propone abordar este proyecto con diferentes líneas de trabajo que trabajen de forma conjunta y coordinada


Creamos la unión de distintos componentes para alcanzar una transformación significativa

- **Línea de trabajo Negocio (Discovery+ Definición +UX)**: Equipo de consultoría de CRM de seguros, para detallar y traducir los requisitos del RFQ a historias de usuario con sus criterios de aceptación y en pantallas de UX que nos permitan ar la experiencia de usuario antes de implementarlo, aprovechando al máximo las capacidades de caja de las soluciones.

- **Línea de trabajo de Implementación CRM (Dynamics + arquitectura):** Equipo de implementación de CRM que traduzca las historias de usuario a funcionalidades dentro de la solución nueva solución de CRM, y que tenga capacidad de integración con los sistemas del core asegurador de LDA.

- **Línea de trabajo de Gestión de cambio (GdC):** Equipo que prepare y plantee un plan de la gestión del cambio de Galgo al nuevo CRM de LDA, de acuerdo, al calendario de releases y despliegue secuencial de la herramienta.

- **Línea de trabajo de soporte post implantación (AM):** Equipo que garantice el soporte de la implantación (mantenimiento incidencias y pequeños evolutivos)

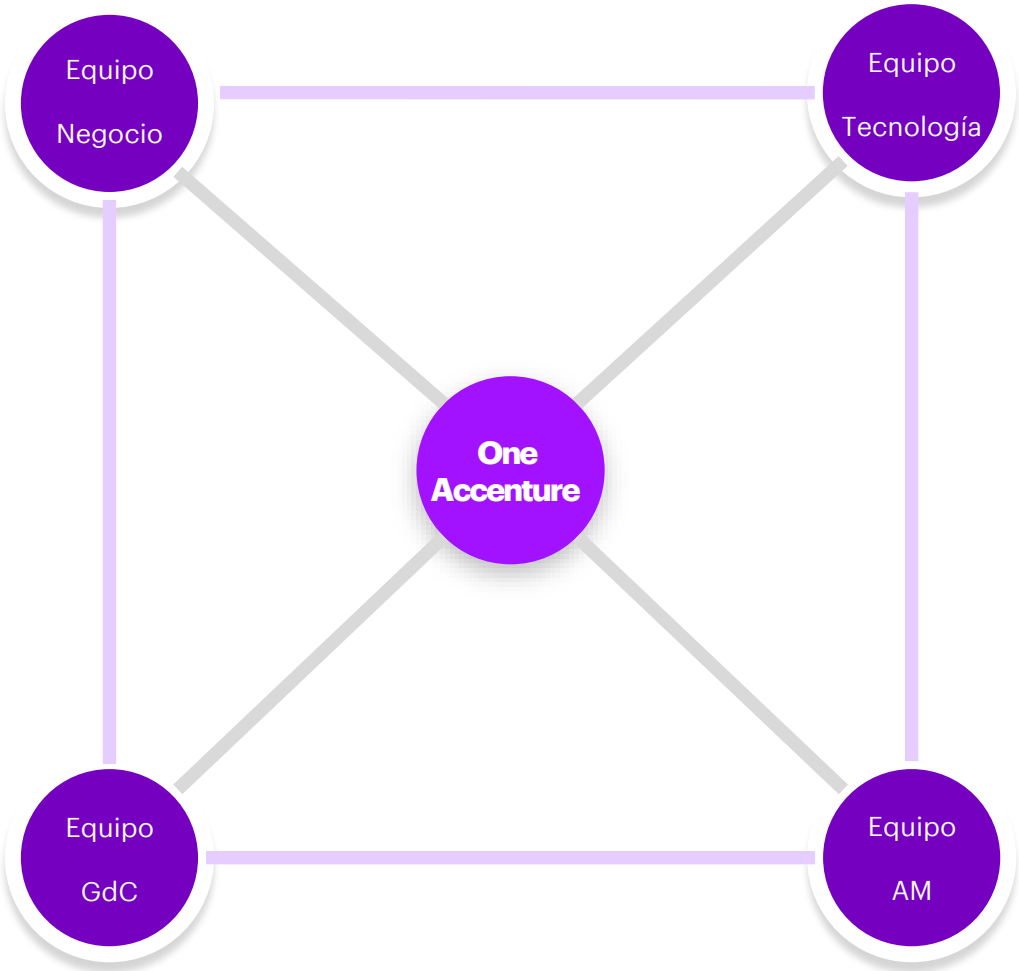

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

2. Propuesta técnica

ENFOQUE

El objetivo de este documento es **presentar nuestro entendimiento de colaboración de Accenture para proporcionar los servicios solicitados por LDA en el ámbito de su CRM sobre Dynamics**. Actualmente LDA dispone de la herramienta GALGO como portal o herramienta de gestión de sus clientes. El portal Galgo, de desarrollo interno en LDA cubre gran parte de las operativas o procesos de la compañía como: Cotizaciones, suplementos, retención, cancelaciones, etc.

Despliegue de la nueva solución CRM para Línea Directa Aseguradora basada en la Plataforma Dynamics 365

Basada en las siguientes directrices:



Keep It Simple

*Basado en **prácticas** modernas de desarrollo y **recomendaciones de Microsoft**, completado con las directrices de **nuestro propio marco de trabajo y metodología**, siempre se intentará afrontar los objetivos y funcionalidades, con funcionalidad estándar primero, o con configuración/personalización codeless / lowcode. Dejando solo para casos muy especificaos y complejos desarrollo a medida con Pro-code.*



Implementación rápida y resiliente

Tal y como expresa LDA en su RFP, el proyecto de implantación se ejecutará de manera faseada buscando una rápida implantación inicial y despliegues sucesivos que irán completando la funcionalidad del nuevo sistema.

Todo esto teniendo en cuenta la convivencia con el actual sistema (Galgo) con el cual se mantendrá una sincronización permanente.



Escalabilidad futura

Pensando en los siguientes pasos, levantando oportunidades de mejora basadas en las características y sinergias que propone la plataforma Dynamics 365 y subyacentes (Power Platform & Azure) que ofrecen un extenso y avanzado catálogo de mejoras y nuevas utilidades que pueden ser de gran interés para LDA.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ENFOQUE. QUE PROPONEMOS HACER

Usar las capacidades de Sales y Customer Service que ofrece Dynamics 365 y orientarlas, dentro de las posibilidades, a las necesidades de negocio de atención al cliente de LDA con el alcance descrito en la propuesta.

Dynamics 365 Customer Service

Herramienta para **gestionar la interacción con los clientes**. Para una empresa como LDA, podría usarse **para responder eficientemente a las consultas de los clientes** sobre como adherirse o revisar su estado de cuentas. También puede ayudar a gestionar y resolver problemas de los usuarios de manera eficiente. Además, esta herramienta puede proporcionar información valiosa sobre las preferencias de sus clientes, lo que puede ser útil para mejorar los servicios.

Dynamics 365 Sales


Puede servir a Línea Directa como la plataforma central de relación comercial con clientes y potenciales, habilitando una visión 360º del asegurado y de todas sus interacciones a lo largo del ciclo de vida. Permite orquestar de forma integrada los procesos de captación, venta, cross-sell y retención, apoyando a los equipos comerciales y de atención con información contextual en tiempo real, automatización de tareas y priorización inteligente de oportunidades. Dynamics 365 Sales contribuye a incrementar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la toma de decisiones, alineando la actividad comercial con los objetivos de crecimiento rentable y excelencia en servicio de la compañía.



Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

MAPA DE ARQUITECTURA

Se muestra alto nivel cada uno de los módulos implicados y la integración con los sistemas de Línea Directa

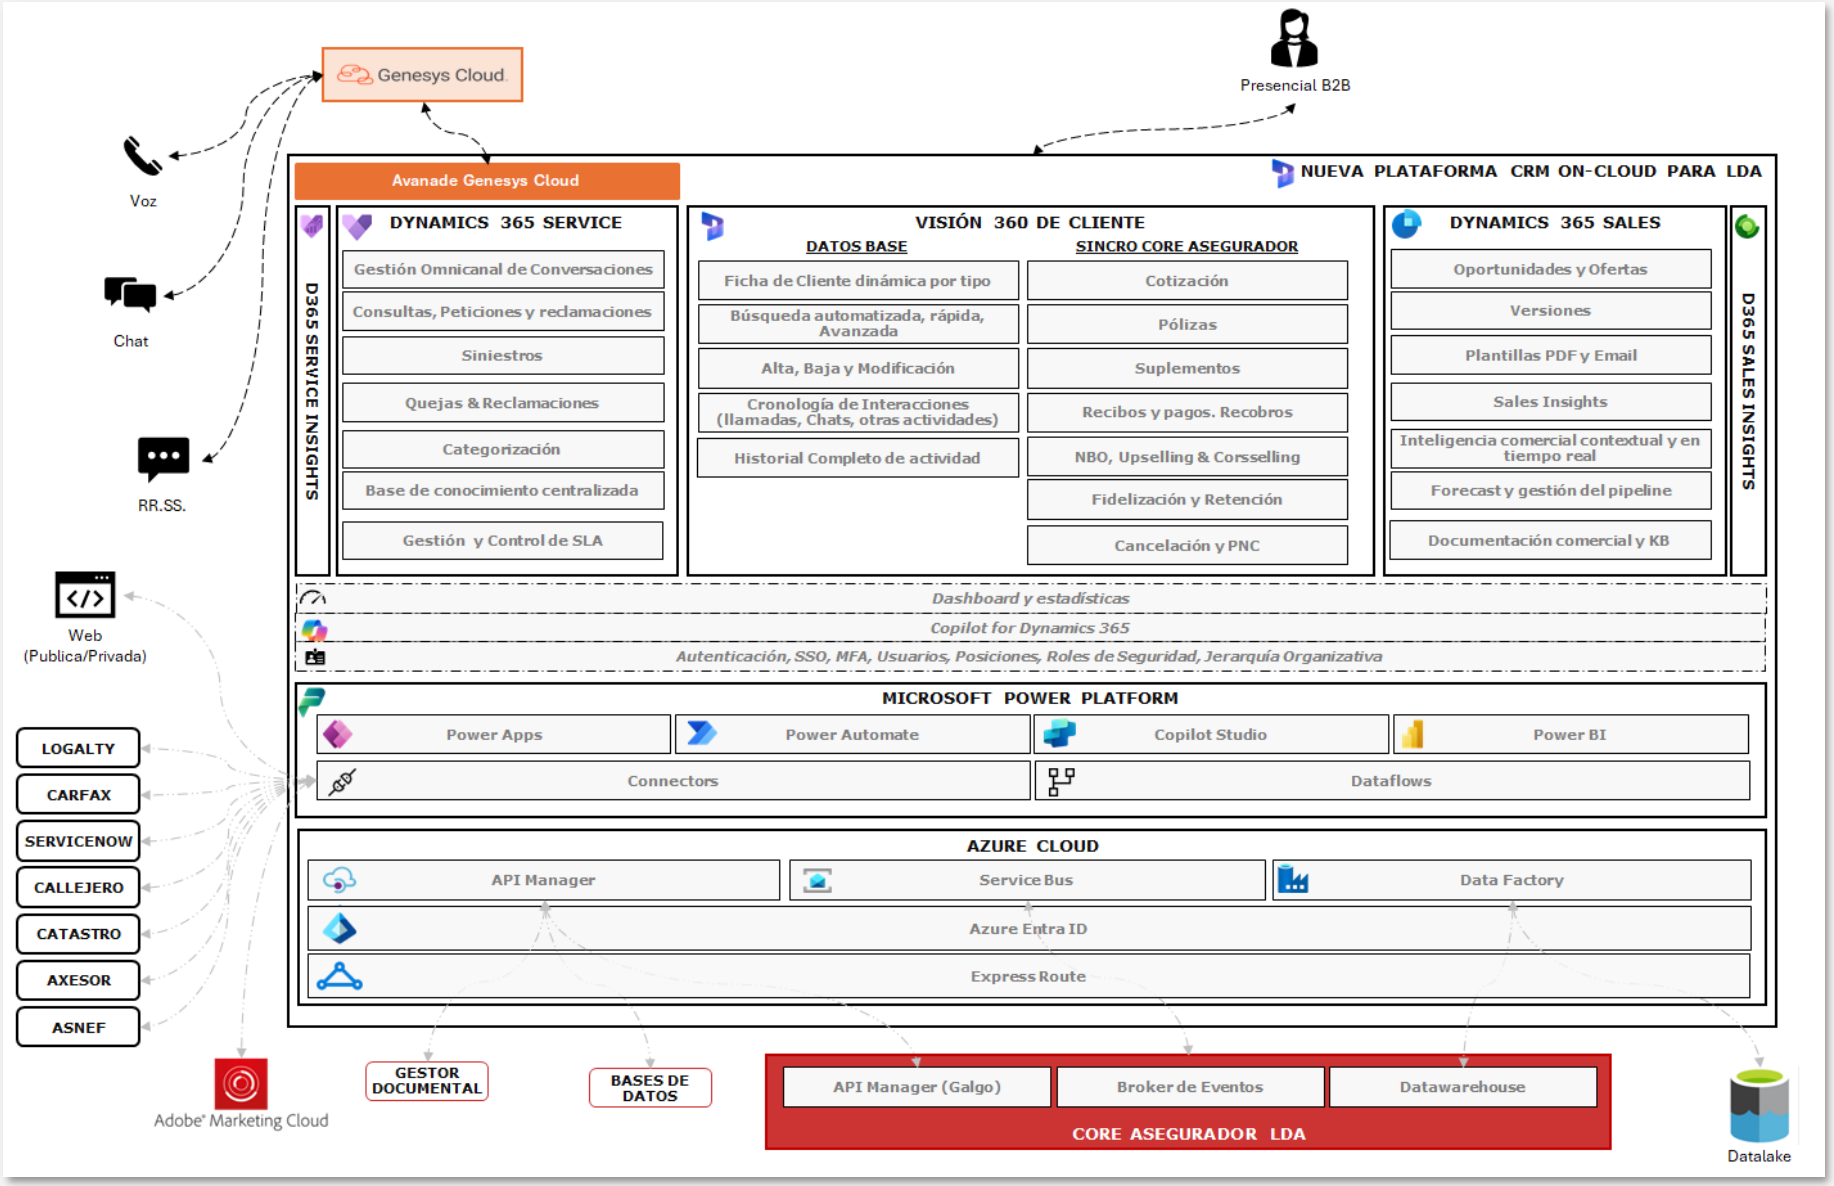

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Dynamics 365 Sales - ¿Qué funcionalidades ofrece el producto?

Automatización de la fuerza de ventas con IA de última generación



Dynamics 365 Sales permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, **tomar medidas basadas en información detallada** y cerrar acuerdos más rápidamente. ***Realiza un seguimiento*** de las cuentas y los contactos, fomenta las ventas desde el cliente potencial hasta la póliza y crea material de apoyo para las ventas.

Gestión de Clientes (Personas y Empresas)

- Gestión de la información relacionada con sus clientes y contactos, obteniendo una **visión de 360º** de los mismos.
- Anticiparse a las necesidades de los clientes.

Gestión de los Procesos de ventas

- Gestión del proceso de ventas **a lo largo de todo el ciclo de vida**.
- Supervisión y control de los estados de las oportunidades, las propuestas y las probabilidades de cierre.
- Ayuda a encontrar y cerrar los mejores negocios.

Inteligencia de ventas

- Proporciona **una imagen en tiempo real del negocio** y profundiza en las métricas clave.
- **Información para toda la empresa** con informes y paneles de control fáciles de personalizar.
- Comparta sus métricas.

Planificación y gestión

- Gestión del **rendimiento del equipo de ventas** estableciendo objetivos y proporcionando ***feedback y coaching en tiempo real***.
- **Seguimiento de las mejores prácticas** para incorporar nuevos agentes comerciales a tu equipo, estandarizando la captación de nuevos clientes.

Social selling

- Proporciona **información** sobre tus clientes potenciales **en las redes sociales** para identificar señales de venta y actuar en consecuencia.
- Creación de nuevos clientes potenciales a partir de publicaciones en redes sociales.

Sales Mobility

- **Gestiona tu negocio desde dispositivos móviles**...
- Gestiona las ventas desde cualquier lugar Escalando, asignando y lanzando aprobaciones.

Automation of your processes

- Aumenta la productividad **optimizando los procesos y automatizando las tareas** rutinarias.
- Integra con otros sistemas (Core empresarial).
- **Agentica**, utiliza agentes que interactúan con procesos, sistemas, otros agentes y otras personas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Dynamics 365 Sales
¿Qué aportará a Línea Directa Aseguradora?

Dynamics 365 Sales se presenta como una solución CRM de mercado ***alineada con los objetivos comerciales de Línea Directa*** *Aseguradora (LDA), proporcionando una visión 360º del cliente, una gestión estructurada del ciclo comercial y un* ***entorno de trabajo omnicanal*** *que mejora la eficiencia de los equipos comerciales. La plataforma combina capacidades nativas de gestión de leads y oportunidades, automatización de tareas y apoyo mediante inteligencia artificial, todo ello sobre una base flexible y escalable que permite evolucionar los procesos comerciales de forma ágil y progresiva, tal y como requiere la RFP del nuevo CRM.*

Las características de Dynamics incluida en esta y siguientes slides están basadas en la descripción y características del producto aportadas por el licenciante y la experiencia en proyectos anteriores, no suponiendo una garantía de resultado o compromiso por parte de Accenture

Gestión de Clientes, Oportunidades, propuestas, pólizas, productos y servicios, y Agenda comercial. Sincro con el core asegurador.

Cobertura de necesidades comerciales

Visión 360º del cliente: Se dispondrá de una ficha de cliente completa según taxonomía. Estará sincronizada con el core asegurador y se podrá ejecutar búsquedas por distintos campos asegurador como teléfono, email e identificación on-line), rápidas por campos básicos y avanzadas.

Gestión de leads y oportunidades: La solución cubre de forma nativa el ciclo comercial desde la captación del lead hasta el cierre, con pipelines y etapas configurables según el modelo de LDA.

Automatización e IA: Incorpora Copilot para Sales, que apoya a los equipos con resúmenes automáticos, sugerencias de acciones y priorización inteligente del trabajo comercial. Capacidad de ir a buscar estas ayudas al core bancario (NBO, Fidelización, CrossSelling, etc..)

Reporting y seguimiento de KPIs: Ofrece dashboards y capacidades de forecasting comercial, con posibilidad de explotación avanzada mediante Power BI.

Adaptabilidad del modelo comercial: Gracias a su base en Power Platform, permite ajustar procesos, formularios y flujos de trabajo sin depender de desarrollos complejos.

Documentación comercial y KB: El agente tendrá siempre disponible y sugerencias de los mensaje corporativos a transmitir (Argumentarios, argumentarios inteligentes, Benchmarking).

Valor añadido

Agentes virtuales comerciales ad-hoc (Agentic Sales): Se puede incorporar agentes de ventas basados en IA que actúan como asistentes virtuales del comercial, ayudando a preparar interacciones, resumir oportunidades y sugerir siguientes pasos en el proceso de venta. Permitiendo automatizar actividades de bajo valor y liberando tiempo del operador para la interacción directa con el cliente. El enfoque agentic es configurable y progresivo, permitiendo a LDA definir qué tareas comerciales se delegan a agentes virtuales según la madurez del modelo comercial.

Sales Insights para priorización y foco comercial: Proporciona scoring y priorización inteligente de leads y oportunidades, identificando aquellas con mayor probabilidad de conversión mediante modelos de IA. La solución genera alertas y recomendaciones proactivas (riesgo de pérdida, falta de actividad, oportunidades estancadas), permitiendo pasar de un modelo reactivo a uno predictivo, alineado con la necesidad de eficiencia y foco indicada en la RFP.

Inteligencia comercial contextual y en tiempo real: Resúmenes automáticos de oportunidades, combinando histórico de interacciones, estado del pipeline y contexto reciente para facilitar la preparación de llamadas y reuniones. La inteligencia se presenta en el flujo natural de trabajo del comercial, sin necesidad de navegar por múltiples pantallas o herramientas.

Forecast y gestión del pipeline: Capacidades de forecasting asistido por IA, que analizan el pipeline y el histórico para ofrecer previsiones más fiables.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


Dynamics 365 Service – ¿Qué funcionalidades trae el producto?

Permite tratar cualquier interacción con el cliente con la misma experiencia de usuario, con las mismas ayudas en línea, con la inteligencia artificial pilotando y aportando valor.

Tabs Permite a los agentes abrir otros componentes dentro de una sesión

Ejemplo: Abrir un caso relacionado con el caso que se está escuchando.

Notificaciones aparecen en formato de diálogo y permiten a los agentes realizar una acción. Ejemplo: Aceptar una llamada telefónica entrante o una solicitud de chat entrante. (notificaciones disponibles con el complemento de mensajería digital en SKU)

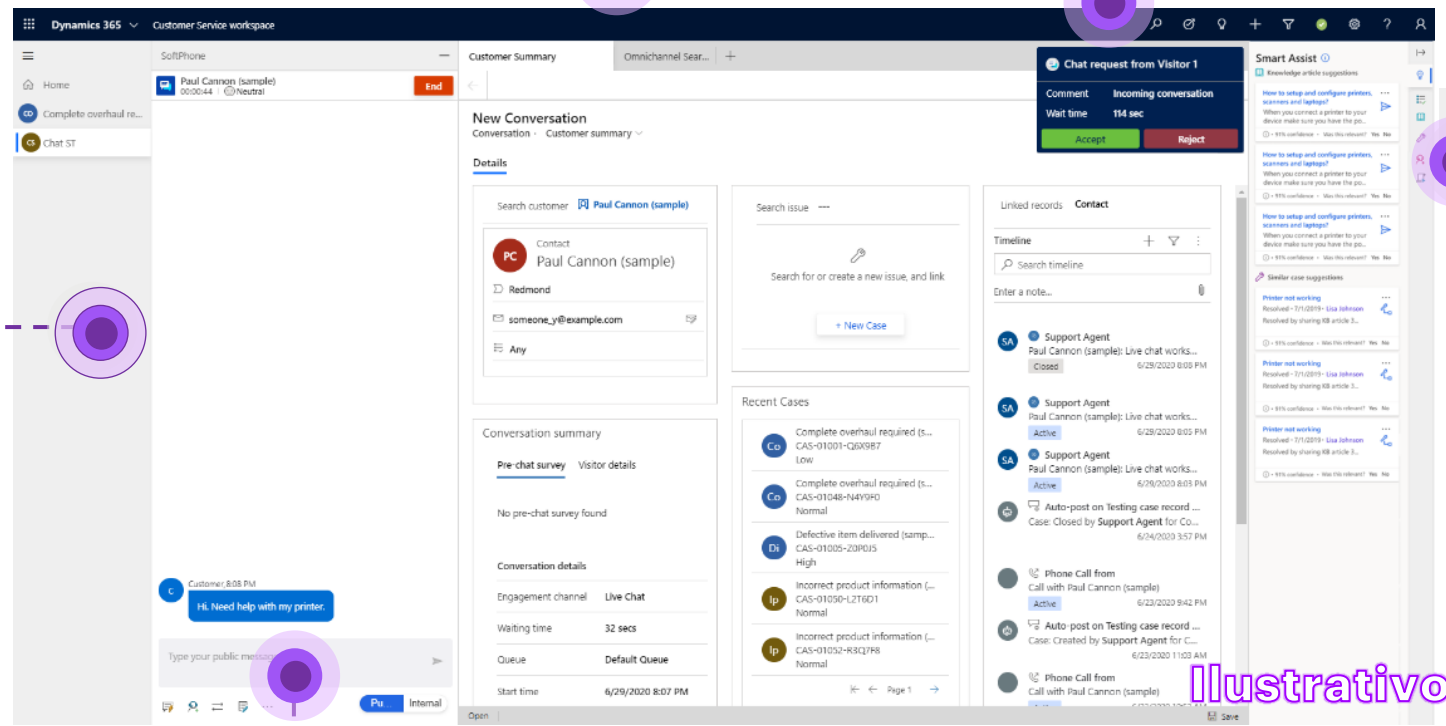

Session Panel Permite a los agentes trabajar en muchas solicitudes de usuarios simultáneamente sin perder el contexto del caso y los detalles del usuario.

Productivity Panel es un espacio de trabajo auxiliar bajo demanda; Fácil acceso cuando sea necesario. Contiene herramientas diseñadas para mejorar la productividad de los agentes y garantizar resultados de trabajo consistentes

Communication Panel alojará la comunicación con el usuario final (Chat, WhatsApp, etc.. También alberga softphones para la integración con sistemas de telefonía).

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Dynamics 365 Customer Service *¿Qué aportará a Línea Directa Aseguradora?*

Dynamics 365 Customer Service puede aportar a LDA ***una plataforma unificada*** *para la gestión de la atención al cliente, permitiendo centralizar todos los contactos e interacciones en una visión única del cliente. La solución proporciona capacidades estándar para la gestión eficiente de casos y* ***SLAs****, apoyando a los agentes con conocimiento contextual, automatización y analítica en tiempo real. Esto permite potencialmente a LDA mejorar la productividad operativa, promover el cumplimiento de los niveles de servicio y ofrecer una experiencia de atención más ágil, consistente y personalizada, reduciendo costes operativos y aumentando la satisfacción del cliente sin depender de desarrollos a medida.*

Las características de Dynamics incluida en esta y siguientes slides están basadas en la descripción y características del producto aportadas por el licenciante y la experiencia en proyectos anteriores, no suponiendo una garantía de resultado o compromiso por parte de Accenture

Consola omnicanal integrada con CCaaS, Visión 360 del cliente, Base de conocimiento, categorización y taxonomía, conexión con core asegurador, incrustación de Galgo .

Cobertura de necesidades de atención

Gestión integral y trazable: D365 Service permite registrar, gestionar y seguir de forma end-to-end todas las peticiones, reclamaciones e incidencias, promoviendo trazabilidad completa, histórico unificado y control del ciclo de vida del caso conforme a los procesos definidos por LDA.

Modelo de atención omnicanal: La plataforma integrada con Genesys da cobertura a la recepción y gestión de las interacciones desde múltiples canales manteniendo el contexto del cliente independientemente del canal de entrada.

Cumplimiento y monitorización de SLAs: Permite definir, medir y controlar SLAs, incorporando temporizadores, alertas y escalados automáticos que promueven el cumplimiento de los compromisos de servicio y facilitan la supervisión operativa.

Optimización de la productividad: El sistema proporciona colas de trabajo, enrutamiento automático, priorización de casos y herramientas de apoyo al agente que permiten una gestión más eficiente del volumen de trabajo.

Gestión estructurada del conocimiento: La solución incluye una base de conocimiento centralizada que permite a los agentes acceder a información validada y reutilizable, promoviendo respuestas homogéneas y alineadas con los criterios operativos y normativos definidos por LDA.

Capacidad de supervisión y control del servicio: Cuadros de mando y KPIs estándar que permiten a responsables y supervisores monitorizar en tiempo real la actividad del servicio, el cumplimiento de SLAs, la carga de trabajo y la calidad de la atención prestada.

Integración con el ecosistema tecnológico de LDA: D365 está diseñado para integrarse con sistemas corporativos existentes (CRM, backoffice, plataformas de atención o sistemas externos), facilitando una arquitectura coherente y alineada con los requisitos de integración planteados en el RFP.

Quejas y Reclamaciones: La solución contempla la gestión integral del ciclo de vida de la queja o reclamación —desde su alta multicanal hasta su resolución y cierre— apoyándose principalmente en funcionalidades nativas como la creación y gestión de casos, formularios, colas, roles, estados, auditoría, vistas y trazabilidad. Allí donde los requisitos requieren lógicas de negocio particulares (identificación de duplicidades, reaperturas, priorización, reglas de prevalencia, integraciones o automatismos), se propone su cobertura mediante customizaciones controladas, reglas de negocio y integraciones con sistemas corporativos como Galgo, plataformas de comunicación, gestor documental y pagos.

Valor añadido

- **Visión unificada del cliente y del expediente:** Eliminando la fragmentación de la información durante la atención.
- **Reducción de tiempos de gestión y resolución**: mediante automatización, Agentica y priorización y enrutamiento inteligente del trabajo.
- **Mayor cumplimiento de SLAs**: Gracias a control proactivo, alertas y escalados automáticos.
- **Homogeneización de la atención y mejora de la calidad**: Apoyada en conocimiento centralizado y reutilizable.
- **Mayor capacidad de supervisión y control del servicio**: Con métricas claras para la toma de decisiones.
- **Escalabilidad del modelo de atención**: Permitiendo evolucionar canales y capacidades sin rediseños estructurales.
- **Reducción del riesgo tecnológico**: Al apoyarse en una plataforma estándar, probada y alineada con el ecosistema Microsoft.
- IA aplicada en la operativa: que permite analizar de forma avanzada el comportamiento del servicio, identificar patrones recurrentes, detectar causas raíz de incidencias y anticipar riesgos de incumplimiento de SLAs. A través de analítica avanzada y capacidades de IA (tendencias, sentimiento, volúmenes y eficiencia).
- **Integración e incrustación de Galgo:** Y otros sistemas necesarios dentro de Dynamics 365, permitiendo a los agentes operar desde un único entorno de trabajo, manteniendo los procesos actuales y reduciendo el impacto en la operación y en la adopción del cambio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Power Platform - ¿Qué aportará a Línea Directa Aseguradora?

Dynamics Sales y Customer Service está basado en Power Platform, que contiene un conjunto de herramientas para personalizar, automatizar, analizar y dotar de IA a la nueva solución.



Power Apps

Entorno de desarrollo rápido con poco código para crear aplicaciones personalizadas para las necesidades empresariales. ***Se utilizará para la personalización del UX, reglas de negocio y mapa de navegación de la solución.*** Tiene servicios, conectores y una plataforma escalable de aplicaciones y servicios de datos (Microsoft Dataverse) que permiten una integración y una interacción simples con los datos existentes.



Power Automate

Motor de proceso para la creación de flujos de trabajo automatizados entre aplicaciones y servicios. Ayuda a automatizar procesos empresariales repetitivos, como la comunicación, las recopilaciones de datos y las aprobaciones de decisiones. ***Se utilizará como primera opción para la construcción y personalización de lógicas de negocio, automatizaciones, escalados, validaciones, alertas e integraciones directas con otros sistemas.***



Dataverse

Solución basada en la nube que estructura con facilidad una gran variedad de datos y lógica de negocios para admitir aplicaciones y procesos interconectados de una manera segura y compatible. Dataverse se ha diseñado para ser el repositorio central de los datos empresariales. ***Se utilizará para la personalización del modelo de negocio y relaciones, reglas de negocio globales, flujos de proceso de negocio y servicio de interoperabilidad de datos.***



Power BI

Servicio de análisis de datos empresariales de alto rendimiento y escalable a cualquier ámbito de la compañía (Desde un fichero Excel a un Data lake). Además, ofrece una gobernanza y seguridad integradas, lo que permite a las empresas centrarse en usar los datos más que en administrarlos.
Los informes estándar de las soluciones Sales & Service Insights están basados en esta tecnología.



Copilot Studio

Herramienta para la creación de bots eficaces con una interfaz gráfica guiada, sin código para la creación de soluciones de conversación. Totalmente integrado con Power Automate y su ecosistema de cientos de conectores, permitiendo a los chatbots ejecutar cualquier acción que Power Platform soporte. ***Esta es la tecnología que usa los agentes de autoayuda para agentes.***



Microsoft 365 admin center


Power Platform está dentro del servicio de computación Azure de Microsoft. Y delega toda las políticas de seguridad y acceso a Azure Active Directory. Que se gestiona a través de la consola de administración central de Microsoft 365. ***Se usará para la gestión de usuarios, asignación de licencias y perfilado básico de los mismos.***

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Azure I - Integración Services con puerta de enlace con Mainframe de LDA

Azure Integración Services proporciona la base tecnológica para promover una interoperabilidad robusta, segura y desacoplada entre entornos en-premise y cloud. A través de una arquitectura híbrida gobernada, permite conectar sistemas legacy, plataformas corporativas y soluciones cloud (como Dynamics 365) de forma progresiva, reduciendo dependencias punto a punto y promoviendo la escalabilidad, resiliencia y control operativo.


- **ExpressRoute:** Proporciona conectividad privada, segura y de alta disponibilidad entre los entornos on-premise de LDA y Azure, evitando la exposición a Internet público. Dispone de baja latencia, mayor estabilidad y un canal de comunicación fiable para los sistemas críticos del negocio.
- **Azure Service Bus:** Actúa como bus de integraciones desacoplado que permite comunicación asíncrona y resiliente entre sistemas on-premise y cloud. Facilita la absorción de picos de carga, mejora la tolerancia a fallos y evita dependencias temporales entre productores y consumidores de información.
- **Azure API Management:** Centraliza y gobierna el acceso a servicios e integraciones mediante APIs, proporcionando seguridad, control de tráfico, versionado y monitorización. Permite exponer capacidades on-premise y cloud de forma homogénea y controlada, tanto para consumo interno como por terceros.
- **Azure Data Factory:** Habilita la integración, orquestación y movimiento de datos entre sistemas on-premise y cloud, soportando procesos de ingesta, sincronización y transformación de datos. Es clave para escenarios de reporting, analítica y coexistencia de datos durante la transición y evolución del CRM.

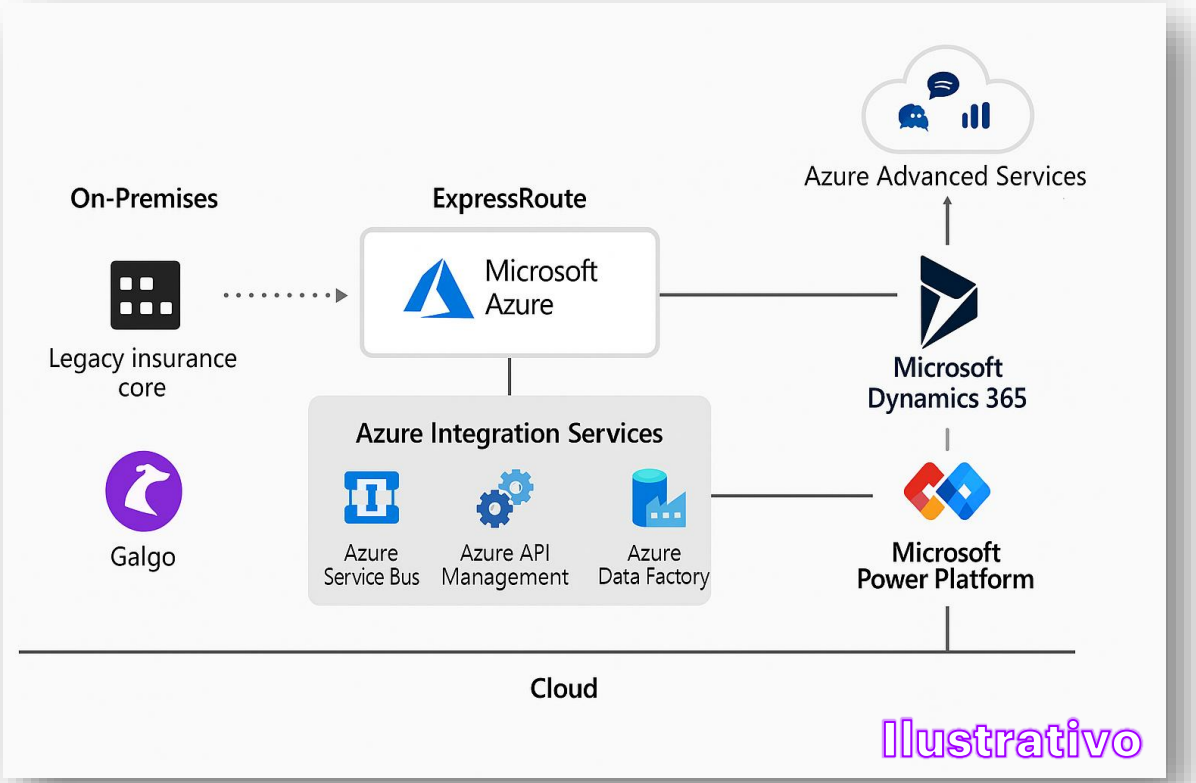

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Azure II - API Management (APIM)

Azure API Management (APIM) es un servicio de Azure que permite publicar, proteger, controlar, monitorizar y gestionar APIs desde un único punto central. Actúa como una puerta de entrada (API Gateway) entre los consumidores de las APIs (aplicaciones, partners, clientes) y los servicios backend que realmente procesan las peticiones. En una arquitectura Azure, se coloca normalmente delante de microservicios, Azure Functions, App Services o sistemas legacy, desacoplando a los consumidores de la implementación interna y permitiendo evolucionar los backends sin impacto directo en quienes consumen las APIs. A continuación, mostramos un esquema a alto nivel de una integración.

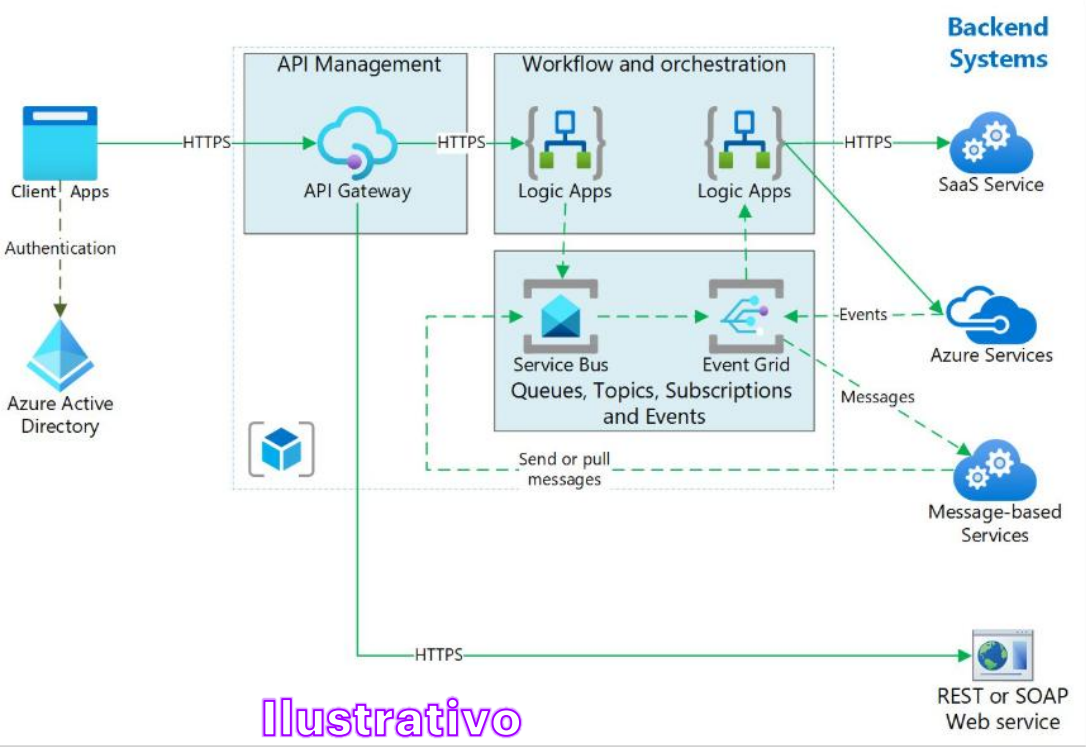

Componentes de APIM:

- **API Gateway:** Permite una configuración consistente de enrutamiento, seguridad, limitación, caché y observabilidad.
- **Self-hosted gateway**: permite a los clientes con infraestructura informática híbrida gestionar APIs alojadas en las instalaciones y a través de nubes desde un único servicio de gestión API Management en Azure.
- **Management plane**: Provisionar y configurar el servicio de gestión de API.
- **Developer portal:** es un sitio web generado automáticamente y totalmente personalizable con la documentación de tus APIs.


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Azure III - Infrastructure as Code (IaC) & DevSecOps

Principals

- La infraestructura definida por código gestiona a los centros de datos implementados por software, cambiando la mentalidad a "Automatizar todo"
- Todos los componentes de recursos deben considerarse como componentes configurables y, por lo tanto, es necesario mantener estados coherentes.
- Estandarización de los procesos, las herramientas y la metodología de despliegue utilizando herramientas y procesos nativos siempre que sea posible.
- Los recursos en el alcance del proyecto se aprovisionarán a través de código, mediante de una serie de iniciativas que se desglosan en planos técnicos y módulos para la realización de valor incremental.

Architecture & Tooling

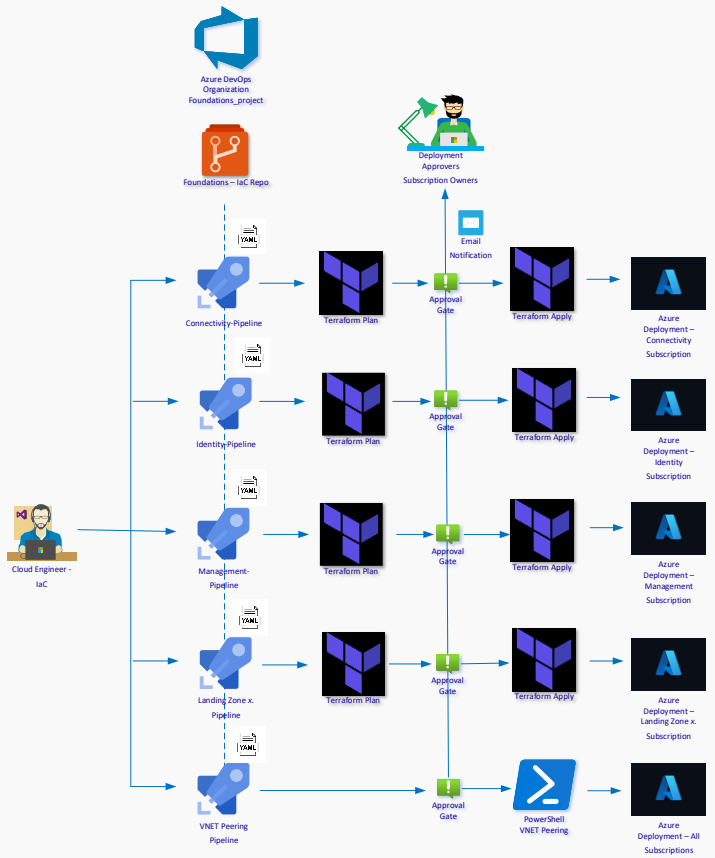

Ilustrativo


Topics

- **Managed pipeline** Despliegues con procesos de aprobación para evitar que se realicen cambios fuera de horario.
- **Planifique** los pasos para permitir que el propietario del servicio vea los cambios que se van a implementar sin revisar el código.
- **Conexiones de servicio individuales** para pipelines para evitar que se realicen cambios sin la aprobación adecuada de los propietarios.
- **IaC completamente gestionada** – Se puede volver a implementar y reutilizar según sea necesario.
- **Auditoría** completa de cambios, aprobaciones y ejecuciones.
- **Repositorio gestionado de forma centralizada.**
- **Posibilidad de revertir cualquier cambio** mediante ejecuciones históricas a una configuración anterior si es necesario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Avanade Genesys Cloud I

Integración de Genesys y Dynamics Customer Service probada

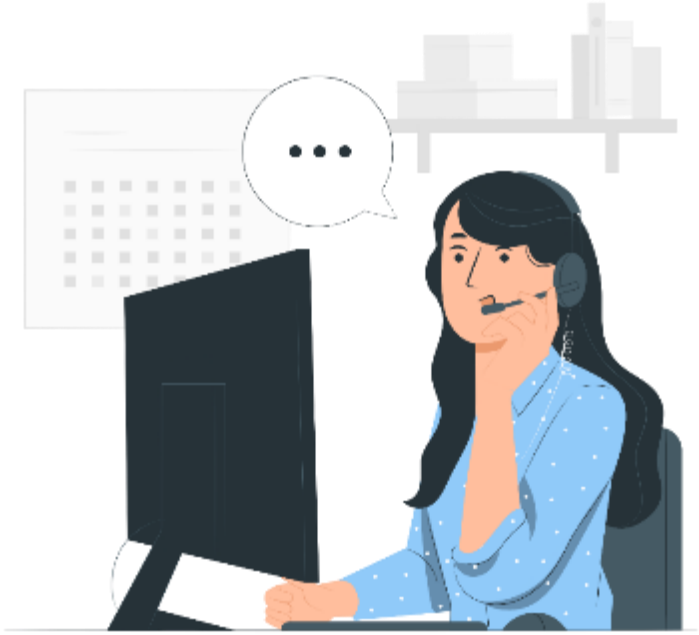

*Avanade Genesys Cloud simplifica la experiencia del agente al ofrecer una **interfaz unificada** para el centro de contacto y CRM **en una sola pantalla de navegación web**. Integra servicios de IA con las conversaciones con los clientes, lo que permite a los agentes concentrarse en los problemas de los clientes y, al mismo tiempo, proporciona métricas esenciales, como resúmenes de conversaciones, resúmenes de llamadas y análisis de opiniones si se dispone del transcript en tipo real*

01 Sin dependencia de terceros

02 Soluciones fáciles de mantener

03 3 meses de esfuerzos de ahorro

04 Sin suscripciones mensuales

Soluciones sencillas y prácticas

Mejora de la experiencia de los usuarios

Aumento del compromiso de los empleados

Infraestructura Segura y Protegida

Incrementado Eficiencias

Llamadas entrantes y salientes

Integración habilitada por SSO

Identifica al cliente en función del número de teléfono y del identificador del cliente.

Soporte para aplicaciones Dynamics CRM de una y varias sesiones.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Avanade Genesys Cloud II

Características

Características principales

- Llamadas entrantes y salientes a través de Genesys Cloud.
- Integración habilitada para SSO.
- Soporte multicanal.
- Identificación de cliente basado en el número de teléfono.
- Soporte a múltiples sesiones simultaneas.
- Soluciones integradas de chatbot.
- Transcripción en tiempo real.
- Capacidades de análisis de llamadas: resumen de llamadas, PII, análisis de sentimientos y resumen de conversaciones.

Principales ventajas

- Utiliza técnicas avanzadas de integración de canales como es Channel Integration Framework.
- Identifica automáticamente al cliente en las llamadas entrantes, muestra los datos relevantes para ese cliente y crea automáticamente un caso.
- Las funciones de IVR y scripts de los agentes estandarizan la atención al cliente, lo que reduce el tiempo de llamada y la carga de trabajo posterior a la llamada.
- Proporciona servicios de IA como transcripción en tiempo real y análisis de llamadas (análisis de opiniones, resumen de conversaciones, información de identificación personal y resumen de llamadas) dentro de CRM. Esta funcionalidad es solo si se dispone del transcript en tiempo real desde Genesys.

Este acelerador proporciona una interfaz de Genesys Cloud CX dentro de Dynamics 365 CRM utilizando Channel Integration Framework. Ofrece funcionalidad de centro de contacto basada en navegador con transcripción en directo, análisis de opiniones, resumen de conversaciones, información de identificación personal y resumen de llamadas dentro de Dynamics 365 CE.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Modelo de Casos de Uso a alto nivel

Desde el grupo especializado en plataforma Microsoft (Accenture Microsoft Bussiness Group) trabajamos para crear modelos de operativos que potencien y maximicen el uso de las características de los productos según las necesidades del negocio.

En este caso, para Dynamics 365 como nuevo CRM para Línea Directa, hemos preconfigurado el siguiente catálogo de casos de uso que nos permitirá agilizar los primeros estadios de la definición funcional.

También nos permite hacer un dimensionamiento temprano inventariando las historias de usuario identificadas en tiempo de propuesta.

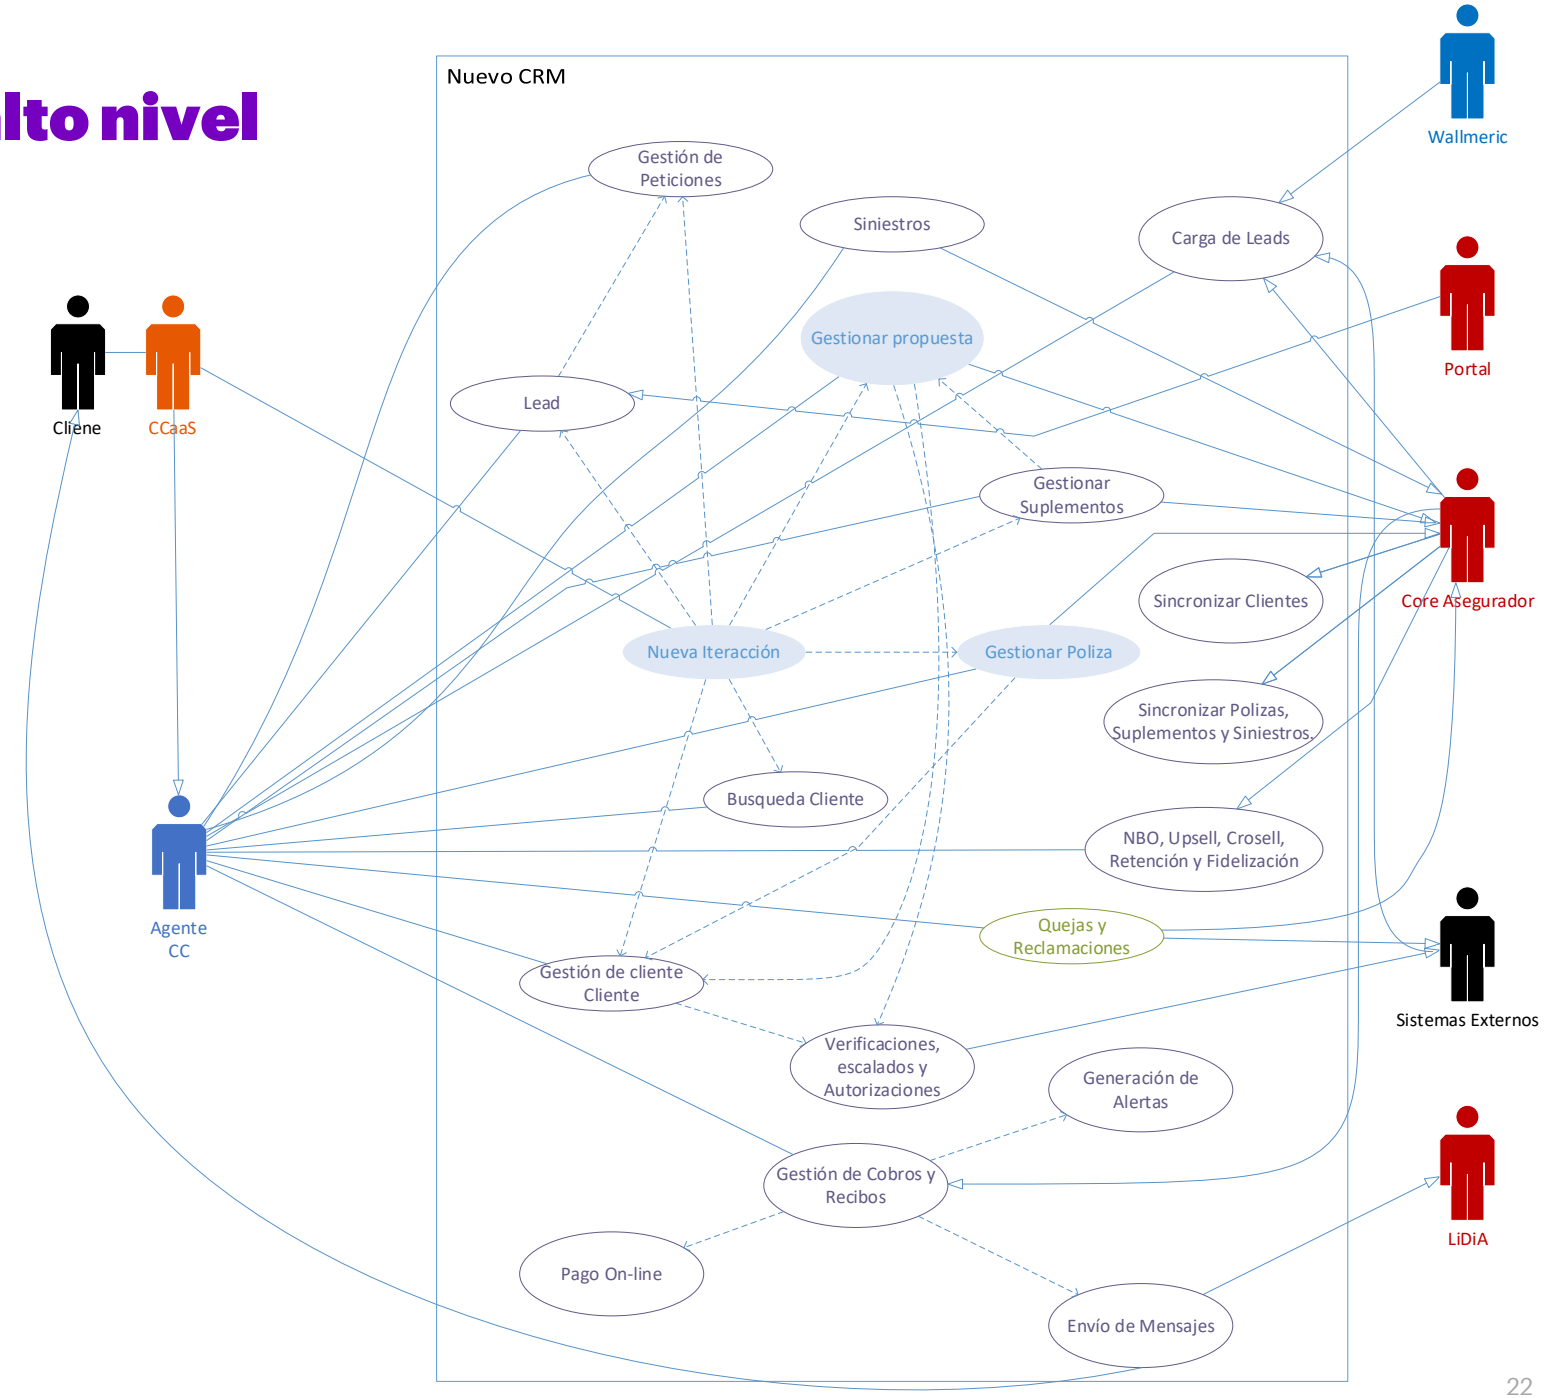


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

3. Cobertura de requisitos

COBERTURA DE REQUISITOS

Nuestra solución propuesta presenta un amplio grado de cobertura en todas las dimensiones de los requisitos de Línea Directa. Se adjunta como anexo el Excel de requisitos realizado por Línea Directa, incluyendo como se cubre cada uno de los desarrollos sobre Dynamics 365. En concreto se han marcado como no cubierto o no aplica ciertos requerimientos del canal chat que se cubren directamente por Genesys, ciertos requerimientos de OCR e integraciones con la web y app.

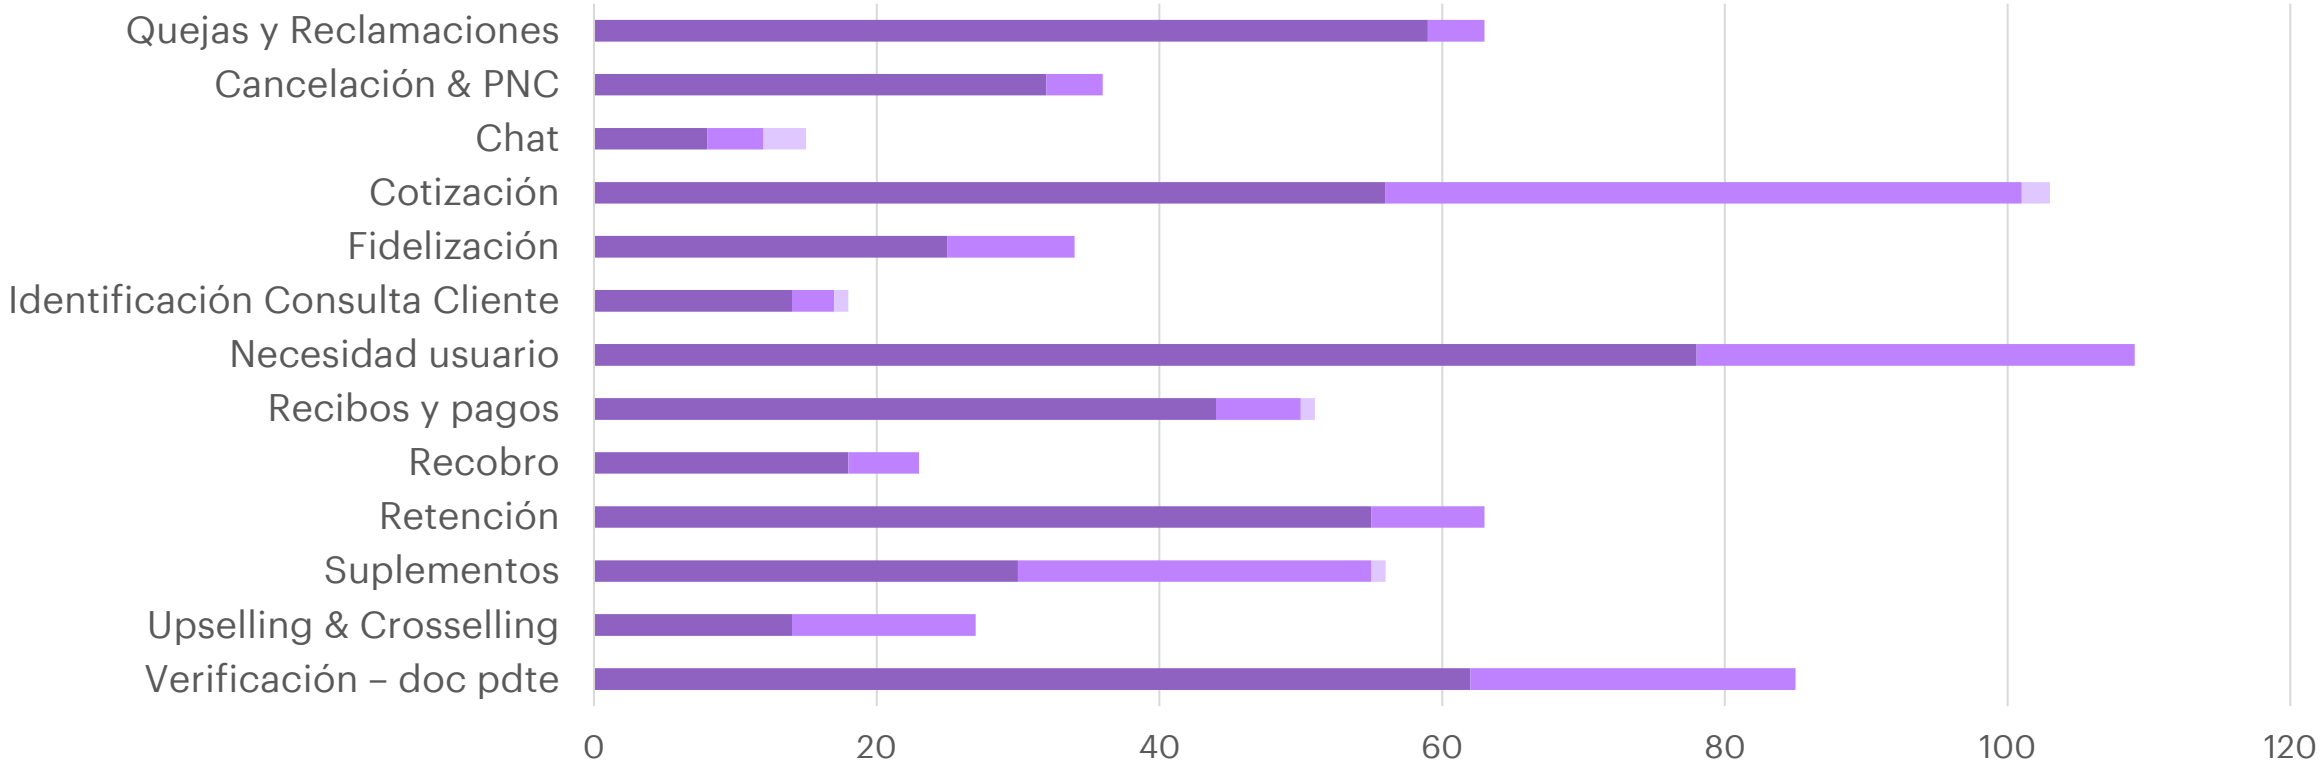

Legenda:

- Cobertura con estándar de Dynamics
- Cobertura con desarrollo sobre Dynamics
- No aplica / No cubierto

Los requerimientos catalogados como No aplica/No cubiertos corresponden a:

- Requerimientos considerados cubiertos por otras herramientas diferentes del CRM (ie: Contact Center)
- Requerimientos que por la magnitud de su estimación de esfuerzo, se consideran objeto de un proyecto independiente, a valorar con LDA.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Inventarios de artefactos a implantar

A continuación, se incluye una tabla con el número de customizaciones/desarrollos en Dynamics por cada uno de las fases. En ella se incluye la complejidad identificada para cada componente.

		Complejidad					
Fases	**Componentes**	**MS**	**S**	**M**	**C**	**MC**	**Total**
Visión Cliente + Hogar	Entidades o tablas	10	6	8	5	3	16
	Flujos de Power Automate	0	8	9	3	0	20
	Desarrollos de Plug-ins en Dynamics para lógica de negocio en backend	0	5	5	3	0	13
	Desarrollos de acciones Custom de Backend	0	5	5	3	0	13
	Web Resource o PCF. Es decir, componentes de UX desarrollados a medida	0	1	6	7	3	11
	Opciones de navegación Barra de navegación	0	1	2	2	0	5
	Modificación del Site Map de Dynamics para incluir botones o acciones	0	2	2	2	0	6
	Reglas de negocio	0	0	5	0	0	5
Motor y Salud	Entidades o tablas	8	6	9	5	0	18
	Flujos de Power Automate	0	6	10	6	0	22
	Desarrollos de Plug-ins en Dynamics para lógica de negocio en backend	0	4	2	3	0	9
	Desarrollos de acciones Custom de Backend	0	6	3	3	0	12
	Web Resource o PCF. Es decir, componentes de UX desarrollados a medida	0	0	4	8	4	13
	Modificación del Site Map de Dynamics para incluir botones o acciones	0	0	3	3	0	6
	Barra de navegación	0	3	2	2	0	7
	Service Bus Instalación y configuración	0	8	7	4	0	19
	Reglas de negocio	0	0	4	0	0	4
Empresas, Fidelización y Atención Cliente	Entidades o tablas	8	6	5	3	0	11
	Flujos de Power Automate	0	7	9	6	0	20
	Web Resource o PCF. Es decir, componentes de UX desarrollados a medida	0	0	4	4	9	16
	Reglas de negocio	0	0	6	0	0	6
Quejas y Reclamaciones	Entidades o tablas	3	2	5	4	2	16
	Flujos de Power Autoamte	0	2	1	0	0	3
	Opciones de navegación	0	0	5	0	0	5
	Reglas de negocio	0	1	4	3	0	8

Niveles de Complejidad

- **MS:** Muy simple. Esfuerzo estimado menor a 5 horas
- **S:** Simple. Esfuerzo estimado entre 5 h-10h.
- **M:** Medio: Esfuerzo estimado entre 10 h-32h.
- **C:** Complejo. Esfuerzo estimado entre 32h-56h
- **MC:** Muy Complejo. Mas de 60h


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

4. Plan de transformación

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

IMPLANTACIÓN FASEADA, PROGRESIVA Y ORIENTADA A VALOR

Para **facilitar la adopción del CRM** por parte de los agentes y una **gestión controlada del cambio**, hemos agrupado los requisitos funcionales por Deployments y Fases, buscando sinergias y optimizando en lo posible los recursos de Línea Directa como propios. Al final de cada fase se ejecutará un Sprint Review. Al final de cada deploy se subirá a producción.

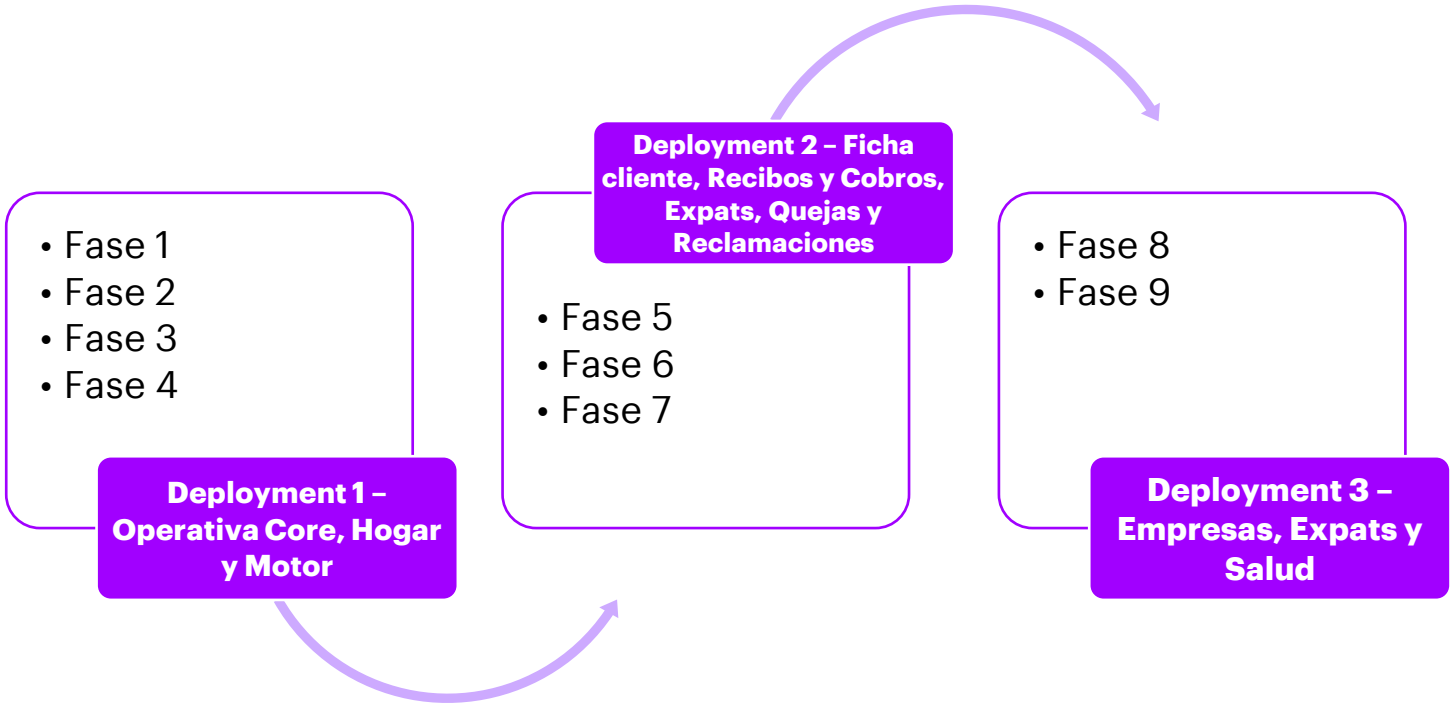

Tareas por fase

Análisis y UX

- Cada Release incluirá una fase inicial de análisis y diseño visual de pantallas (UX) cuyo objetivo será detallar los requisitos, validar dependencias y confirmar la viabilidad de la solución planteada. A la finalización de dicha fase de definición en cada release, Accenture elaborará una revisión de alcance detallado y una estimación revisada de esfuerzo.

Configuración y personalización de Dynamics 365 a las necesidades de la fase:

- Para configurar y adecuar Dynamics 365 en base a las necesidades de negocio de Línea Directa.
- Adecuar el modelo de datos identificado en las sesiones funcionales sobre la herramienta de Dynamics.
- Configuración/extensión de Dynamics 365 para cubrir las necesidades funcionales definidas.

Construcción de las integraciones:

- Desarrollo de las integraciones de Dynamics 365 con otros sistemas de Línea Directa.
- Desarrollo de la migración inicial de datos y las migraciones delta necesarias.

Gestión del cambio y Testing:

- Despliegue en entorno de testing
- Pruebas, unitarias y pruebas integradas.
- Gestión del cambio, formación a formadores y UAT (Entre 2 y 4 semanas según necesidad de la fase).

Despliegue en Producción:

- Fixing UAT
- Despliegue en entorno productivo.
- Sesiones de KT para equipo designado por LDA: Entre 1 y 3 sesiones, 2h-3h, según necesidades de la fase.
- Go live

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Deployment 1 – Operativa Core, Hogar y Motor

Fases Incluidas

Fase 1
- Telefonía
- Identificación
- Ficha cliente (equipo comercial + venta a la cartera)
- Dashboard Seguimiento (Operador y Supervisor)
- Agenda + Tareas

Fase 2
- Ingesta de NBO (Upselling y Crosselling)
- Cotización Hogar (pantalla de precio)
- Cotización Hogar (pantalla de resumen)
- Cotización Hogar (metodos de pago + generación de documentación)

Fase 3
- Cotización Coche(pantalla de precio)
- Cotización Coches (pantalla de resumen)
- Cotización Coches (pantalla de cierre)
- Verificación
- Multicierre (carrito)

Fase 4
- Cotización motos, nuevos productos (pantalla de precio)
- Cotización motos, nuevos productos (pantalla de resumen)
- Cotización motos, nuevos productos (pantalla de cierre)
- Verificación
- Documentación Pendiente

INTEGRACIONES

- Integración online con Genesys Cloud
- Integración online con Mainframe (cliente, pólizas, riesgo país, etc.)
- Integración online con Motor Analítico /BI y modelos predictivos
- Integración online con Walmeric
- Integración online y batch con Adobe
- Integración online con Centro de Notificaciones
- Integración online con Repositorio documental
- Integración online con Outlook
- Integración online con RRHH (PeopleSoft)
- Integraciones batch para las cargas iniciales, procesos de reconciliación, etc..
- Integración online con Mainframe (Motor de validación de elegibilidad)

DEPENDENCIAS

- Licenciamiento y configuración de Genesys cloud
- Licenciamiento y configuración del CRM. Accesos y perfiles definidos para agentes y supervisores
- Servicios del CORE apificados (servicios de consulta y de actualización)
- Disponibilidad del modelo de datos y maestro de clientes, incluyendo la Unidad Familiar.
- SSO y gestión de contexto entre CRM y sistemas legacy.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Deployment 2 – Ficha cliente, Recibos y Cobros, Expats, Quejas y Reclamaciones

Fases Incluidas

Fase 5
- Ficha cliente (suplementos)
- Suplementos atc telefonica (motor: coches + motos)
- Suplementos atc telefonica (hogar)
- Ficha cliente (historico de nbo)

Fase 6
- Ficha cliente (equipo de retención)
- Retención telefonica
- Fidelización
- Recibos y pagos
- Recobro

Fase 7
- Retención y ATC Chats
- Expats no productos empresas
- Quejas & Reclamaciones

INTEGRACIONES

- Integración online con Genesys Cloud
- Integración online con Mainframe (cliente, pólizas, riesgo país, etc.)
- Integración online con Motor Analítico /BI y modelos predictivos
- Integración online con Walmeric
- Integración online y batch con Adobe
- Integración online con Centro de Notificaciones
- Integración online con Repositorio documental
- Integración online con Outlook
- Integración online con RRHH (PeopleSoft)
- Integraciones batch para las cargas iniciales, procesos de reconciliación, etc..
- Integración online con Mainframe (Motor de validación de elegibilidad)

DEPENDENCIAS

- Licenciamiento y configuración de Genesys cloud
- Licenciamiento y configuración del CRM. Accesos y perfiles definidos para agentes y supervisores
- Servicios del CORE apificados (servicios de consulta y de actualización)
- Disponibilidad del modelo de datos y maestro de clientes, incluyendo la Unidad Familiar.
- SSO y gestión de contexto entre CRM y sistemas legacy.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Deployment 3 – Empresas, Expats y Salud

Fases Incluidas

Fase 8
- Ficha de cliente (empresas)
- Cotización Empresas
- Suplementos Empresas
- Expats (Empresas)

Fase 9
- Cotización (Salud)
- Valoración(Salud)
- Suplementos (Salud)
- Retención(Salud)
- Upselling (Salud)

INTEGRACIONES

- Integración online con Genesys Cloud
- Integración online con Mainframe (cliente, pólizas, riesgo país, etc.)
- Integración online con Motor Analítico /BI y modelos predictivos
- Integración online con Walmeric
- Integración online y batch con Adobe
- Integración online con Centro de Notificaciones
- Integración online con Repositorio documental
- Integración online con Outlook
- Integración online con RRHH (PeopleSoft)
- Integraciones batch para las cargas iniciales, procesos de reconciliación, etc..
- Integración online con Mainframe (Motor de validación de elegibilidad)

DEPENDENCIAS

- Licenciamiento y configuración de Genesys cloud
- Licenciamiento y configuración del CRM. Accesos y perfiles definidos para agentes y supervisores
- Servicios del CORE apificados (servicios de consulta y de actualización)
- Disponibilidad del modelo de datos y maestro de clientes, incluyendo la Unidad Familiar.
- SSO y gestión de contexto entre CRM y sistemas legacy.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Migración de datos inicial y posteriores deltas

Con el fin de alinear y poder activar la **sincronizacíón Dynamics 365 Vs Galgo** será necesario una migración inicial de las entidades principales y datos maestros. Estas ETLs podrán ser reusadas luego para los procesos Incrementales delta **de re-sincronización**.

Enfoque


Preparación de datos
- Definición del ámbito a migra.
- LDA define el mapeo basándose en el archivo proporcionado por Accenture
- LDA limpia, consolida y transforma los datos fuente y rellena los archivos de importación de plantillas
- Las fuentes de datos serán DB2 y DWH y la migración incluye hasta 25 tablas de datos.

Pruebas de migración
- LDA valida los datos antes de proporcionarlos a Accenture para una prueba de migración de datos
- Accenture ejecuta pruebas de migración de datos en un entorno de prueba
- LDA y Accenture analizan los resultados y las razones de los rechazos.

Corrección de errores
- LDA corrige los datos para corregir los errores y los valida
- Accenture importa los datos para probar las correcciones.
- Se contempla hasta 3 ciclos de prueba.

Data Validation and Migration to Production
- Accenture importa los datos al entorno UAT
- LDA comprueba los datos y migra a producción, si está validado.

Método previsto para la migración de datos a D365

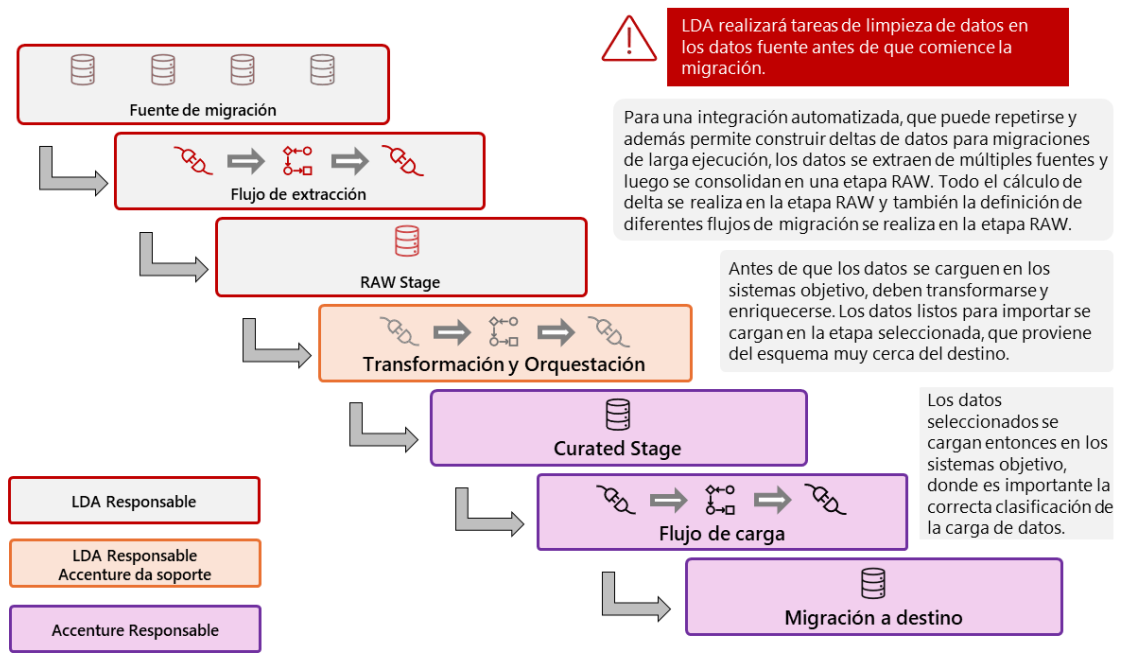

Entidades identificadas

Tablas principales DB2
- Cliente: Personas y Empresas.
- Calendario: Citas.
- Propuestas.
- Pólizas
- Suplementos.
- Pagos
- Recibos.
- Siniestros
- Peticiones de usuario.

Tablas DWH
- Upselling Crosselling por cliente.
- Fidelización y retención por Cliente.
- NBO por cliente / Lead.
- PNC

Maestros
- Productos y servicios (Hogar, Motor, Salud).
- Tipos de polizas.
- Tipos de Complementos.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Interfaces previstas para Fase I – 1/2

Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
Clientes	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica de clientes (nuevos y actualizaciones)*	
Pólizas	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos básicos de las pólizas*	*BulkAPI & DC*
Oportunidades	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de las oportunidades*	
Productos	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de los datos de productos*	
Siniestros	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de los siniestros*	*BulkAPI & DC*
Incidencias / Quejas	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de las incidencias*	
Recibos	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de los recibos asociados a las pólizas*	*BulkAPI & DC*
Retención	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de los casos de retención/cancelación asociados a las pólizas*	
Solicitudes comerciales	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de las Solicitudes comerciales*	*BulkAPI & DC*
Conexión a galgo	Nueva	Dynamics 365	Galgo	Link	*Link contextualizado al cliente de acceso a galgo para poder operar*	*Este link estará incluido en la ficha 360 del cliente*
Conexión con Genesys	Nueva	Genesys	Dynamics 365	Conector	*Conexión con Genesys para poder recibir las llamadas y levantar la ficha del cliente*	*Se utilizará el conector estándar*
Click-to-call	Nueva	Dynamics 365	Genesys	Conector	*Click to call desde el CRM para realiza una llamada a un cliente*	
Gestor documental	Nueva	Gestor documental	Dynamics 365	Online	*Consulta de los documentos del cliente*	
Eventos	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	*Sincronización de los eventos generados en el core asegurador con Dynamics 365*	
Eventos - Sincronización	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	*Sincronización de los eventos generados y actualizados en Dynamics 365 con el core asegurado*	*Sincronización en el momento de creación y actualización del registro*
Tareas	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de tareas del agente*	
Tareas – Sincronización	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	*Sincronización de las tareas generadas, actualizadas y gestionada en Dynamics 365 con el core asegurador relacionadas con la gestión de llamadas*	*Sincronización en el momento de creación y actualización del registro*
Cliente potenciales	Nueva	Dynamics 365	Walmeric	Online	*Sincronización de los clientes potenciales generados en Dynamics 365 con el core asegurador*	*Sincronización en el momento de creación y actualización del registro*
Clientes potenciales	Nueva	Walmeric	Dynamics 365	Online	*Consulta de información de posibles cliente potenciales no identificados*	
Jerarquía de centros y empleados	Nueva	LDAP	Dynamics 365	Batch	*Carga actualizada de la estructura de centros y roles de los agentes*	
SSO	Nuevo	LDAP	Dynamics 365	Online	*Configuración del acceso por SSO a los usuarios de Dynamics 365*	
Clientes – detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle del cliente en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Pólizas - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de la póliza en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Siniestros - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de los siniestros en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Incidencias - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de las incidencias en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Recibos - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de los recibos en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Retención - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de los retención/cancelación en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Solicitudes comerciales - detalle	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del detalle de las solicitudes comerciales en Dynamics 365 desde el core asegurador	
Oportunidades	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Exclusión de la carga de las oportunidades de Hogar.	
Oportunidades - Sincronización	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Dynamics 365 del ramo Hogar	Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Dynamics 365
Recomendación NBO	Nueva	Motor NBO	Dynamics 365	Batch	Carga actualizada de las recomendaciones NBO para cada cliente del ramo Hogar	
Gestor documental	Nueva	Dynamics 365	Gestor documental	Online	Envío de los documentos adjuntos a una oportunidad o suplemento al gestor documental del cliente	
Riesgos	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Consulta de la información de riesgo relacionado con cliente y póliza	Se lanzará durante el proceso de cotización o suplementos.
Suscripción	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Consulta de las condiciones, precios, descuentos, restricciones técnicas, campañas asociadas al cliente, producto y póliza	Se lanzará durante el proceso de cotización o suplementos
Coberturas	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Consulta de las coberturas aplicables a la póliza, producto y cliente según corresponda	Se lanzará durante el proceso de cotización o suplementos
Acciones de retención	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Consulta de las acciones de retención que pueden ser ofrecidas por póliza y cliente	Se lanzará durante el proceso de retención

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Interfaces previstas para Fase I – 2/2

Nombre	Nueva/Mod	Origen	Destino	Tipo	Descripción	Consideraciones
Validaciones	Nueva	Externo	Dynamics 365	Online	Validación de datos contra bases de datos externas.	Se desconoce el número exacto de ellas sistemas. Se identifican al menos 4 sistemas
Pasarela de pago	Nueva	Dynamics 365	Externo	Online	Integración para realizar pagos online	
Firma digital	Nueva	Dynamics 365	Logalty	Online	Generación de documentos y lanzamiento del proceso de firma	
Emisión de póliza	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Envío al core asegurador de la orden de emisión tras pago y firma, o tras la confirmación del método de pago.	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención
Notificaciones	Nueva	Dynamics 365	Centro notificaciones	Online	Envío del lanzamiento de una o varias notificaciones al cliente	Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención
Oportunidades	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Exclusión de la carga de las oportunidades de Motor y Salud.	
Oportunidades - Sincronización	Modificación	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Dynamics 365 del ramo Motor y ramo salud	*Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Dynamics 365*
Productos	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Modificación de la carga actual para la inclusión de información complementaria de productos de Motor y Salud	
Casos	Modificación	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Sincronización de los casos de retención creados y gestionados en Dynamics 365 correspondientes al ramo Motor y ramo Salud	*Se lanza tras la creación o actualización de los registros en Dynamics 365*
Recomendación NBO	Modificación	Motor NBO	Dynamics 365	Batch	Carga actualizada de las recomendaciones NBO para cada cliente de Motor y Salud	
Verificación	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Consulta de las condiciones y estado de las validaciones necesarias según póliza y producto de Motor y Salud	*Se lanzará durante Interfaces el proceso de cotización, suplementos o retención*
Verificación – resultado	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	El core asegurador actualizará el estado de la valoración una vez se haya producido	
Visita perito externo	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Envío de la información de la visita del perito externo	*Se lanzará durante el proceso de cotización, suplementos o retención*
Productos	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Modificación de la carga actual para la inclusión de información complementaria de productos de Motor y Salud	
Clientes	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Modificación actual de la carga de clientes para incluir información de: clientes Expats, programa de fidelización	
Fidelización	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Envío de las acciones de fidelización al core asegurador para su aplicación	
Oportunidades	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Inclusión en la carga de las oportunidades de upselling y crosselling	
Recomendación	Nueva	Motor NBO	Dynamics 365	Batch	Carga actualizada de las recomendaciones de upselling y crosselling	
Recibos	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	Carga periódico actualizada de los recibos de los clientes	
Recibos - Acciones	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	Online	Envío al core asegurador de ordenes de emisión, reemisión, cancelación, recobro, actualización del proceso de pago	*Se lanzará durante el proceso de gestión de recibos*
Recibos – actualización	Nueva	Core / DB2	Dynamics 365	Online	Actualización del estado de recibos desde el core asegurador	*Proceso lanzado desde el core tras identificar un cambio de estado*
Recobro	Nueva	Dynamics 365	Adobe	Online	Información de campañas y lanzamiento de notificaciones	
Recobro – comprobación	Nueva	Externo	Dynamics 365	Online	Comprobación del recobro	
Gestor documental	Modificación	Gestor documental	Dynamics 365	Online	Modificación de la consulta de documentos para incluir el estado de los documentos pendientes	
Clientes	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Inclusión de las personas jurídicas en la carga actualizada de cliente con su información específica*	
Pólizas	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos básicos de las pólizas de empresas*	
Oportunidades	Modificación	Dynamics 365	Core / DB2	Online	*Sincronización de las oportunidades creadas y gestionadas en Dynamics 365 de empresas*	
Productos	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de los datos de productos de empresas*	
Recibos	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de los recibos asociados a las pólizas de empresas*	
Recomendación NBO	Modificación	Motor NBO	Dynamics 365	Batch	*Carga actualizada de las recomendaciones NBO para cada empresa*	
Casos	Nueva	Dynamics 365	Core / DB2	On-line	*Alta y actualización de Siniestros, consultas, incidencias y quejas.*	
Siniestros	Modificación	Core / DB2	Dynamics	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de los siniestros asociados a las clientes tanto personas físicas como personas jurídicas*	
Casos	Modificación	Core / DB2	Dynamics	Batch	*Eliminación de los casos de atención al cliente de la carga de casos*	
Casos	Nueva	Dynamics	Core / BD2	Online	*Sincronización de los casos de atención al cliente creados y gestionados en Dynamics con el core asegurador*	
Incidencias / Quejas	Modificación	Core / DB2	Dynamics 365	Batch	*Carga periódica actualizada de datos de las incidencias de empresas*	

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

IA integrada en Dynamics 365 (Insights + Copilot)

La combinación de Dynamics 365 Sales Insights, Service Insights y Copilot for Dynamics 365 **convierte el CRM solicitado por Línea Directa Aseguradora en una plataforma inteligente**, orientada a eficiencia operativa, calidad de servicio y toma de decisiones basada en datos e IA. Las siguientes características detalladas están disponibles de caja solo requieren de activación y uso:



Sales Insights – Eficiencia comercial y foco en valor

- **Priorización inteligente de leads y oportunidades** basada en datos históricos, comportamiento y señales del negocio.
- **Recomendaciones de siguiente mejor acción** para mejorar ratios de conversión y reducir tiempos de cierre.
- **Visión predictiva del pipeline y Forecast** para anticipar resultados y optimizar la planificación comercial.
- **Temas de conversación**, que ayudan a una conversación con el cliente más amigable.
- **Quien es quien,** en una organización.

Impacto para LDA

✓ Mayor productividad comercial
✓ Mejora del ratio de conversión
✓ CRM orientado a valor desde fases tempranas



Service Insights – Excelencia operativa y control del servicio

- **Análisis histórico de Customer Service,** analizar la evolución de casos, SLAs y rendimiento para identificar tendencias.
- **Sugerencia de artículo KB,** IA que recomienda el artículo de conocimiento adecuado en el momento exacto de la atención.
- **Sugerencias de IA para casos similares,** asistir al agente en tiempo real, recomendando automáticamente soluciones previas.

Impacto para LDA

✓ Reducción del tiempo operativo por interacción.
✓ Mejora de la calidad del servicio y cumplimiento de SLA.
✓ Mayor trazabilidad end-to-end



Copilot for Dynamics 365 – IA generativa al servicio del agente

- **Asistente integrado en Sales y Customer Service**, embebido directamente en la experiencia Dynamics.
- **Resúmenes automáticos de conversaciones, correos y casos**, facilitando hand-offs y cierres.
- **Soporte al agente en tiempo real**, sugiriendo respuestas, próximos pasos y acceso rápido a conocimiento.
- **Interacción en lenguaje natural** para consultar datos, preparar reuniones y entender el contexto del cliente.
- **Reducción del esfuerzo cognitivo** y aceleración de la adopción del CRM..

Impacto para LDA

✓ Agentes más productivos y autónomos
✓ Menor tiempo de formación y ramp-up
✓ Experiencia de usuario moderna y alineada con la RFP

Nota: No está previsto ninguna personalización o mejora sobre estas funcionalidades out-of-the-box. Ya que están basadas en modelo avanzadas de IA, LLM y Machine Learning desarrollados y administrados directamente por la propia Microsoft.


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

IA y IA Generativa en Dynamics 365 I

Sales Insights I - Priorización inteligente de leads y oportunidades

Focalizar en las oportunidades y los clientes potenciales de calidad que facilitan a alcanzar los objetivos de ventas. Dynamics 365 aprovecha sus modelos de aprendizaje automático para ayudar a ***predecir qué oportunidades y clientes potenciales se convertirán en ingresos****.*


- Identificación rápida de las oportunidades que parecen tener posibilidades de cerrarse, basándose en los resultados de oportunidades anteriores.
- Foco en los clientes potenciales que se ajustan al perfil de los compradores que han tenido éxito en el pasado.
- Tendencias de los clientes potenciales y las oportunidades para prestarles la atención que necesitan para convertirlos en clientes y generar ingresos.



Sales Insights II - Recomendaciones de siguiente mejor acción

Es un mecanismo prestablecido de ***priorización inteligente*** *que* ***guía a los agentes*** *sobre la siguiente mejor acción en cada interacción, promoviendo la eficiencia, foco comercial y calidad de servicio a partir de datos del cliente y señales del negocio.*


Este acelerador de ventas ayuda a los vendedores internos a acelerar aún más su ritmo de ventas, gestionar su jornada laboral interactiva priorizando las actividades (1) relacionadas con los clientes potenciales u oportunidades, e interactuar directamente con los clientes a través de correos electrónicos integrados y un marcador telefónico (2).

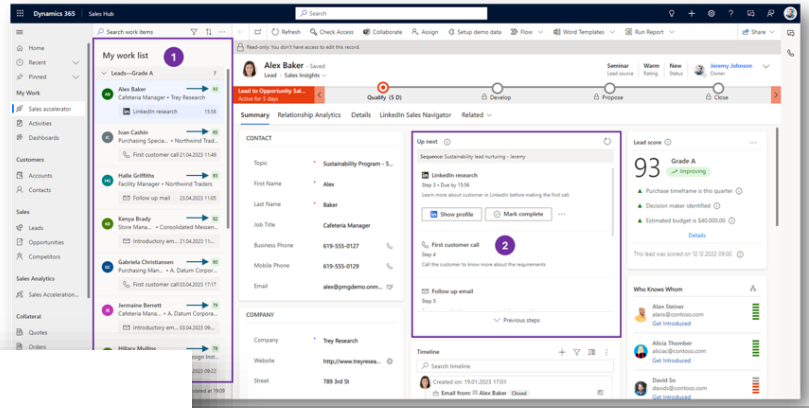

Sales Insights III - Visión predictiva del pipeline y Forecast

La visión predictiva del pipeline y el forecast predictivo de Sales Insights permiten anticipar resultados comerciales con mayor fiabilidad, combinando ***probabilidad de cierre y previsión de ingresos para tomar decisiones proactivas y basadas en datos****.*

- **Forecast predictivo de ingresos:** estima de forma automática el volumen de negocio esperado, reduciendo la dependencia de estimaciones manuales.
- **Detección temprana de riesgos y desviaciones:** identifica oportunidades con baja probabilidad de cierre o fuera de objetivo antes de que impacten en resultados.
- **Priorización del esfuerzo comercial:** orienta a los equipos hacia las oportunidades con mayor impacto en el forecast.
- **Mejor planificación y control:** facilita una visión consolidada y realista del pipeline para la toma de decisiones de negocio.

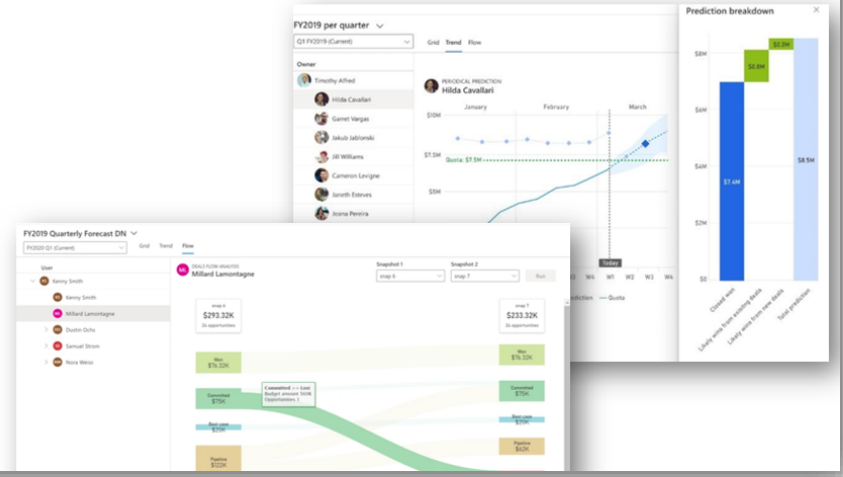


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

IA y IA Generativa en Dynamics 365 II

Service Insights I - Análisis histórico de Customer Service

*El análisis histórico de Customer Service permite evaluar el comportamiento pasado de la operación de atención al cliente para **identificar tendencias, patrones recurrentes y oportunidades de mejora basadas en datos reales**.*


- **KPIs históricos de servicio:** volumen de casos, tiempos de resolución, SLAs y CSAT a lo largo del tiempo.
- **Análisis de tendencias y estacionalidad:** detección de picos, caídas y evolución por periodos.
- **Segmentación por tipología y canal:** comparación histórica por tipo de caso, siniestro, reclamación o canal de entrada.
- **Rendimiento de agentes y colas:** análisis comparativo histórico para identificar cuellos de botella y mejores prácticas.
- **Soporte a decisiones de mejora continua:** base objetiva para optimizar procesos, SLAs y dimensionamiento del servicio.



Service Insights II – Sugerencia de artículo KB

La sugerencia de artículo KB utiliza inteligencia artificial para recomendar automáticamente al agente el artículo de conocimiento más relevante según el contexto del caso, facilitando una resolución más rápida y consistente.


- Recomendación automática de artículos de conocimiento, basada en el contenido del caso y patrones históricos.
- Sugerencias contextuales en tiempo real, visibles directamente durante la gestión del caso..
- Asistencia contextual en tiempo real (Smart Assist), integrada en el formulario del caso sin cambiar de aplicación.
- Priorización de artículos más efectivos, en función de su uso y éxito en resoluciones anteriores.
- Integración nativa con Smart Assist, sin necesidad de búsquedas manuales por parte del agente.
- Reducción del tiempo medio de resolución (AHT) y mejora de la calidad y homogeneidad de las respuestas.



Service Insights III – Sugerencias de IA para casos similares


Las sugerencias de IA para casos similares y artículos de conocimiento permiten asistir al agente en tiempo real, recomendando automáticamente soluciones previas y contenido relevante para acelerar la resolución y mejorar la consistencia del servicio.

- Recomendación automática de casos similares resueltos, basada en patrones históricos y contexto del caso actual.
- Sugerencia inteligente de artículos de conocimiento, priorizando el contenido con mayor probabilidad de resolver el caso.
- Asistencia contextual en tiempo real (Smart Assist), integrada en el formulario del caso sin cambiar de aplicación.
- Reducción del tiempo medio de gestión (AHT) y de escalados gracias a acceso inmediato a soluciones probadas.
- Aprendizaje continuo del modelo de IA, que mejora las recomendaciones a medida que se resuelven más casos y se utilizan los artículos..

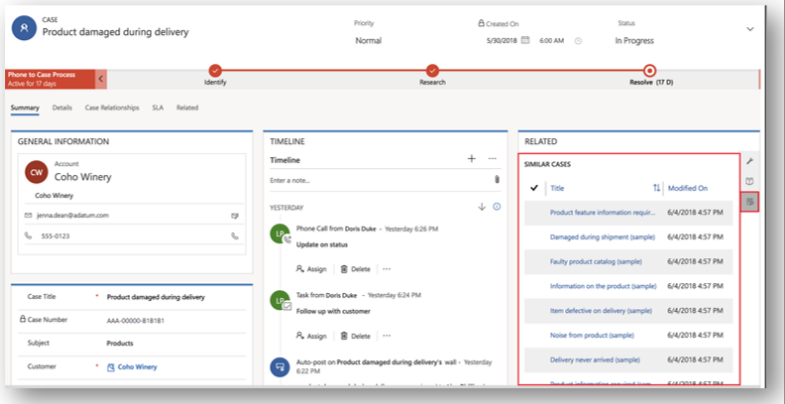

Copilot for Dynamics 365


1. Asistente integrado en Sales y Customer Service, embebido directamente en la experiencia Dynamics.
2. Resúmenes automáticos de conversaciones, correos y casos, facilitando hand-offs y cierres.
3. Soporte al agente en tiempo real, sugiriendo respuestas, próximos pasos y acceso rápido a conocimiento.
4. Interacción en lenguaje natural para consultar datos, preparar reuniones y entender el contexto del cliente.

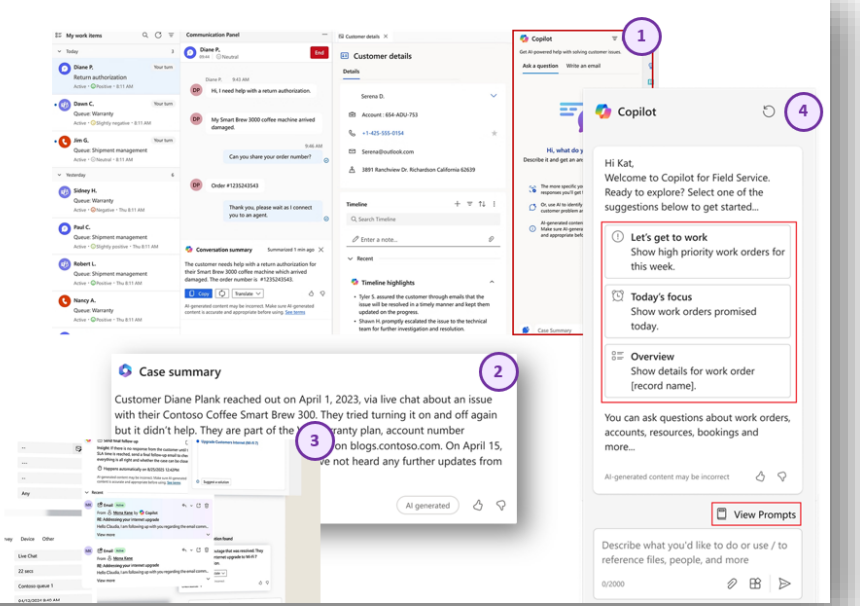

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live

A partir de la subida a Producción de la **Fase I**, se activará un **equipo adicional de Mantenimiento y Evolución** que acompañará el resto del programa hasta su finalización. Este equipo operará en paralelo a las siguientes fases de implementación. Al finalizar la implementación comenzará el mantenimiento extendido de 12 meses como se indicaba en la planificación

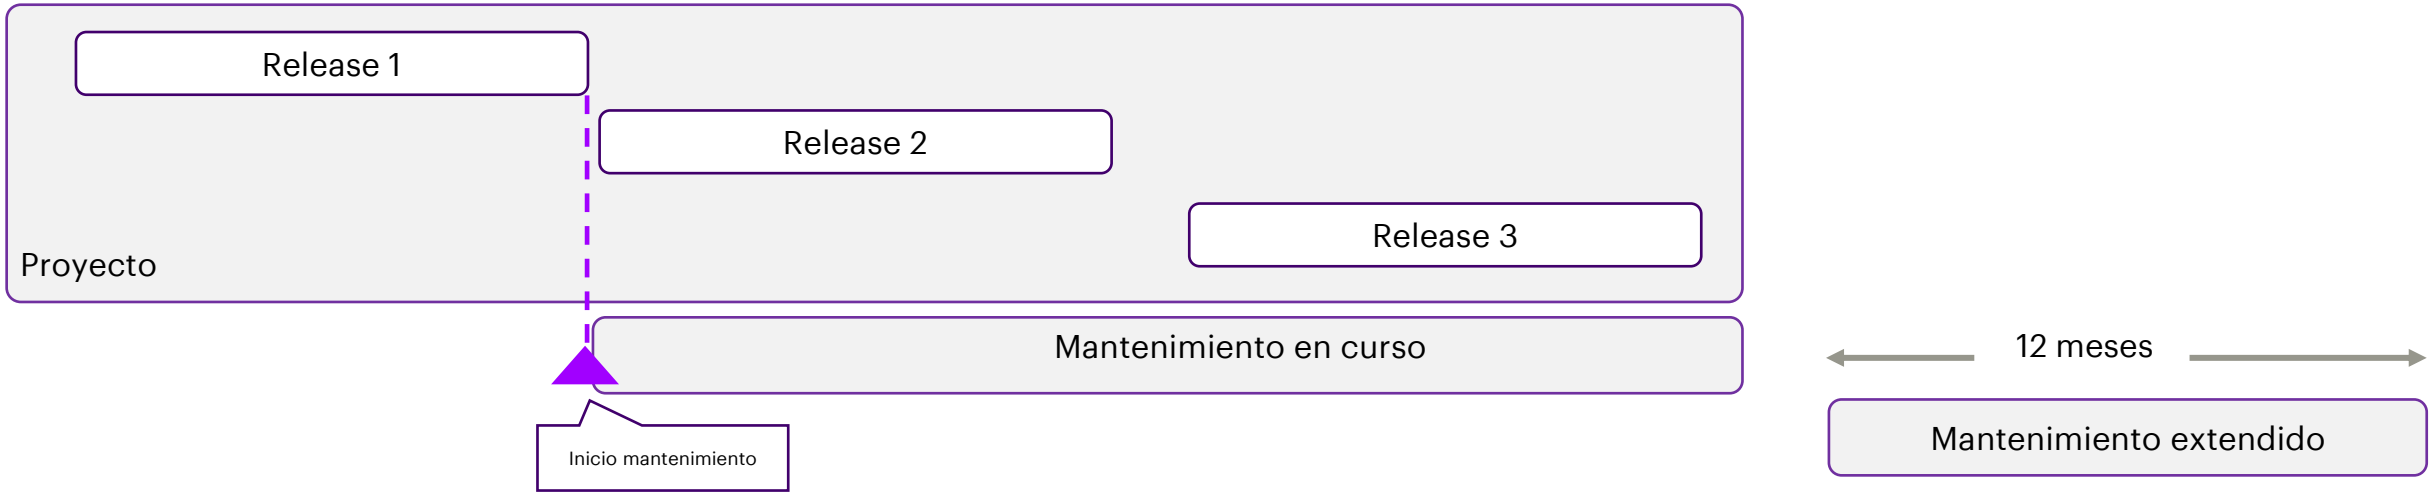

Objetivos del Modelo

- ✓ Promover la estabilidad tras cada Go-Live
- ✓ Gestionar incidencias funcionales y técnicas
- ✓ Promover la continuidad operativa del negocio
- ✓ Incorporar pequeños evolutivos de bajo impacto
- ✓ Preparar el sistema para siguientes releases

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento Activo desde el Primer Go-Live. Traspaso

A partir del despliegue de la primera fase se propone hacer el traspaso al equipo de mantenimiento o bien al equipo de LDA en caso de que no se contrate el mantenimiento

Cada una de las **reuniones tendrá una duración aproximada de 2 horas** donde participarán todas las áreas implicadas en referencia al módulo o módulos a tratar durante la sesión.

Se proponen las siguientes **reuniones para la cobertura del traspaso** de todas las funcionalidades impactadas:

- Sesión para explicar la documentación generada para el proyecto
- Sesión de funcionalidad implementada (US y diseños visuales)
- Sesión de integraciones y arquitectura global (pruebas de carga de datos,...)
- Sesión de Gestión del cambio para explicar documentación y procedimientos implantados
- Sesión de administración de la herramienta e incidencias en curso
- Una sesión adicional de aclaración de dudas

Se propone realizar una transferencia de servicio las dos últimas semanas previas a cada despliegue, la transferencia del servicio donde debe promover el traspaso efectivo del conocimiento al equipo de mantenimiento

PLANIFICACIÓN



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Documentación generada		Funcionalidad		aplicación
Arquitectura	GdC		Administración e incidencias en curso	Aclaración de dudas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El alcance para la solución CRM de LDA se basa en un modelo de servicio que contempla las siguientes tareas de:

- Correctivos
- Soporte de Mantenimiento
- Evolutivos y Tareas
- Release Management a entornos previos a Producción

El servicio a LDA dará soporte a las siguientes herramientas implantadas durante el proyecto:

- Dynamics 365 for Sales
- Dataverse.
- Integraciones basadas en los componentes de Azure desplegados.
- Power Automate
- Copilot Studio
- Conector de Genesys

1 CORRECTIVO

- Resolución de incidencias de la solución Dynamics de LDA
- Análisis, de forma coordinada con el resto de los equipos, de la solución más adecuada según la tipología de la incidencia y su afectación al negocio.

2 SOPORTE

- Revisión diaria del sistema, en conjunción con los arquitectos de LDA del equipo.
- Seguimiento de Incidencias y Tareas.
- Confección de la documentación técnica necesaria y almacenamiento en los repositorios correspondientes de las herramientas
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados

3 EVOLUTIVOS

- Implementar nuevas iniciativas o funcionalidades o adaptación/modificación de las ya existentes para la evolución de la solución de CRM conforme a los requerimientos acordados con negocio.

- Ejecución de pequeños evolutivos y tareas de hasta 40 horas el ciclo completo de ejecución (desde el desarrollo hasta la subida a PREPRODUCCION).

4 RELEASE MANAGEMENT

- Responsable de promociones entre entornos previos a PROD.
- Mantenimiento de ramas.
- Realización de informes de calidad del código y deuda técnica.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tareas y entregables

Objetivo

- Resolución de incidencias detectadas en producción de la plataforma Dynamics, incluyendo errores de código o configuraciones de la aplicación.
- El servicio cubrirá las actividades para solventar la incidencia y restaurar tan pronto como sea posible la normalidad del servicio y operación, desde el análisis inicial y diagnostico hasta la resolución en los sistemas dentro del alcance que estén impactados.
- Soporte a los procesos de la plataforma

Tareas Accenture

- Análisis y resolución de las incidencias detectadas en el funcionamiento del CRM Dynamics, con sus evidencias asociadas
- Escalado de las incidencias producidas en los procesos de integración con terceros sistemas al grupo responsable.
- Actualización estado incidencia en el servicio de ticketing de LDA

Tareas LDA

- Registro de tickets con detalles del incidente en el servicio de ticketing de LDA aportando los datos de prueba y pasos necesarios para reproducir la incidencia y las condiciones en las que se ha producido.
- Tipificación y priorización de tickets.
- Nivel 1 de servicio de mantenimiento.
- Pruebas de usuario.
- Soporte al escalado de incidencias críticas.
- Actualización estado incidencia en el servicio de ticketing de LDA

Entregables

- Actualización de la documentación técnica de la aplicación.
- Documentación de la resolución de incidencia en el servicio de ticketing de LDA tanto de soluciones como de workaround lo que contribuirá a tener un repositorio de conocimiento que ayude a mejorar la resolución de futuras incidencias.
- Actualización en repositorio de los elementos modificados.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: Tipificación de incidencias

La tipificación de incidencias que proponemos es la detallada a continuación:

Tipología	Prioridad	Descripción
Incidencias Correctivo	1.- Crítica	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Impide totalmente la ejecución de un proceso crítico de negocio definido en el Documento de Alcance. ➢ Afecta a más del 50% de los usuarios activos del sistema o a la totalidad de un colectivo operativo esencial. ➢ No existe workaround técnico ni operativo razonable. ➢ Genera al menos uno de los siguientes impactos: • Incumplimiento contractual frente a clientes finales. • Incumplimiento regulatorio o riesgo sancionador. • Imposibilidad de facturación o ejecución económica de operaciones. • Caída total del servicio.
	2.- Alta	➢ Se produce en entorno productivo. ➢ Afecta de forma severa a un proceso crítico de negocio o a más del 25% de usuarios activos. ➢ Permite la continuidad operativa mediante workaround temporal. ➢ No implica caída total del sistema. ➢ Puede generar impacto financiero u operativo relevante, pero no paraliza completamente la actividad.
	3.- Media	➢ No impide la ejecución de procesos críticos de negocio. ➢ Afecta a menos del 25% de los usuarios activos. ➢ Existe workaround razonable. ➢ No genera incumplimiento contractual ni regulatorio. ➢ No impide la facturación ni la ejecución económica de operaciones.
	4.- Baja	➢ No impacta en procesos de negocio. ➢ No afecta a datos transaccionales. ➢ No genera impacto financiero ni regulatorio. ➢ Se limita a aspectos visuales o parametrizaciones menores

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Las Partes deberán acordar los supuesto que se consideran procesos críticos de negocio

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Correctivos: ANSs de incidencias

Los ANSs que proponemos a aplicar durante el mantenimiento son los siguientes:

Tipología	Prioridad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias Correctivo	1. Crítica	30 min	5 horas labor.	Mensual	≥90%
	2. Alta	30 min	8 horas labor.	Mensual	>90%
	3. Media	6 horas	3 días labor.	Mensual	>90%
	4. Baja	12 horas	10 días labor.	Mensual	>90%

Definición	Frecuencia Medición	ANS Esperado
Incidencias repetitivas	Mensual	≤5%
Tickets reabiertos tres o más veces	Mensual	≤2% (12 meses)
Retrasos en la entrega de AD	Puntual	0 semanas

Consideraciones:

- Los tiempos deben medirse con la herramienta para la gestión de incidencias proporcionada por LDA, y estos deben computarse conforme las ventanas de servicio descritas en la presente propuesta. Cuando un ticket está bajo la responsabilidad de algún equipo NO Accenture, los tiempos no se considerarán.
- Si como consecuencia de un despliegue, se produce un aumento de las incidencias por problemas en la calidad de los desarrollos no realizados por Accenture, el no cumplimiento de los ANSs no será de aplicación para los desarrollos que lo provocan, asumiendo que dichas desviaciones serán cubiertas por la garantía de las empresas responsables de realizar dichos desarrollos
- La asignación de prioridades se realizará por parte de Accenture conforme un patrón normal a acordar de buena fe.
- Solo se podrán computar ANS si se recibe una muestra de valores que permita hacer el cálculo de forma representativa. Accenture y LDA acordarán de buena fe los vectores de determinación de la naturaleza representativa de cada muestra.
- Se contempla la posibilidad de revisar y modificar los ANSs de mutuo acuerdo, cuando las circunstancias lo aconsejen

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Soporte: Tareas y entregables

Objetivo

- Seguir realizando acciones de carácter perfectivo y gestión de tareas administrativas que surjan de forma proactiva desde el propio Servicio, o bien a demanda a través de peticiones de los usuarios.
- Comprobaciones manuales y desarrollo de procesos enfocados a mejorar la operación y disponibilidad de Dynamics.

Tareas Accenture

- Chequeo periódico del estado de la aplicación para la identificación proactiva de posibles incidencias o degradación del sistema.
- Revisión de movimientos diarios en las integraciones con terceros, relanzamiento de los procesos automáticos en casos de ser necesario o creación de tickets de soporte en caso de errores/incidentes.
- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en la herramienta de ticketing de LDA
- Actualización estado de las solicitudes de servicio en ANSYS la herramienta de ticketing de LDA
- Detección y definición de nuevas alarmas, puntos de control y procedimientos de monitorización que puedan ser incorporados al sistema en producción.
- Propuesta de mejoras en base a los riesgos y problemas identificados, que permitan potenciar la operación de la aplicación y la reducción progresiva de incidencias.
- Monitorización de volumetrías y rendimiento.

Tareas LDA

- Registro de solicitudes de servicio requerido con detalles en ANSYS la herramienta de ticketing de LDA
- Tipificación y priorización de la solicitud de servicio en base al criterio especificado más adelante.

Entregables


- Informes de posibles riesgos y problemas junto con propuestas de mejora.
- Documentación de las tareas de soporte realizadas.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO


Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

LDA



Negocio

Requerimientos
- Identificación evolutivos



Product Owner

Seguimiento y gestión del servicio de evolutivos
- Toma de requisitos
- Anticipación de necesidad de capacidad
- Seguimiento y gestión del backlog
- Priorización y confección de las historias de usuario
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación de evolutivos
- Información a usuarios



Evolutivos

SERVICIO ACCENTURE



Project Manager

Gestión del servicio
- Gestión y planificación de la capacidad del equipo



Equipo Evolutivos

Desarrollo y pruebas de nuevos requerimientos
- Realización de estimaciones en base a requerimientos recibidos.
- Desarrollo y pruebas acorde al backlog definido.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.
- Soporte a la validación de los desarrollos e implementación.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Pequeños evolutivos: Tareas y entregables

Objetivo

- Evolución con pequeños evolutivos de la plataforma Dynamics conforme a las necesidades de negocio de LDA .

Tareas Accenture

- Coordinación del equipo e iniciativas a desarrollar.
- Estimación y planificación del desarrollo.
- Análisis funcional y técnico.
- Realización de estimaciones en base a requerimientos.
- Desarrollo.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de regresión.
- Soporte a pruebas de integración de sistemas.
- Resolución de defectos detectados en las pruebas.
- Documentación de evolutivos en herramientas correspondientes.

Tareas LDA

- Aprobación estimación y planificación del desarrollo.
- Comunicación con negocio y otros equipos / sistemas para la toma de requisitos.
- Definición detallada de las historias de usuario describiendo el *definition of ready* y *done* (cubriendo según aplique flujo del caso de uso, lógica de negocio, respuestas, pruebas integradas o rendimiento, etc..).
- Gestión del backlog priorizado teniendo en cuenta la planificación y estrategia interna de LDA .
- Participación en los workshops de descripción funcional de las historias de usuario.
- Revisión y aprobación de las estimaciones
- Validación del entregable del sprint review.
- Pruebas de usuario.

Entregables

- Código fuente en repositorio de cliente.
- Pruebas unitarias creadas/actualizadas.
- Pruebas funcionales creadas/actualizadas.
- Pruebas regresión creadas/actualizadas.
- Documentación técnica correspondiente a cada evolutivo.
- Informe mensual de seguimiento del servicio.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Release manager: Tareas y entregables

Objetivo

- Mantenimiento de entorno.

Tareas Accenture

- Refresco y mantenimiento de los entornos sandbox de desarrollo y UAT.
- Revisión y aprobación de pull requests. La revisión se realizará usando las herramientas proporcionadas por LDA así como una checklist definida junto con LDA.
- Ejecución de validaciones de la subida al entorno.
- Realización de despliegues a los entornos de INTEGRACIÓN, UAT,
- Ejecución de test en los entornos de desplegados para asegurar que la subida ha sido correcta.
- Alineación de entornos, refresco de entornos tras las subidas a producción programadas (correctivos y/o evolutivos) y nuevas releases.

Tareas LDA

- Definición junto con Accenture de checklist de revisión de pull request
- Definición del backlog de despliegues.

Entregables

- Informes de despliegues.
- Actualización del estado de los despliegues en el dashboard de despliegues.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

5. Gestión del cambio y Adopción

NUESTRO FRAMEWORK | CAMBIO CONTÍNUO


Entrega de Cambio Continuo, nuestro enfoque iterativo centrado en las **personas** e **impulsado por IA y datos**, facilita que, aunque el CRM evolucione por releases, su adopción sea **continua**, **sostenible** y **medible** en toda la operación.

1. Alinear el Cambio

Desarrollar **una estrategia de cambio adaptable y orientada al valor** y un plan que se alineen con las prioridades de negocio de Línea Directa, y que apoyen una estrategia de cambio **personalizada y centrada en las personas internas y externas.**

2. Alinear la Organización

Impulsar el **liderazgo y el compromiso de los equipos** mediante la construcción de una narrativa de cambio sólida y coherente, basada en un **enfoque común**, alineando a líderes y patrocinadores en torno a una estrategia compartida.

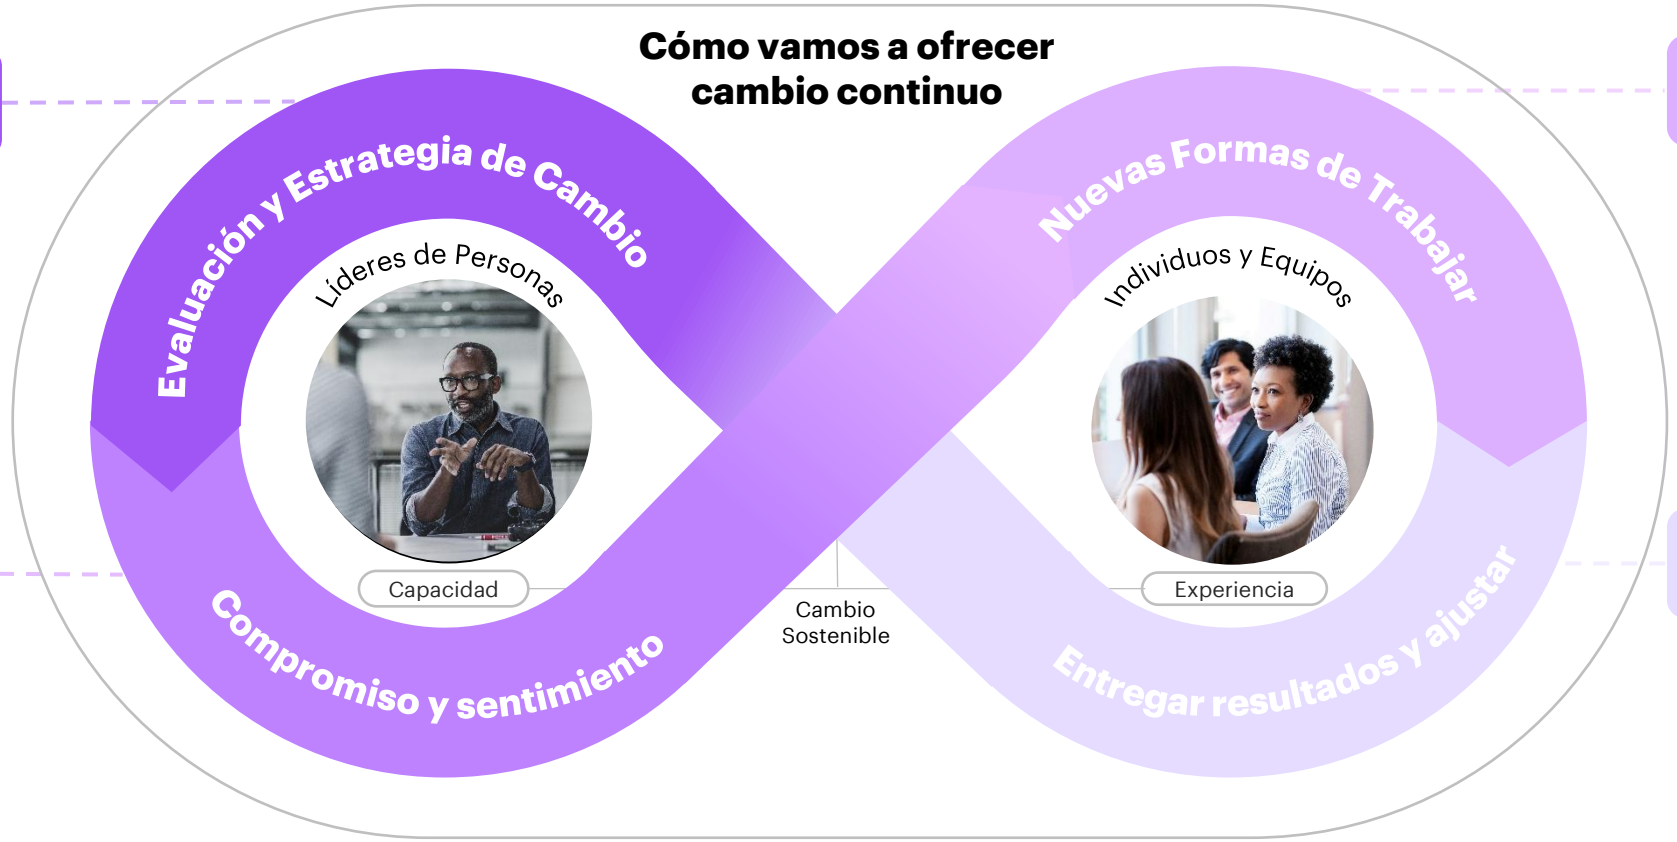

3. Activar el Cambio

Capacitar a los operadores del Contact Center y del resto de los colectivos involucrados para trabajar de con el nuevo sistema y adoptar nuevas mentalidades a través de **experiencias de aprendizaje personalizadas y entornos de práctica inmersivos.**

4. Sostener el Cambio

Supervisar el **progreso del cambio y adaptar continuamente** el enfoque de cambio para reflejar las necesidades cambiantes de los operadores, garantizando que el valor se materialice para Línea Directa.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CÓMO IMPULSAREMOS EL CAMBIO CONTÍNUO

Aplicamos la **metodología de Gestión del cambio** de Accenture, adaptada al **contexto de Línea Directa**, colocando siempre al **usuario en el centro** del proceso de cambio para promover una **adopción eficaz**, **coordinada** y **sostenible**.

OBJETIVO DEL CAMBIO	**Alinear** la transformación evaluando sus impactos, definiendo una visión clara, desarrollando el roadmap correspondiente y articulándolo con el enfoque de liderazgo para fomentar su compromiso.	**Preparar** para el cambio activando el liderazgo, creando la implicación de los grupos de interés, fomentando la concienciación y desarrollando un enfoque para monitorizar el sentimiento.	**Activar** el cambio implementando actividades y habilitación de cambio, abordando la resistencia y equipando a los equipos con las herramientas y el apoyo necesarios.	**Sostener** el cambio integrando el cambio en la cultura, reforzando comportamientos y promoviendo la mejora continua mediante conocimientos basados en datos.
ACTIVIDADES DE CAMBIO	**Evaluación y Estrategia de Cambio** • **Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos** para entender impactos en procesos, cultura y colectivos. • **Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE)** traduciendo el diseño funcional a comportamientos y capacidades. • **Identificación y priorización gaps,** según el nivel de impacto y riesgo de no adopción. • **Gobernanza y activación temprana de stakeholders** como palanca de liderazgo • **Visión compartida y estrategia de cambio** alineados con los hitos del programa • **Red de embajadores del cambio** para sostener el compromiso.	**Compromiso y Sentimiento** • **Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio** mediante un modelo de relación, gobernanza clara y dinamización continua del liderazgo. • **Plan de comunicación del cambio** con narrativa, mensajes segmentados y campañas adaptadas para acelerar la adopción.	**Nuevas Formas de Trabajar** • **Estrategia de formación y transferencia de conocimiento** Plan formativo por rol con modelo TTT para promover adopción y autonomía interna. • **Modelo de formación por oleadas** sesiones por rol y oleadas alineadas al Go-Live para maximizar impacto. • **Coaching operativo y acompañamiento en campo** Soporte intensivo post Go-Live con canales dedicados y agente de ayuda. • **Verificación de la transferencia** Evaluación, certificación e informe de estabilización con mejoras accionables.	**Entregar Resultados y Ajustar** • **Métricas de adopción y reporting** Medimos el uso y desempeño del CRM mediante KPIs y seguimiento continuo. Reportamos resultados para ajustar y optimizar la adopción. • **Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM** transferimos conocimiento, roles y materiales al CoE. Promovemos continuidad operativa y mejora continua post-proyecto.
EXPERIENCIA DE CAMBIO	Soy **consciente**... de los objetivos de la Transformación del CRM.	Estoy **comprometido**... Entiendo lo que esto significa para mí, mi papel en el estado interino y futuro, y los hitos clave.	Me estoy **transformando**... Entiendo las nuevas formas de trabajar y con quién trabajar de ahora en adelante.	Estoy **actuando**... Puedo rendir de forma eficiente en lo "nuevo" y tener nuevos comportamientos y mentalidades.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ACELERADO POR GEN AI Y ACTIVOS

Incorporamos Gen AI en las actividades que desarrollamos a través de nuestra metodología para **impulsar la adopción de manera más ágil.** Adicionalmente, Accenture cuenta con un conjunto de **activos que maximizan el impacto** de la Gestión del cambio.

GENAI

CAPACIDADES HABILITADORAS

Accenture Gen AI Reinvention Console

Reinvention Console es la plataforma interna unificada de Accenture, **impulsada por IA generativa**, que integra **soluciones, activos, conocimiento experto** y **herramientas de IA** para ayudar a los equipos a generar **valor consistente** y de **alto impacto** a lo largo de todo el proceso de reinvención.

ChatGPT Enterprise, Copilot y Agentes

Nuestros equipos cuentan con licencias de **ChatGPT Enterprise** y **M365 Copilot** como asistentes de **análisis y síntesis** dentro del proceso de Gestión del cambio.

A continuación, presentamos **3 agentes de IA** ilustrativos relevantes para este proyecto:

Synthesia

Con **Synthesia**, creamos **vídeos** basados en avatares para **personalizar** la comunicación y hacerla más **accesible** y **atractiva** para los equipos.

ILUSTRATIVOS

Agente de análisis de Impactos

Agente de análisis de Impactos que analiza la documentación de diseño detallado del CRM y **genera automáticamente una matriz de impactos por área y rol**, con su **nivel de severidad**, proponiendo además las acciones de Gestión del cambio necesarias para **asegurar la adopción**.

Agente generador de Comunicaciones

Agente que crea **correos electrónicos, publicaciones de Teams y scripts personalizados**, adaptando el tono y el estilo, tanto del remitente como del receptor, asegurando la relevancia y la completa **alineación con la narrativa del cambio y el plan de Comunicación**.

Agente generador de materiales de Gestión del cambio

Agente generador de borradores de materiales de Gestión del cambio (formación, comunicación, comités, etc.) **a partir de datos del proyecto** como impactos, KPIs, colectivos y nivel de preparación aplica de forma automática la plantilla corporativa.

ACTIVOS



Metodología y comunidad global de Gestión del cambio en CRM

Accenture cuenta con una sólida **metodología** respaldada por **activos predefinidos,** una **red global de expertos comerciales** y una plataforma colaborativa para compartir **experiencias y lecciones aprendidas**.



Transformation GPS* Monitorización continua

Herramienta que agrega datos para crear un panel interactivo de **visualización que permita el seguimiento de las actividades clave de Gestión del cambio**: Análisis de Stakeholders, Evaluación de Impacto del Cambio y Comunicación & Engagement.

** Asumimos la autorización de Línea Directa para la utilización de las herramientas de GenAI y consecuente generación de eficiencias.*

EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA

En la activación inicial del enfoque, evaluamos la **preparación al cambio** e **impacto por colectivos**.

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (1/2)

En la activación inicial del enfoque, evaluamos la **preparación al cambio** e **impacto por colectivos**.

Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos:

- **Análisis de la documentación** existente* (mapas de procesos, estudios, encuestas, …) relativa a procesos, cultura, competencias digitales, niveles de resistencia, relacionados con los cuatro grandes grupos de trabajo identificados: usuarios Contact Center, operativos, externos y consultivos.
- **Realización de 4 entrevistas** con uno/dos representantes de cada grupo impactado para analizar procesos actuales, cultura, madurez y competencias digitales, así como principales resistencias al cambio de sus principales colectivos.
- **Segmentación de colectivos en roles** (gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones).

Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE):

- **Recopilación del diseño objetivo** del CRM definido por el equipo técnico (procesos futuros, funcionalidades clave, roles y responsabilidades).**
- Traducción de ese diseño técnico a un **modelo objetivo de adopción**, enfocado en personas (comportamientos (cultura), competencias digitales clave requeridas y posibles resistencias).
- **Validación** del modelo objetivo con negocio para promover su viabilidad operativa.

Identificación de gaps, colectivos impactados y nivel de impacto

- Contraste estructurado entre el estado actual (AS-IS) y el modelo objetivo de adopción (TO-BE) para cada colectivo identificado para **identificar hasta 5 brechas** en cada una de las siguientes categorías: procesos, comportamientos (cultura), competencias digitales y posibles resistencias.
- Clasificación del **nivel de impacto** por colectivo (alto / medio / bajo).
- **Priorización** de los gaps según su criticidad para el éxito de la implantación del CRM y el riesgo de no adopción.

ENTREGABLES

- Change impact analysis (incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto)

ILUSTRATIVOS



Change Impact Analysis (CIA)

** Línea Directa proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.*

*** Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, …) quedando su elaboración fuera de alcance.*

ALCANCE DE PROYECTO | EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA (2/2)

En base a la evaluación inicial, definimos una **gobernanza** clara, **visión** compartida y una **red activa de embajadores** para impulsar la adopción.

Gobernanza y activación temprana de stakeholders

- **Identificación de los stakeholders clave** mediante **una sesión de trabajo** con los líderes del programa, para identificar los grupos, sus principales responsabilidades y nivel de impacto.
- Definir del **modelo de gobernanza** del cambio con la **involucración temprana** de los stakeholders clave, para promover su rol como palanca de adopción durante todo el proyecto.

Visión compartida y estrategia de cambio

- Definición y validación de la **estrategia de Gestión del cambio** y **roadmap** alineado con los hitos del programa y la participación explícita de las áreas de **Personas y Comunicación**.

Red de embajadores del cambio

- **Identificar a los embajadores** seleccionados en una lista de Excel*.
- Definir un **plan de activación** para mantener a los embajadores activos y comprometidos durante todo el proyecto.

ENTREGABLES

- Mapa de stakeholders y sponsors y plan de activación de la red de cambio
- Roadmap de adopción

ILUSTRATIVOS



Mapa de stakeholders



Roadmap de Adopción

ALCANCE DE PROYECTO | COMPROMISO Y SENTIMIENTO (1/1)

Activamos el **liderazgo y una comunicación estructurada** para **alinear a los colectivos clave y acelerar la adopción** del cambio a lo largo del proyecto.

Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio

- Puesta en marcha del **modelo de relación**, incluyendo la cadencia de reuniones, para recoger feedback continuo y promover el alineamiento de los mensajes clave.

Plan de comunicación del cambio

- Definición de la **estrategia y el plan de comunicación**, junto con el equipo del programa y las áreas de Personas y Comunicación.
  - Alineamiento sobre **la narrativa del proyecto, los mensajes clave y el branding interno**, asegurando una comunicación segmentada **según el perfil del usuario**, definiendo emisores, calendarios y audiencias, usando los siguientes canales: email/ Iseazy/ Microsoft Teams.
  - Diseño de un **plan de comunicación**, definiendo acciones, formatos, calendario, grupos de trabajo objetivo e indicadores objetivo.
- **Despliegue de campañas de comunicación** adaptadas, orientadas a generar conocimiento y comprensión de los cambios en sistemas, procesos y cultura, mediante un enfoque multicanal.*
- **Adaptación de materiales de comunicación** corporativos a los distintos contextos de cada grupos de trabajo impactado.

ENTREGABLES

- Narrativa del cambio y kit de identidad visual (branding)
- Estrategia, plan y materiales de comunicación

ILUSTRATIVOS





Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (1/3)

Profundizamos en cómo **capacitamos e impulsamos la adopción** de Línea Directa.

Dado el número de usuarios implicados, proponemos ofrecer la formación en el modelo **Train the Trainers** alineada con las necesidades de cada audiencia.

ENFOQUE DE FORMACIÓN:

Involucrar a los usuarios clave desde el principio permitirá a Línea Directa mantener el **conocimiento internamente**, permitiendo operar de forma más autónoma en el futuro.
Además, Línea Directa dependerá de **agentes de cambio** internos para facilitar la adopción de **nuevas formas de trabajo** y la **cultura** generada por esta transformación comercial.

AUDIENCIA


01 Operadores


02 Supervisores


03 Back office


04 Perfiles mixtos

- **El número de trainers (formadores)** considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 trainer por cada 40-50 usuarios finales, con perfil mixto conocimiento técnico y skills (comunicación, liderazgo, ...).

FOCO

Por Releases de producto por ejemplo: Ficha cliente, Hogar, Coches, Motos, Salud, Empresas, Fidelización....

APPROACH

- Enfoque de formación de **Train The Trainers (TTT)* en oleadas**, con fechas cercanas al Go-Live, para elevar el conocimiento de los formadores.
- **Sesiones TTT** (en español): diseñadas para promover una comprensión óptima de la nueva herramienta por producto y colectivo. La formación se organiza por **oleadas**, garantizando que en cada release se imparta como **máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos con necesidades formativas equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
  - ✓ Oleada 1: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleada 2: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Oleada 3: hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - ✓ Cada sesión durará como máximo 3 horas para cubrir actividades generales con ejercicios prácticos y presentaciones de apoyo.
  - ✓ Actividades de simulaciones con gamificación como juegos de rol y concursos se incluirán en las sesiones.

MATERIALES

- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol y vídeos** (en español) sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
  - Máximo 2 vídeos por herramienta realizados con grabación de pantalla y PPT.
  - Los manuales desarrollados en PPT.

** Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc..)*

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (2/3)

Capacitamos a los usuarios por **rol y oleadas** para promover una **adopción efectiva** del nuevo CRM.

Estrategia de formación y transferencia de conocimiento

- **Diseño del plan de formación y transferencia** orientado a garantizar la adopción efectiva del nuevo CRM por rol y alineado a cada release.
- **Identificación de itinerarios formativos** y su diseño a alto nivel para los roles de operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos.
  - **Audiencia:** El número de superusuarios (formadores) considerados por grupo de trabajo en una proporción de 1 superusuario por cada 40 usuarios finales.

Modelo de formación por oleadas

- **Sesiones TTT (en español):** diseñadas para promover una comprensión óptima de la nueva herramienta por **producto y colectivo**, incluyendo aprendizaje teórico y práctico. La formación se organiza **por oleadas**, garantizando que en cada release se imparta **como máximo una sesión de formación por tipo de colectivo**, priorizando la **agrupación de colectivos** con necesidades formativas **equiparables** para maximizar eficiencia y coherencia.
  - **Oleada 1:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - **Oleada 2:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
  - **Oleada 3:** hasta 1 sesión TTT por colectivo (Operadores, Supervisores, Back office y perfiles mixtos).
- Las sesiones se impartirán de forma **presencial** en Madrid y, cuando sea necesario, en formato híbrido, ajustándonos a los horarios que más convengan al negocio.
- Creación de **plantillas de manuales operativos por rol** y **vídeos (en español)** sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta que afectan a sus actividades diarias:
  - Máximo 2 vídeos por herramienta y se harán con grabación de pantalla y PPT.
  - Los manuales se harán en PPT.

ENTREGABLES

- Estrategia y plan de formación
- Presentaciones, sesiones Train the Trainers, videos por herramienta y manuales formativos

ILUSTRATIVOS



Plan y sesiones de formación

Demo Vídeos

**Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.*

ALCANCE DE PROYECTO | NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR (3/3)

Cómo **acompañamos** a los usuarios para promover la **estabilidad operativa** en el Go-Live.

Coaching operativo y acompañamiento en campo

- **Acompañamiento** intensivo durante el primer mes uso real tras cada release, con la creación de canales en Teams que aborden los distintos pilares de adopción, por ejemplo:
  - **Canal de coaching**: segmentado por los 4 roles (operadores, supervisores, back office y perfiles mixtos). Incluye toda la documentación relacionada con la formación, gamificación y retos para las sesiones de formación.
  - **Canal de apoyo:** canal de preguntas frecuentes para formadores.
  - **Canal de feedback:** envío de encuestas para entender cómo los empleados se sienten durante el programa respecto a la comunicación, la formación y las formas de trabajar, permitiéndonos entender sus necesidades y ajustar la estrategia de adopción cuando sea necesario.
- Desarrollo de un **agente* de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini** para resolver las preguntas de los usuarios. Para facilitar respuestas precisas, el agente deberá alimentarse con materiales relacionados con el proyecto (como los manuales operativos).
- Las cuestiones planteadas se resuelven principalmente en estos canales, escalándose a las reuniones de gobierno pertinentes únicamente las cuestiones más críticas.

Mecanismos formales de verificación de la transferencia

- **Evaluación /certificación** teórico-práctica obligatoria al finalizar la formación. El % de % superación / recertificación y la actuación en los supuestos de no recertificación se decide durante el proyecto conjuntamente con Sabadell.

**Para el caso de este agente, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.*

ENTREGABLES

- Canales de acompañamiento (MS Teams)
- Agente de IA para soporte y adopción del CRM
- Informe de estabilización post Go-Live

ILUSTRATIVOS



Informe de estabilización

ALCANCE DE PROYECTO | ENTREGAR RESULTADOS Y AJUSTAR (1/1)

Medimos la adopción, aseguramos la **sostenibilidad y transferimos capacidades** para una operación CRM **estable y autónoma**.

Métricas de adopción y reporting

- Las siguientes métricas se obtendrán a partir de **encuestas** y de la información proporcionada por la **herramienta CRM.**
- **Definición de métricas de adopción y uso** por colectivo para medir nivel de uso del CRM por rol, grado de utilización de funcionalidades clave y comparativa entre colectivos.
- **Definición y seguimiento de KPIs de eficiencia operativa**, utilizando como baseline los KPIs actuales, definidos en base a la eficiencia y la gestión comercial, para medir reducción de tiempos operativos y mejora en rendimiento tras la implantación.
- **Seguimiento de curva de aprendizaje** para analizar evolución del desempeño durante las primeras semanas y detectar necesidades de refuerzo.
- **Medición de satisfacción del usuario** para evaluar percepción de utilidad, facilidad de uso y nivel de adopción mediante encuestas breves.
- **Análisis de incidencias funcionales repetitivas** para identificar fricciones en procesos o gaps formativos y **activar acciones correctivas.**
- **Reporte periódico de adopción** (semanal durante el primer mes de la release y mensual a continuación) para promover seguimiento continuo y toma de decisiones basada en datos.
- **Informe de estabilización** al cierre del primer mes, con análisis de feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora.

Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM

- 1 sesión **final de transferencia de conocimiento** con los stakeholders clave identificados.
- **Definición de roles y responsabilidades** para la operación futura con una **matriz RACI** incluida en la sesión final.*
- **Entrega de materiales finales** como parte de la sesión final para garantizar que el CoE dispone de la información necesaria para operar y dar soporte al CRM.
- **Recomendaciones de mejora continua** documentadas como parte de la sesión final para facilitar una adopción sostenible a largo plazo.

ENTREGABLES

- Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint
- Documento de sesión de transferencia final

ILUSTRATIVOS



Reporte de métricas de adopción

**Modelo Operativo definido por LDA.*

LISTADO DE ENTREGABLES

Entregable	Tipo de trabajo	Contenido orientativo	Línea de trabajo
Change impact analysis	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye el modelo AS-IS, el TO-BE, la identificación de gaps y la clasificación del nivel de impacto por grupo de trabajo en Excel.	Gestión del cambio
Mapa de stakeholders y sponsors	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye un mapeo de stakeholders clave en PPT, análisis de influencia de impacto, definición de sponsors y estrategia de involucración.	Gestión del cambio
Roadmap de adopción	Evaluación y Estrategia de Cambio	Incluye una hoja de ruta de Gestión del cambio alineada al programa, hitos clave, palancas de adopción y plan de seguimiento en formato PPT.	Gestión del cambio
Narrativa del cambio	Compromiso y sentimiento	Narrativa del cambio con mensajes claros, propuesta de valor del cambio y kit de identidad visual (branding) en formato PPT.	Gestión del cambio
Estrategia, plan y materiales de comunicación	Compromiso y sentimiento	Incluye estrategia segmentada por colectivos, plan editorial y calendario en formato PPT, definición de canales y desarrollo de materiales de comunicación.	Gestión del cambio
Estrategia y plan de formación	Nuevas Formas de Trabajar	Plan formativo por rol y releases con modelo Train the Trainers (TTT) que define itinerarios formativos, oleadas alineadas al Go-Live, criterios de agrupación de colectivos con necesidades equiparables y mecanismos de transferencia de conocimiento para promover la adopción y autonomía interna en formato PPT.	Gestión del cambio
Train the Trainers y vídeos	Nuevas Formas de Trabajar	Presentaciones y sesiones TTT en español por rol y oleadas, con un máximo de sesión por tipo de colectivo y release. Incluye la creación de manuales operativos por rol y vídeos formativos desarrollados en PPT y grabación de pantalla, alineados a las funcionalidades del CRM.	Gestión del cambio
Canales de acompañamiento	Nuevas Formas de Trabajar	Canales en MS Teams segmentados por rol para coaching, soporte continuo y gestión de feedback y acceso a materiales de formación durante el post Go-Live en PPT.	Gestión del cambio
Agente de IA para soporte y adopción CRM	Nuevas Formas de Trabajar	Agente conversacional de IA para soporte al usuario, integrado en el entorno de trabajo, entrenado con materiales del proyecto (manuales, FAQs, guías operativas) para resolver dudas funcionales y apoyar la adopción del CRM durante el uso diario.	Gestión del cambio
Informe de estabilización	Nuevas Formas de Trabajar	Informe post Go-Live con análisis de adopción, feedback, curva de aprendizaje y acciones de mejora en PPT.	Gestión del cambio
Informe de métricas y Reporte	Entregar Resultados y Ajustar	Informe de métricas y reporte de adopción en PowerPoint periódico para seguimiento y toma de decisiones en formato PPT.	Gestión del cambio
Documento final de transferencia	Entregar Resultados y Ajustar	Documento de sesión final con transferencia al CoE, RACI definido y recomendaciones de mejora continua en formato PPT.	Gestión del cambio

PLAN DE TRABAJO DYNAMICS: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

El plan de trabajo de Gestión del cambio se estructura integrando las fases de nuestra metodología en el desarrollo propio del proyecto y las correspondientes releases


Fase	Actividad	Abr – M1	May – M2	Jun- M3	Jul - M4	Ago - M5	Sep - M6	Oct - M7	Nov - M8	Dec M9	Ene M10	Feb M11	Mar M12	Abr M13	May M14	Jun M15	Jul M16	Ago M17	Sep M18	Oct M19	Nov M20	Dec M21	Ene M22
	• Análisis del punto de partida (AS-IS) y colectivos																						
	• Aterrizaje del modelo objetivo de adopción (TO-BE)																						
	• Identificación y priorización gaps,																						
	• Gobernanza y activación temprana de stakeholders																						
	• Visión compartida y estrategia de cambio																						
	• Red de embajadores del cambio																						
	• Implicación de stakeholders clave y activación de la red de cambio							R1						R2					R3				
	• Plan de comunicación del cambio						DEF	DES R1						DES R2					DES R3				
	• Estrategia de formación y transferencia de conocimiento						DEF																
	• Modelo de formación por oleadas							DES R1	EJE R1					DES R2	EJE R2				DES R3	EJE R3			
	• Coaching operativo y acompañamiento en campo								R1						R2					R3			
	• Verificación de la transferencia																						
	• Métricas de adopción y reporting							DEF	EJE R1						EJE R2					EJE R3			
	• Plan de sostenibilidad y transición al CoE CRM																						

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

6. Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

La implantación del nuevo CRM se articula en fases progresivas con hitos claros, asegurando una ejecución controlada, predecible y orientada a valor, minimizando el riesgo operativo y garantizando la continuidad del negocio de Línea Directa.

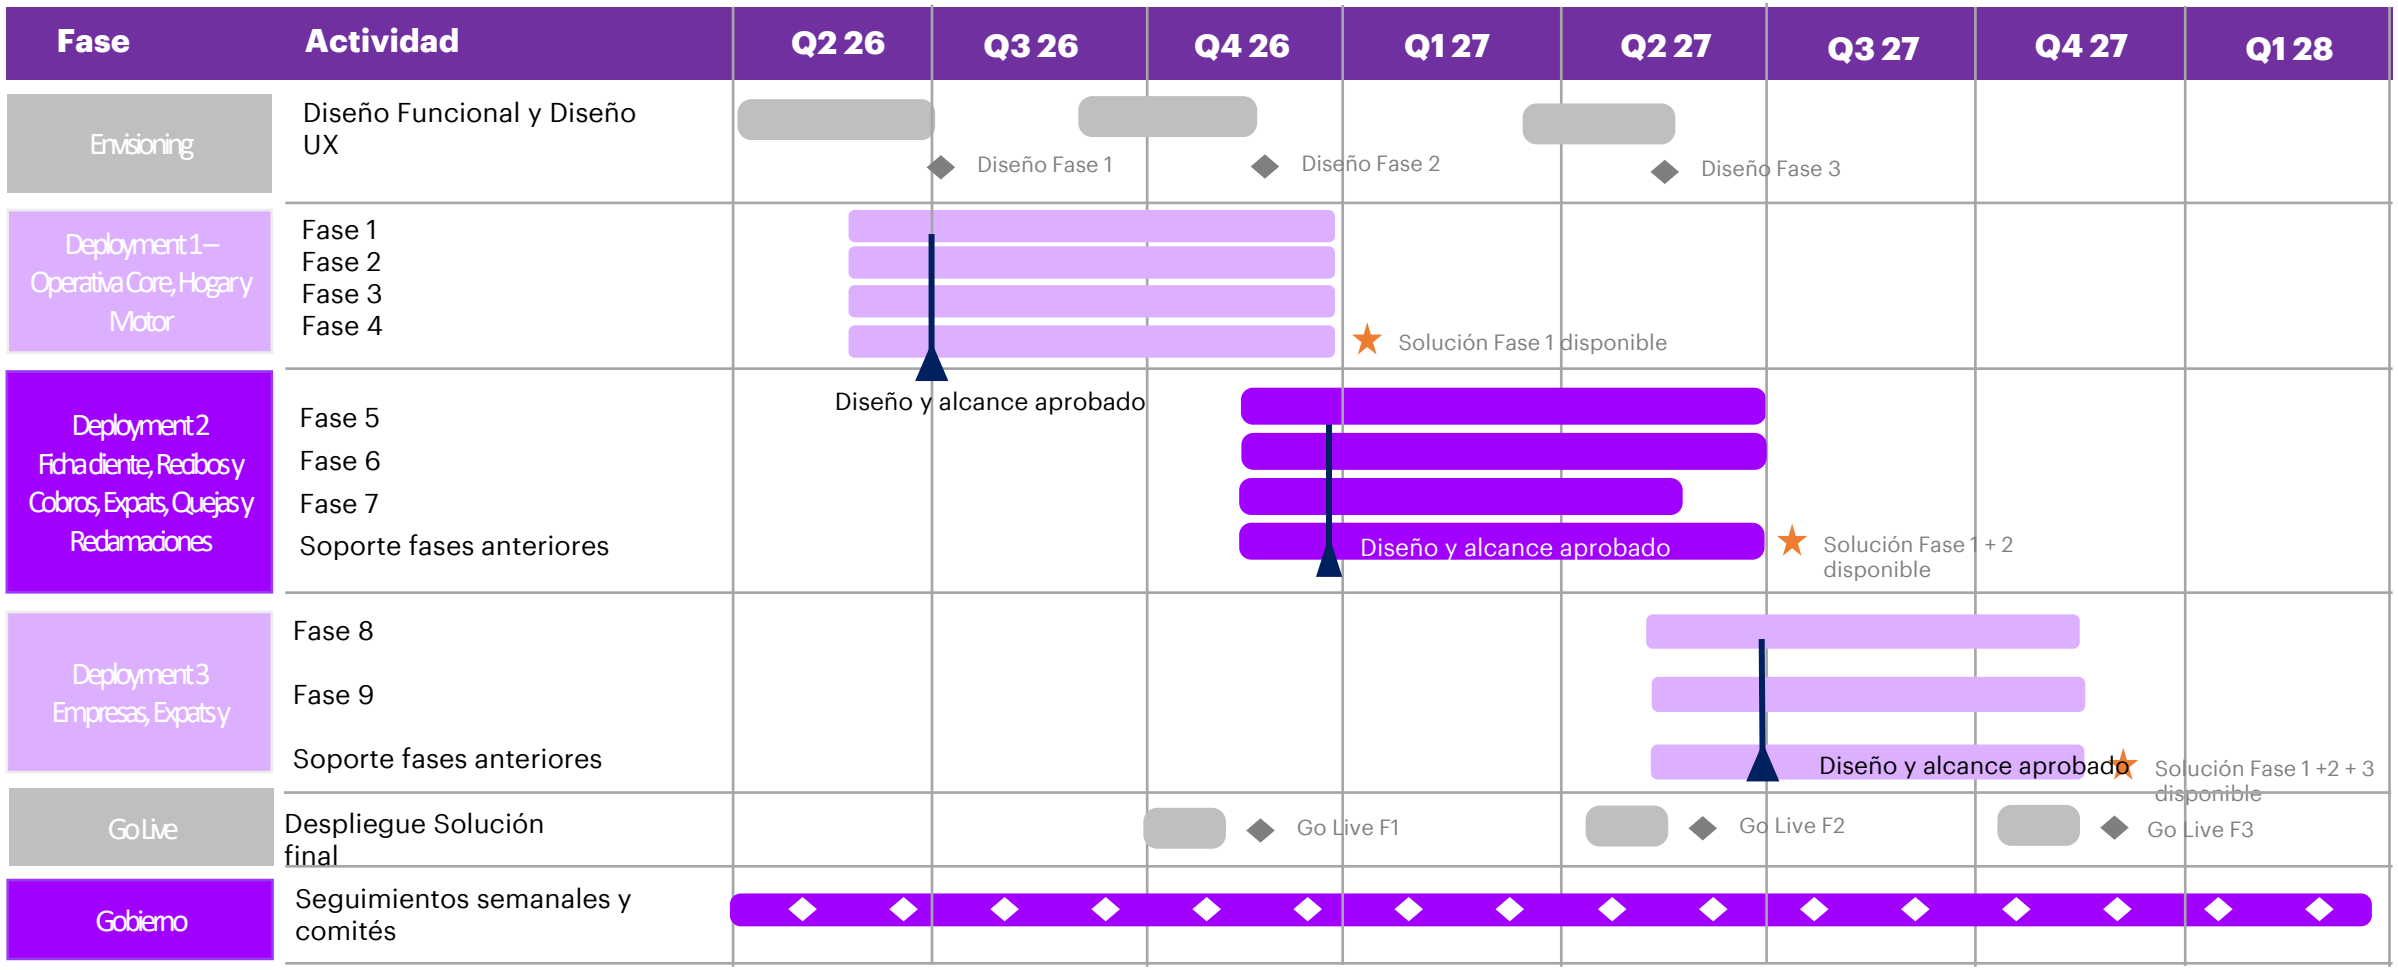

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

METODOLOGÍA – ADF FOR BUSINESS APPS

Se propone utilizar la metodología de Avanade Delivery Framework (ADF) for Business Apps en el proyecto para la implementación de Dynamics 365 Customer Engagement

Esta metodología está definida por Avanade dentro de nuestro modelo global de delivery. ADF for Business Apps incluye las prácticas recomendadas de Microsoft Solutions Framework (MSF), metodologías Avanade y experiencias de proyectos Accenture. La metodología combina definiciones, plantillas y prácticas para promover la eficiencia, la coherencia y la calidad. ADF proporciona un marco para desarrollar soluciones CRM de forma consistente.



PLAN

- Realizar planificación de proyectos, evaluación detallada de ajuste y mapas de ruta basados en soluciones preconfiguradas, establecer el equipo de proyecto y refinar el contenido creado en la evaluación



ANÁLISIS

- Definir el backlog basándose en un análisis de la funcionalidad por defecto de la herramienta y los GAPs debidos a los requisitos y necesidades
- Este Backlog es una descripción de los procesos de negocio funcionales y técnicos



DISEÑO

- Refinar una descripción detallada de los procesos de negocio, funcionales y técnicos
- Requisitos basados en soluciones preconfiguradas



CONSTRUCCIÓN

- Configuración, construcción y pruebas unitarias de procesos de negocio, funciones de aplicación, técnicos e integraciones.



PRUEBA INTEGRADA

- Evaluación de los Planes de Prueba para abarcar toda la solución y todos los puntos de contacto de integración en escenarios empresariales de extremo a extremo.
- Formalizar las pruebas de la solución completa.



UAT

- Aceptación por parte del usuario y pruebas de prueba para asegurar la preparación de la solución para la operación en producción
- Posteriormente a la aceptación despliegue de la solución



Go Live


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

PLAN DE TRABAJO: FASES, HITOS Y ENTREGABLES

Plan de implantación en cada fase

Validación inicial pre-construcción

Plan | Análisis | Diseño | Construcción | Prueba integrada | UAT | Despliegue



Tareas

- Identificación de áreas e interlocutores
- Refinamiento de requerimientos
- Identificación de riesgos
- Definición del plan de solución

- Workshops para refinamiento de requerimientos
- Reunión de validación de requerimientos

- Diseño técnico de la solución

- Construcción y configuración de la herramienta.
- Definición de Test
- Plan de Despliegue

- Pruebas integradas

- Pruebas integradas con usuario final

- Completar documentación
- Corrección y estabilización
- Puesta en producción

Entregables

- Definición de Alcance del proyecto
- Planificación detallada

- Arquitectura de la solución

- Diseño funcional/técnico de la solución

- Caso de uso de test

- Plan de despliegue

- Registro de incidencias

Principales Dependencias

- Disponibilidad de los usuarios clave y responsable del Proyecto


- Entorno de DEV CRM

- Entorno de Test / Pre-Prod y Prod

- Usuarios clave para realización de las pruebas
- Datos de ejemplo para las pruebas
- Solución en los entornos de Test / Pre-Prod y Prod

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIO

- Un cambio es cualquier tipo de modificación o ampliación que afecte al alcance del trabajo del proyecto definido en este documento. Un cambio es también cualquier modificación de un resultado entregable ya aceptado por LDA.
- Un cambio puede ser una actualización, una mejora, una ampliación o una corrección, y puede estar motivado por:
  - **Cambios en el alcance y/o identificación de nuevos componentes.**
  - **Variaciones en el equipo de trabajo y/o en la dedicación de sus miembros.**
- El objetivo del control de cambios es identificar, documentar, realizar un seguimiento y acordar los cambios que se realizan para dejar claro el alcance de los mismos, y estimar su impacto en la planificación y los costes, ya que se trata de una modificación del alcance inicial.
- Una vez que LDA acepta la funcionalidad y el coste del cambio, se volverá a planificar el proyecto para llevarlo a cabo.

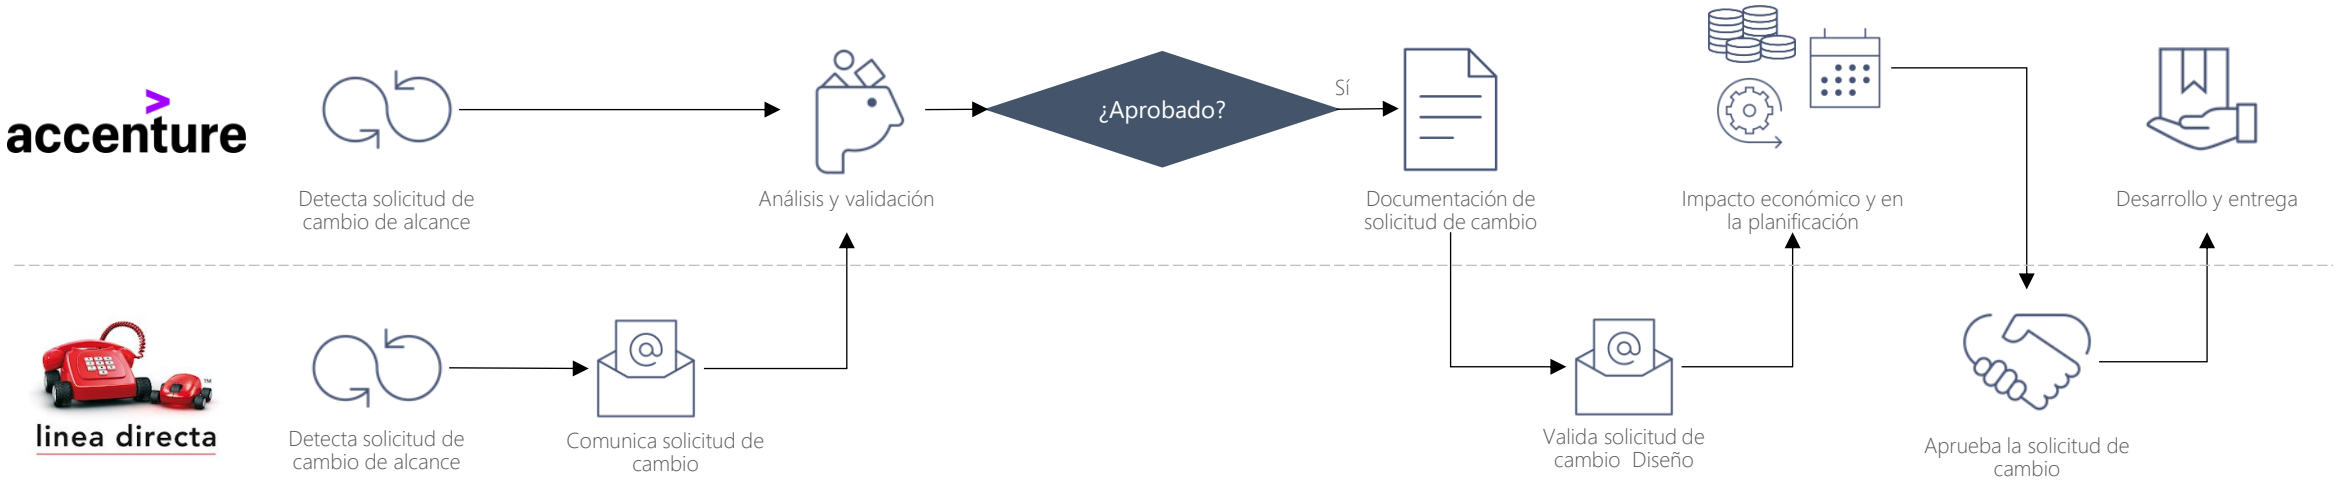


Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

Gestión de problemas

Dado que la resolución de los problemas podría exigir la atención del nivel estratégico, se desarrollará un proceso de escalado detallado y dichos problemas se remitirán al correspondiente comité del proyecto conforme a su nivel de importancia e impacto. Se prestará especial atención a los problemas que cumplan los siguientes criterios:

- Problemas decisivos para la misión.
- Problemas pasados (decisivos para la misión, altos, medios, bajos).
- Problemas de importancia alta, media y baja con fecha de vencimiento en el mes siguiente.
- Nuestro enfoque habitual de progresión de los problemas para nuestros clientes se detalla en la imagen siguiente.

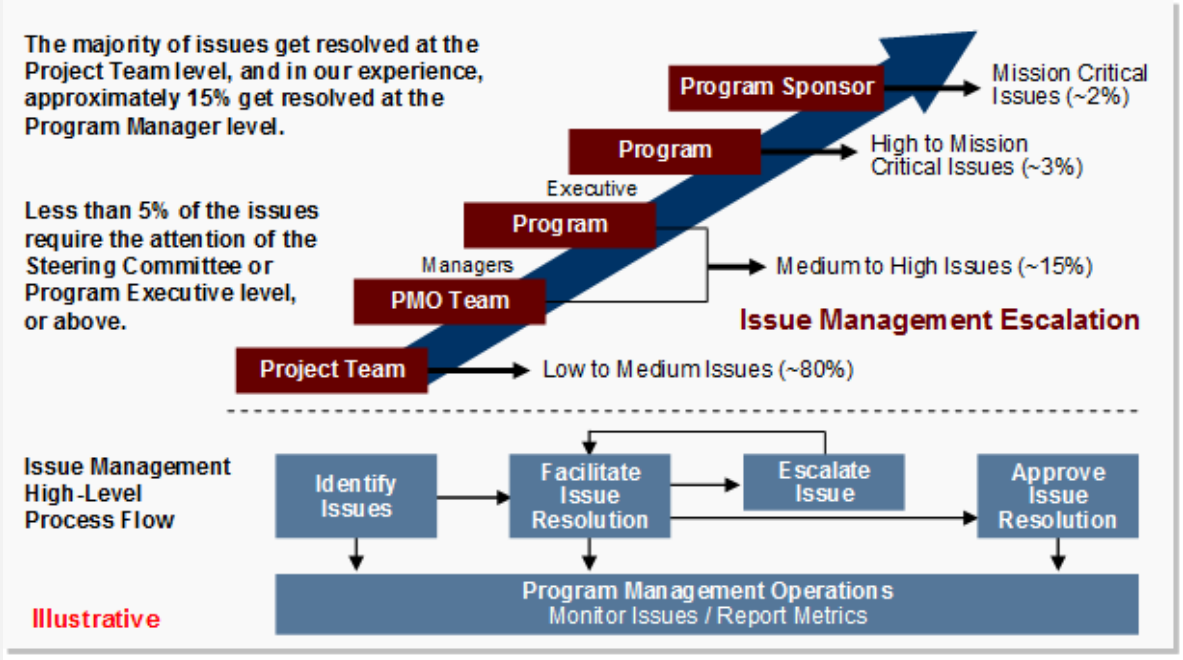


EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se detalla el equipo propuesto para la implantación y soporte de la herramienta durante la ejecución de la implantación:

IMPLEMENTACIÓN + MANTENIMIENTO EN CURSO


A continuación, se detalla el equipo propuesto para la implantación y soporte de la herramienta durante la ejecución de la implantación:

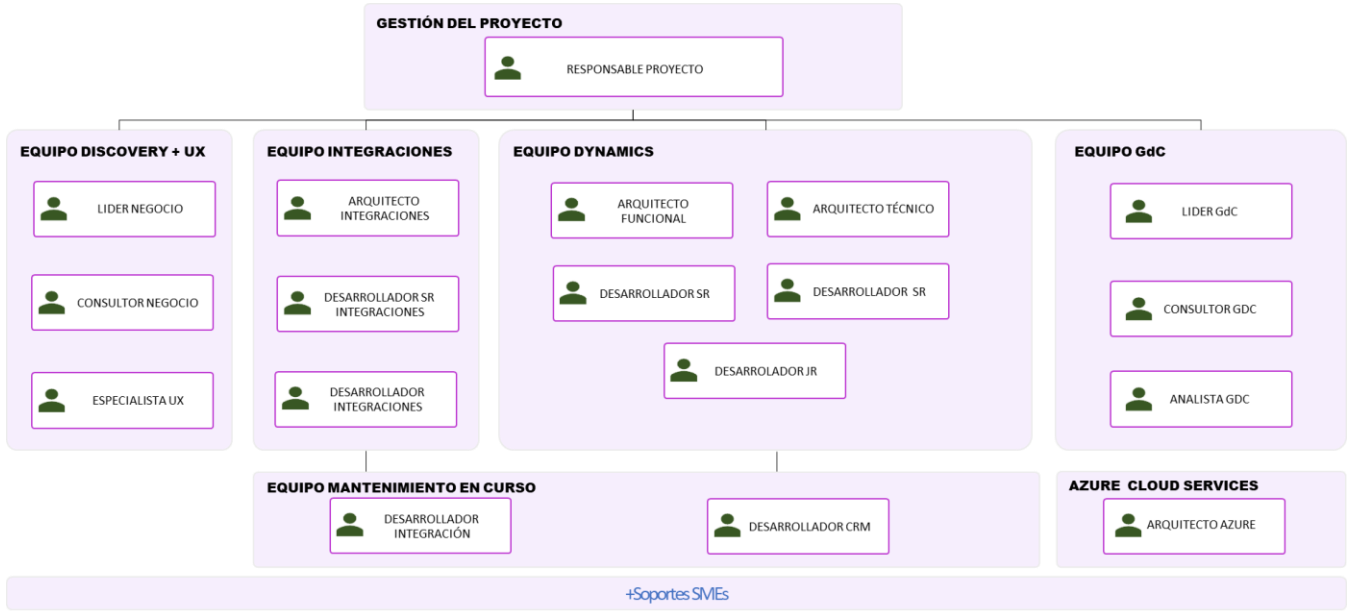

Modelo de trabajo:
Respecto a modelo de trabajo se propone un híbrido, en particular para las líneas de trabajo de Funcional y Gestión del cambio, compaginando presencialidad en las oficinas de Línea Directa cuando sea necesario con trabajo remoto.

MANTENIMIENTO EXTENDIDO

A continuación, se detalla el equipo propuesto para los 12 meses de mantenimiento extendido:

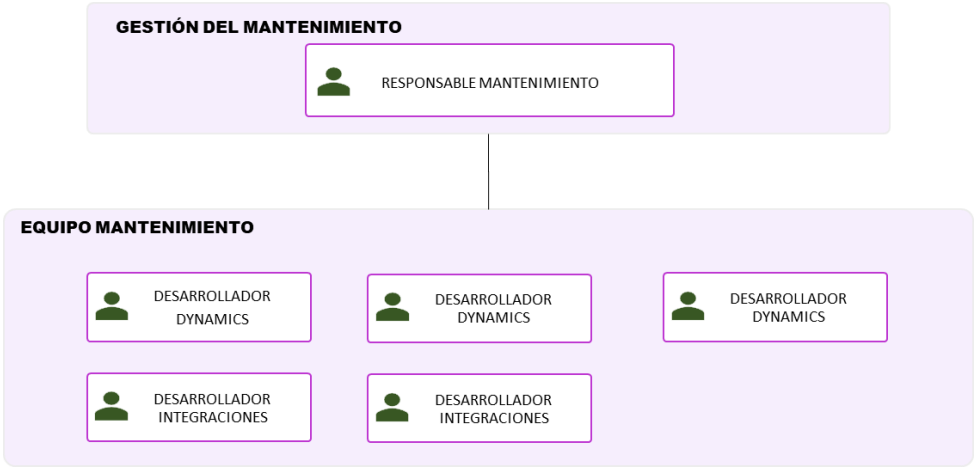

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

Roles y perfiles del equipo

RESPONSABLE PROYECTO	Participa en el comité de seguimiento. Es el responsable final del proyecto en cuanto ejecución y satisfacción del cliente. Gestiona la planificación del proyecto, haciendo velar por el cumplimiento de hitos y entrega, y la parte económica del Proyecto.
ARQUITECTO TÉCNICO	Responsable del gobierno técnico y la arquitectura de Dynamics 365, definiendo estándares, estrategia de entornos y despliegues. Lidera la validación técnica de las soluciones, coordina al equipo y actúa como referente frente al cliente y Microsoft.
ARQUITECTO INTEGRACIONES	Responsable de definir y gobernar la arquitectura de integración del proyecto, promoviendo la correcta comunicación entre Dynamics 365, y sistemas externos. Diseña los patrones de integración, revisa la seguridad y el rendimiento, y valida técnicamente las integraciones durante todo el ciclo del proyecto.
ARQUITECTO FUNCIONAL	Responsable de definir y validar la arquitectura funcional y técnica de Dynamics 365 del proyecto, promoviendo alineación con las especificaciones acordadas y los estándares de la plataforma. Lidera las decisiones técnicas clave, supervisa la calidad de la solución y actúa como referente técnico frente al cliente y el equipo..
DESARROLLADOR SR	Responsable del análisis funcional y técnico avanzado, liderando el diseño de la solución y la configuración compleja del sistema. Coordina con arquitectura y desarrollo, valida la solución y promueve la correcta cobertura de las especificaciones acordados.
DESARROLLADOR JR	Responsable de la configuración funcional de Dynamics 365 y el soporte a las actividades del proyecto. Participa en pruebas, documentación y soporte al usuario, ejecutando tareas bajo la supervisión del analista senior y la arquitectura definida.
DESARROLLADOR SR INTEGRACIONES	Responsable del análisis y diseño detallado de las integraciones, participando activamente en la definición funcional y técnica de los flujos entre sistemas. Ejecuta y valida integraciones complejas, coordina con arquitectura y desarrollo, y promueve la calidad y estabilidad de las soluciones integradas.
DESARROLLADOR JR INTEGRACIONES	Responsable del análisis, modelado y validación de los datos del proyecto, asegurando su calidad, consistencia y trazabilidad. Transforma datos en información útil para la toma de decisiones y colabora con negocio y arquitectura en la definición de métricas y reporting.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES - MATRIZ RACI

TAREA	LDA	ACN
Pre-Work y Plan		
Incorporar las actividades de todas las partes interesadas en un plan general de ejecución siguiendo el calendario de esta propuesta	A	R
Informar a todas las partes interesadas sobre el calendario de entrega y el alcance (kick-off)	I	R, A
Obtención, seguimiento sobre las entregas del alcance de las terceras partes de acuerdo con los plazos de la propuesta	R, A	I
Preparación de los entornos (DEV, INT, UAT, PROD)	R, A	I
Análisis y Diseño		
Planificación, programación y ejecución de workshops para el alcance		R, A
Priorización de requerimientos con Negocio	R,A	C
Creación de un diseño funcional y técnico para el alcance		R, A
Prototipado UX de la solución	A,C	R
Mejoras del alcance transferidas a las solicitudes de cambio	A, R	A,R (*)
Construcción, Prueba Integrada y UAT		
Completar el ciclo de desarrollo y pruebas (SIT(INT), Regression (UAT)) sobre la base del diseño funcional y técnico aprobado para el alcance de los servicios contratados con Accenture		R, A
Ejecución de las pruebas en sistemas terceros de LDA que afecten a la solución implementada por Accenture	R	I
Creación de matriz de pruebas de UAT	R	C
Preparación de set de datos para la UAT para la solución implementada por Accenture	I	R
Ofuscación o anonimización de datos para el testing	R	I
Realización de las pruebas UAT y ok al entorno de UAT	R,A	I
Definición de entidades y datos a migrar	R,A	C
Diseño técnico de migración	A,C	R
Extracción de datos del sistema origen	R,A	C,I
Ejecución de la migración	C,A	R
Validación funcional de datos migrados	R	I
Despliegue		
Despliegue desde Dev hasta UAT de la funcionalidad desarrollada por Accenture	I	R, A
Despliegue de UAT a Prod de la funcionalidad desarrollada por Accenture	A,R	C
Desarrollo del ciclo de pruebas Smoke Test y Regresión	A,T	I
Actualización de versión en los entornos de Dynamics/actualizaciones de versión	R,A	I
Creación de usuarios en entonos no productivos	A	R
Creación de usuarios en entonos productivos	R,A	C,I

TAREA	Línea Directa	Accenture
Gestión del cambio y adopción		
Entrega documentación AS-IS del CRM actual y TO-BE de sistemática comercial. Selección de embajadores. Definición del modelo operativo	R	I
Entrega documento de análisis de impactos	C	R
Mapa de stakeholders y sponsors y Roadmap de adopción	I	R
Planificación y definición estrategia de comunicación	A	R
Comunicación a externos	R	I
Definición de los usuarios a formar (modelo formación a formadores) y su disponibilidad	R,A	I
Calendarización de los workshops de formación	A	R
Ejecución de los workshops de formación	I	R,A
Acompañamiento en la fase de adopción de la herramienta – Informe de métricas y reporte de adopción	A	R
Metodología y Gobierno		
Gestión de riesgos	A	R
Gestión de dependencias	R	I
Seguimiento de hitos y entregables		R,A
Gestión del plan maestro y reporting ejecutivo	A	R
Gestión de decisiones y escalados	A	R

* Ambas partes podrás proponer cambios de alcance y deberán acordar el contenido de éstas

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.


MODELO DE RELACIÓN

Accenture propone **modelo de gobernanza** basada en una estructura flexible de tres niveles (mostrada a continuación) para proporcionar una visibilidad transparente y detallada de la aplicación y del estado del proyecto al cliente. Esto puede personalizarse según los requisitos y preferencias del cliente. Este proyecto se basa en la metodología especifica ADF para BA. Por ello, ha definido reuniones operativas para hacer seguimiento de tareas e impedimentos. La frecuencia de las reuniones estratégicas y tácticas será "bajo demanda".

El enfoque de Accenture respecto a la gobernanza del proyecto estará alineado con la estructura del Cliente para gestionar de forma cooperativa la prestación de servicios en tres niveles: estratégico, gerencial/táctico y operativo.

Los tres niveles corresponden a nuestro modelo de gobernanza de tres niveles:

- Nivel Estratégico - Estos se formalizarían en acuerdo con el cliente y sirven para representar el estado general de la interacción y el rendimiento.
- Nivel gerencial/ táctico - Estos se formalizarían en acuerdo con el cliente y para representar el estado general del proyecto y el rendimiento
- Nivel Operativo (Transaccional) – Estos reflejan el estado y el rendimiento diario del proyecto.

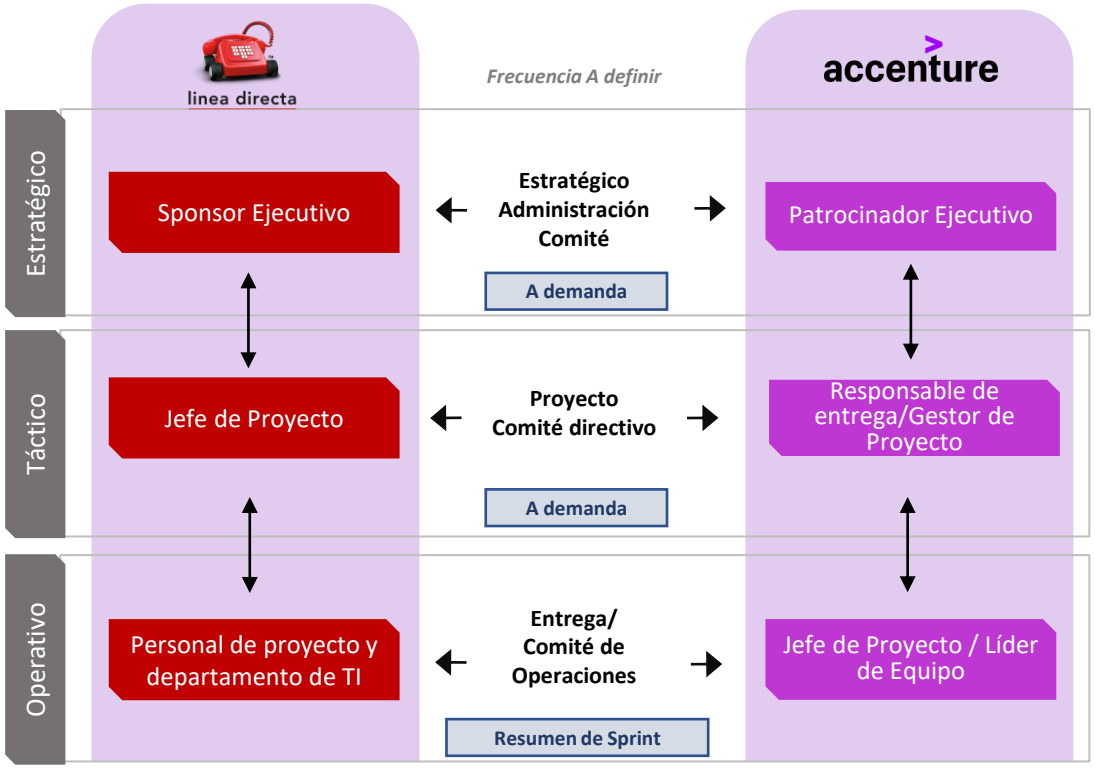

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

LISTADO DE ENTREGABLES

Documento de Kickoff	Documento introductorio del proyecto,, alcance y marco general de trabajo. Sirve como punto de partida para el resto de la documentación, proporcionando una visión global de la solución y del enfoque seguido durante el proyecto.	PowerPoint
Análisis Funcional	Documento que recoge el análisis funcional de la solución, describiendo los procesos de negocio, requisitos funcionales y casos de uso identificados. Define cómo la solución da respuesta a las necesidades del negocio y sirve de base para el diseño técnico y la implementación.	Word
Diseño Técnico - Dynamics 365	Documento técnico específico de Dynamics 365, que detalla la configuración de la plataforma, las entidades y componentes utilizados, las customizaciones realizadas y el uso de capacidades estándar y extendidas. Proporciona una referencia técnica para la implementación y mantenimiento de la solución en Dynamics 365.	Word, Excel *
Diseño Técnico - Arquitectura	Documento que describe la arquitectura técnica de la solución, incluyendo los componentes principales, su interacción, los entornos, patrones de diseño y decisiones arquitectónicas adoptadas. Permite entender la estructura global de la solución y promueve su coherencia, escalabilidad y sostenibilidad.	Word, PowerPoint
Diseño Técnico - Integraciones	Documento técnico que recoge la documentación detallada de las integraciones implementadas, describiendo las APIs utilizadas, los flujos de información entre sistemas, la gestión de errores y excepciones, así como pautas de troubleshooting. Sirve como referencia para la operación y soporte de las integraciones.	Word, PowerPoint
Manual de Usuario	Documento dirigido a los usuarios finales, que describe el uso funcional de la solución, los principales procesos y funcionalidades, y las pautas de operación en el día a día. Facilita la adopción de la herramienta y el uso correcto de la solución	Word
Manual del Administrador I - Dynamics 365 / Power Platform	Documento orientado a los administradores de la plataforma, que detalla las tareas de administración, configuración y gestión de Dynamics 365 y Power Platform. Incluye pautas para la gestión de entornos, usuarios, configuraciones y elementos funcionales de la plataforma.	Word
Manual del Administrador II - Azure	Documento técnico dirigido a los administradores de la infraestructura en Azure, que describe la gestión de los recursos desplegados, configuraciones clave, aspectos de seguridad, monitorización y operación de los componentes en la nube. Facilita la administración, soporte y mantenimiento de la infraestructura.	Word

Ver los entregables específicos de Gestión del cambio en sección 6.

*El listado de componentes técnicos de la solución será entregado en Excel

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

7. Consideraciones

CONSIDERACIONES

GENERALES:

- **Reunión de Inicio (Kick-Off):** Celebración de una reunión de inicio del proyecto (Kick-Off) con una antelación mínima de dos semanas respecto a la fecha prevista de arranque. En dicha sesión participarán los responsables designados por LDA y por Accenture, y tendrá como objetivo:
  - Confirmar los interlocutores del área de IT y de Negocio que participarán en el proyecto.
  - Definir el calendario de trabajo. Establecer las necesidades de dedicación y participación de los distintos equipos.
- **Modelo de Gobierno y Toma de Decisiones:** LDA centralizará la toma de decisiones y validaciones en una o dos personas designadas como responsables del proyecto, con el fin de agilizar los procesos de aprobación y el cierre de fases.
- **Idioma de la Documentación:** Toda la documentación generada durante el proyecto se elaborará en castellano.
- **Disponibilidad de Recursos Clave:** LDA garantizará la participación activa y disponibilidad de las personas clave del área de Negocio y de los equipos del área de Sistemas que resulten necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.
- **Ubicación de los Trabajos** La ejecución del proyecto se realizará principalmente en las oficinas de Accenture. En caso necesario, se contemplarán desplazamientos puntuales a las oficinas de LDA en Madrid.
- **Sistemas Externos a Dynamics:** Todos aquellos desarrollos, adaptaciones o configuraciones requeridas en sistemas distintos de la plataforma Dynamics (incluyendo, entre otros, Galgo y otros sistemas legacy) serán gestionados y ejecutados por LDA. Asimismo, LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas correspondientes en dichos sistemas, en coordinación con las pruebas de integración definidas en el marco de este proyecto.
- **Seguridad y Protección de Datos:** LDA deberá comunicar a Accenture sus políticas de seguridad y protección de datos aplicables al proyecto.
  En particular, deberá identificar los datos considerados sensibles y definir los criterios de ofuscación, disociación o anonimización que deberán aplicarse en los entornos de prueba. Cualquier tarea relacionada con esa ofuscación, disociación o anomización de la información necesaria será responsabilidad de LDA
- **Datos para Pruebas Integradas:** Para la correcta ejecución de pruebas integradas y pruebas de usuario en escenarios de integración entre sistemas, LDA garantizará la disponibilidad de juegos de datos adecuados y suficientes en todos los sistemas involucrados.
- **Proceso de Validación de Entregables:** LDA dispondrá de un plazo máximo de una semana desde la entrega formal de cada entregable para comunicar observaciones o solicitudes de modificación. En ausencia de comunicación dentro de dicho plazo, el entregable se considerará tácitamente aprobado.
- **Licencias y Herramientas del Proyecto:** El coste y la gestión comercial de las licencias necesarias para la ejecución del proyecto (incluyendo, entre otras, Dynamics, Jira, Confluence, herramientas de gestión documental o UX) serán responsabilidad de LDA.
- **Asignación de Equipo Accenture:** La intención de Accenture es asignar al proyecto los perfiles profesionales o similares previamente detallados (según CVs aportados). No obstante, la asignación definitiva estará sujeta a la fecha efectiva de inicio del proyecto y a la disponibilidad de los recursos en dicho momento.
- **Alcance**: El alcance de esta propuesta se define de manera integral por el presente documento y su Anexo Técnico [RFP_Linea Directa - 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484 - Anexos - Solucion Dynamics]. Ambos documentos son complementarios y constituyen la descripción total de los entregables y servicios incluidos. El Anexo proporciona el detalle granular de las funcionalidades, por lo cual debe ser considerado parte esencial del alcance aquí descrito.
- **La aceptación del software** se realizará exclusivamente con referencia a la última especificación aprobada formalmente por las Partes al finalizar la fase de UAT (User Acceptance Testing). Cualquier especificación más detallada y aprobada reemplazará por completo el alcance base definido por especificaciones y requerimientos anteriores. Si no existe diseño (p. ej., funcionalidad estándar del producto), se realizarán pruebas, pero quedarán excluidas del procedimiento de aceptación del trabajo de Accenture.
- **Estándares de Desarrollo y Calidad del Código:** La codificación se llevará a cabo siguiendo las prácticas y recomendaciones establecidas por Microsoft en Dynamics CRM y las mejores prácticas aplicadas en la Metodología de Accenture respecto a proyectos de CRM basados en Dynamics 365.
- **Accesos y Documentación Inicial:** Durante la semana de movilización del proyecto, LDA proporcionará al equipo de Accenture todos los accesos necesarios a los sistemas implicados, así como la documentación técnica y funcional requerida para el correcto inicio de los trabajos.
- **Modelo de Integración Continua y DevOps:** Se asume que el modelo actual de integración continua, basado en prácticas DevOps e implantado por LDA, se encuentra operativo y funcionando de manera estable al inicio del proyecto para poder realizar los despliegues de los desarrollos. El proyecto se apoyará en dicho modelo para la gestión de despliegues y control de versiones.
- **Dependencias de Infraestructura y Accesos:** Cualquier retraso en la provisión de infraestructura, accesos o información necesaria podrá impactar en los plazos comprometidos del proyecto.
- **Pruebas de Usuario (UAT)**: Será responsabilidad de LDA el desarrollo de las sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT), necesarias para la validación funcional y aprobación del paso a Producción. Además la aprobación de los casos de uso y escenarios de prueba correspondientes a la fase de UAT será responsabilidad de LDA.
- **Pruebas de Regresión en Sistemas Externos:** LDA será responsable de la planificación y ejecución de las pruebas de regresión en aquellos sistemas que puedan verse afectados por modificaciones o integraciones con Dynamics.
  Asimismo, será responsable de la gestión del esfuerzo e incidencias derivadas de dichas pruebas cuando afecten a procesos o desarrollos no incluidos en el alcance de la presente propuesta.
- **Uso de Funcionalidad Estándar:** En línea con las prácticas recomendadas por Dynamics, se priorizará el uso de funcionalidad estándar proporcionada por la plataforma frente a desarrollos a medida, con el objetivo de promover mantenibilidad, escalabilidad y alineación con futuras evoluciones del producto.
- **Modelo de trabajo**:
  - Al ser un Precio Fijo basado en resultados no será aplicable el uso de metodologías ágiles o iterativas, dada la naturaleza evolutiva y adaptativa de dichos enfoques
  - Las especificaciones más detalladas que sean posteriormente definidas y aprobadas formalmente por las Partes sustituirán en su totalidad al alcance base previamente establecido en las especificaciones o requisitos iniciales.
- **Gobernanza de cambios**: El alcance base, la planificación y las hipótesis contractuales del proyecto estarán sujetos al proceso formal de gestión de cambios (Change Control) con el fin de analizar, acordar y aprobar los posibles impactos en alcance, calendario y precio. Las actividades de análisis y estimación asociadas a una solicitud de cambio (CR – Change Request) se considerarán igualmente parte de dicha solicitud y serán facturables.
- No se consideran en el presente alcance **integraciones con el portal (web) ni con la App móvil** de LDA
- Se considera que la operativa de los usuarios que van a gestionar a los clientes desde Dynamics es la misma independientemente del canal por el que sean tratados (Chat, Teléfono, presencial) y no hay diferencias funcionalidades.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GENERALES (Continuación):

- **Validación al inicio del desarrollo**: Cada Release incluirá una fase inicial de análisis y diseño visual de pantallas (UX) cuyo objetivo será detallar los requisitos, validar dependencias y confirmar la viabilidad de la solución planteada. A la finalización de dicha fase de definición en cada release, Accenture elaborará una revisión de alcance detallado y una estimación revisada de esfuerzo.
- En caso de que, como resultado del análisis realizado, se identifique que el alcance funcional difiere del inicialmente considerado en la presente propuesta, existen nuevas dependencias técnicas o integraciones no contempladas, o la complejidad técnica implique un esfuerzo superior al estimado inicialmente con base en las consideraciones de este documento, las Partes analizarán y acordarán conjuntamente el impacto en planificación y presupuesto y/o los siguientes pasos respecto a la Release afectada antes del inicio de la fase de construcción.
- **Gestor documental**: Se asume que existe un gestor documental "Content manager" y que toda la documentación necesaria será subida a dicho gestor documental
- **Estandarización de procesos**: Se asume que los procesos que forman parte de la operativa de gestión entre los diferentes ramos presentan un alto grado de similitud, siendo necesarias únicamente adaptaciones puntuales para su adecuación a cada ramo, sin que ello suponga un rediseño completo de los mismos.
- **Modelo de datos**: La definición final del modelo de datos se realizará durante la fase de diseño asociada a cada requisito, pudiendo verse modificados los objetos necesarios para cada fase en función de las conclusiones alcanzadas para cada uno de ellos.
- **Dependencias**: Todas las adaptaciones, desarrollos, configuraciones o modificaciones necesarias en sistemas propios de LDA distintos de la plataforma Dynamics — incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, Galgo, Genesys, BB.DD. Internas, gestores documentales u otros sistemas legacy — serán responsabilidad exclusiva de LDA. LDA asumirá la planificación, ejecución, pruebas y puesta a disposición en plazo de dichas adaptaciones, garantizando su alineación con el calendario general del proyecto. El cumplimiento de los hitos y plazos del proyecto estará condicionado a que dichas adaptaciones en sistemas propios del cliente se encuentren disponibles en tiempo y forma conforme al plan acordado. Cualquier retraso en su ejecución podrá implicar un impacto en el cronograma, hitos y/o costes del proyecto, que deberá ser analizado y gestionado a través de los mecanismos de gobierno establecidos. Las Partes deberán acordar al inicio de cada Fase las fechas en que deberán cumplirse las dependencias del Cliente.
- **Aceptación de las pruebas**: La aceptación de las pruebas no requerirá que todas las funcionalidades estén completadas al 100%. Se permitirá un número limitado de defectos (incidencias de criticidad media y baja) y transacciones que no cumplan totalmente los objetivos. Un error solo se considerará como tal si contradice la última especificación aprobada y es reproducible por Accenture en el entorno de pruebas.
- **Puesta en Producción del software**: La puesta en producción del software se considera como aceptado.
- Durante la fase de implementación del proyecto, no se aplicarán niveles de servicio (SLA) ni penalizaciones, ya que el objetivo principal es garantizar la correcta entrega y despliegue de la solución. Los niveles de servicio y cualquier penalización se definirán y acordarán por ambas partes al inicio de la fase de mantenimiento extendido, una vez finalizada la implementación y el Proyecto esté operativo y en condiciones de soporte, considerando el alcance y la calibración necesarios para esta etapa.
- **Alcance**: El alcance de esta propuesta se define de manera integral por el presente documento y su Anexo Técnico [RFP_LineaDirecta - 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484 - Anexos – Solucion Dynamics]. Ambos documentos son complementarios y constituyen la descripción total de los entregables y servicios incluidos. El Anexo proporciona el detalle granular de las funcionalidades, por lo cual debe ser considerado parte esencial del alcance aquí descrito.

GARANTIA:

- Accenture garantiza durante un **período de seis (6) meses** desde la fecha de puesta en producción que los desarrollos realizados en el marco del presente proyecto funcionarán sustancialmente de acuerdo con las especificaciones funcionales y técnicas expresamente aprobadas por las Partes tras la superación de las pruebas de aceptación de usuario (UAT).
- Durante dicho período, Accenture se compromete a corregir, sin coste adicional, aquellos **defectos tipificados como Prioridad Crítica o Alta** que:
  - Sean reproducibles en entorno productivo,
  - Supongan una desviación respecto a las especificaciones aprobadas en UAT, y
  - Sean directamente imputables a defectos en el desarrollo realizado por Accenture.
- La aceptación de los desarrollos tras la superación de las UAT implicará la conformidad de LDA con el funcionamiento de la solución respecto de los requisitos validados, no pudiendo considerarse como defectos en garantía aquellas incidencias que hubieran sido detectables razonablemente durante dicha fase y no hubieran sido reportadas antes de la puesta en producción.
- Quedan expresamente excluidos:
  - Incidencias derivadas de cambios realizados por LDA o por terceros sobre el código o configuración entregada.
  - Incidencias derivadas de sistemas externos, integraciones o plataformas de terceros.
  - Cambios normativos o regulatorios posteriores a la puesta en producción.
  - Evolutivos, mejoras funcionales o cambios de alcance no contemplados en las especificaciones aprobadas.
  - Incidencias derivadas de uso inadecuado o distinto al definido en la documentación funcional.
  - Incidencias clasificadas como Media o Baja en base al criterio de tipificación anteriormente expuesto.
  - Necesidad de rediseño sustancial o reconstrucción de funcionalidades aceptadas en UAT.
- La validez de la garantía queda condicionada a que las modificaciones del software se realicen exclusivamente por Accenture. Cualquier modificación efectuada por LDA o por terceros supondrá la no aplicación de la garantía.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

INTEGRACIONES:

- Las **integraciones síncronas** se estiman hasta la respuesta del CORE; las asíncronas desde la lectura del mensaje en cola/tópico.
- Las **modificaciones son evolutivos** sobre APIs existentes, no rediseños completos.
- **Arquitectura híbrida**: REST/CTG (síncrono) y Kafka (asíncrono), con Azure Service Bus como orquestador y API Management como Gateway de seguridad.
- Las **cargas iniciales** se realizarán vía batch/ETL; se considera alto volumen >5M registros por entidad y se ejecutarán en ventanas controladas. La migración de datos al CRM se realizará mediante procesos batch/ETL sobre las entidades identificadas, considerando los volúmenes facilitados (clientes, pólizas, leads y oportunidades). No se incluyen transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos, asumiéndose que la información proveniente de los sistemas origen está previamente validada y preparada para su carga.
- Las **estimaciones de carga de datos** se han realizado considerando las volumetrías indicadas por LDA. Variaciones significativas en volumen de datos, número de entidades o número de interacciones podrán requerir revisión de arquitectura y reestimación de esfuerzo según la siguiente tabla:

Entidad	Volumen
Clientes	**3.6M**
Pólizas	**6M**
Leads	**1.7M**
Oportunidades	**7M**

- La **captura CDC no está incluida**; se asume publicación previa de eventos en cola/tópico.
- Seguridad gestionada mediante Azure API Management y cifrado TLS extremo a extremo.
- Se contemplan cuatro entornos: DES / INT / PRE / PROD, que deberán estar disponibles y operativos antes del inicio del desarrollo.
- La configuración de redes, accesos, firewall y certificados será responsabilidad del cliente.
- Kafka y la herramienta de ETL deberán estar previamente aprovisionados, instalados y configurados, incluyendo conectores y accesos necesarios.
- No se incluye la implantación base ni la configuración inicial de estas plataformas.
- Se asume disponibilidad de accesos técnicos, certificados, usuarios de servicio y definición previa de colas/tópicos.
- La planificación, estimación y secuenciación por fases se han realizado tomando como base el volumen de integraciones actualmente identificado, compuesto por 67 nuevas integraciones online/asíncronas, 9 procesos batch y 33 modificaciones asociadas.
- A efectos de estimación se ha considerado una distribución de complejidad de integraciones del 35% baja, 45% media y 20% alta, basada en patrones habituales de integración en proyectos CRM con middleware y sistemas core.
- A efectos de estimación, los procesos batch se han distribuido en 20% de baja complejidad, 50% de complejidad media y 30% de complejidad alta, considerando el volumen de datos y la lógica de transformación habitual en procesos ETL y cargas masivas.
- Para calcular la **complejidad de los procesos** se ha tenido en cuenta la siguiente tabla:

Complejidad	Número de Campos	Número de Sistemas a Orquestar	Transaccionalidad	Seguridad	Tipos de Sistemas de Backend
Simple	6-15	1-2	Baja	Media	JDBC, REST (autenticación básica), SOAP (simple)
Media	16-30	3-4	Media	Alta	JDBC, REST (OAuth2/JWT), SOAP, Kafka
Alta	31-50	5-6	Alta	Muy alta	JDBC, REST, SOAP, Kafka, FTP/SFTP

- La compañía proporcionará **estándares de logging, convenciones de naming y plantillas corporativas** de dashboards.
- Las **pruebas funcionales y UAT** serán responsabilidad compartida con Línea Directa.
- No se incluyen **pruebas de carga** sobre sistemas legacy salvo especificación expresa en alcance.
- El **proceso de reconciliación** se limita a un máximo de dos entidades críticas previamente acordadas y no incluye transformaciones complejas, normalización, enriquecimiento ni sanitización de datos (duplicados, inconsistencias o errores de formato), así como tampoco la corrección de calidad de datos en origen. Cualquier entidad adicional requerirá estimación y planificación independiente.
- **La gestión documental** permanecerá en el repositorio corporativo existente (Content Manager). El CRM se integrará mediante APIs para consultar y referenciar la documentación asociada a clientes y pólizas, limitándose a la gestión de metadatos y enlaces, sin contemplar la migración ni el almacenamiento de documentos dentro del CRM.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.

CONSIDERACIONES

GdC:

- LDA proporcionará la documentación AS-IS del CRM actual, quedando su elaboración fuera de alcance.
- Línea Directa proporcionará el modelo to-be de sistemática comercial (procesos, principios, comportamientos, ...) quedando su elaboración fuera de alcance.
- La selección de los embajadores es responsabilidad de LDA.
- Quedan fuera de alcance las comunicaciones a externos. Las comunicaciones a internos se realizarán en coordinación con Comunicación y, únicamente, si se habilitan los permisos correspondientes en los canales existentes (canal de email, Iseazy (exclusiva para internos), Teams).
- Formación adaptada para perfiles internos y externos, considerando las especificidades de estos últimos (limitación comunicación y reporting, accesibilidad formación, etc..)
- Queda fuera del alcance la carga de los materiales de formación en ningún LMS interno o site para externos.
- Asumimos la autorización de Línea Directa para la utilización de las herramientas de GenAI y consecuente generación de eficiencias.
- Para el caso del agente de acompañamiento, las licencias de M365 Copilot / ChatGPT Enterprise / Gemini deben ser proporcionadas por LDA; de lo contrario, no será posible que los usuarios puedan utilizarlo.
- El modelo operativo será definido por LDA.

MANTENIMIENTO:

- **Accesos y prerrequisitos:** Con carácter previo al inicio de la línea de Mantenimiento, LDA facilitará a Accenture todos los accesos, credenciales, licencias, entornos, documentación técnica y funcional, así como cualquier otra información necesaria para la correcta prestación del servicio. Cualquier retraso en la provisión de dichos elementos podrá implicar la replanificación de los servicios y el correspondiente ajuste en los plazos y precio comprometidos, sin que ello genere responsabilidad alguna para Accenture.
- **Dependencias y demoras imputables a LDA durante el mantenimiento**: Accenture no asumirá responsabilidad por retrasos, ineficiencias o incumplimientos derivados de:
  - Actuaciones u omisiones de LDA.
  - Retrasos de terceros proveedores de LDA.
  - Falta de disponibilidad de información, accesos o validaciones necesarias.
  - Incidencias en infraestructuras o sistemas fuera del alcance del servicio.

  Esto podría afectar al calendario de entregas
- **Licencias y herramientas del mantenimiento**:
  - LDA proporcionará, sin coste para Accenture, las licencias, accesos y herramientas necesarias para la prestación del servicio descrito en este documento. En ningún caso LDA repercutirá a Accenture costes asociados a herramientas, infraestructura o medios necesarios para la correcta ejecución del servicio. Los aceleradores, metodologías, frameworks y herramientas propias utilizadas por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad, no implicando su uso la cesión de derechos de propiedad intelectual ni la concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.
  - Los aceleradores, metodologías, frameworks, herramientas, componentes reutilizables y know-how propios utilizados por Accenture durante la ejecución de los servicios son y seguirán siendo de su exclusiva titularidad. Su utilización en el marco del proyecto no implica cesión de derechos de propiedad intelectual ni concesión de licencia alguna a favor de LDA, salvo pacto expreso en contrario.
- **Organización del equipo:**
  - Accenture mantendrá plena autonomía organizativa en la asignación, dirección, coordinación y gestión de los recursos destinados a la prestación del servicio, sin perjuicio del cumplimiento de los niveles de servicio y compromisos contractualmente asumidos.
  - Accenture será responsable de la prestación de los servicios de soporte de Nivel 2 y Nivel 3, incluyendo la resolución técnica especializada y la coordinación con el proveedor de la tecnología para la gestión de incidencias complejas.
  - El servicio se prestará en modalidad remota desde cualquiera de las localizaciones de Accenture en España, utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos.
- **Tipificación de incidencias:** La clasificación y priorización de las incidencias reportadas será realizada por Accenture conforme a los criterios objetivos de tipificación previamente acordados entre las Partes y recogidos en el presente documento. LDA podrá proponer una prioridad inicial al registrar la incidencia; no obstante, la asignación definitiva de la tipología corresponderá a Accenture tras el análisis técnico correspondiente y de acuerdo con los criterios establecidos. En caso de discrepancia sobre la clasificación asignada, las Partes analizarán conjuntamente el impacto objetivo de la incidencia conforme a los criterios definidos, manteniéndose la clasificación asignada por Accenture hasta la resolución de dicha revisión.
- **Exclusiones del alcance**: Queda expresamente excluido del alcance del servicio de Mantenimiento y soporte:
  - La configuración, instalación, operación o mantenimiento de la infraestructura tecnológica del LDA.
  - La configuración o mantenimiento de sistemas no expresamente incluidos en la presente propuesta.
  - La resolución de incidencias imputables a productos o soluciones de terceros, cuya gestión corresponderá al LDA frente a sus respectivos proveedores.
  - Cualquier responsabilidad derivada del funcionamiento, actualización o soporte de productos de terceros.
- **Modelo de trabajo**: La prestación del servicio de Mantenimiento se realizará en modalidad remota, desde las instalaciones de Accenture utilizando los accesos y herramientas habilitados por LDA. La modalidad remota no afectará a los niveles de servicio, tiempos de respuesta ni compromisos asumidos en el marco del presente proyecto.
- **Validación de entregables del Mantenimiento**: La documentación o entregables que requieran validación por parte de LDA deberán ser revisados en un plazo máximo de tres (3) días laborables desde su entrega. En ausencia de respuesta expresa dentro del plazo indicado, se considerarán tácitamente aprobados a todos los efectos. Cualquier retraso en la validación podrá implicar ajustes en la planificación sin responsabilidad para Accenture.
- **Cambios de alcance**:
  - Cualquier actividad fuera del alcance del proyecto que requiera capacidades adicionales a las ofertadas será considerada un cambio de alcance y deberá gestionarse conforme al procedimiento formal de gestión de cambios.
  - Asimismo, cualquier modificación significativa en herramientas, medios materiales, entornos o condiciones necesarias para la prestación del servicio será objeto del correspondiente análisis de impacto y ajuste contractual, en su caso.
- **Horario**: El horario estándar del servicio de Mantenimiento será el establecido por Accenture:
  - De 08:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves.
  - De 08:00 a 14:30 horas, los viernes.
  - De 08:00 a 15:00 horas desde el 1 de julio al 15 de septiembre.

  Cualquier necesidad de cobertura fuera del horario indicado deberá tratarse como servicio de guardia, conforme a las condiciones que se acuerden entre las Partes.

  Para la prestación de servicios en modalidad de guardia 24x7, LDA facilitará a Accenture el dispositivo móvil o medio de contacto necesario.

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.
