MINSAIT | linea directa



Implantación CRM

REQ0028484

Oferta técnica – 2ª ronda

Abril 2026

MINSAIT

Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partner, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el "Propósito").

La información aquí presentada es propiedad de la sociedad del grupo controlado por Indra Holding TI, S.L.U. que suscribe el presente documento (en lo sucesivo, "Minsait"), y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito de Minsait.

Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de aquellos terceros a los que Minsait haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación. Una vez finalizado o concluido el Propósito, el cliente debe restituir a Minsait toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo utilizar de ninguna manera, ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait salvo que haya sido autorizado para ello previa y expresamente por escrito por Minsait.

El destinatario de la información confidencial, después de finalizado el Propósito, no podrá utilizar de ninguna manera ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait.

Copyright © 2026 Minsait. Todos los derechos reservados. España

01 ¿POR QUÉ FSC?/ ESTRATEGÍA IA

02 PLAN DE PROYECTO Y EQUIPO

03 FASES DEL PROYECTO, METODOLOGÍA Y LICENCIAMIENTO

04 INTEGRACIONES – ASPECTOS CLAVES TECNOLÓGICOS

05 GESTIÓN DEL CAMBIO

06 SOPORTE / TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

07 CASOS DE ÉXITO

08 ¿POR QUÉ MINSAIT?

MINSAIT

¿Por qué FSC? / Estrategia IA

01



MINSAIT


Financial Services Cloud es la única plataforma CRM diseñada para el negocio asegurador y sin duda, la que mejor encaje tiene para las necesidades de LDA

Modelo de datos de pólizas nativo, procesos de cotización y suplementos sin código, recomendaciones comerciales preconfiguradas para el sector asegurador y cumplimiento regulatorio de serie: FSC convierte en configuración lo que cualquier alternativa convierte en deuda técnica.

- **Modelo de datos nativo de seguros**
  Insurance Policy · Insurance Policy Asset · Insurance Policy Coverage · Financial Account · Financial Account Role · Financial Holding · Claim · Producer
- **OmniStudio**
  OmniScript · DataRaptor Extract · DataRaptor Transform · DataRaptor Load · Integration Procedure · FlexCard · Calculation Matrix · Calculation Procedure
- **Componentes visuales exclusivos**
  Actionable Relationship Center (ARC) · Financial Services Summary · Life Events & Milestones · Household Layout · Intelligent Form Automation
- **Inteligencia específica FSC**
  Einstein NBA para servicios financieros · Recommendation Strategy Builder · Prediction Builder (FSC models)
- **Cumplimiento regulatorio financiero**
  Compliance Builder · Complaint Management · Service Process Studio

Beneficios/palancas clave para Linea Directa:

- Adoptar una **arquitectura probada** en aseguradoras líderes globalmente
- **Reducir drásticamente** desarrollos personalizados estructurales
- **Acelerar la transformación digital** con implementación ágil
- **Evitar deuda técnica futura** con arquitectura escalable
- **Incorporar innovación continua** sin re-implementaciones costosas

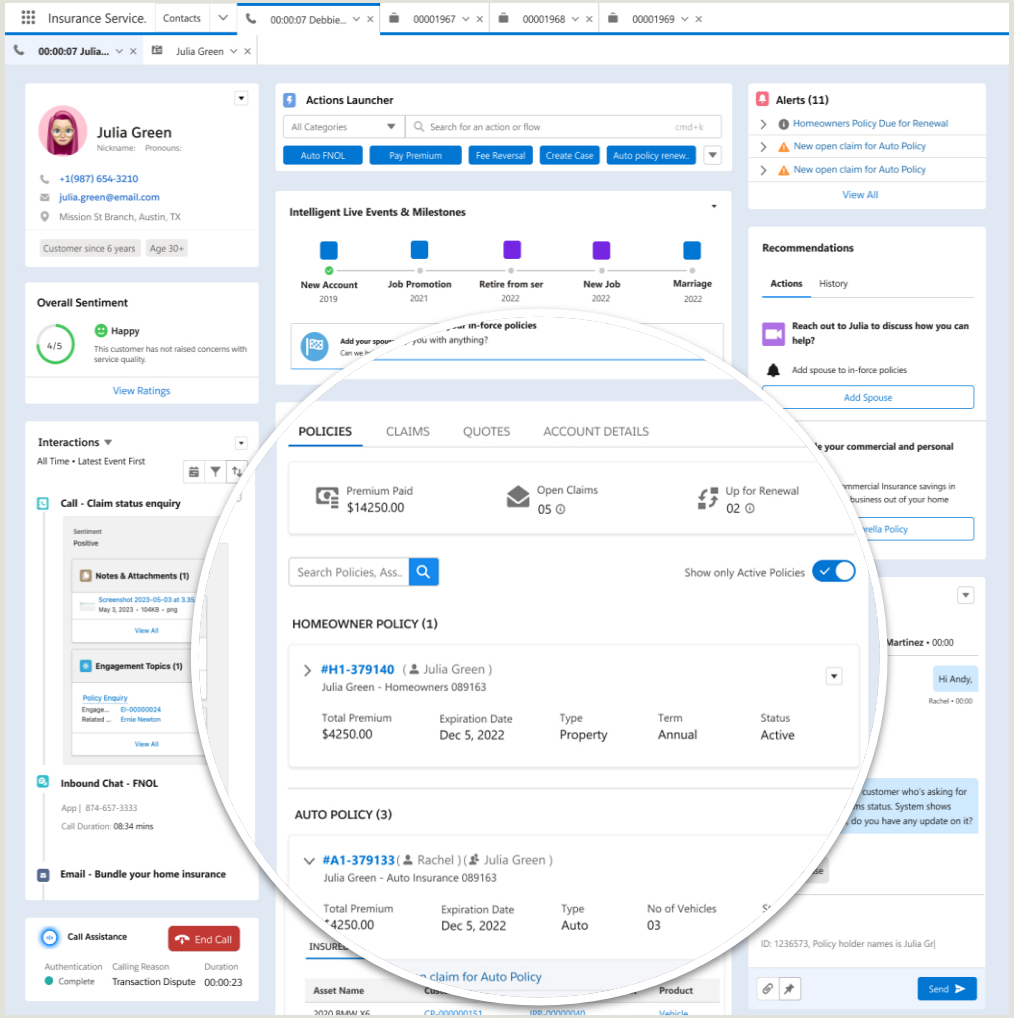

Las Eficiencias de FSC vs S&S son argumentos clave que nos permiten justificar la decisión de forma objetiva

La diferencia fundamental entre implantar FSC e implantar Sales & Service Cloud en una aseguradora no es de funcionalidad: **es de punto de partida**. Sales & Service Cloud es una plataforma horizontal diseñada para cualquier sector. FSC es esa misma plataforma con el modelo de datos, los procesos y la inteligencia del sector asegurador ya construidos encima. La consecuencia práctica es que en FSC el equipo configura desde el primer sprint; en Sales & Service Cloud construye primero lo que FSC ya trae.

En implantación

✓ **Reducción del tiempo de construcción del modelo de datos**
En Sales Cloud estándar, el equipo técnico debe diseñar, construir y validar desde cero todos los objetos que en FSC ya existen: póliza, coberturas, bien asegurado, figuras, siniestros. Cada objeto custom implica diseño del esquema, validaciones, relaciones, seguridad y documentación.

✓ **Reducción del tiempo de construcción por proceso**
Un proceso de cotización completo (captura de riesgo, tarifación, precio, cierre, documentación) construido sobre Sales Cloud estándar requiere diseño de objetos custom, desarrollo Apex, componentes LWC y lógica de integración propietaria. El mismo proceso sobre FSC con OmniStudio se configura declarativamente reutilizando el modelo de datos nativo.

En mantenimiento

✓ **Velocidad de cambio y evolución futuro**
Una vez en producción, los cambios de negocio más frecuentes (nueva cobertura, nuevo tipo de verificación, nuevo motivo de retención, nueva regla NBA) tienen costes radicalmente distintos según la plataforma.

✓ **Cobertura de testing y coste de regresión**
FSC con OmniStudio reduce drásticamente el volumen de código Apex que necesita cobertura de tests. Menos código custom significa menos tests que escribir, menos regresiones posibles y menos tiempo de validación en cada despliegue.

✓ **Tiempo de onboarding de nuevos desarrolladores**
Cuando el equipo inicial rota (habitual en proyectos de 18+ meses), el coste de incorporar un nuevo desarrollador depende directamente de la complejidad del código a aprender. Un sistema construido sobre objetos custom, Apex propietario y LWC a medida tiene una curva de aprendizaje muy superior a uno construido sobre componentes estándar de FSC documentados por Salesforce.

En Minsait, posicionamos FSC como el motor clave de crecimiento para alcanzar los objetivos estratégicos de LDA

Tasa de conversión

+12%

+756.000€/año*

Porcentaje de cotizaciones que se convierten en póliza

NBA, argumentario inteligente y proceso de cotización guiado eliminan fricciones y orientan al agente en cada paso.

2.160 pólizas nuevas/año

Cancelaciones voluntarias

-15%

+456.000€/año*

Pólizas que el cliente decide no renovar o dar de baja

Ficha de retención con índice de fuga, argumentario y proceso guiado de negociación con condiciones especiales

1.200 pólizas retenidas/año

Average Handle Time (AHT)

-25%

+640.000€/año*

Tiempo medio de gestión por llamada: conversación + registro post-llamado

Screen-pop automático elimina la búsqueda manual; registro post-llamada automático al colgar elimina el wrap-up manual

1.600h liberadas/día → 40 FTE redirigidos

Cobro en primer intento

+20%

+4,3M€/año*

% de recibos impagados recuperados en el primer contacto de recobro

Gestión unificada de impagados con datos actualizados, comunicaciones por CDN y priorización automática por valor y antigüedad

+360.000€/mes recuperados

*Cálculos aproximados realizado para LDA teniendo en cuenta experiencias pasadas en proyectos de implantación de Salesforce FSC en el sector Asegurador.

Logrando una mayor conversión, reducción de cancelaciones y una eficiencia operativa superior, lo que se traduce en un retorno de inversión superior a 3,5× en el tercer año.

La IA no es un fin en sí mismo ni un añadido posterior, sino una capacidad transversal que se activa de forma incremental en cada fase, capitalizando los datos y procesos que el proyecto va generando

Nuestra recomendación no es esperar a tener el sistema completo para pensar en IA: es diseñar desde el inicio para que cada fase deje el sistema más preparado para sacarle partido.

El punto de partida es la inteligencia ya embebida en la licencia de FSC llamada Einstein. No requiere un proyecto adicional: se activa y configura durante el desarrollo normal del proyecto. No es inteligencia predictiva todavía, pero genera desde el primer Go-Live el activo más valioso para cualquier modelo posterior: datos estructurados y limpios sobre el comportamiento real del cliente y del agente.

A medida que los datos se acumulan, se activan modelos predictivos entrenados sobre el histórico real de LDA, significativamente más precisos que cualquier modelo genérico del sector. A partir de ahí, la automatización inteligente introduce autonomía en procesos de alto volumen y baja variabilidad con casos de uso de **Agentforce,** mientras los procesos deterministas con implicaciones contractuales se resuelven con guiones estructurados que garantizan consistencia absoluta usando **Agent Script**.

El resultado es un sistema que evoluciona con el negocio sin requerir un proyecto de IA independiente.

Caso de uso	Motor IA	Descripción	KPI esperado
NBA Cotización Multiproducto	Einstein NBA + Rules Engine	Recomienda la mejor oferta multiproducto para maximizar conversión.	+12% conversión
Lead Scoring — Propensión compra	Einstein Lead Scoring	Prioriza leads con mayor probabilidad de compra.	+18% leads Walmeric
Clasificación automática siniestros	Einstein Classification (NLP)	Clasifica siniestros por tipo y severidad automáticamente.	-60% tiempo clasificación
Predictive Case — Riesgo litigio	Einstein Prediction Builder	Estima probabilidad de litigio y dispara mitigaciones.	-20% derivación litigio
Predictive Case — Riesgo litigio	Einstein Prediction Builder	Predice riesgo de abandono para activar acciones preventivas.	-15% cancelaciones
NBA Retención — Argumentario dinámico	Einstein NBA (retención)	Sugiere argumentario de retención adaptado al perfil.	+25% retención Riesgo Alto
Scoring propensión al pago	Einstein Scoring	Predice propensión de pago para optimizar recobro.	+20% cobro 1er intento

Capacidades de IA embebidas de serie en FSC para que los agentes pueden utilizar de forma natural en su trabajo diario

Como valor añadido, compartimos con LDA casos de uso reales de IA desarrollados en clientes del sector Seguros con Agentforce y Data Cloud siguiendo la misma estrategia

El sector asegurador enfrenta un cambio donde la eficiencia y la experiencia del cliente ya no dependen solo de procesos manuales o bots rígidos. Casos de éxito muestran cómo aseguradoras han mejorado con agentes inteligentes que razonan, acceden a datos en tiempo real y actúan con precisión.

Data Cloud no es imprescindible para este proyecto porque FSC ya dispone de un modelo de datos nativo que centraliza la información relevante del cliente: pólizas, interacciones, cotizaciones, historial y recomendaciones NBA viven en objetos estándar de Salesforce accesibles desde cualquier proceso sin necesidad de una capa de unificación de datos adicional. La integración con Galgo vía CDC/Kafka garantiza que los datos del *core* asegurador están disponibles en FSC en tiempo real. Para los casos de uso del proyecto (cotización, retención, verificación, recobro) el modelo de datos de FSC es suficiente.

De todos modos, es muy **recomendable tener la posibilidad de habilitar el uso de Data Cloud** para poder desarrollar algún caso de uso de Agentforce que se defina y priorice durante el transcurso del proyecto actual.

Empresa	Desafío	Solución
Aseguradora confidencial	Un agente autónomo que califica leads, responde consultas y agenda citas 24/7, liberando al equipo comercial de tareas repetitivas.	Resultado: **-85% en tiempo de respuesta, +40% en conversión y +55% en productividad** del equipo de ventas..
Mas Seguros	Alta carga en consultas de coberturas, descarga de certificados y estado de pagos.	Automatización del 70% de las consultas frecuentes sin intervención de agentes.
Andina ART	4 personas coordinando 12,000 traslados al mes. Tiempo de asignación: 29 horas.	Tiempo de asignación bajó a 40 min. Agentforce gestiona el 69% de los casos por WhatsApp.
Más Seguros	Localizar información en carteras de +1,000 pólizas era lento y frustrante para el usuario.	Respuesta en < 5 minutos (antes 1-2 días). Libera 1/3 del tiempo de los asesores.
Hipotecario Seguros	Bot de WhatsApp (Einstein) rígido, limitado para escalar y con diálogos poco naturales.	Migración a Agentforce para conversaciones fluidas y escalabilidad total del roadmap digital.



Experiencias reales y lecciones aprendidas que servirán de guía en la evolución de LDA

Plan de proyecto y Equipo

02



MINSAIT

Basándonos en el assessment realizado y la información compartida por LDA, identificamos seis factores clave para asegurar el éxito de la implantación CRM

1.



Instaurar gobierno y asegurar dedicaciones

- Disponer de un **gobierno integral** que involucre con **altos niveles de dedicación a los equipos de CRM, negocio, procesos, tecnología, usuarios y soporte**. El CRM conlleva una transformación operativa y cultural que requiere alineamiento de todos los actores clave

2.



Flexibilidad para adoptar el vertical de Financial Services Cloud

- Realizar una **revisión de los requisitos** junto con el equipo especialista de Minsait para adoptar la solución de Salesforce y respetar las Best Practises que permitirán reducir la deuda técnica y facilitarán la adopción de mejoras.

3.



Alinear y coordinar la transformación global

- Velar porque las **iniciativas que tienen impacto directo sobre la implantación del CRM se ejecuten en tiempo y forma**, **asegurando la disponibilidad para evitar replanificaciones o retrabajos** (como el mapa de contactos actualizado, la evolución del Contact Center a una solución Cloud, implantación CDP, entre otros)

4.



Despliegue gradual de funciones y usuarios

- **Desplegar las funcionalidades CRM de forma progresiva con fases controladas**, y un plan de **ramp-up de usuarios,** comenzando **con pilotos funcionales** y validando resultados antes de escalar. **Evitar implantaciones masivas** sin estabilización previa que puedan comprometer la operación o la adopción

5.



Evitar la hiper-personalización

- **Adaptar la organización / procesos a la solución y no al revés**, para aprovechar al máximo la **adherencia al estándar** y evitar tener una herramienta hiperpersonalizada que conllevaría mayores costes de mantenimiento y mayor time to market de las actualizaciones en funcionalidades

6.




No subestimar el cambio y formar “champions”

- Diseñar un **plan de formación y acompañamiento con “champions” internos**, que facilite la adopción, el handover **y minimice resistencias**. **Monitorizar la transición** para detectar bloqueos o ajustes necesarios, asegurando una adopción fluida y sostenible del nuevo modelo de trabajo

Fuente: análisis Minsait

Diseñamos un plan de proyecto cerrado apoyado en dos principios: generación de valor incremental desde el mes 6 y minimización del impacto operativo en los distintos colectivos de usuarios

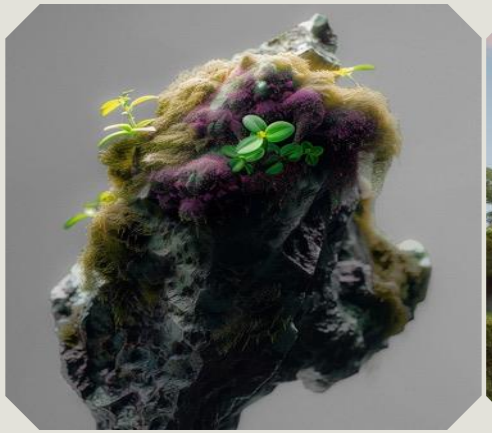


Respeta las 9 fases y el orden de priorización definido por LDA.

9 Fases



Reduce las transiciones operativas de cada colectivo de usuarios al mínimo necesario.

6 Go-Lives

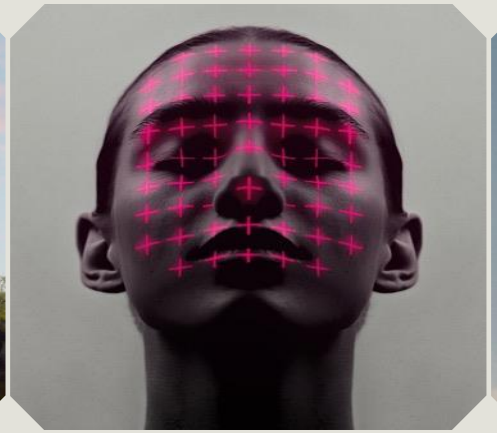


Genera valor de negocio desde el mes 5-6 (Ficha 360 + CTI), sin esperar al año 2.

6 meses



Permite sincronizar la primera entrega con el proyecto de Genesys, evitando duplicidad para los agentes.

Genesys

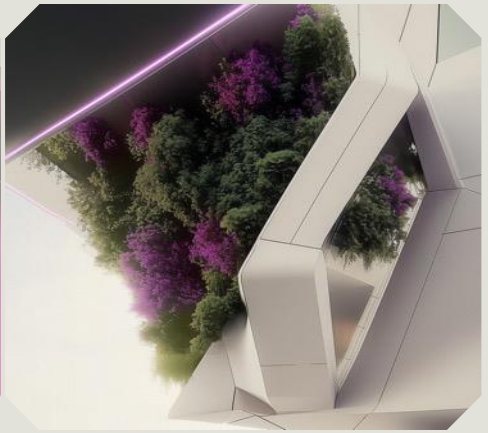

Agrupa las fases con dependencias técnicas compartidas, reduciendo costes y tiempos de integración.

Framework


Con el objetivo de priorizar la adopción por parte de los usuarios, proponemos un plan de implementación gradual a lo largo de 19 meses seguidos de una línea de mantenimiento

- Sobre el plan inicial de **18 meses de proyecto** para completar una implementación gradual por grupos de usuarios, incorporamos 1 mes más de trabajo para dar cobertura al nuevo requerimiento de Quejas & Reclamaciones; en el que también hemos reajustado en alcance de las fases 6, 7 y 9 para acomodar la solicitud de LDA en esta segunda ronda del proceso de RFP.

  La Fase 0 de Discovery tendrá una duración de **3 meses** y permitirá definir y cerrar el **alcance completo del proyecto**, así como sus **dependencias,** dentro del marco temporal establecido y con un acuerdo formal por parte de LDA.

- Este trabajo tendrá continuidad mediante **sesiones de refinamiento** que se llevarán a cabo en las semanas previas al inicio de cada una de las 9 fases, con el objetivo de profundizar en el nivel de detalle necesario para su correcta ejecución.

- A la finalización de primer Go Live, arrancaremos en paralelo con un **soporte post – implementación iterativa**. A la finalización, arrancará un **soporte y mantenimiento de 12 meses**

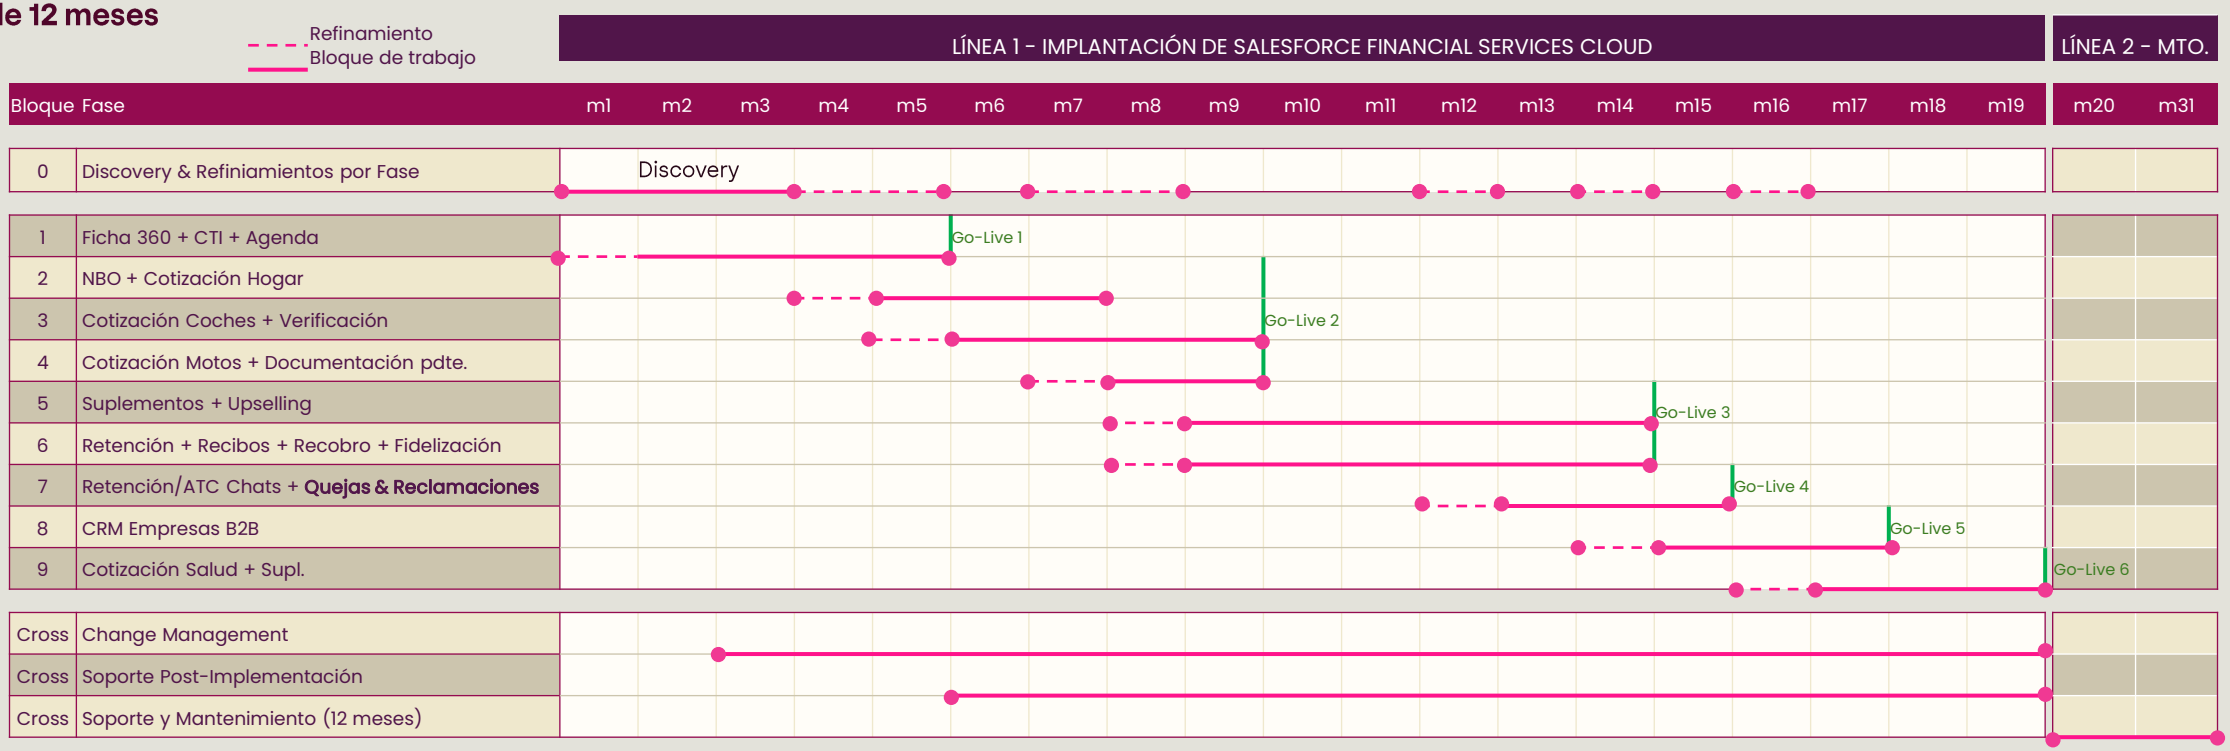

linea directa

Con un equipo de trabajo, que combina la excelencia en el ecosistema Salesforce con una sólida experiencia en el sector asegurador

(*) Los Roles y permisos de acceso de los usuarios a la plataforma se definirán en la fase de Discovery, dentro de las actividades de seguridad. Adicionalmente, los accesos de los equipos técnicos del CoE de LDA durante el proyecto se determinarán en la fase de definición del propio CoE

Gestión

Director de proyecto

Lidera la coordinación y el gobierno del proyecto durante toda la implantación, asegurando la correcta ejecución del plan, la alineación con los objetivos de Línea Directa y la coherencia entre los distintos workstreams. Supervisa la planificación, el roadmap funcional y técnico y la gestión de dependencias entre los diferentes equipos (Salesforce, Genesys, Integraciones, Datos, QA, Canales y Change), actuando además como punto de contacto principal con el cliente. Asimismo, impulsa la gobernanza, consolida el reporting ejecutivo, prioriza el backlog y coordina a los equipos multidisciplinares bajo un modelo híbrido de trabajo, garantizando una implantación controlada, alineada y orientada a valor

Sponsor, PM, Exec. Team y CoE

Equipos por Work stream

Discovery + Definición + UX

Experto funcional Seguros + (1) Implementación + (2) Pruebas y Calidad

Asegura que los requisitos y procesos del negocio se traduzcan al modelo y capacidades de la vertical de SF.

Colaborar con el experto funcional para definir una solución que refleje fielmente la operativa y garantice consistencia con requisitos

Líderes negocio, IT, Key users ~75%

1 Implementación y migración de datos

- Líder de implementación
  - Especialistas FSC
    - Arquitecto técnico FSC
    - Líder Técnico FSC
      - Desarrolladores FSC
      - Ingeniero DevOps
    - Experto funcional FSC
  - Integraciones
    - Arquitecto Integraciones
      - Desarrolladores Integraciones
      - Experto Integración CC

Lidera la configuración y parametrización de la solución, así como la definición y construcción de las integraciones con los sistemas externos. El equipo se organiza en dos líneas de trabajo —especialistas en FSC e integraciones— coordinadas por un jefe de proyecto y respaldadas por arquitectos técnicos y líderes especializados, garantizando coherencia técnica, alineación con el negocio y una implantación robusta adaptada al sector asegurador

2 Pruebas y Calidad

- Líder QA
  - Analista QA

El equipo de QA se centra en pruebas transversales, E2E y de negocio, necesarias para un proyecto con múltiples integraciones y para asegurar un UAT eficiente y sin regresiones.

Líderes negocio, IT, Key users ~50%

Soporte & Mantenimiento

- Service Manager
  - Experto funcional FSC
  - Desarrollador FSC
  - Desarrollador Integraciones

Garantizar la continuidad operativa del servicio tras la implantación, coordinando las actividades de soporte, supervisando niveles de servicio, priorizando incidencias y asegurando una comunicación entre negocio y equipo técnico

IT

Equipos gestión del cambio

Change management team

- Responsable de Gestión del Cambio
  - Consultor de negocio
  - Consultor de diseño

Lidera la gestión del cambio asociada a la implantación del CRM, coordinando las iniciativas de comunicación, formación y adopción para facilitar la transición de los usuarios al nuevo sistema. El responsable coordina y asegura la ejecución del plan, El consultor de negocio define la estrategia de adopción alineada con los procesos y necesidades de los usuarios, mientras que el consultor de diseño transforma estos contenidos en materiales claros, visuales y estructurados que facilitan la comprensión y el aprendizaje

Líderes negocio, IT, Key users, Personas y comunicaciones

Bajo un modelo de trabajo alineado con LDA, con alta presencialidad y enfocado en maximizar la cercanía, la comunicación y la eficacia en la ejecución

Proponemos un modelo de trabajo que responde explícitamente a la demanda de presencialidad del cliente, incorporando la cercanía de los equipos como un elemento clave para facilitar la comunicación, la coordinación diaria y la toma ágil de decisiones. Este modelo no se plantea de forma homogénea, sino que ajusta el nivel de presencialidad en función de las fases del proyecto y de los roles involucrados, garantizando una presencia intensiva en los momentos críticos —Delivery, Diseño, UX, Gestión de Cambio y PostImplantación— y asegurando en todo momento una interacción fluida entre equipos.

Rol	Diseño e Implementación	Pruebas y Calidad	Gestión de Cambio	Soporte Post-Implantación	Soporte y Mantenimiento
Director de Proyecto	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*60% Presencial*	*80% Presencial*	
Líder de equipo FSC	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*60% Presencial*	*60% Presencial*	
Experto Funcional FSC	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*60% Presencial*	
Arquitecto FSC	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*40% Presencial*	*40% Presencial*	
Desarrollador Senior FSC	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*40% Presencial*	*60% Presencial*	
Arquitecto Integraciones	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*40% Presencial*	*60% Presencial*	
Desarrolladores/ Consultores	*60% Presencial*	*60% Presencial*	*40% Presencial*	*60% Presencial*	
Experto Funcional Seguros	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*80% Presencial*	*40% Presencial*	
Equipo Soporte				*80% Presencial*	*80% Presencial*

Durante la fase inicial del proyecto se determinará el modelo definitivo de trabajo en cada una de las dinámicas del proyecto (por ejemplo, sesiones de diseño, cocreación, validación en presencial, desarrollo y preparación de material en remoto) que determinará la localización de los equipos.

Minsait garantiza la estabilidad del equipo apalancándose en nuestro modelo de gestión y retención del talento y un plan de transmisión del conocimiento

Contamos con **una política dirigida a la retención** de los perfiles clave del proyecto.

Formación continua en las diferentes habilidades en función del rol y **gestión del conocimiento interno.**

Incentivos y reconocimiento

Indra | Minsait como marca empleadora

- Marca empleadora de primer nivel,
- Contratación de talento
- Permanencia de los recursos clave.

Desarrollo profesional

- Planes de carrera sólidos
- Crecimiento acorde

Movilidad

- Oportunidades en distintas geografías
- Mecanismos de movilidad interna

Formación

- Planes de formación Salefsorce
- Programa de Certificaciones

Reconocimiento

- Plataforma de reconocimiento personal y profesional.
- Promociones a través de políticas de comunicación y difusión.

Desarrollo personal

- Identidad corporativa
- Mejores prácticas y metodologías del mercado de trabajo


Aseguraremos la **mínima pérdida de conocimiento** con un modelo de gestión de la rotación basado en **cross-training y documentación actualizada**.

Gestionaremos de forma estructurada cualquier sustitución planificada o imprevista. Aplicamos un **proceso de traspaso estandarizado y gradual** que asegura una transición sin impacto para LDA.

Documentación	Workshop Funcional	Workshop Técnico	Shadowing	Shadowing Inverso	Traspaso
Documentación útil • Kick off presentación documentación • Lectura de la documentación • Revisión conjunta de dudas Minsait garantiza la existencia y actualización continua del Repositorio de Conocimiento	**Inmersión Acelerada en el proyecto** • Procedimientos del Servicio • Personas de Contacto • Estructura organizativa del Cliente • Procesos de Negocio • Funcionalidades implantadas	**Dominio de la Tecnología del Proyecto** • Gestión de entornos • Procesos de subidas • Metodologías de programación y mejores prácticas (nomenclaturas, etcétera) • Revisión de los principales desarrollos e integraciones	**Trabajo Compartido para Aterrizaje Operativo** • Trabajo en paralelo de la ejecución de las tareas • Se alternará entre los involucrados (saliente/entrante) quien lidera y quien supervisa • Revisión del backlog pendiente • Involucración de la persona entrante en las comunicaciones con el Cliente		**Incorporación Plena** • Comunicación a LDA del Traspaso y el nuevo componente del equipo
Preparación	***Transferencia***	***Transferencia***	***Trabajo compartido***		***Incorporación***
1 semana			2 semanas		

Un único equipo LDA & Minsait para abordar el reto: alineamos esfuerzos y definimos la implicación clave de LDA para garantizar el éxito

La siguiente matriz muestra el grado de implicación esperado por equipo, diferenciando los principales dominios de TI para reflejar adecuadamente las dependencias

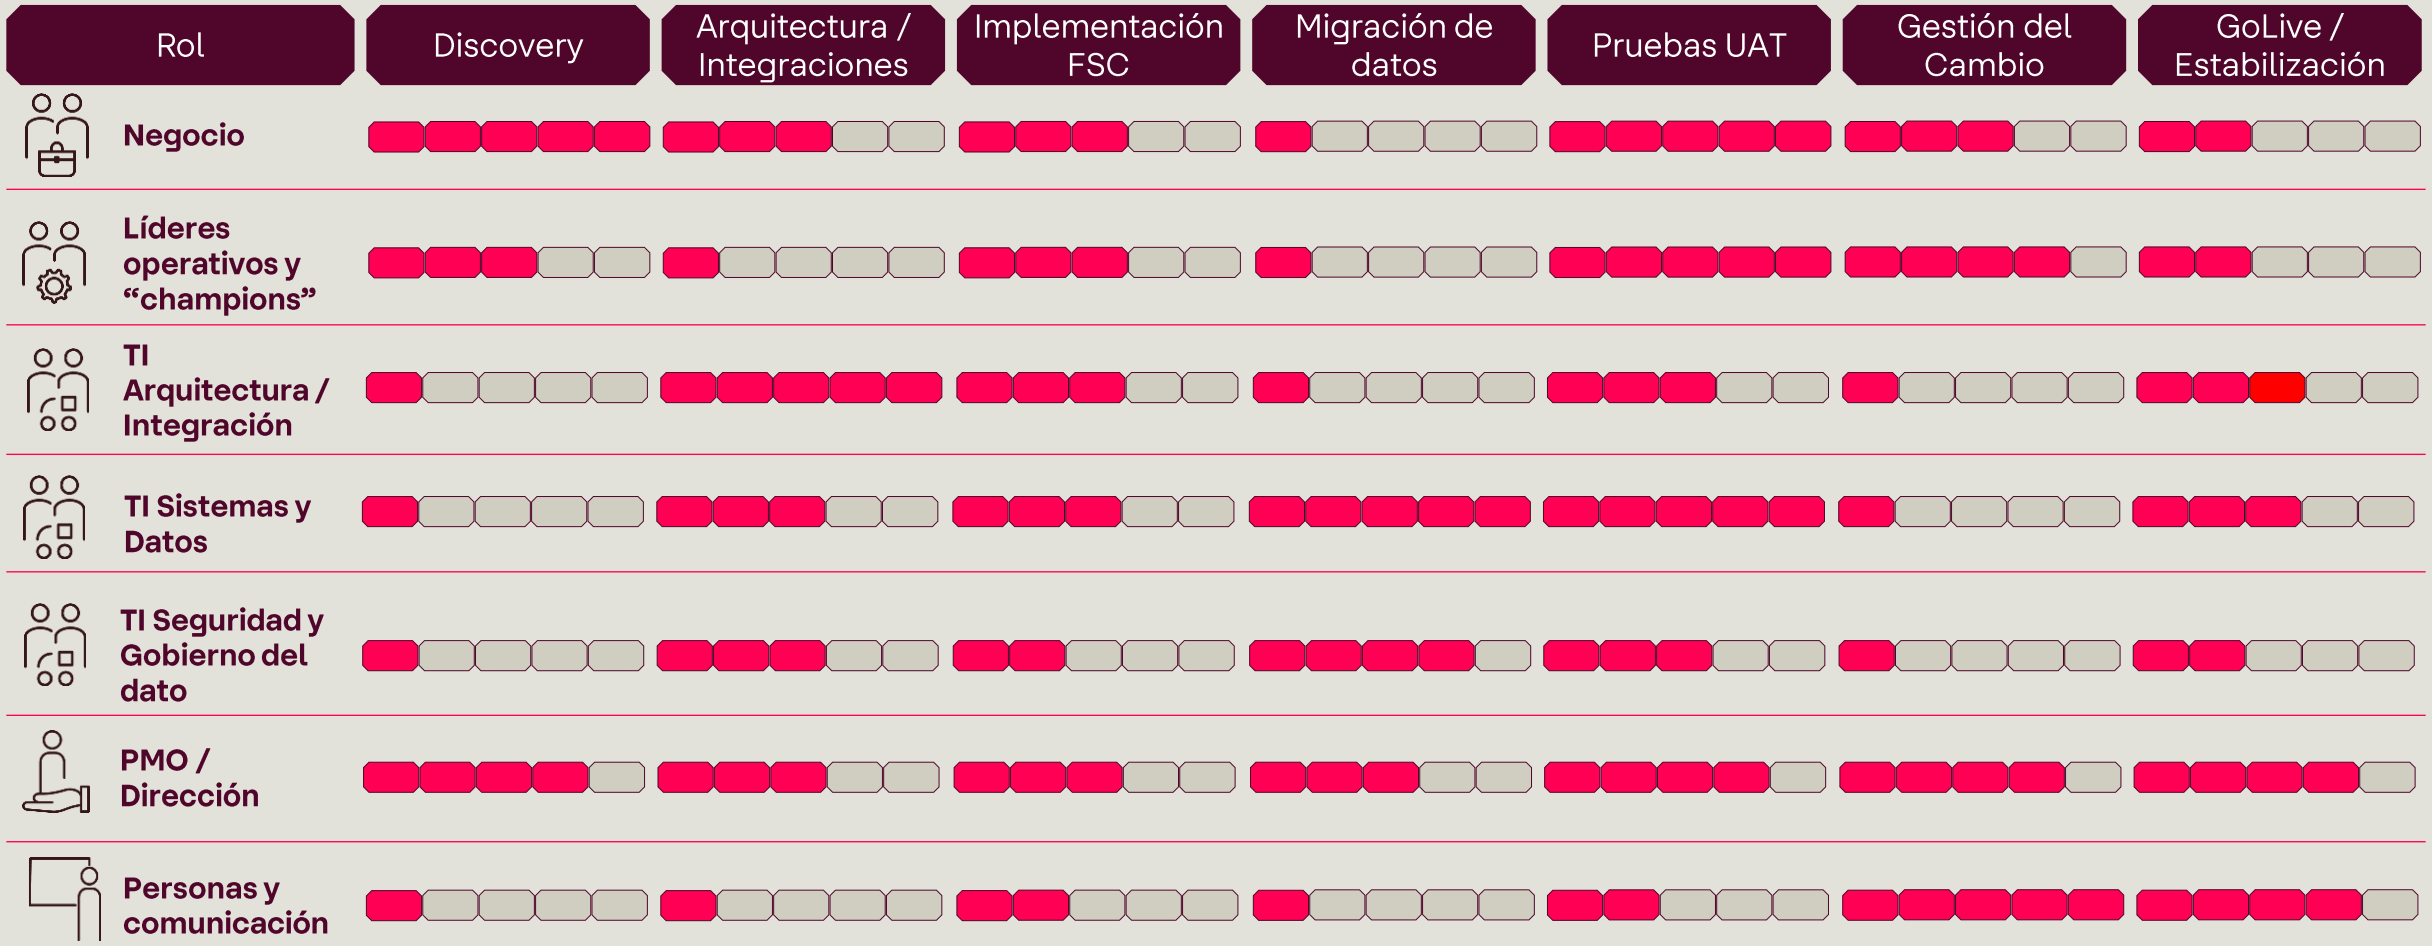

(1) De forma aproximada: 1) Implicación puntual (1-2h / semana); 2) apoyo ocasional (4-6h/semana); 3) Colaboración recurrente (8-12h / semana); 4) Participación activa (12-20h/semana); 5) Rol clave (dedicación completa)

(*) Compartimos con LDA documento independiente con un plan de capacidad detallado **"Anexo Plan de Capacidad LDA"**

Fases de proyecto, Metodología y Licenciamiento

03



MINSAIT

Proponemos un modelo híbrido de proyecto: de waterfall a ágil, con una fase de Discovery y definición sólida que enmarque el proyecto y un desarrollo Agile que impulse el crecimiento y la creación de valor

Ejes de decisión



Agilidad

Rapidez en la definición de **objetivos** a corto plazo.

Flexibilidad

Comprensión de las diferentes necesidades del **momento.**

Incertidumbre

No descartar posibles cambios que contribuyen al objetivo común del proyecto, **crear valor**.

Entregas “parciales”

- Modelo flexible que proporcione valor desde las primeras etapas del proyecto.
- Productos finales en cada Fase del proyecto.

Filosofía de trabajo y método para **aportar valor** de forma temprana.

Entrega de **mayor valor añadido** y **antes.**

Validaciones y revisiones continuas por IT y Negocio

- Mantenimiento de opciones “abiertas” el mayor tiempo posible.

Evitamos GAPs entre la definición y la implantación final, asegurando que lo que se define es implementable

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros + Fidelización

Fase 7:
Retención/ATC Chats + Quejas & Reclamaciones

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Cotización Salud + Supl.

Estructuramos la Fase 0 - Discovery en 3 etapas secuenciales e iterativas a fin de transformar los requisitos funcionales en artefactos accionables para implantar

Se plantean **3 fases secuenciales** que garantizan la **trazabilidad completa desde el requisito funcional hasta la experiencia de usuario validada**

Cada fase genera entregables que alimentan la siguiente, asegurando que no se pierde información crítica en la transición y que cada decisión es aprobada por los interlocutores de LDA.

El objetivo es **maximizar el aprovechamiento de las capacidades estándar de la solución CRM**, evitando personalizaciones innecesarias y proponiendo, cuando proceda, reenfoque de procesos que simplifiquen la implementación sin perder valor funcional

Enfoque metodológico

Fases	1. Discovery de requisitos	2. Definición de historias de usuario	3. Diseño UX y prototipados
Actividades	• **Análisis documental inicial**: Revisión de requisitos antes de su validación con negocio *(en RFQ, propuesta previa)* • **Sesiones de inmersión por dominio**: Validación guiada de requisitos y confirmación de flujos E2E, reglas, etc. • **Gap analysis y reglas de negocio**: Evaluación frente al estándar CRM para maximizar configuración OOTB • **Consolidación y validación**: Formalización de clasificación funcional y validación como base para historias de usuario	• **Descomposición inicial**: Traducción de requisitos en historias de usuario manteniendo traza con el origen • **Definición de reglas de negocio y criterios de aceptación:** formalización de validaciones y escenarios Given-When-Then • **Refinamiento colaborativo y Definition of Ready**: Sesiones iterativas con Product Owners de alineamiento • **Análisis de dependencias y priorización :** Identificación de impactos cruzados, y ordenación del backlog	• **Definición de flujos de interacción**: Traducción de historias en flujos E2E y arquitectura de información • **Diseño HI FI en CRM (o Figma)**: Creación de pantallas alineadas con historias y criterios de aceptación (campos, validaciones, estados, mensajes) • **Prototipado navegable:** Simulación interactiva de flujos principales. • **Validación de stakeholders y usuarios**: visión funcional y de usabilidad / experiencia
Entregables	• Matriz de requisitos final • Catálogo de reglas de negocio • Procesos validados E2E • Backlog preliminar cualificado	• Historias de usuario completas, y priorizadas (alineado a fases de implantación) • Matriz dependencias e impactos	• Diseño HI FI / prototipos navegables • Diseño visual aprobado (blueprint UX)
Equipo	• Experto Funcional Seguros • Líder de implementación • Arquitecto técnico FSC	• Experto funcional FSC • Desarrollador Senior FSC • Líder QA	

Iniciamos con el TO BE - Best Practices Industrias – Listos para Usar AI. - Listo para Escalar

Como punto de partida para abordar la implementación, compartimos con LDA las premisas que guiarán una ejecución rigurosa y habilitarán una solución flexible y escalable

EFICIENCIA OPERATIVA:


Menos pasos manuales, menos tiempo por llamada y más capacidad operativa sin aumentar el equipo.

ARQUITECTURA ESCALABLE:

Nuevos ramos, productos y canales se incorporan como extensiones del sistema existente, sin rediseñar la arquitectura base.

REDUCCIÓN DE DEUDA TÉCNICA:

TDD desde el Sprint 1 garantiza un sistema mantenible y auditable sin acumular el coste oculto que genera el desarrollo sin disciplina de calidad.

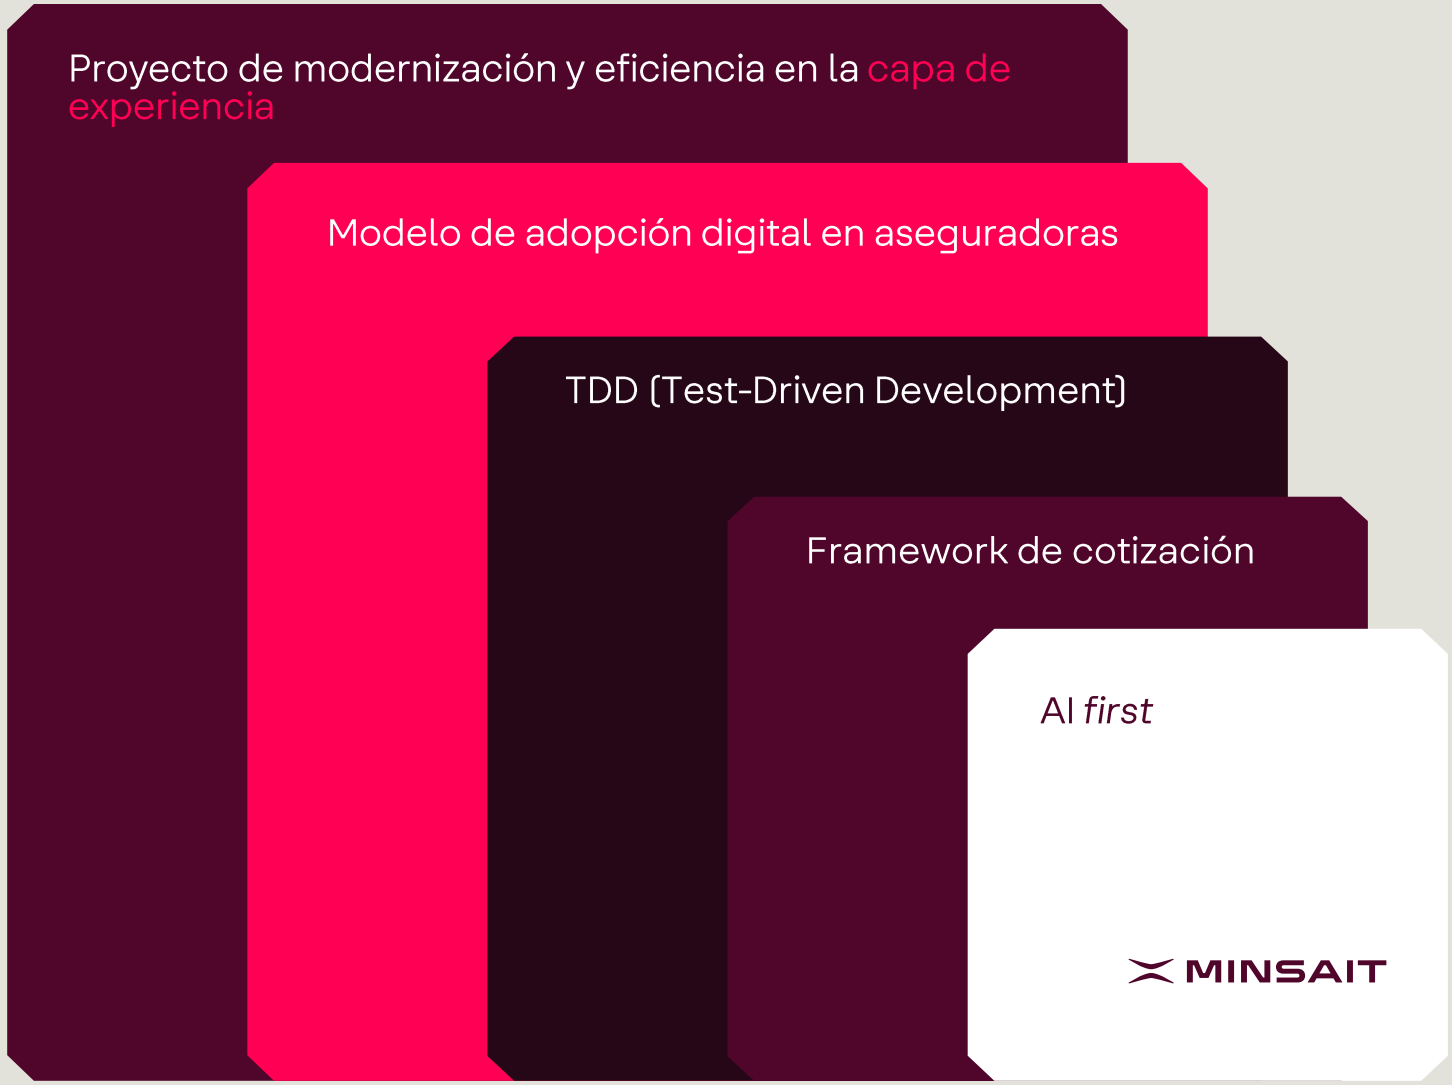

Aceleradores que permiten terminar el desarrollo del proyecto antes manteniendo un nivel de calidad óptimo y reduciendo la deuda técnica

Por parte de fabricante proponemos el módulo de **Financial Services Cloud** como elemento fundamental para construir el proyecto de LDA por ser le único CRM que contiene todos los elementos necesarios para desarrollar un proyecto en el sector Asegurador y adaptarse a las necesidades descritas en el pliego, del que destacamos:

- Modelo de datos Seguros FSC
- OmniStudio como framework de procesos único

Por parte de Indra/Nespon, desde nuestra experiencia implementando proyectos para el sector Asegurador con FSC desde hace más de 5 años, identificamos los siguientes puntos clave para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario y que aceleran el proyecto en diferentes fases del proyecto:

- Discovery
  Discovery inicial con refinamiento continuo por fase
- Diseño
  Framework de cotización construido para ser reutilizado desde el primer ramo
- Desarrollo
  TDD desde el Sprint 1 con Definition of Ready estricta

OmniStudio: ventajas y consideraciones de utilizar el framework declarativo de Salesforce FSC

VENTAJAS

Desarrollo declarativo sin código
OmniScripts, DataRaptors e Integration Procedures se configuran visualmente sin Apex, reduciendo el tiempo de construcción y la deuda técnica.

Reutilización entre ramos y fases
Los componentes construidos para el primer ramo (Hogar) se reutilizan en Coches, Motos, Salud y Empresas con parametrización mínima.

Menor necesidad de testing
Al no generar código Apex, se elimina la necesidad de mantener test classes con cobertura >75%. Las pruebas se concentran en validación funcional.

Mantenimiento autónomo por negocio
Cambios frecuentes (nueva cobertura, nuevo motivo, nueva regla) se aplican sin intervención de desarrolladores: basta con perfiles Admin.

Componentes visuales out-of-the-box
FlexCards, ARC y Action Launcher proporcionan experiencia visual rica sin LWC custom, acelerando la UX en la consola del agente.

CONSIDERACIONES

Curva de aprendizaje inicial
El equipo necesita formación específica en OmniStudio. Mitigación: Nespon aporta +5 años de experiencia en FSC con formación incluida en Discovery.

Dependencia de la licencia FSC
OmniStudio requiere la licencia FSC Sales & Service. Mitigación: la licencia ya está contemplada en el alcance del proyecto.

Limitaciones en lógica muy compleja
Escenarios con lógica de negocio muy específica pueden requerir Apex invocable. Mitigación: se estima <5% del alcance como desarrollo custom.

Herramientas de debugging diferentes
El debugging de IPs y DRs requiere herramientas propias (OmniStudio Debugger). Mitigación: se entrega documentación de troubleshooting en el handover.

Actualizaciones de plataforma
Las releases de Salesforce pueden impactar componentes OmniStudio. Mitigación: se incluye validación de releases en el plan de mantenimiento post Go-Live.

Ejemplo: llamada al motor de tarifación del Galgo

Versión Apex

Para usar esta clase necesitas además un test unitario con mock del callout, un wrapper de la respuesta, gestión de errores y un trigger o Flow que la invoque. Son entre 150 y 200 líneas adicionales antes de tener algo desplegable.

```
public class TarifacionService {

    public static TarifacionResponse obtenerPrecio(TarifacionRequest request) {

        HttpRequest req = new HttpRequest();
        req.setEndpoint('callout:PAS_Tarifacion/api/v1/tarifa');
        req.setMethod('POST');
        req.setHeader('Content-Type', 'application/json');
        req.setHeader('Authorization', 'Bearer ' + getToken());
        req.setBody(JSON.serialize(request));
        req.setTimeout(10000);

        Http http = new Http();
        HttpResponse res = http.send(req);

        if (res.getStatusCode() == 200) {
            return (TarifacionResponse) JSON.dese
                res.getBody(),
                TarifacionResponse.class
            );
        } else {
            throw new TarifacionException(
                'Error PAS: ' + res.getStatusCode
            );
        }
    }

    private static String getToken() {
        // lógica de autenticación OAuth contra e
    }

    public class TarifacionRequest {
        public String ramo;
```

Versión Integration Procedure

Integration Procedure no genera deuda técnica, no requiere cobertura de tests y puede ser modificada por un consultor sin ciclo de desarrollo ni despliegue.

```
IP: TarifacionPAS
|
├── 1. DataRaptor Extract — "CargaDatosRiesgo"
|      Lee del contexto del OmniScript:
|      ramo, modalidad, CP, año construcción,
|      valor continente, valor contenido
|      → Output JSON: { "request": { ... } }
|
├── 2. HTTP Action — "LlamadaPAS"
|      Endpoint: Named Credential "PAS_Tarifacion"
|      Method: POST
|      Path: /api/v1/tarifa
|      Body: {input.request}
|      Timeout: 10000ms
|      → Output JSON: { "response": { primaNeta, primaTotal, coberturas[] } }
|
|   3. DataRaptor Transform — "MapeaRespuesta"
                                                    l
                                                    s[]

                                                    []
                                                    en el OmniScript
```

Comparativa	Apex	Integration Procedure
Líneas de código	~200 líneas	0 líneas
Test unitario obligatorio	Sí, +100 líneas adicionales	No requerido
Cambio en el endpoint del Galgo	Modificar código + deploy	Cambiar URL en Named Credential
Cambio en un campo del payload	Modificar clase + test + deploy	Modificar DataRaptor Transform
Perfil necesario	Desarrollador Apex	Consultor FSC OmniStudio
Tiempo de construcción	2–3 días	4–6 horas
Tiempo de modificación posterior	4–8 horas + deploy	30–60 minutos

Análisis de los requerimientos de LDA con Salesforce Financial Services Cloud para evaluar el grado de cobertura y el tipo de personalización requerido

El análisis de los 739 requerimientos del proyecto muestra que el 44% se resuelve con configuración declarativa pura o Flows estándar sin una sola línea de código. El 22% requiere OmniStudio en niveles básico e intermedio, aprovechando los componentes nativos de FSC para procesos guiados y automatización.

Solo el 34% restante requiere personalización avanzada con Integration Procedures e integraciones externas hacia Galgo, API Manager y BBDD externas, que es precisamente donde viven las integraciones con los sistemas core de LDA. En conjunto, más del 65% del proyecto se construye sobre capacidades estándar de FSC sin desarrollo propietario, lo que valida la elección de la plataforma y reduce significativamente el riesgo técnico del proyecto.

Número total de requerimientos de LDA

833

Incluyendo los 770 iniciales y los 63 adicionales de Quejas & Reclamaciones

0% Config. Declarativa

351

Campos, layouts, record types, validation rules, picklists, dynamic forms, list views, related lists

50% Flows Simples

133

Screen Flow, Record-Triggered Flow, Scheduled Flow) y Flows + Custom Metadata combinados

70% Omnistudio básico

194

OmniScript navegación, FlexCard display, DataRaptor Extract/Load, OmniScript, Calculation Matrix/Procedures

80% Integración

154

OmniScript + Integration Procedure orquestado, Flow + HTTP Callout, Screen Flow + HTTP Callout + Named Credential, IP con sistema externo simple. Integration Procedure + DataRaptor + integración externa (Galgo, API Manager, BBDD externas, Carfax)

Estrategia de persistencia de datos en Salesforce FSC

La estrategia de persistencia parte del siguiente principio : en Salesforce solo viven los datos que el agente necesita para operar, recomendar y gestionar la relación con el cliente.

- Las entidades *core* del negocio asegurador (cliente, póliza, figuras, cotización, verificación, interacciones) se persisten en FSC sobre el modelo de datos nativo.
- Los datos de valor contractual y regulatorio (coberturas detalladas, recibos, movimientos contables, documentación) permanecen en Galgo como fuente de verdad y se acceden en tiempo real desde FSC mediante Integration Procedures y Salesforce Connect sin replicarlos.

Esta arquitectura elimina la duplicidad de datos, garantiza la consistencia entre sistemas y minimiza el volumen de almacenamiento en Salesforce.

Objeto Salesforce	Uso en el proyecto LDA
Account / PersonAccount	Ficha 360, segmentación, Household
Contact / Lead	Figuras, prospectos Walmeric, scoring
Opportunity / Quote	Cotización multiproducto, versiones
Quote Line Item / Product2	Coberturas, catálogo de productos
Quote Contact Role	Tomador, asegurado, pagador por producto
InsurancePolicy	Pólizas vigentes, estados, suplementos
Case	Quejas, verificaciones, retención, recobro
Task / Event	Agenda, llamadas, citas, seguimiento
Campaign / Household	Campañas fidelización, grupo familiar
PaymentInstrument	Métodos de pago tokenizados (IBAN, tarjeta)
ContentVersion / EmailMsg	Documentos adjuntos, comunicaciones

Proponemos gestionar el ciclo completo de Quejas y Reclamaciones sobre el módulo nativo de Complaint Management de FSC: recepción multicanal, enrutamiento automático, trazabilidad regulatoria DGS, proceso guiado en 4 pasos y comunicaciones al cliente integradas con el Centro de Notificaciones de LDA

Componente central	Canales de entrada	Proceso guiado	Integraciones
Complaint Management (FSC)	**Omnicanalidad de Service Cloud**	**Service Process Studio + OmniScript**	**Omnicanalidad de Service Cloud**
FSC resuelve el núcleo del proceso con su módulo nativo de Complaint Management. El objeto Case se extiende con los campos regulatorios específicos de LDA (área de gestión, motivo, submotivo, número DGS, idioma, canal de entrada) y los 5 estados del ciclo de vida (en revisión, en gestión, terminada, duplicada, rechazada, reaperturada) se modelan sobre el motor de estados nativo de Salesforce.	Email-to-Case gestiona los buzones habilitados de recepción y crea automáticamente el caso con los adjuntos vinculados. Web-to-Case gestiona los formularios online. El motor de reglas de asignación de Salesforce distribuye de forma automática los casos a los buzones de los operadores según criterios de negocio. Los roles de coordinador y supervisor tienen acceso a reasignación manual desde la vista de lista con filtros por estado, canal, área de gestión y fecha de vencimiento.	Los 4 pasos del proceso (revisar nueva incidencia, revisar caso, comunicar resolución, tipificar queja) se construyen como pasos navegables en Service Process Studio, con campos condicionales por paso y cabecera fija con los datos clave del caso (reclamante, póliza, DGS, área de gestión, motivo, fecha de vencimiento).	**Galgo:** al crear y cambiar de estado el caso, una Platform Event publica automáticamente un comentario en la póliza asociada en Galgo con el ID del caso y el estado **CDN:** Integration Procedure centralizada la comunicación de cambios de estado al cliente por canal (email, SMS, carta, web) **Gestor documental:** los adjuntos se sincronizan con el gestor documental de LDA. **Ficha de pago:** cuando la resolución implica abono al cliente.

Basados en lecciones aprendidas y experiencias de proyectos similiares, identificamos potenciales riesgos, sus correspondientes planes de mitigación...

El proyecto se apoya en un contexto funcional, tecnológico y regulatorio preexistente en LDA, que condiciona el diseño, la integración y la evolución de la solución.

El modelo propuesto de gestión del proyecto incorpora una gestión estructurada y proactiva de riesgos, basada en **gobierno, seguimiento continuo y evidencias objetivas**, con el objetivo de anticipar impactos, reducir desviaciones y facilitar una toma de decisiones informada durante todo el proyecto.


En este marco, Minsait asume la gestión y **mitigación operativa**, mientras **que los riesgos estructurales derivados de procesos, datos, integraciones y decisiones de negocio forman parte del ámbito de responsabilidad de LDA.**

ID	Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Enfoque de mitigación (Minsait)	Asumido por
R1	Adaptación del CRM a procesos de negocio actuales de LDA	Alta	Alto	Análisis funcional, validaciones iterativas y control de alcance	LDA
R2	Evolución o indefinición del alcance funcional	Media	Alto	Gobierno de requisitos y trazabilidad de cambios	LDA
R3	Dependencia de integraciones con sistemas core y terceros	Alta	Crítico	Coordinación técnica y análisis de impacto	LDA
R4	Calidad y modelo de los datos origen (migración y trazabilidad)	Media	Alto	Validaciones, alertas tempranas y reporting	LDA
R5	Condicionantes regulatorios (RGPD, DORA, EIOPA)	Media	Crítico	Alineación técnica y evidencias de cumplimiento	LDA
R6	Dependencia de validaciones de negocio (UAT, decisiones clave)	Media	Alto	Planificación, seguimiento y escalado	LDA
R7	Expectativas sobre automatización de pruebas sin estabilidad previa	Media	Alto	Automatización desde el inicio priorizando flujos críticos y ampliación progresiva	LDA
R8	Cambios de prioridad sin ajuste de capacidad	Media	Alto	Gestión de la demanda y visibilidad de impacto	LDA
R9	Expectativas implícitas fuera del alcance de una implantación	Media	Alto	Delimitación clara de alcance, roles y reporting	Compartido
R10	Riesgos de ciberseguridad derivados del contexto corporativo	Baja	Crítico	Gestión de vulnerabilidades y priorización por criticidad	LDA

Minsait asume la responsabilidad de gestionar y mitigar los riesgos del proyecto mediante gobierno y control. Los riesgos estructurales de partida, ligados al contexto, procesos y decisiones de negocio de LDA, no pueden ser transferidos al proveedor y deben ser asumidos por LDA, aunque Minsait los gestione activamente.

Contamos con un modelo de gestión de cambios de alcance que garantiza control, transparencia y una evolución ordenada del proyecto

En el caso en el que, tras definir el alcance en la fase de Discovery y en cada Release, se detecten nuevas funcionalidades, incremento relevante de volúmenes (datos, usuarios o integraciones), cambios en prioridades que alteran la planificación, nuevos requisitos regulatorios o modificación del modelo operativo, se aplicará un **control de cambios de alcance** que **garantiza el cumplimiento de este, los plazos y el presupuesto establecidos**.

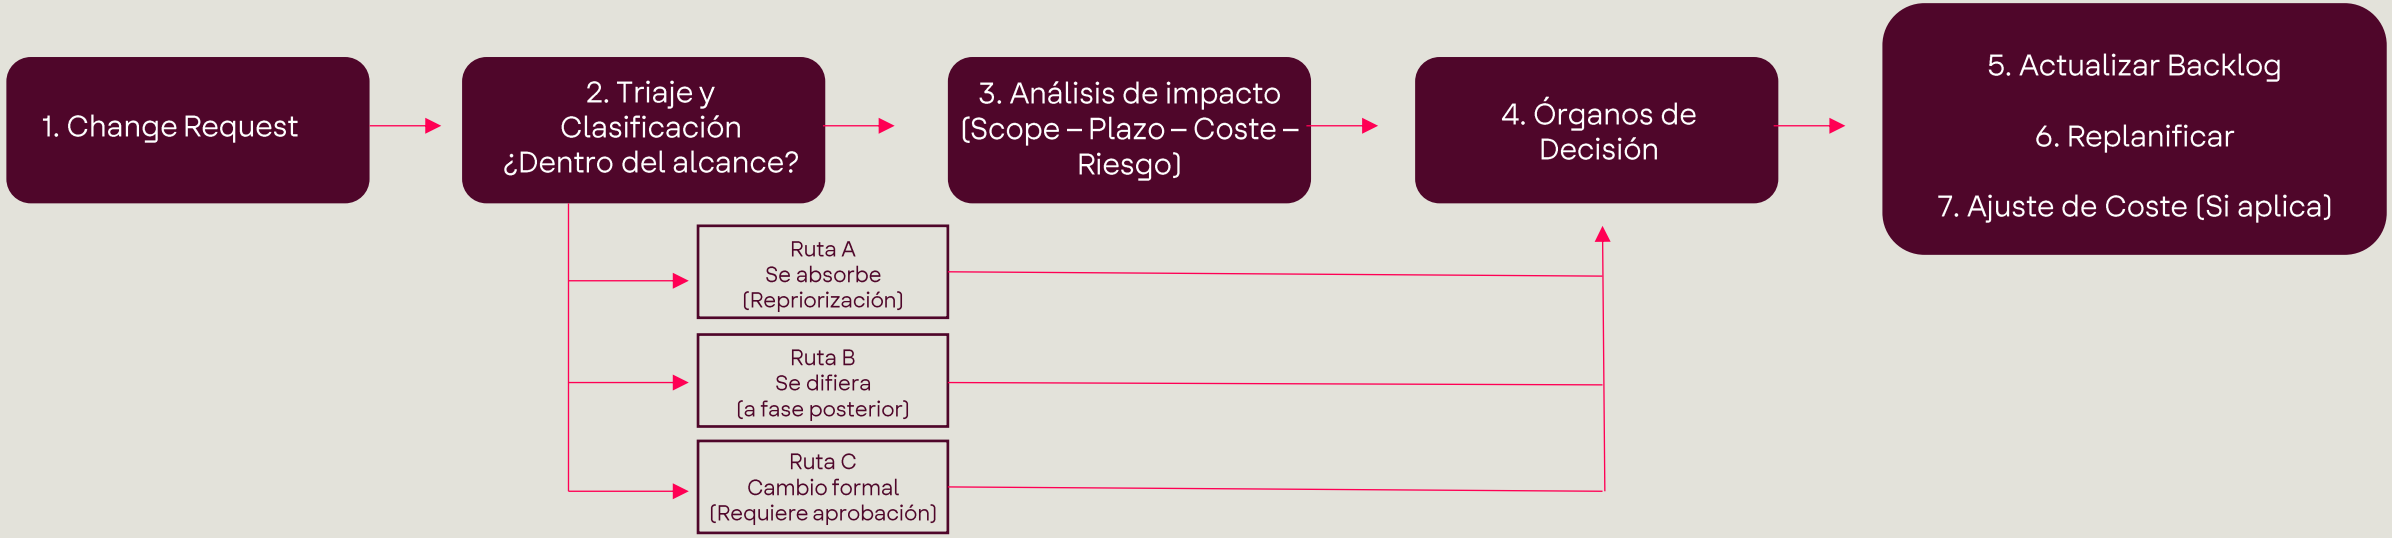

Aplicaremos un modelo de gobierno claro, ágil y trazable, con un flujo único de gestión de cambios y checkpoints de control en los momentos críticos (tras Discovery y al inicio de cada sprint/fase)

A continuación, compartimos con LDA nuestra visión sobre licenciamiento CRM

Product Name	Unidades	Visión MINSAIT
Financial Services Cloud (Incluido OmniStudio)	1.900	Plataforma Vertical de Salesforce diseñada específicamente para entidades financieras y aseguradoras (Incluye OmniStudio es un conjunto de herramientas low-code diseñado para crear procesos guiados complejos y experiencias digitales dinámicas)
Experience Cloud	100	Experience Cloud permitirá el acceso a un portal a los agentes externos para el alta de Leads y Oportunidades
Agentforce + Flex Credits	N/A	En el momento actual, **no se han identificado requerimientos funcionales ni casos de uso concretos de inteligencia artificial** que hagan necesaria la activación inmediata de **Agentforce** ni el consumo de **Flex Credits** dentro del alcance de esta implantación. No obstante, teniendo en cuenta el **horizonte temporal de contratación de licencias de Línea Directa**, así como el **modelo de consumo flexible basado en uso real de los Flex Credits**, Minsait **recomienda la contratación de estos componentes (con un volumen mínimo) sin activación inicial**, de forma que queden disponibles como habilitadores tecnológicos. Esta aproximación permite **preservar la capacidad de evolución futura de la plataforma**, facilitando la incorporación progresiva de capacidades de IA cuando se definan y prioricen casos de uso concretos, sin necesidad de reabrir procesos de licenciamiento ni alterar la arquitectura base. La **activación efectiva de Agentforce y el consumo asociado de Flex Credits quedará supeditada a la definición y validación de dichos casos de uso** y en **coherencia con la eventual incorporación de componentes habilitadores como Data Cloud**, que, en su caso, se gestionarían mediante el correspondiente proceso de gestión de cambios.
Data Cloud (Provisioning)	N/A	Minsait considera que **no resulta necesaria la inclusión de Salesforce Data Cloud en el alcance de los requerimientos actuales** para la construcción de la plataforma objeto de esta propuesta. En el contexto funcional y arquitectónico definido, las capacidades que aporta este componente (como la integración avanzada de datos, el enriquecimiento de la ficha de cliente, la disponibilidad de datos en tiempo real o la resolución de identidades) **no constituyen requisitos imprescindibles ni justifican, en esta fase, la inversión ni el consumo asociado**, al estar dichas necesidades adecuadamente cubiertas por los componentes incluidos en la solución propuesta. No obstante, Minsait considera que **Data Cloud es el habilitador estratégico en fases posteriores** en casos de uso de Agentforce, donde sus capacidades aportan valor adicional. La **eventual incorporación de Data Cloud supondría una ampliación del alcance funcional y técnico inicialmente definido**, con impacto en el modelo de datos, las integraciones, el licenciamiento y la operativa de la plataforma, por lo que debería ser abordada mediante el correspondiente proceso de gestión de cambios.
Service Cloud Voice – Partner Telephony **CX Cloud from Genesys and Salesforce**	N/A	Para **habilitar la correcta integración entre Salesforce y Genesys Cloud**, dando soporte a los canales de atención incluidos en el alcance del proyecto. Estos componentes permiten **la integración nativa de la capa omnicanal de atención, asegurando la correcta gestión de interacciones de voz y chat dentro de Salesforce, así como la trazabilidad de las interacciones y su contextualización en la ficha de cliente**. El licenciamiento y consumo asociado a Service Cloud Voice deberá **alinearse con el alcance funcional validado y formará parte del modelo de implantación de Genesys y Salesforce integrado**, sin impacto en el modelo arquitectónico propuesto

linea directa

Y nuestra visión sobre Middleware + API Manager con Mulesoft

Product Name	Unidades	Visión MINSAIT
Mulesoft Anypoint Platform	Por determinar	Plataforma de integración donde de desplegarán las APIs de integración y el consumidor de los eventos generados en Galgo. Adicionalmente proporciona los componentes necesarios para gestionar el ciclo de vida completo de las APIs. Componente para la exposición de los servicios de CRM mediante el conector nativo de Saleforce que no requiere licenciamiento adicional lo que evita el consumo de las APIs de Salesforce que pueden suponer un coste oculto dentro del sistema Experience Cloud permitirá el acceso a un portal a los agentes externos para el alta de Leads y Oportunidades
Plataforma de Gestión de Eventos	Por determinar	Solución de Gestión de Eventos quer permitirá la publicación de los eventos generados en Galgo mediante CDC (la solución también puede proveer este componente), así como la implementación del resto de integraciones asíncronas que se puedan requerir en el proyecto. Incorporación en CRM de la información generada en Galgo mediante el consumidor de eventos implementado en Mulesoft
API Gateway	Por determinar	Solución de API Gateway que permitirá en caso necesario la aplicación de políticas de seguridad (autenticación y autorización) y de consumo (Rate Limiting, Throatling, etc.) sobre las APIs expuestas en Anypoint Platform Asegurar el consumo de los recursos de CRM únicamente por aplicaciones autorizadas y asegurar el rendimiento de la plataforma global mediante la monitorización del consumo de las APIs, así como la aplicación de SLAs en los flujos de integración

Apoyándose en las licencias Experience Cloud LDA podrá dar cobertura al Portal Call Center Externo

Línea Directa requiere habilitar a **agentes de Call Centers externos para la captación comercial de Leads y el registro de Oportunidades**, integrando dicha actividad en Salesforce como **fuente única de verdad**

- Minsait propone el uso de **Experience Cloud** a través de **Partner Community** como portal específico para agentes externos, desacoplado del canal interno, seguro y plenamente **integrado con Financial Services Cloud**

Beneficios para LDA

- **Integración ordenada de canales externos** en el ecosistema CRM.
- **Homogeneización de la captación comercial** desde todos los canales.
- **Mayor control, trazabilidad y calidad del dato** desde el origen.
- Desacoplamiento del canal externo **sin exponer procesos internos**.
- **Escalabilidad del modelo** a nuevos partners o plataformas.

Captación Comercial

- **Alta y edición de Leads** por agentes externos.
- **Creación y actualización de Oportunidades** asociadas.
- **Ownership de registros creados** por los agentes externos
- **Reporting estándar de rendimiento comercial** para seguimiento de responsables de canal.

Integración con el Canal LDA

- **Visibilidad inmediata de Leads y Oportunidades** en Salesforce FSC.
- **Aplicación de reglas de asignación y tratamiento** definidas por LDA.
- **Continuidad del ciclo comercial** por los equipos internos.
- **Seguimiento de la actividad comercial de canal externo**

Acceso y Experiencia de usuario

- **Acceso mediante portal Experience Cloud** independiente del canal interno.
- **Interfaz Lightning creada a partir de plantilla estándar de Salesforce**, adaptada al rol del agente.
- Navegación simplificada, enfocada exclusivamente a captación.

Seguridad y Control

- **Perfiles y permisos** específicos para agentes externos.
- **Acceso restringido exclusivamente a los objetos y datos** necesarios para la actividad.

La solución permite a Línea Directa incorporar la actividad de agentes externos como parte integral de su CRM, manteniendo el control funcional, la seguridad del dato y la coherencia del modelo comercial, sin comprometer la gobernanza ni la operativa del canal directo

....Y los supuestos y las dependencias críticas para realizar una implantación con éxito

El proyecto se apoya en un contexto funcional, tecnológico y regulatorio preexistente en LDA, que condiciona el diseño, la integración y la evolución de la solución.

La propuesta de implantación del CRM Salesforce se basa en un **modelo de trabajo colaborativo entre los equipos de Minsait y LDA**, estructurado en distintos workstreams y fases.

El éxito del proyecto requiere la **disponibilidad efectiva de determinadas capacidades, servicios, infraestructuras y equipos de LDA**, que actúan como dependencias críticas para la ejecución del plan de trabajo.

La siguiente lista identifica en detalle dichos supuestos

Licencias	Licencias FSC Sales & Service con OmniStudio, SPS, Complaint Management y Einstein activas día -1. MuleSoft y Kafka operativos antes de integraciones.
Equipo	Coordinador de Proyecto LDA (50-70%), 2 Product Owners con decisión funcional (30-40%), Responsable IT Galgo (20-30%), Responsable Infraestructura (10-20%).
Equipo	Key Users (mín. 10 agentes/colectivo) en validación UX y UAT en horario laboral. Equipo CoE CRM activo desde mes 14 para Knowledge Transfer.
Alcance	Gestión del cambio y formación según plan aprobado. Cambios en estrategia de adopción requieren re-planificación con impacto en calendario.
Mig Datos	Disponibilidad, calidad y conocimiento de los datos origen, así como criterios regulatorios definidos
Datos	LDA entregará taxonomía de quejas, valores de picklists, catálogos de productos y reglas de negocio en formato estructurado antes de cada sprint.
Integración	Documentación y disponibilidad de las API REST de Galgo, pasarela de pagos, gestor documental IBM Content Manager y centro de notificaciones antes del sprint de cada integración.
Integración	API Manager operativo con endpoints, rate limiting y Named Credentials. Bus Kafka/Confluent con tópicos CDC por entidad para sync near-RT.
Entornos	Sandbox desarrollo con datos representativos antes de cada fase. Sandbox Genesys Cloud target para validar Open CTI (SLA < 2 seg).
Entornos	Sandbox Galgo con datos anonimizados y transacciones CICS para pruebas E2E de integración bidireccional FSC↔Galgo.
Seguridad	SSO SAML 2.0 Oracle IAM ↔ FSC completado en Fase 0. Trusted IP Ranges de LDA y proveedores externos (Konecta, Majorel, Salesland, Marktel, Transcom).
Proyectos	Coordinación con CCaaS Genesys Cloud (CTI en F1), definición maestro Lead ID↔Persona ID con Walmeric, y coexistencia Epiphany/Adobe Campaign antes de F1.

El modelo propuesto por Minsait mitiga activamente los riesgos de ejecución mediante planificación, gobierno y seguimiento continuo. Sin embargo, el cumplimiento de estos supuestos y dependencias por parte de LDA es clave para preservar plazos, calidad y alcance, garantizando una implantación ordenada y alineada con los objetivos de negocio del proyecto.

Integraciones – aspectos claves tecnológicos

04



MINSAIT

Minsait propone Mulesoft como solución de Integración para cubrir los requisitos de integración planteados por LDA en esta RFP, e Informatica para la extracción de datos del CRM


A través de Mulesoft, Linea Directa contará con una plataforma que le permitirá evolucionar su ecosistema tecnológico gracias a las siguientes capacidades:


- Gestión del ciclo de vida completo de las APIs mediante una plataforma unificada.
- Implementar cualquier patrón de integración y transformación, incluyendo API Management, ESB, SOA, ETL/ELT, Batch, streaming y Publicación / Suscripción.
- Permite la ejecución tanto on-premise, iPaas, nube privada o en instalaciones híbridas.
- Permite conectar cualquier aplicación, dato o dispositivo, ya sea en la nube u on-premise.
- Enfoque de entrega único, permitiendo a los clientes crear el modelo operativo óptimo para favorecer la reutilización y el autoservicio de las APIs.

Para la extracción de datos del CRM hacia el Lakehouse, recomendamos que LDA utilice su plataforma corporativa de datos (Informatica), conectándose directamente a Salesforce mediante **conectores estándar** y **APIs** (utilizando la Bulk API para grandes volúmenes y/o mecanismos de incrementalidad basados en LastModifiedDate, SystemModstamp u otros criterios acordados.). Este enfoque **evita desarrollos innecesarios**, mantiene la arquitectura desacoplada y sitúa la gestión del dato analítico bajo el gobierno natural del Lakehouse. **El equipo de proyecto Minsait dará soporte en la definición del modelo, la exposición de APIs y la validación de la información**.

Mulesoft es una plataforma COMPLETA de integración...



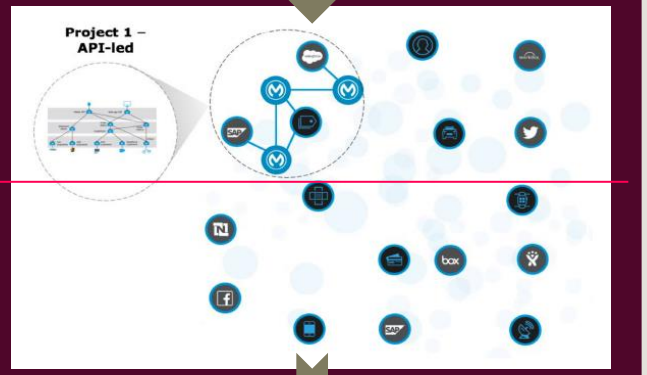


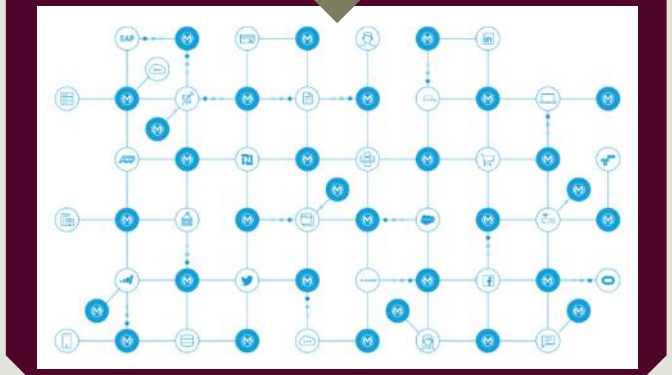


Proponemos una arquitectura de integración orientada a APIs para conectar Salesforce con el ecosistema tecnológico de LDA...

La arquitectura propuesta cuenta con **3 elementos principales**:

- **Control Plane** que incluye API Exchange, Design Center y Management Center que permite llevar a cabo la gestión del ciclo completo de las APIs
- **Flex Gateway** que será el API Gateway donde se ejecutarán las políticas de seguridad del consumo de las APIs.
- **Mule Runtime** donde se podrán albergar los flujos de integración con los diferentes sistemas (Galgo, ASNEF, SINCO,...) que permitirá llevar a cabo la orquestación de servicios y se comunicará mediante un conector nativo con el **Salesforce**

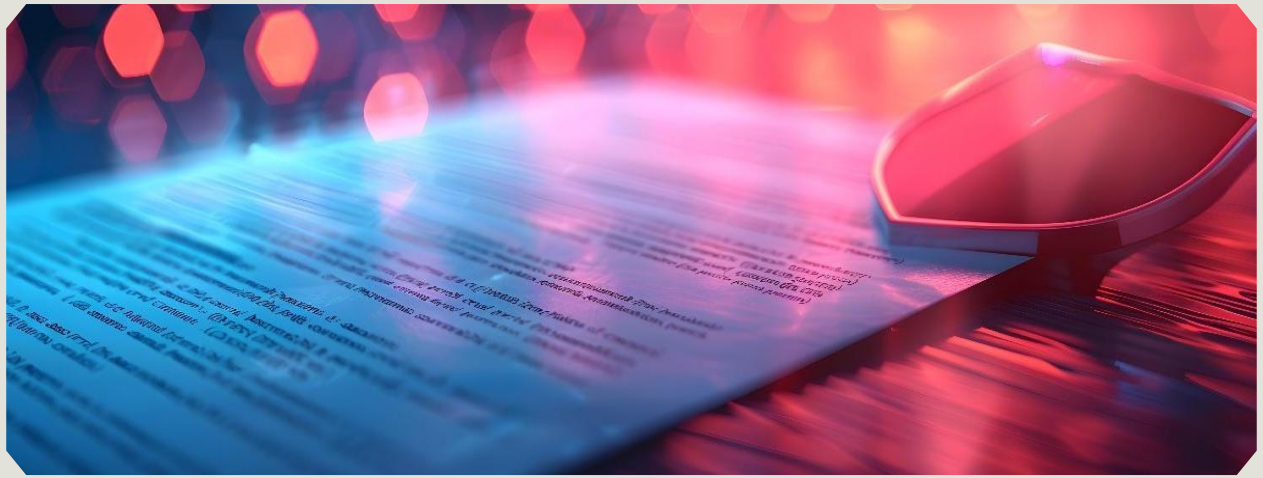


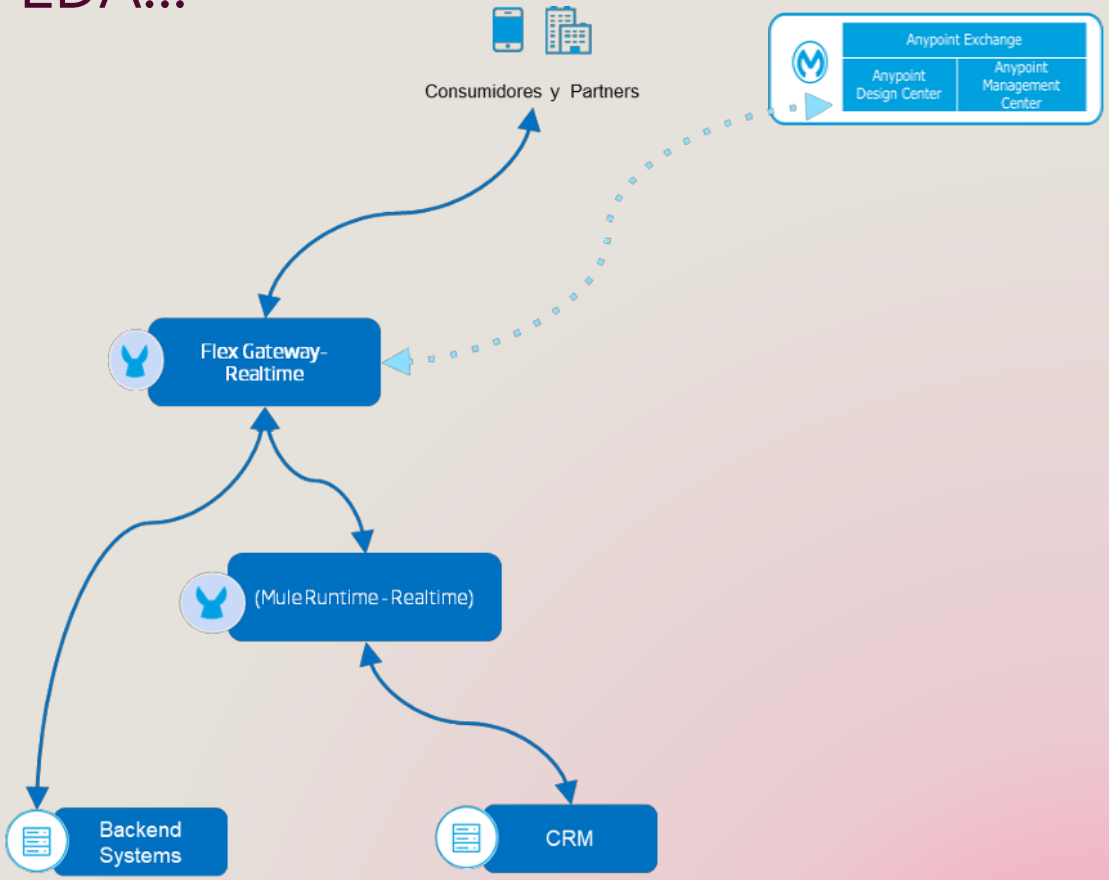

...donde cada elemento asumira un conjunto dentro del ecosistema de arquitectura...

Dado que Mulesoft es una plataforma unificada de gestión de APIs (Middleware + API Manager), se plantea el siguiente escenario en cuanto al reparto de responsabilidades

- **API Manager (Control Plane):** Permite llevar a cabo la **gestión global del ciclo de vida de las APIs** que incluye API Exchange como catálogo de servicios y su documentación asociada de manera interna, Design Center para la definición de las APIs, Developer Portal, API Visualizaer para llevar a cabo la monitorización de las APIs
- **API Gateway (Flex Gateway)** que será el API Gateway donde se ejecutarán las políticas de seguridad del consumo de las APIs definidas en el API Manager.
- **Middleware (Mule Runtime)** donde se podrán albergar los flujos de integración con los diferentes sistemas (Galgo, ASNEF, SINCO,...) que permitirá llevar a cabo la orquestación de servicios y se comunicará mediante un conector nativo con el **Salesforce** lo que evitará que afloren **costes ocultos** por la invocación de sus APIS.

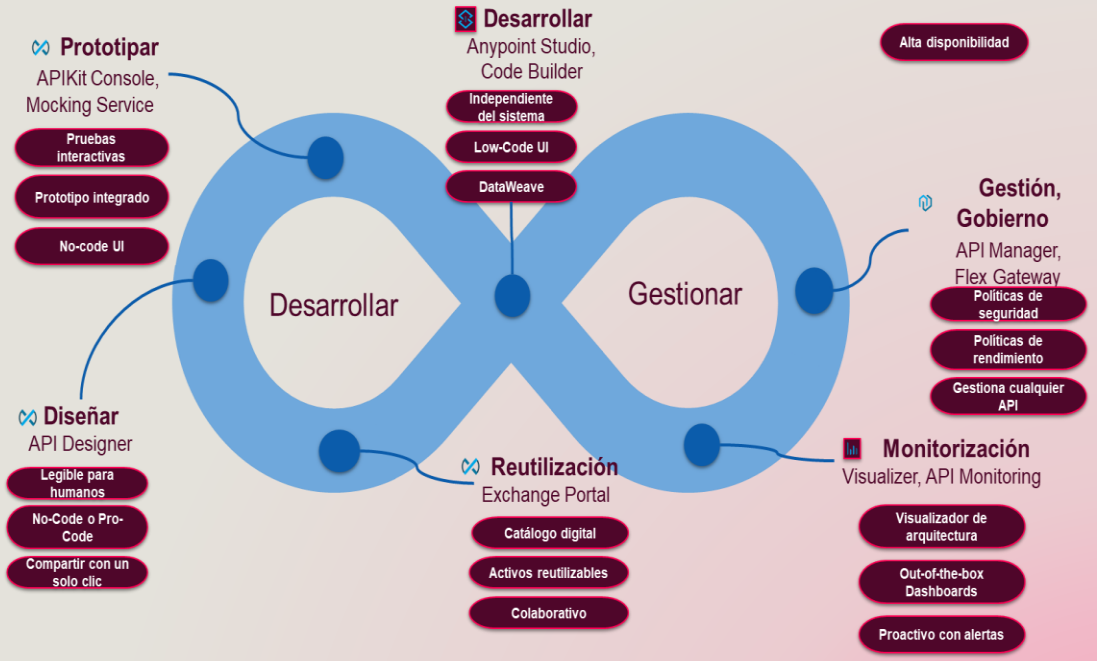


Adicionalmente a los componentes Mulesoft identificados se plantea la incorporación de una plataforma de gestión de eventos basada en Kafka, siendo la recomendación de Indra la opción de Confluent.io

...incluyendo la integración de canales con Genesys Cloud CX...

- La solución propuesta integra el **centro de contacto en la nube Genesys Cloud CX** —actualmente en implantación en Línea Directa— con **Salesforce Financial Services Cloud**, unificando la experiencia del agente mediante un modelo de **arquitectura desacoplada pero profundamente integrada**.
- En el enfoque alineado con la iniciativa de implantación del Contact Center, **Genesys Cloud CX** actúa como la plataforma omnicanal para la gestión completa (incluido el enrutamiento a agente) de las interacciones (voz y chat), mientras que **Salesforce FSC** se consolida como el **sistema central de cliente y operación de servicio** (Policy 360, siniestros, agrupación de hogares, etc.) desde el que el agente interactúa con el cliente por voz y conversaciones de chat
- La integración se habilita mediante el paquete gestionado **CX Cloud from Genesys and Salesforce**, disponible en AppExchange, que incrusta tanto el softphone de Genesys como la interfaz de conversación del chat dentro de la consola de Salesforce junto a **Service Cloud Voice** y permite funcionalidades clave como **screen-pop automático**, consulta en tiempo real del cliente, y sincronización de estados del agente en ambas plataformas. El modelo asegura una **omnicanalidad unificada**, integrando presencia, enrutamiento y políticas de contacto mediante Genesys Architect, junto con **mapeo bidireccional de datos**.


En el caso de las conversaciones por chat, Salesforce recibe el flujo de datos del chat de Genesys a través de APIs. Esto es suficiente para que **Salesforce Einstein** (embebido en Financial Services Cloud) "lea" la conversación y ofrezca asistencia (Agent Assist/Copilot) para el resumen de la conversación o sugerencias para el agente entre otras.

Flujo de orquestación de chat

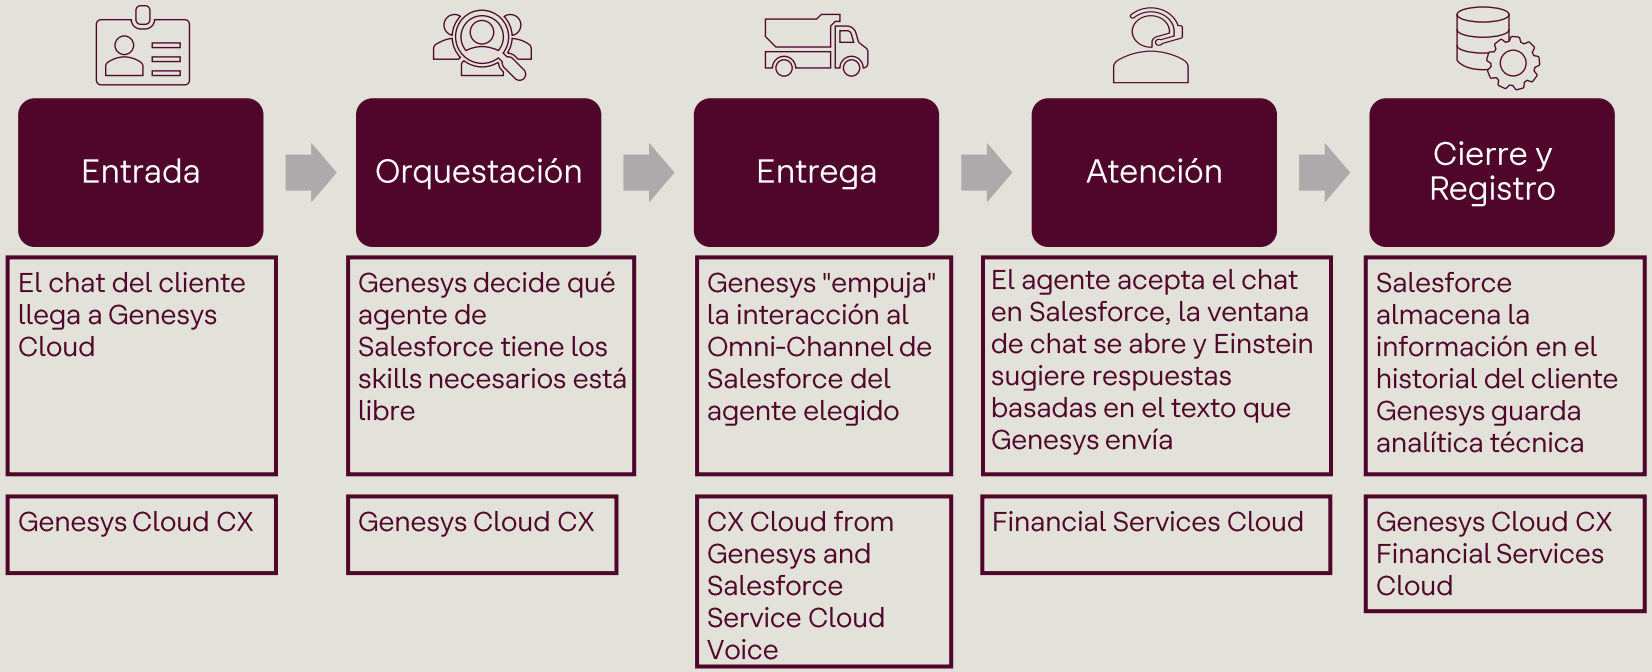

...proporcionando un modelo de seguridad unificado mediante la gestión de Identidad y autorización (FSC-Middelware-Galgo)

Modelo de identidad y autorización centralizado que garantiza accesos seguros, trazabilidad completa y protección del core Galgo en todos los flujos entre CRM y sistemas.

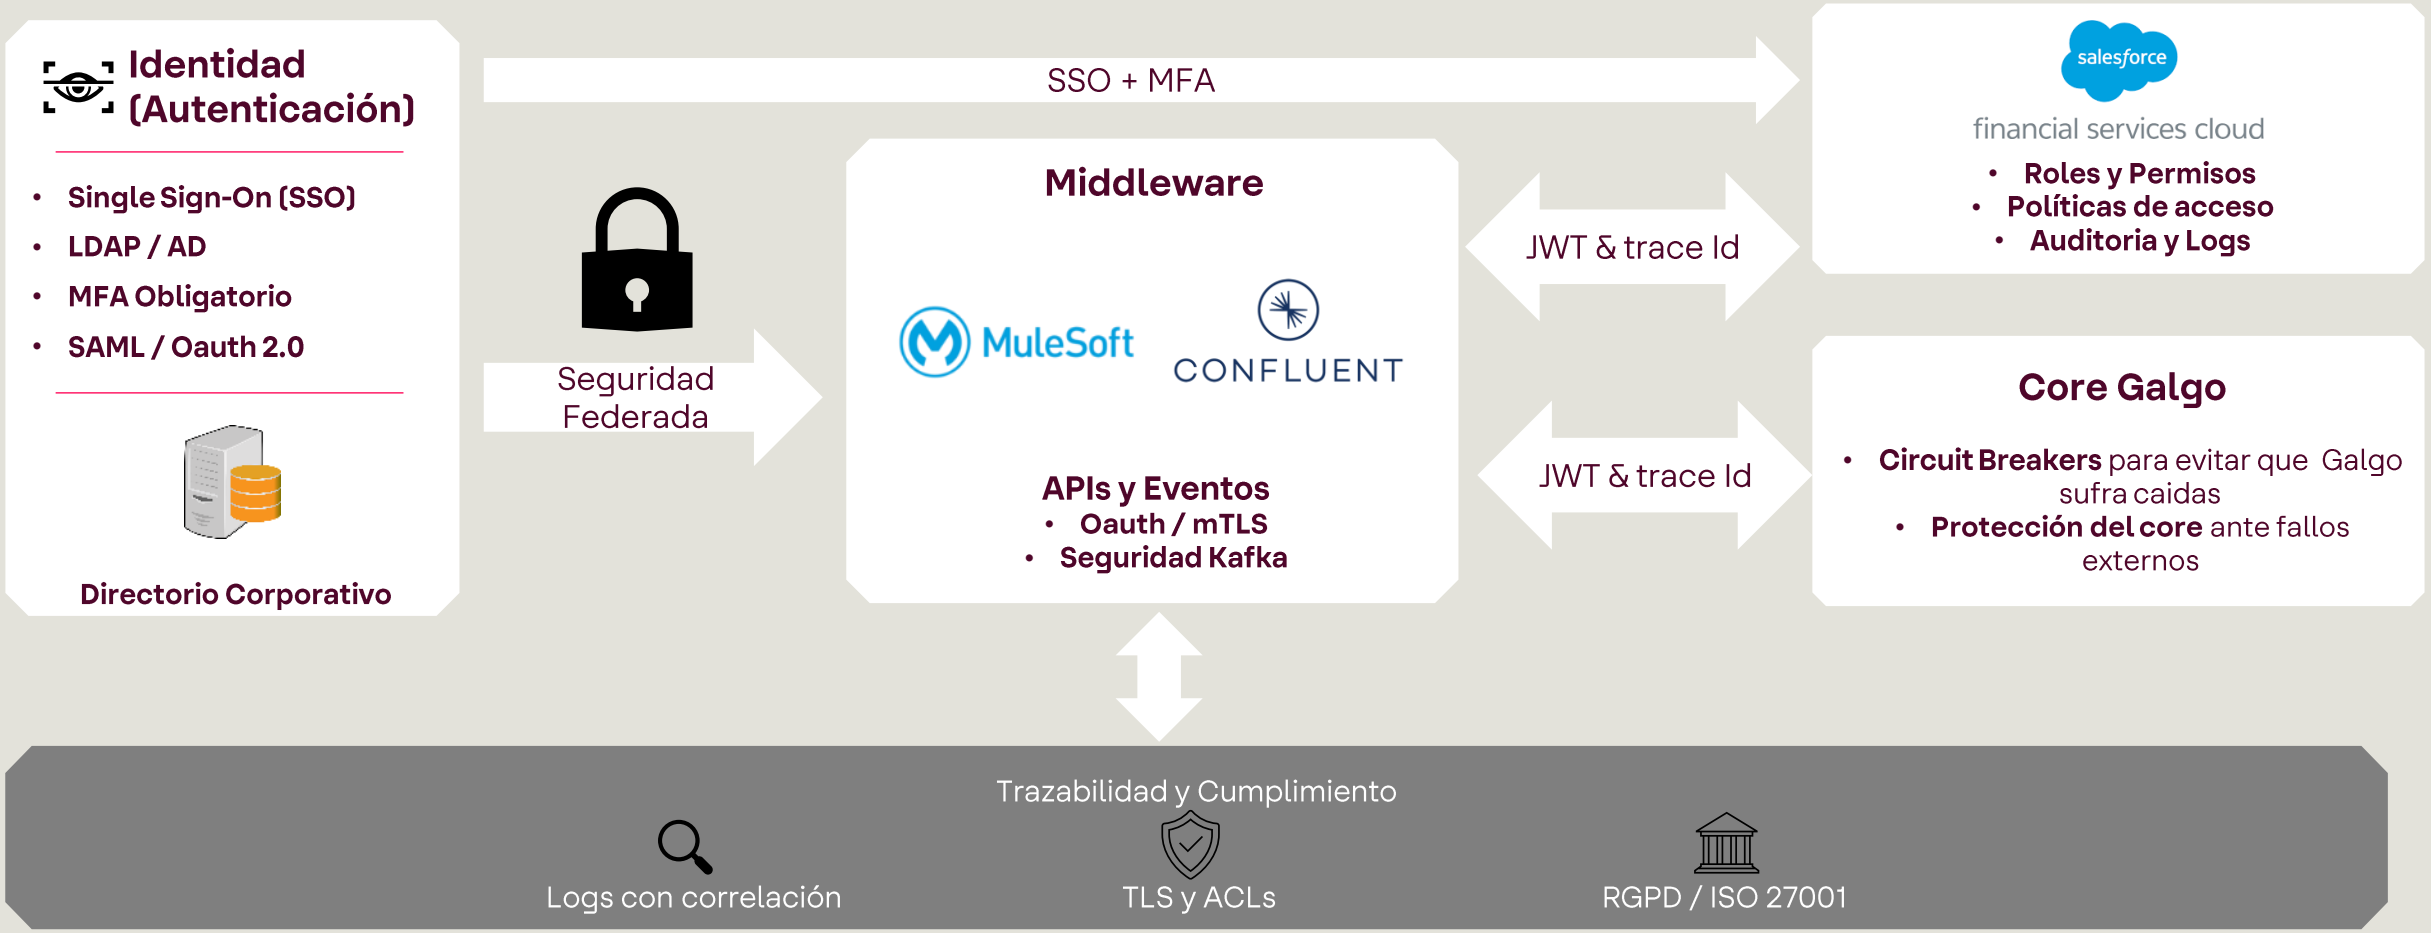

Entornos de trabajo completamente homogéneos y alineados con la estrategia CI/CD de LDA

A.

Desarrollo

Entorno de tipo Sandbox **utilizado por los desarrolladores** para realizar la implementación y las pruebas, al margen del entorno de producción.

Todos los **evolutivos solicitados y fixes reportados** serán gestionados y solucionados en este entorno.



Movimiento controlado →

B.

Preproducción

El entorno de preproducción será una copia idéntica al entorno de producción de manera que se pueda simular éste con el fin de que los **usuarios de negocio puedan testear las actualizaciones** y asegurar que no dañarán la solución cuando se encuentren desplegadas en el entorno de producción.

Una vez que el proyecto está **totalmente testeado y se han pasado todas las UATs** definidas se desplegará en el entorno de producción.



Movimiento muy controlado →

C.

Producción

Entorno de producción **previsto para utilizarse en el trabajo permanente de la organización**, donde accederán los usuarios finales y donde se trabaja con los datos reales del negocio.




Reportes de Testing ←

Pedidos de nuevas funcionalidades o cambios en el proyecto ←

Mapa de integraciones identificadas

Siguiendo la aproximación API-Led Connectivity que nos permitirá aumentar la reutilización de los activos construidos durante la ejecución del proyecto mejorando el time-to-market de los flujos de integración y basado en la información obtenida durante la fase de assessment se han identificado un conjunto de integraciones que se representan de manera ilustrativa en el diagrama adjunto

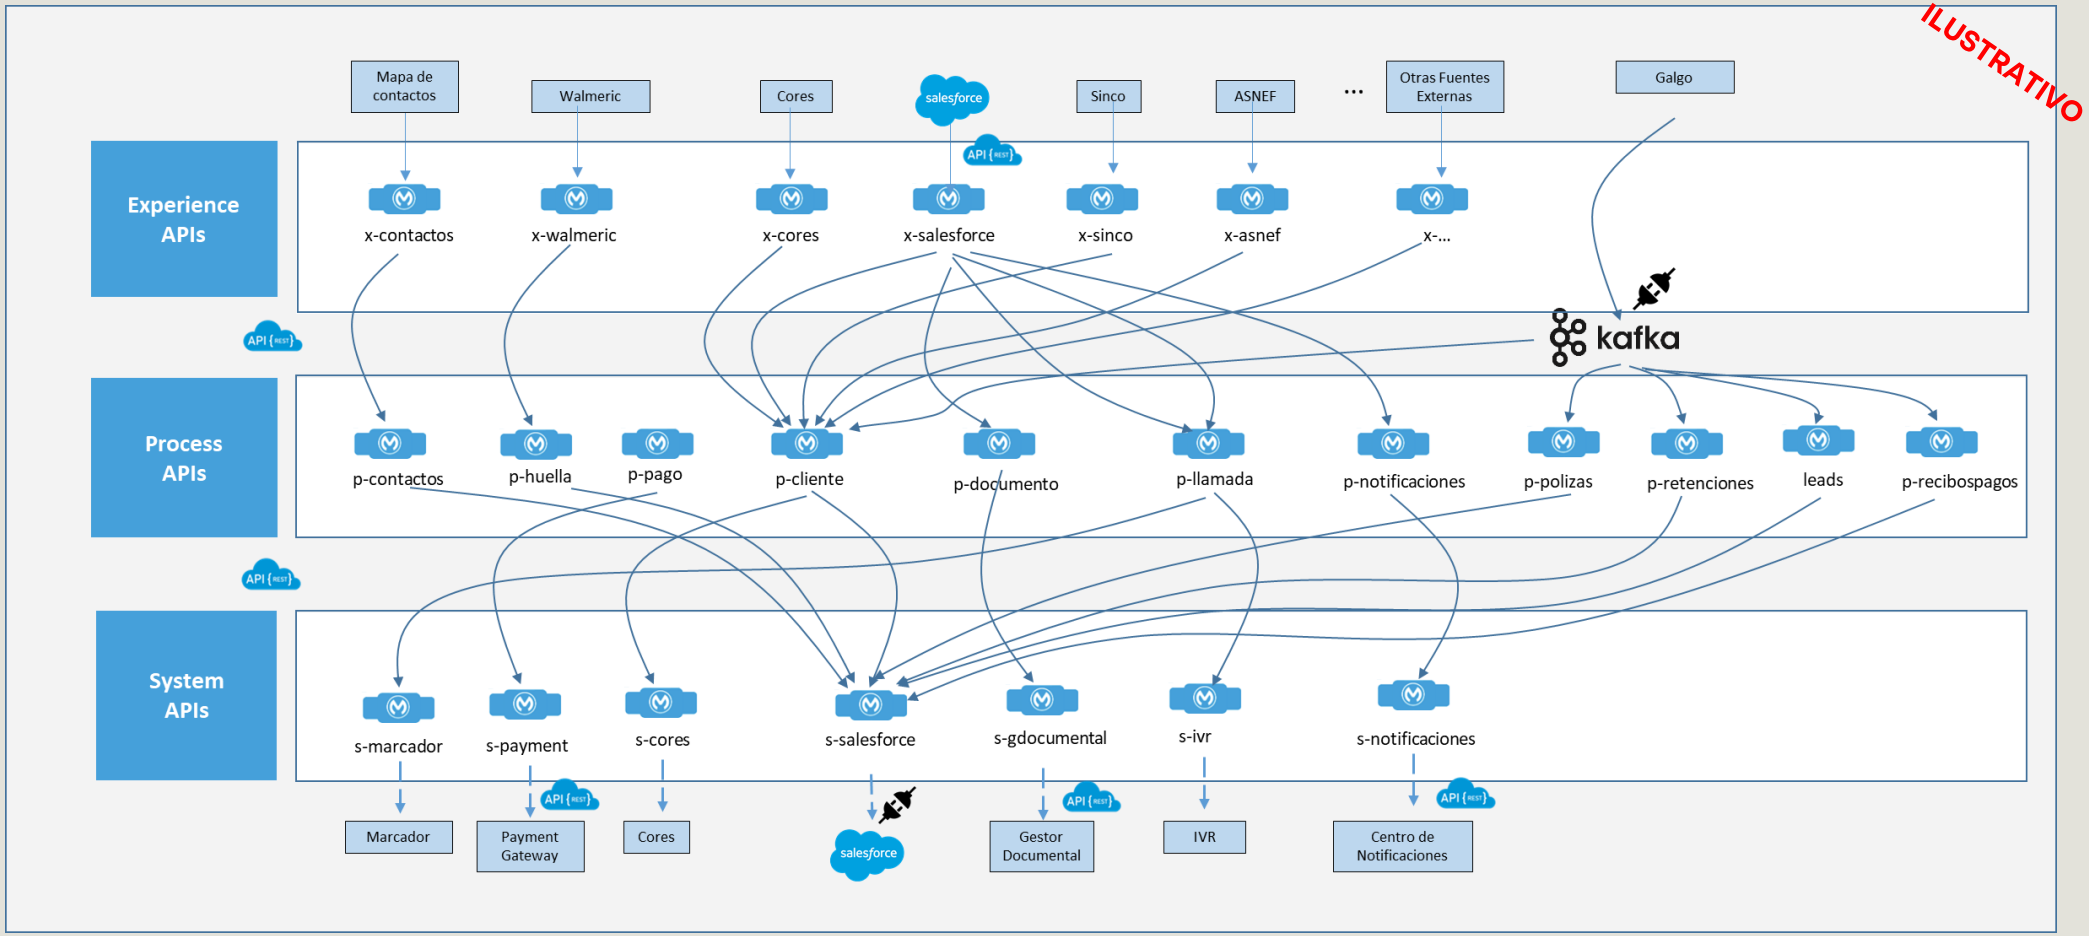

Durante la fase de Discovery se realizará un análisis detallado de las integraciones con los 45 sistemas mencionados necesarias de cada fase en la RFP junto con LDA para refinar el diagrama API-Led donde será posible establecer el volumen de llamadas y eventos.

El desarrollo basado en API-Led del mapa de sistemas no permite plantear unos escenarios de convivencia entre FSC y Galgo controlados que permitan asegurar una transición sin impacto…

Autos, Hogar y Motos

- Usuarios de los ramos Hogar, Autos y Motos pasan a utilizar el frontal de CRM para su operativa diaría
- Integraciones iniciales mediante APIs del Core
- Sin impacto en la operativa actual para el resto de usuarios

9 meses

Retención, Recobros, Recibos Q&R

- Usuarios de los ramos Retención, Recobros, Recibos, Quejas y Reclamaciones y Fidelización pasan a utilizar el frontal de CRM para su operativa diaría
- Integraciones impactadas implementadas sobre Mulesoft
- Sin impacto en la operativa actual para el resto de usuarios

6 meses

B2B

- Usuarios del ramo de empresas los ramos Hogar, Autos y Motos pasan a utilizar el frontal de CRM para su operativa diaria
- Integraciones impactadas implementadas sobre Mulesoft
- Sin impacto en la operativa de los usuarios de Salud

2 meses

Salud

- Plataforma completamente migrada
- Todas las integraciones desplegadas y

2 meses

… y por tanto, plantear un plan de migración consistente

El objetivo del plan de migración es asegurar que los datos necesarios para la operación estén disponibles en Salesforce con calidad, trazabilidad y sin impacto en la continuidad del negocio

Procedimiento progresivo y controlado

- **Migración incremental por fases funcionales**, alineada con el roadmap del proyecto CRM.
- **Ejecución en entornos QA** → Staging → Producción, evitando enfoques Big-Bang.
- **Secuencia controlada por dominio de datos** (clientes, pólizas activas, relaciones, recibos, etc.).
- **Convivencia temporal CRM–Core** asegurada durante el proceso.

Herramientas

- **Talend será la herramienta principal** de ETL, por su robustez en:
  - tratamiento de grandes volúmenes,
  - transformaciones complejas,
  - controles de calidad y reconciliación.
- **Informatica como alternativa equivalente**, aprovechando que LDA dispone de esta plataforma, mediante:
  - conectores nativos con Salesforce,
  - extracción incremental vía APIs estándar (Bulk API / REST).
- **MuleSoft** se mantiene como **plataforma de integración operativa**; sus activos podrán reutilizarse puntualmente si aportan valor, sin convertirlo en el eje de la migración.

Validación de calidad del dato

- **Controles automáticos pre y post carga**:
  - conteo de registros,
  - integridad referencial,
  - validación de campos críticos.
- **Reconciliación funcional** con negocio en cada fase.
- **Gestión de errores por registro y reprocesado selectivo**.
- **Evidencias documentadas** de cada ejecución.

Plan de rollback

- **Migraciones repetibles y no destructivas**.
- Identificación en todo momento, mediante combinaciones de campos, **de los registros migrados en cada momento de la carga**.
- Creación de **procesos de reversión de cambios** para cada proceso de carga.
- Posibilidad de **revertir por fase o dominio de datos**.
- **Uso del core asegurador como fuente de verdad** durante la convivencia.
- Ventanas de ejecución y go-lives protegidos.

Planteamos un modelo de migración seguro, gobernado y alineado con las mejores prácticas, que prioriza la calidad del dato, minimiza el riesgo operativo y se apoya en herramientas consolidadas del ecosistema de Línea Directa

Gestión del cambio

05




MINSAIT

La ejecución de un assessment inicial, fijará las bases del plan de gestión del cambio que se aterrizará y ejecutará de forma acompasada a cada release

Framework de la Gestión del Cambio

I *Assessment* inicial de preparación del del Cambio



- Analizar el **punto de partida** (procesos, cultura, competencias, niveles de resistencia, etc.)
- Identificar y clasificar los **grupos de usuarios / stakeholders** y entender su operativa actual
- Definir cómo ejecutar **comunicación y formación** en el proceso de gestión del cambio
- Establecer la metodología de las **acciones de adopción**
- Resultará un **journey de acciones** (formaciones y comunicaciones) **por grupo de usuario**
- Definir **modelo de acompañamiento, seguimiento y refuerzo**

4 semanas

A ejecutar de forma previa a la preparación de la primera release

II Gestión del cambio ligada a cada *release*




- **Revisión y refinamiento del enfoque preliminar definido en el assessment** que deberá ajustarse y personalizarse.
- Se **elaborarán los materiales seleccionados** en base a las características de cada release funcional
- Se ejecutarán las **acciones de gestión del cambio** a **asociadas a cada release**
  - **Acciones de comunicación y motivación** antes de la certificación intermedia o ejecución de releases parciales
  - **Acciones de formación** tras la certificación intermedia de la release y antes de implantación
  - **Acciones seguimiento y control** continuas**, y de refuerzo**

8 semanas por release (4 de preparación y 4 de ejecución)

A ejecutar en paralelo a cada release funcional y posteriormente para seguimiento y control

La identificación y definición del mapa de audiencias nos debe permitir maximizar el impacto en el diseño de estrategias objetivo

Mapa de stakeholders y gobierno del cambio

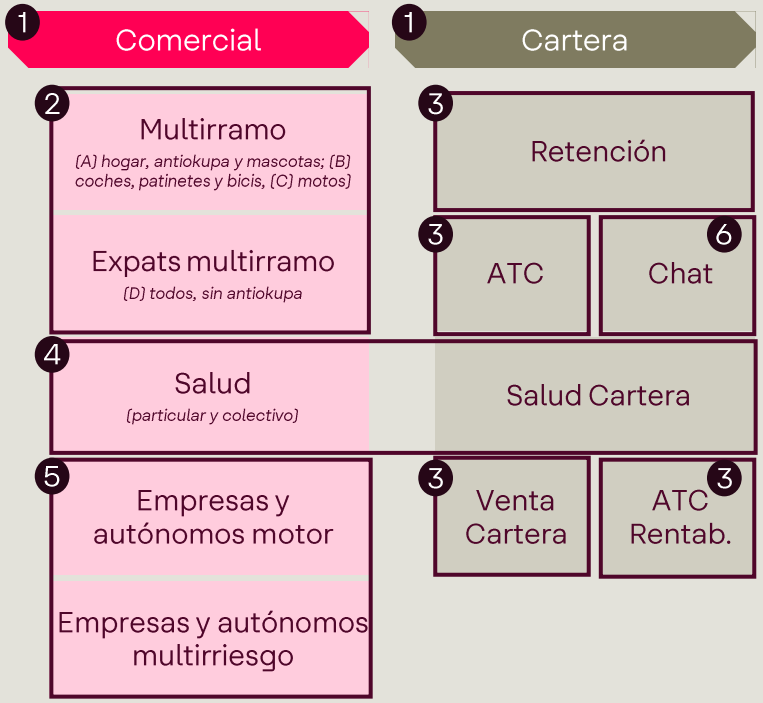

Plan de afectación usuarios, alineado con releases
(ver detalle en sección de implantación CRM)

Para cada release será clave identificar impactados y afectados: gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones

1. *MVP*
2. *Cotización integral:*
   - *(A) Hogar, antiokupa, mascotas*
   - *(B) Coche, patinetes y bicis*
   - *(C) Motos*
   - *(D) Expats, todos sin antiokupa*
3. *Suplementos (ATC+ATC rent.) y cross-sell (venta cartera) Retención, recibos y pagos, y recobros (retención)*
4. *Salud comercial y cartera*
5. *Empresas*
6. *Chat*

Aspectos relevantes

- Será necesario **analizar los diferentes colectivos identificados a priorizar por la compañía**
- Se realizarán **dinámicas de escucha activa** al usuario en las que identificar sus miedos, preocupaciones y motivaciones respecto al cambio
- De esta forma podremos **desarrollar un "mapa" de impacto que nos ayude a estructurar las acciones, así como una matriz RACI**
- **En el proceso de análisis podremos identificar las figuras de la compañía que actuarán como impulsores del cambio**, creando un referente para el resto de la organización

Ej. Matriz/mapa de impacto por colectivo



La **identificación y análisis de colectivos** permite entender a los usuarios y sus necesidades /nivel de resistencia para **personalizar las medidas de adopción** para maximizar su impacto apalancándose en **diferentes dinámicas**

El análisis permitirá identificar la composición de los equipos involucrados y su operativa actual con el objetivo de **identificar el gap funcional asociado a cada release**, los colectivos impactados y la estrategia óptima de formación

Formulación y validación de hipótesis | Realización de encuestas por colectivos | Organización de workshops | Neurociencia | Planteamiento de focus groups

El assessment inicial definirá la estrategia de comunicación incluyendo la tipología de acciones informativas y motivacionales…

Estrategia de comunicación

Se definirán los elementos que estructuren el plan a ejecutar, con **comunicaciones informativas y motivacionales** (p.e. beneficios del cambio, usuarios sean formadores "champions", reconocimiento de logros, etc.)

Objetivos de comunicación

Qué se quiere lograr a través de la comunicación. Hacer partícipe a los usuarios del avance del proyecto y hacerles partícipes de los beneficios y logros derivados de la releáse.

Mensaje de comunicación

El mensaje debe ser claro, conciso y adaptado a cada grupo de interés. **Debe ser coherente con la visión, misión y valores de la organización y comunicado de forma consistente.**

Canales de comunicación *

Seleccionar los **canales de comunicación más adecuados** y de mayor impacto para llegar a los grupos de interés identificados

Planificación de comunicación

Calendario de actividades, los responsables de cada actividad y los indicadores de seguimiento y evaluación. actualizado y ajustado a medida que avanza el proyecto

**LDA dispone del canal de email "Iseazy" para personal interno, teams, etc. aunque se propondrán también sesiones presenciales, newsletters, redes sociales, vídeos, etc. según conveniencia y definición en el assessment inicial*

Acciones informativas

Comunicación de estado y avance del proyecto	• Informar del avance • Comunicar cambios de alcance • Informar de las fechas clave • Informar de los próximos pasos
Comunicación consecución de hitos clave	• Comunicar un hito logrado • Comunicar cierre de fase
Comunicación formaciones	• Informar sobre las formaciones a realizar • Comunicar dedicación necesaria
Comunicación de comités	• Informar sobre los comités planificados • Comunicar dedicación necesaria
Comunicación de publicación de documentos	• Difundir la disponibilidad de nuevo contenido formativo

Acciones motivacionales

Comunicación beneficios del cambio	• Explicar la visión del proyecto y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
Comunicación que involucren a los stakeholders en el proceso de cambio	• Promover la participación y la colaboración de los usuarios • Promover la aportación de conocimiento y experiencia
Comunicaciones que celebren los éxitos y los logros alcanzados	• Reconocer los logros y los avances del proyecto • Celebrar logros con los stakeholders
Comunicaciones que fomenten el aprendizaje y el desarrollo	• Promover el uso de los materiales formativos, el aprendizaje y el desarrollo

En esta fase se fijará la narrativa del cambio alineada con la estrategia de comunicación de LDA y las especificaciones en términos de branding

...así como la estrategia de formación, las acciones y journeys de adopción...

Estrategia de formación

Contempla necesidades de los **usuarios y guía el diseño de acciones formativas** de cada reléase teniendo en cuenta sobre los usuarios: grado de conocimiento/Expertise, cómo les afecta el cambio y el nivel aversión a la transformación

Objetivos de la formación

Para cada formación o grupo de usuarios: objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y con un tiempo definido

Contenido de la formación

Documentación, píldoras o sesiones con materiales didácticos, guías, ejercicios, etc., que ayuden a adquirir las habilidades y conocimientos

Métodos de formación

Diferentes métodos de formación y acciones de adopción que mejor se adapten a las necesidades y a los objetivos

Planificación de la formación


Programación de sesiones de formación, la asignación de recursos y la coordinación de la logística necesaria – combinando modelo síncrono/asíncrono

Acciones de adopción
(a decidir en fase de assessment)

Desarrollaremos diferentes acciones en función de la estrategia**. No existe una acción óptima** para todos los casos y dependerá de las necesidades de adopción, tipología de usuarios, complejidad del cambio a adoptar, capacidades internas y cultura de la organización

- **Sesiones prácticas** liderada por un perfil experto y donde se resuelvan dudas planteadas por los usuarios
- **Segregación y personalización de sesiones** adaptadas a la expertise, necesidades y aversión a la transformación de cada usuario
- **Coffee corner** para reunir a equipos multidisciplinares y crear un foro de diálogo
- **Podcasts y entrevistas** para hacer zoom en contenidos relevantes
- **Jornadas formativas** temáticas con la participación de los equipos involucrados en el proyecto
- **Demos** de productos, servicios, funcionalidades y herramientas
- **Espacios de conexión** para compartir contenidos entre equipos involucrados
- **Píldoras formativas y** microlearning bajo demanda en streaming

Ej: Journey de adopción

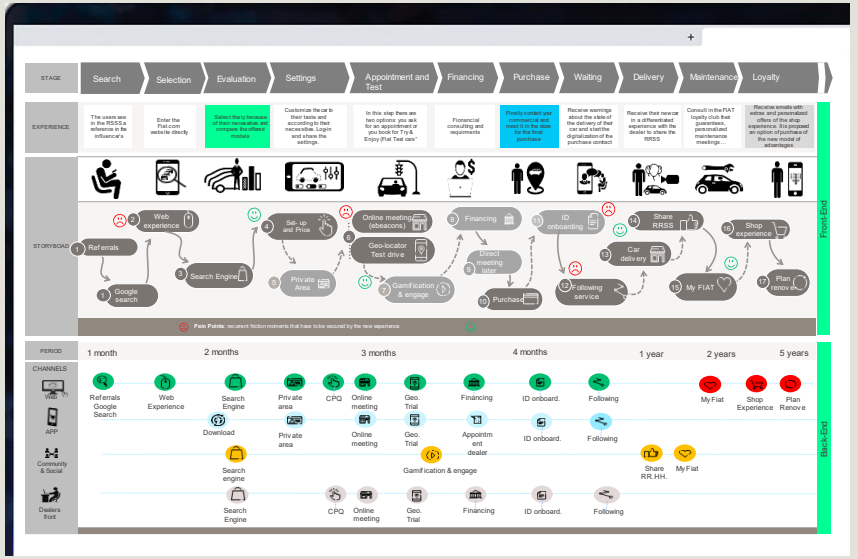

Los *journeys* de adopción facilitan el seguimiento y el progreso gradual hacia la meta final y ayudan a **mitigar riesgos** permitiendo **realizar ajustes** y asegurando una **transición más suave y exitosa**

- **Establecer metas medibles y concretas** para cuantificar el retorno del programa y evaluar el éxito de la implantación
- **Alinear las expectativas** de todas las áreas involucradas para lograr una visión común y coherente
- **Establecer metas ambiciosas a largo plazo,** lo que requiere dedicación y perseverancia en su consecución

… y también un primer marco de KPIs que permitirá medir la adopción de las funcionalidades implementadas en cada release

Assessment inicial – Elaboración de KPIs, plan de seguimiento y control

Se identificará la **información e indicadores disponibles** en Salesforce para las funcionalidades implementadas segmentados por colectivos, roles, ubicación, etc.

Indicadores de uso (nivel de uso por colectivo)	• Número de cotizaciones con pricing dinámico generadas al día por usuario • Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario • Uso de la funcionalidad de volcado de recibos • Número de solicitudes de abono procesadas
Indicadores de soporte	• Número de incidencias generadas en funcionalidad de actualización de datos en póliza • Número de registros de error generado por día • Número de consultas al apartado FAQ • Incidencias funcionales repetitivas • Tiempo medio de incidencia abierta en el sistema
Otros indicadores	• Grado de satisfacción de los usuarios • Curva de aprendizaje y rendimiento, • Número de visitas a los cursos subidos a la plataforma • Puntuaciones medias de los tests ejecutados por usuarios

Se planteará la fijación de umbrales y alertas en cuadros de mando de adopción a cada release…

Seguimiento de conexiones al CRM



Seguimiento de emisiones realizadas

… y se definirá la **estrategia de refuerzo y control**, que deberán activarse ante desviaciones en los KPIs definidos

Recopilación de Feedback → Plan de seguimiento → Acciones correctivas → Beneficios vs plan

Tras el assessment inicial y previo al GO LIVE de cada release, refinaremos el plan e iniciaremos la ejecución de las actividades de gestión del cambio

Framework de Gestión del cambio ligada a cada *release*

Definición | Desarrollo | Pruebas | Despliegue

1. Refinamiento del assesment inicial y preparación

Para cada reléase del proyecto de implantación, se refinarán las tareas realizadas en el assesment inicial y se revisarán y ajustarán de forma detallada los **usuarios impactados, se acordará definitivamente las acciones de adopción** (formación comunicación) y se **elaborarán los materiales** que les darán soporte en base a la estrategia del assessment inicial

- Selección de grupos de usuario impactados
- Configuración de acciones de adopción (comunicación y formación)
- Elaboración de materiales de formación / comunicación
- Definición de journeys de adopción (refinamiento de la fase de assessment inicial)

2. Ejecución

Se ejecutan las **acciones de formación, adopción y comunicación** en línea con la estrategia del assessment inicial

- Impartir sesiones de formación
- Ejecución de otras acciones de adopción
- Lanzamiento de comunicaciones

3. Refuerzo y acompañamiento

Se recoge el **feedback de usuarios**, se **refuerza ante desviaciones** en indicadores y se acompaña al usuario

- Recopilación del feedback
- Ejecución del refuerzo
- Acompañamiento (junto con "usuarios champions") en GO LIVE para evitar pérdida de tracción

4. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación se realizará en función del **plan de seguimiento, control y refuerzo** definido durante el assessment inicial, que determinará los **indicadores a monitorizar**, los **umbrales** para la fijación de alertas y las **acciones de refuerzo** a ejecutar ante desviaciones

En fase de preparación, aprox. 2 meses antes del GO LIVE de cada release, refinaremos el plan del assessment y prepararemos los materiales necesarios

1. Refinamiento del *assesment* inicial y preparación

La fase de preparación se ha abordado enel setup, pero será necesario personalizar y adaptar a cada release

Grupos de usuarios	Confirmar usuarios impactados por la reléase, el grado de afectación en su día a día y clasificar para determinar las acciones más adecuadas
Formación y materiales	Elaboración de las formaciones acordes al plan para poder realizar el diseño de materiales correspondientes
Comunicación	Adaptar las comunicaciones previstas a los contenidos específicos de la release y a las características de los usuarios impactados
Acciones de adopción	En base al set up y las características de los usuarios seleccionar las acciones de adopción para cada grupo y plantear el calendario detallado
Journeys de adopción	Revisar los journeys establecidos en el set up para garantizar que se realizan las acciones planteadas y ajustar en función de las necesidades específicas


Entregables a construir

Manuales de la operativa completa de la release que se construirá de forma **modular** y **específico a cada rol** (se *actualizará con cada Release hasta tener documento final*)

Materiales de apoyo para las acciones de gestión del cambio (formativo, comunicación, adopción, motivación, etc.):


- Vídeos
- Píldoras formativas
- Infografías
- Cartelería
- Cursos (SCORM)
- ...

Ej: ilustrativo Manual operativo



Materiales en función del canal:

- **A través de personas**: Workshops y sesiones grupales para formadores, directores y gerentes
- **Canales internos digitales**: Difusión mediante email, teams, forms ,intranet y blog de empresa
- **Canales internos físicos**: Organización de eventos, rollups e infografías y campañas físicas
- **Canales externos**: Diseño y creación de reels y formaciones interactivas





Reels de formación

Formación iteractiva



Formación mediante Form




Difusión mediante email



En base a la estrategia de comunicación definida en el diseño se personalizarán las acciones de comunicación a lanzar


2. Ejecución de comunicaciones y formaciones

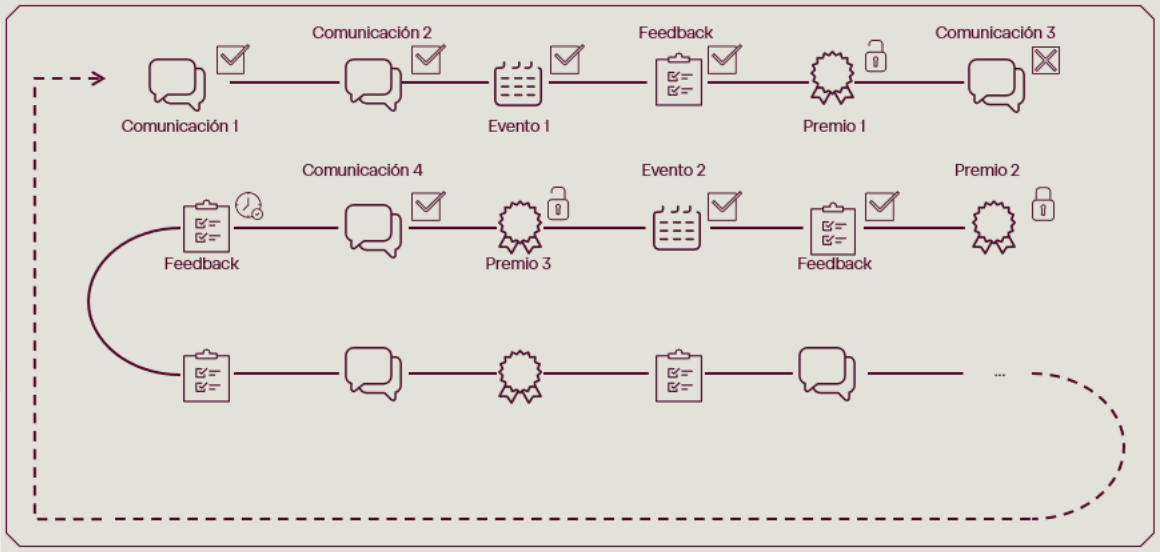


- El **envío de comunicaciones** debe realizarse desde canales que garanticen el impacto en función el grupo de usuarios (teams, eventos corporativos, etc.)
- El **envío de comunicaciones** debe realizarse tanto **antes de la acción de adopción** para generar interés como **después para generar continuidad** y **recoger feedback**

LDA dispone del canal de email "Iseazy" para personal interno, teams, etc. aunque se propondrán también sesiones presenciales, newsletters, redes sociales, vídeos, etc. según conveniencia y definición en el set-up

Ejemplo real de calendario de comunicaciones coordinado con acciones de formación

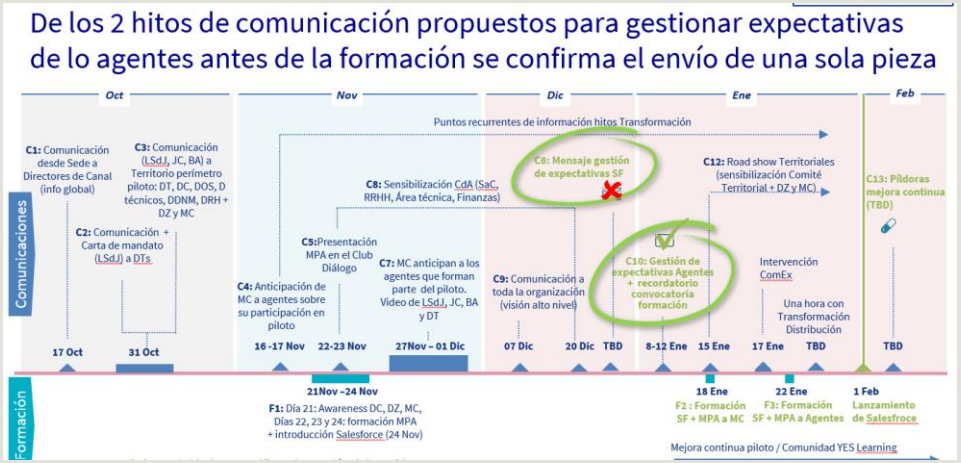

Ejemplo real de acción de comunicación tipo awarness

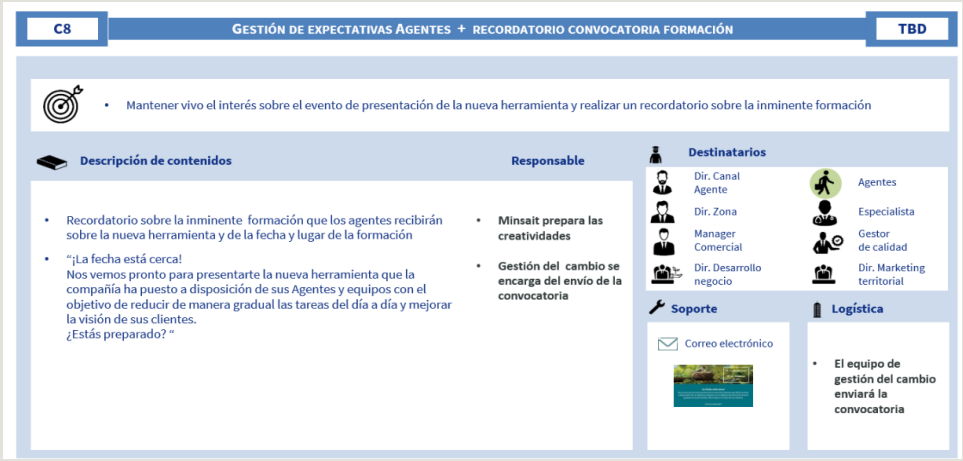

En las semanas previas al GO LIVE se ejecutará la formación, incorporando mecanismos para evaluar la adopción

2. Ejecución de comunicaciones y formaciones

Por volumen de usuarios	0 - 30	30 - 50	50 - 100	+100
Roles	Directivos, responsables y formadores	Supervisores y coordinadores	Agentes seleccionados como impulsores	Grupos de agentes en función de operativas
Dinámicas contempladas	One-to-one, coffee corner, entrevistas personales, etc.	Sesiones grupales, eventos, espacios de conexión, etc.	Demos en remoto, sesiones en vivo, etc.	Sesiones grabadas, píldoras, vídeos, etc.
Formato de la formación	Presencial	Presencial / Remoto	Remoto	Remoto

Por número de sesiones

Preliminar

Con la información de la que disponemos y bajo las premisas de:

- Formar a un colectivo de 1.000 agentes de Contact Center
- Release funcional tipo de 5 meses de duración
- Preparación previa de las sesiones de 1 mes
- Ejecución de las acciones formativas durante 1 mes
- Sesiones formativas de 20 usuarios en total

Estimamos las sesiones y perfiles involucrados:

50 sesiones en total
1000 agentes / 20 agentes por sesión


2-3 sesiones diarias
50 sesiones / 20 días laborables

3 perfiles del equipo de proyecto involucrados
Reparto de la formación diaria en 2-3 franjas horarias durante la jornada para evitar impactar a la operación de los Contact Center


- El modelo planteado es de **formación de formadores.** Utilizaremos equipo propio Minsait con conocimiento de la solución
- En base al **itinerario formativo establecido en el journey de adopción para cada grupo se formará a los responsables** y posteriormente estaremos de apoyo en las sesiones de formación a usuarios (si aplica – a confirmar en assessment)

Formadores internos (preliminar)

- **Conocimiento profundo de la operativa y la organización** (pueden pertenecer a equipo de formación/RH o formar parte de la plantilla de agentes en roles de supervisión)
- **Motivación “extra” y experiencia previa en entornos formativos**

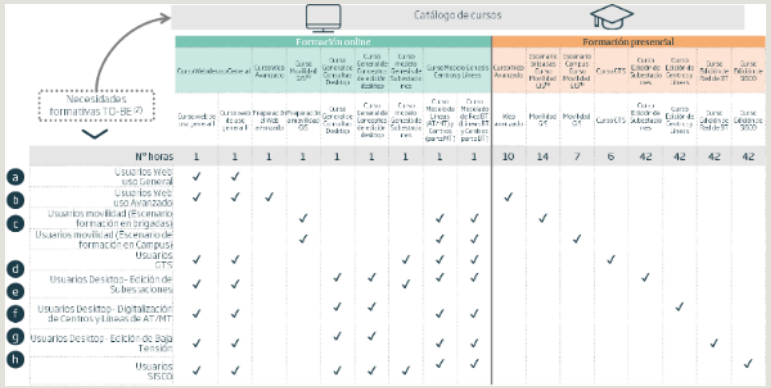

Ejemplo real de distribución de formaciones por colectivo y tipo (online/presencial)

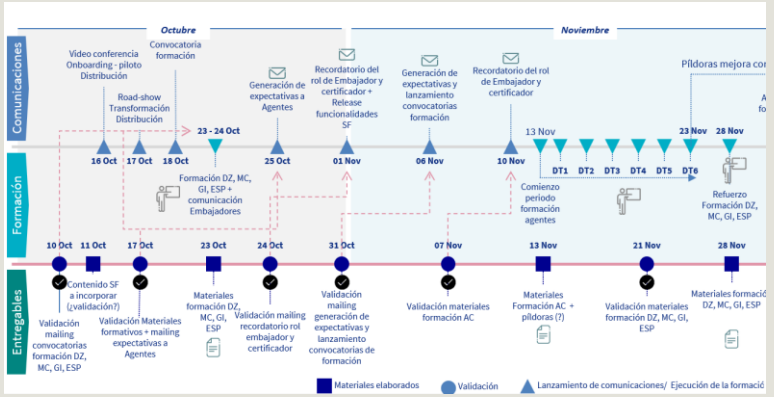

Ejemplo real de coordinación de actividades de formación, acciones de comunicación y la generación de entregables

Ejecutaremos la formación en base a la estrategia definida en el diseño de planes y los materiales elaborados en la preparación


2. Ejecución de comunicaciones y formaciones

- La ejecución de la formación se **realizará siguiendo el Plan de Formación** establecido en los pasos anteriores
- Cada uno de los formadores que recibirán la formación tendrá asignado un **itinerario formativo establecido en el journey de adopción**
- El enfoque de la formación será mixto incluyendo **sesiones presenciales con ejercicios prácticos y formación online**
- Toda la documentación generada **podrá almacenará en el repositorio online** de la organización siguiendo parámetros SCORM
- Las sesiones organizadas desde **plataformas de colaboración como Teams potencian la participación** frente a canales tradicionales como intranet o correo

Documentación formación práctica



Videos formativos soportados en plataformas de trabajo colaborativo

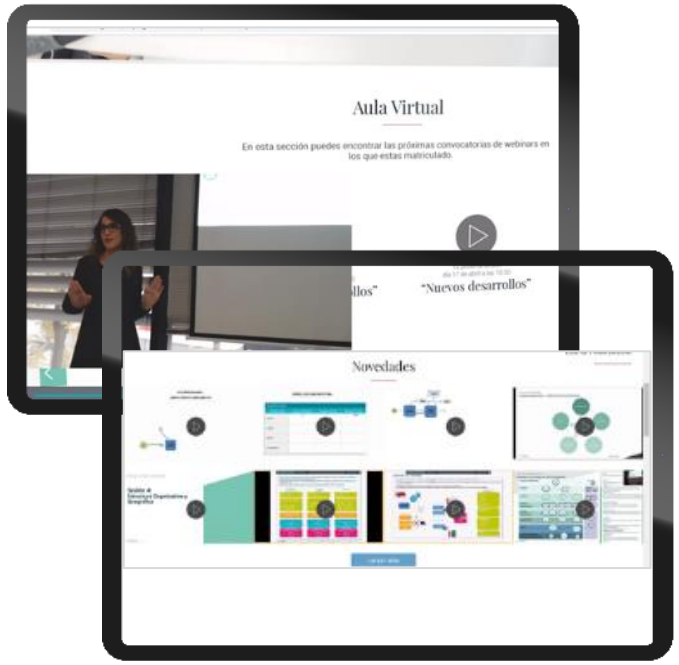


Es clave que se definan mecanismos de verificación de la transferencia mediante evaluaciones, certificaciones internas o equivalente

Tras la comunicación y formación se recogerá feedback mediante encuestas y, junto con los datos de adopción, se definirán y ejecutarán acciones de refuerzo

3. Refuerzo

Ejecución del feedback

Tras la realización de las dinámicas de formación recogeremos el feedback y aspectos de mejora a aplicar en las próximas sesiones

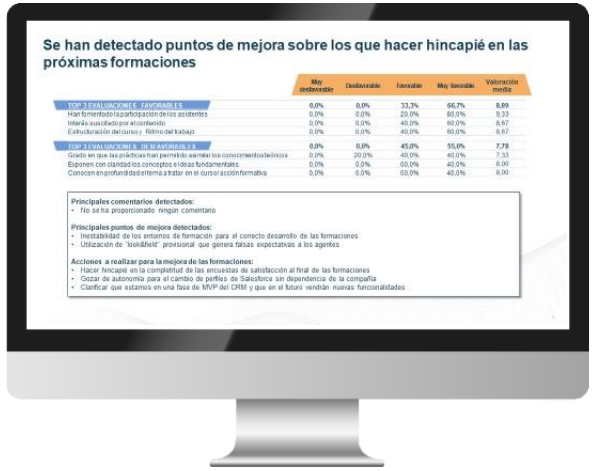

- Una vez realizada la formación se distribuirán **encuestas para valorar las sesiones** y de esta forma incorporar en los siguientes ciclos formativos las mejoras identificadas
- Adicionalmente podemos **realizar la monitorización de toda la actividad online** para detectar los problemas que se encuentran los usuarios y que no se verbalizan en las encuestas

Ejecución de acciones de refuerzo

Mediante el feedback y el seguimiento de las acciones determinaremos acciones de refuerzo a aplicar sobre los colectivos identificados



- El seguimiento del **impacto de las acciones de adopción y la recogida de feedback** de usuarios y formadores permitirá **enriquecer el diseño de las acciones de refuerzo**
- El **refuerzo se ejecuta** en base:
  - **Feedback** de usuarios y formadores
  - **Lecciones aprendidas**
  - **Monitorización realizada** a través de indicadores

Acompañamiento Minsait junto a usuarios “champion”

- Activaremos “usuarios champions”, preferiblemente aquellos que hayan participado en la fase de testing, para que actúen como referentes dentro de sus equipos. Su papel será apoyar a sus compañeros en la adopción del cambio y servir como punto de referencia cercano ante posibles dudas o dificultades en el uso de la herramienta
- Adicionalmente, desde Minsait proporcionaremos soporte operativo a supervisores, coordinadores y usuarios de sala para resolver dudas relacionadas con la operativa y asegurar una transición fluida durante la adopción del nuevo CRM
- Generalmente activamos un **Buzón Generico de resolución de dudas** por correo electrónico y/o teams que enriquecerá el material FAQs y permitirá identificar aquellos puntos donde es necesario reforzar la formación

Finalmente, se construirán los KPIs que medirán el uso y el éxito de la herramienta de CRM, que se monitorizarán a través de cuadros de mando

4. Seguimiento y evaluación

A Modelo de seguimiento: Construcción de indicadores

- Se identificará la **información e indicadores disponibles** en la propia herramienta o funcionalidad implementada
- Se propondrán **nuevos indicadores** que permitan medir:
  - **Uso de la herramienta**
  - **Utilización de funcionalidades implementadas**
  - **Satisfacción** del usuario
  - **Fiabilidad** de las nuevas funcionalidades implementadas
- Los indicadores se clasificarán en tres grupos:

No exhaustivo

Indicadores de uso
- % de usuarios que acceden al CRM
- Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario

Indicadores de soporte
- Incidencias funcionales repetitivas
- % de empleados que completan acciones de formación

Otros indicadores
- Grado de satisfacción de los usuarios
- Curva de aprendizaje y rendimiento,

B Seguimiento de la adopción: cuados de mando

- Se reportan los **resultados periódicamente según los KPIs** establecidas y con acompañamiento experto
- Es clave la **monitorización del despliegue**
- La **definición de umbrales y controles** permite configurar alertas ante desviaciones no contempladas
- Los indicadores acordados podrán ser agregados en **un cuadro de mando de gestión del cambio** para facilitar su visualización
- Una **comunicación fluida con las diferentes áreas** implicadas es una palanca óptima para el transcurso del proyecto

Seguimiento de emisiones realizadas con nuevo portal



Seguimiento de conexiones a la herramienta



Ilustrativo

Soporte / transmisión del conocimiento

06




MINSAIT

La creación del CoE de Salesforce en LDA, da respuesta interna a necesidades de gobernanza y evolución ordenada de la plataforma

Responsabilidades del CoE Salesforce LDA

1. Definir y evaluar el roadmap de la plataforma
2. Garantizar la definición, validación y custodia de la arquitectura y estándares técnicos
3. Gestión, control y priorización de la demanda
4. Garante de calidad, sostenibilidad y escalabilidad de las soluciones
5. Establecer el alineamiento entre Negocio y Tecnología para la optimización del uso de plataforma y la construcción de soluciones user friendly

Organigrama Propuesto

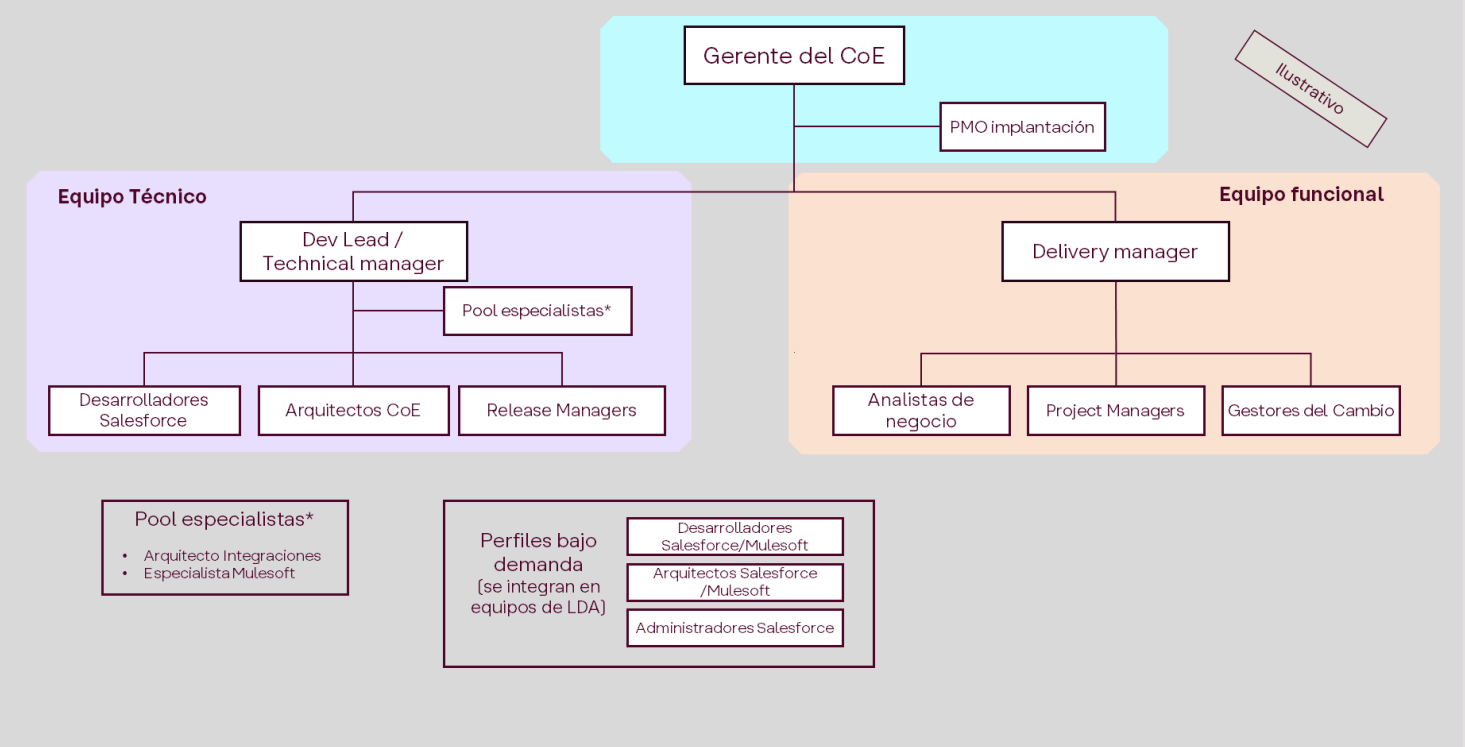

La constitución del CoE se aborda en paralelo al proyecto, permitiendo que el equipo de LDA evolucione progresivamente desde un rol de acompañamiento hacia un rol de gobierno y liderazgo de la plataforma, asegurando autonomía, control arquitectónico y capacidad de evolución futura

Ejecución

Implementación SQUADS de Desarrollo, QA, Configuración, Proyectos, Mantenimiento Salesforce

Centro de Excelencia SalesForce

SET UP del CoE
- Gobierno y Procesos Metodologías
- Lineamientos de Arquitectura
- Embajadores CRM (red de champions)

Cierre gaps a corto plazo

Implementación
- Creación comunidad CRM en portales internos o canales digitales (FAQs, guías, casos de uso)
- Procesos y procedimientos
- Objetivos, medición y cuadros de mando
- Herramientas identificadas como necesarias
- Gestión del Conocimiento y del Talento

Transferencia de conocimiento

Liderazgo y ejecución LDA

Organización del traspaso y plan de sostenibilidad

- Organización de sesiones de transferencia de conocimiento progresiva por bloques / procesos (KT sessions)
- Favorecer dinámicas en la Comunidad CRM: “Tips & Tricks” periódicos y casos de éxito internos
- Revisión periódica de responsabilidades y dedicación para evolucionar el modelo de gobierno hacia mayor independencia de LDA
- Formalización de entrega de materiales/manuales/documentación a lo largo de la implantación y cierre final
- Aplicación de “reverse shadowing” donde confirmaremos que la trasferencia se ha formalizado con éxito

Formalización traspaso final

En paralelo se iniciarán las labores de consolidación e implementación de los procesos de gobierno, arquitectura, autoridad de diseño y gestión del conocimiento a través de métricas y KPIs, transfiriendo gradualmente capacidades y conocimiento desde el proyecto a LDA en un proceso gradual y guiado

Este enfoque se articula en un modelo por fases que define, para cada etapa, los objetivos y la evolución de responsabilidades entre el proyecto y el CoE

Fase	Objetivo	Rol de Proyecto	Rol de CoE
Fase 1. SET UP del CoE	Definir y poner en marcha el modelo de gobierno del CoE desde el inicio del proyecto.	Liderar la definición inicial del marco de gobierno, metodologías de trabajo y lineamientos de arquitectura, integrándolos en la ejecución del proyecto.	Constituirse como órgano de referencia, validando el modelo de gobierno, los procesos definidos y los principios arquitectónicos propuestos.
Fase 2. Implementación del CoE (en paralelo al proyecto)	Implantar los procesos operativos del CoE y cerrar gaps a corto plazo necesarios para su funcionamiento.	Ejecutar el proyecto mediante squads (desarrollo, QA, configuración, mantenimiento), incorporando los procesos del CoE en la operativa diaria.	Adoptar progresivamente los procesos del CoE: gestión de la demanda, seguimiento de objetivos y KPIs, uso de herramientas, y gestión del conocimiento y del talento.
Fase 3. Transferencia progresiva de conocimiento	Transferir de forma estructurada conocimiento funcional, técnico y de gobierno desde el proyecto al CoE.	Acompañar y tutorizar al CoE en decisiones de diseño, arquitectura, calidad y priorización, reduciendo progresivamente la dependencia del proyecto.	Asumir un rol activo en la validación de soluciones, revisión arquitectónica, control de calidad y priorización de iniciativas.
Fase 4. Liderazgo y ejecución del CoE (LDA)	Alcanzar la autonomía del CoE en el gobierno y evolución de la plataforma Salesforce.	Actuar como soporte experto puntual y asesor estratégico en iniciativas de especial complejidad.	Liderar la evolución de Salesforce: definición del roadmap, gobierno de la arquitectura y estándares, control de la demanda y garantía de calidad.

Actividades clave que materializan la transferencia de conocimiento y responsabilidades al CoE

1 Mediante decisiones reales del proyecto

- Participación en Diseño funcional y técnico
- Acompañamiento en toma de decisiones clave
- Revisión de HUs y aceptación

2 Criterios de arquitectura y gobierno

- Revisión de arquitectura y validaciones técnicas
- Participación activa en comités de seguimiento y priorización



3 Calidad y Sostenibilidad

- Revisión de calidad y validación de entregables
- Definición de criterios de escalabilidad

La implantación de un CoE de Salesforce tiene impacto en diversos ámbitos de la organización, y para medirlo hemos definido una serie de KPIs de mejora

No exhaustivo



KPIs de Gobierno y Metodología	Objetivo
Nº de evolutivos entregados en plazo	70%
Velocidad de entrega (Story Points / LDA)	+ 20%
Tasa de rechazo de entregables en UAT	-5%
Cobertura de pruebas automáticas	≥ 85% (1 año)
Ratio de deuda técnica resuelta	≥ 70% (6 meses)

KPIs de Capacitación	Objetivo
Nº de usuarios formados	≥ 100 (1 aó)
% de asistencia a sesiones formativas	≥ 80%
Nº de formaciones completadas por usuario	≥ 2 por año
% de usuarios certificados internamente	≥ 80%
Satisfacción con la formación (NPS)	+50 puntos

KPIs de Evolución y Mejora Continua	Objetivo
Nº de revisiones de arquitectura realizadas	≥ 2 por mes
Nº de licencias activas sin uso	< 5%
% de cumplimiento del roadmap anual	≥ 90%
Nº de integraciones monitorizadas y operativas	≥ 90%

KPIs release management	Objetivo
% reducción de errores y rework	≥ 70% año 1
% Cobertura de pruebas automatizadas	≥ 85%
% Proyectos que cumplen con la totalidad de estándares de desarrollo establecidos	≥ 95%
% Reducción Time to Market de proyectos	≥ 30% año 1
Nº de automatizaciones de tareas repetitivas	≥ 10 año 1

Durante la fase de creación se acordarán con el LDA tanto los KPIs de medición definitivos como los valores iniciales y objetivos a cubrir

Proporcionaremos a LDA el soporte Hypercare iterativo para la estabilidad y uso de la plataforma desde la implantación del MVP

El periodo posterior al Go-Live del MVP y de los releases incrementales es una fase crítica del proyecto y será gestionada con especial atención

- Participan los equipos de proyecto de manera coordinada: **gestión de cambio, funcionales y técnicos**
- Priorización la resolución temprana de incidencias
- Detección de usos no previstos, lagunas funcionales, necesidades de ajuste fino



Soporte presencial en oficinas de LDA durante las 4 semanas posteriores a la puesta en producción de cada Release para proporcionar soporte funcional y técnico



Triaje y resolución de incidencias registradas en herramienta de soporte y Shadowing del uso de la herramienta

Actividades en el soporte post-implantación

Soporte estructurado y orientado a diferentes objetivos

Identificación de necesidades formativas

- Shadowing con usuarios para soporte
- Apoyo en píldoras de formación para reforzar el buen uso

Mejora operativa

- Planteamiento de mejoras según incidencias detectadas
- Seguimiento de mejoras

Cuadros de Mando e Informes de Control (sistema)

- **Cuadro de Mando de incidencias con foco en las repetitivas**
- Seguimiento de mejoras
- Listados e Informes de Control operativo

- Resumen actuaciones y status

Informe de conclusiones y plan de estabilización

Formación

Gestión de Personas

Incidentes

Anomalías

Principales objetivos del Soporte:

- ✓ Acelerar la **adopción** tras el despliegue
- ✓ **Disminuir la aparición** de incidencias **y resolver** anticipadamente
- ✓ Proporcionar información agregada y de detalle para permitir evaluar la situación del despliegue
- ✓ Dotar a LDA de la **información necesaria** para que pueda realizar un seguimiento lo más detallado posible del estado general del servicio.
- ✓ **Gestión de conocimiento** en base a los informes realizados en el conjunto de la prestación de servicio.

Minsait presenta una propuesta integral que cubre el alcance del servicio de soporte y mantenimiento demandado

1. Alcance temporal

El servicio se extenderá durante 12 meses y se iniciará al finalizar el último golive del proyecto de implantación, si bien durante el mismo se ejecutarán tareas de Post-Implantación (hypercare) por parte del equipo de proyecto para garantizar el éxito del despliegue.



4. Niveles de soporte ofrecidos

El servicio se adaptará al modelo de servicio definido por LDA



2. Horario y equipo dedicado al servicio

Minsait ofrece un horario de atención en **8x5 de lunes a viernes**. Atendiendo a la demanda de LDA sobre Incidencias críticas se ofrece **servicio 24x7**.

Minsait prestará el servicio en remoto y con todos los recursos situados **dentro del territorio Español**, lo que permitirá garantizar el crecimiento humano necesario.


El equipo de Minsait estará formado mayoritariamente por **perfiles involucrados en el proyecto con el fin de disminuir la curva de aprendizaje**

3. Canales de soporte

Los canales de soporte para la comunicación de incidencias

- Correo Electrónico (Entra de incidencias)
- Teléfono (Entrada de incidencias)
- ServiceNow de LDA (Registro y Gestión de incidencias)

5. Equipo de soporte

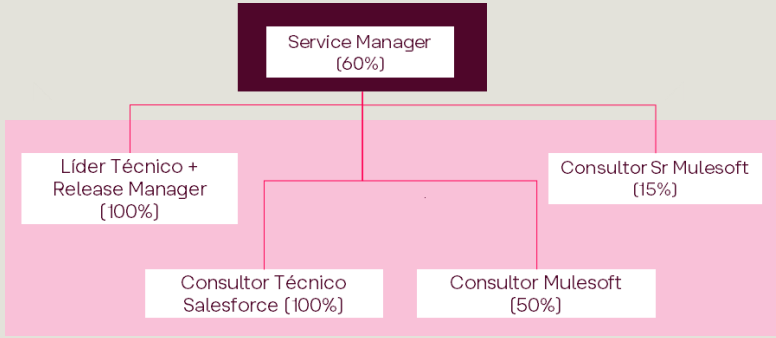

Alcance global del servicio de Mantenimiento: Gestión del Servicio, Mantenimiento Correctivo, adaptativo, preventivo y línea de proyectos

Definiendo un modelo integrado, donde el mantenimiento y los proyectos no operan como silos independientes, sino como elementos coordinados dentro de un único marco de gestión, priorización y control.

Gestión del Servicio

- Gobernanza y Reporting
- Gestión de la Transición
- Seguimiento y control de la demanda
- Monitorización SLAs
- Gestión del conocimiento y cambio
- Programa de formación a usuarios finales
- Calidad
- IA asociada a Servicio

Evolución

- Estimación, planificación y ejecución de proyectos integrado con mantenimiento
- Foco en innovación a través de IA

Correctivo (Nivel 1 extendido, Nivel 2 y Nivel 3) adaptativo y preventivo

Nivel 1 (L1) extendido – Atención y Gestión de Usuarios:

- Triage y Clasificación
- Resolución de Consultas de Operación

Nivel 3 (L3) – Seguimiento y Escalado:

- Escalado de incidencias al fabricante Salesforce y seguimiento
- Escalado de incidencias a otros sistemas
- Seguimiento y coordinación proactiva de incidencias que afecten a Salesforce y Mulesoft pero dependan de otros sistemas

Nivel 2 (L2) – Soporte Funcional y Gestión de Datos:

- Mantenimiento Genérico de la Plataforma
- Operaciones Masivas de Datos
- Gestión de Documentación
- Soporte a Procesos de Negocio
- Desarrollo de mejoras que disminuyan la entrada de incidental recurrente
- Soporte a pruebas UAT, pruebas Integradas e implantación
- Monitorización y reporting diario de Org PRO
- Mantenimiento de la Base de Datos de Conocimiento del servicio

Nivel 2 (L2) – Mantenimiento Correctivo Técnico y DevOps:

- Resolución de Causa Raíz
- Gestión del Ecosistema Integrado. Soporte a integraciones críticas
- Eficiencia operativa DevOps con Copado (Sanboxes y Producción)
- Evaluación de impacto de nuevas releases de Salesforce
- Analizar y comunicar a LDA impacto de novedades y cambios de las releases Salesforce
- Actualización de Certificados de seguridad

Propuesta sujeta a discusión

Proponemos un modelo de gobernanza flexible estructurado en 3 niveles para agilizar la toma de decisiones y asegurar la correcta interlocución

Se aconseja la participación del CoE de Salesforce de LDA en todos los niveles

	Comité de Dirección (Nivel Estratégico)	Comité Operativo (Nivel Ejecutivo)
Periodicidad	Mensual	Quincenal/Semanal
Funciones	• Validar la **evolución estratégica del servicio** y su alineación con los objetivos de LDA • **Revisar indicadores clave** de rendimiento (KPIs) y cumplimiento de **SLAs** • Escalar temas críticos y **resolver bloqueos** de alto impacto • Aprobar **cambios relevantes en alcance** y priorización del roadmap Salesforce	• Supervisar la ejecución y **avance de la demanda priorizada** por LDA • Controlar la capacidad de ejecución del servicio **(planificación y recursos)** • Garantizar la **calidad de entregables** técnicos y funcionales • Identificar y gestionar **riesgos operativos** • Ajustar **dependencias** y tiempos
Participantes	• Sponsor Ejecutivo (LDA) • Steering Committee (LDA) • Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait)	• Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait) • Product Owners (LDA)
Coordinación con LDA	• El Service Manager informa a LDA del avance, obstáculos y necesidad de ajuste de prioridades • En los comités estratégicos y operativos se pueden incluir responsables del Negocio LDA	

Comités Técnicos (Nivel Operacional)

Se definirán los comités específicos necesarios para garantizar todos los ámbitos del servicio:

- **Comité de Arquitectura** – para alinear estándares y mejores prácticas
- **Comité de Innovación** – para analizar y validar iniciativas y soluciones de mejora y optimización, además asesoramiento de adopción de la IA en los procesos de negocio
- **Comité de competencias** – realizará el seguimiento de la gestión del conocimiento, planes de capacitación, transferencia de conocimiento…
- **Comité de gestión de la demanda** – realizará el seguimiento de la calidad de los recursos, planes de capacitación, transferencia
- **Comité de gobierno modelo de datos** – para velar por la integridad, coherencia y eficiencia del modelo
- **Comité de priorización de deuda técnica** – para priorizar el backlog de deuda

También se podrán convocar comités adicionales para cubrir necesidades adicionales

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los SLAs indicados LDA y Minsait y minimizar cualquier riesgo de penalización, implantamos un modelo de gestión por criticidad estructurado, con control continuo y mecanismos preventivos de escalado

El procedimiento por Criticidad y Control de SLA se articula en tres niveles: respuesta, resolución y control preventivo.

Critical

Servicio LDA caído independiente de la Plataforma

- Activación tras registro
- **Revisión prioritaria por N1 en menos de 15 minutos**. En soporte 24x7
- Comunicación activa cada 60 minutos hasta estabilización.
- **Resolución en menos de 4 horas – Incluye N3**
- Seguimiento directo por el Responsable del Servicio.
- Registro de causa raíz obligatorio en caso de impacto significativo.

High

Funcionalidad crítica afectada (proceso crítico o 75% usuarios finales)

- Priorización en la cola operativa en jornada 8x5
- **Revisión prioritaria por N2 en menos de 1 hora en Soporte 24x7**
- **Resolución en menos de 8 horas**.
- Revisión semanal de incidencias repetitivas para prevención.

Medium

Impacto medio (superior al 50% de los procesos y usuarios finales de LDA)

- Gestión planificada dentro de backlog priorizado en Servicio 8x5
- **Revisión priorizada por N2 en menos de 4 horas**
- Agrupación de tareas cuando sea eficiente.
- **Resolución en menos de 2 días**
- Seguimiento en comité semanal de operación.

Consulta

Incidencias o dudas menores

- Gestión en bloque. En cola operativa en formato 8x5
- Optimización por eficiencia operativa.
- Revisión mensual de patrones repetitivos.
- **Atendida en menos de 4 horas**
- **Resuelta en menos de 4 días**

Casos de éxito

07



MINSAIT

linea directa

Principales referencias Salesforce

Banca y Seguros

BBVA · CaixaBank · bradesco · Liberty Seguros · ZURICH Seguros · MUTUAMADRILEÑA · AXA · helvetia

Específicas de FSC

GlobalSeguros · sura · BANORTE | SEGUROS · Pinnacle Pet Group · APS bank values you can bank on · MAS SEGUROS

Sector Público

SeguridadSocial · INPS · Aeroporti di Roma · MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA · IDM SÜDTIROL ALTO ADIGE · trentino marketing SOCIETÀ PER IL TURISMO

Telco y Media

Telefónica · vivo · WINDTRE · sm

Energía

Naturgy · CPFL ENERGIA · COPEL Pura Energía · REPSOL · enel · acea · SOLGAS

Industria y Consumo

acciona · Clece · KERN PHARMA · Uriach · sodexo · DANONE · GRUPO PIÑERO · MELIÃ HOTELS & RESORTS · GRUPO LACTALIS · thyssenkrupp · TECNICAS REUNIDAS · YDUQS · MANGO · IKEA · Carrefour · CALIER · PERCASSI · AHORRAMAS · PortAventura · pullmantur

Contact Center InBound con Salesforce en Mutua Madrileña



Situación de partida

Plataforma con un foco en el activo y la póliza, basado en un **modelo administrativo** y con una visión de **repositorio de datos**. **Tecnológicamente obsoleto**, con dificultad para escalar en la atención y contratación de todos los ramos de la compañía e ineficiente en la integración de datos del core y otros sistemas.

Objetivos

Superar la rigidez de su CRM para pasar a un **enfoque centrado en el cliente.** Para ello:

- **Eficientar el trabajo de los agentes** ofreciendo una visión 360 del mutualista
- **Simplificar su labor comercial** con mejoras en las tareas de cotización integradas con el CRM
- **Mejoras en las ratios de venta digital**
- **Personalización del servicio** que mejore la valoración del cliente

Participación Minsait

Desde 2019 Minsait es el **partner principal en la implantación de las diferentes fases de CRM y en el mantenimiento correctivo y evolutivo**. Con participación activa en el ciclo completo del proyecto, desde la definición hasta la implantación productiva

Principales problemas encontrados

- Alienamiento entre el negocio y la tecnología
- La gestión de cambio que supuso la transformación tecnológica
- Reporting eficaz de los avances a los diferentes stakeholders de un proyecto estratégico
- El desarrollo de los procesos de integración de datos

Impacto en el negocio

- **Integración de procesos comerciales** de los distintos ramos
- **Aumento de la conversión de venta** con funcionalidades como clicktocall en la web
- **Aumento de la fidelización por atención personalizada** al integrar segmentación, campañas y atención comercial
- **Toma de decisiones** basada en datos

Lecciones aprendidas

- **Discovery** como fase fundamental para la definición de procesos y la traslación a la definición tecnológica
- **Agilismo en la gestión del proyecto**, con participación activa por parte del negocio y coordinación entre todas las áreas IT

salesforce service cloud · salesforce marketing cloud · AVAYA

+500 Agentes
+13M Clientes

Proyectos de mantenimiento y evolución Salesforce en AXA España



Situación de partida

AXA España contaba con una plataforma Salesforce con Sales, Service y Marketing, con una necesidad de evolución y mantenimiento integrado en un ecosistema acotado de Partners. Minsait es el elegido como partner principal para la evolución de la Solución Lead Management, Procesos de retención y la gestión del Mantenimiento global de la plataforma (incluyendo Marketing Cloud)

Objetivos

- **Lead Management:** Mejorar el motor de entrega del lead a los equipos comerciales
- **Reducción de la fuga de clientes:** Automatización y estandarización de los procesos de retención de pólizas en Salesforce, tomando como base las reglas definidas por un sistema tercero de AXA
- **Mantenimiento global:** Soporte de mantenimiento correctivo de todas las plataformas productivas

Participación Minsait

Desde 2023 Minsait es el **partner principal de AXA para mantenimiento correctivo y evoluciones** de sus nubes en SalesCloud.

Principales problemas encontrados

- Alinear las expectativas de los diferentes departamentos de AXA asignando prioridades a los desarrollos y demandas de cada una de ellas
- Problemas de sobreescritura de código entre los diferentes proyectos
- Pruebas de de validación y regresión requieren mucho esfuerzo

Impacto en el negocio

- **Lead Management**: Aumento de la tasa de conversión de leads gracias a las mejoras en la asignación inteligente
- **Retención de pólizas:** Disminución de la fuga
- **Plataforma con un mantenimiento centralizado** en un solo proveedor, mayor velocidad en la atención y resolución de incidencias, con procedimientos estandarizados para la documentación de causa raíz, repositorio de conocimiento etc

Lecciones aprendidas

- **La gestión global de todas las iniciativas** requiere de una planificación estricta
- **El release management automatizado y un modelo de gobierno** como herramientas para el control centralizado de todos los desarrollos

salesforce service cloud · salesforce sales cloud · salesforce marketing cloud · Genesys Cloud

+1.500 Agentes

MAS Seguros es un bróker líder en México con más de 30 años de experiencia, especializado en equipo pesado. Para el año 2025, reportaron más de 200 millones de USD en prima emitidas, protegiendo a más de 7.000 clientes y asegurando más de 90.000 unidades de transporte



salesforce
financial services cloud

Octubre 2024
Actualidad


3 Países en Latam
Principal Broker de Seguros de Pesado en Mexico

25% de participación de mercado Mexicano

MAS SEGUROS

Componentes del CRM usados en la solución	Financial Services Cloud (FSC), migrado desde Sales Cloud y Service Cloud, & Agentforce
Contexto inicial del cliente	El cliente operaba en Salesforce Sales Cloud y Service Cloud, pero necesitaba una solución más adaptada a su operación de Broker. Su visión estratégica era convertirse en una compañía donde la tecnología apalanque su crecimiento.
Participación concreta del integrador (Nespon)	• Posicionamiento estratégico de FSC como herramienta clave de negocio • Reingeniería de procesos para adopción efectiva de FSC • Migración completa de datos y configuraciones desde Sales/Service Cloud
Objetivo buscado con el proyecto	Migrar toda la operación de CRM (Sales y Service) a Financial Services Cloud, el cual se adaptaba mejor a su operación de Broker, y habilitar su visión de usar tecnología como palanca de crecimiento.
Impacto en el negocio tras la implantación	• Procesos de M&A de otros brokers mucho más sencillos • Procesos de ventas más rápidos • Incremento en satisfacción del cliente • Mejor tasa de renovación de pólizas • Aumento en recuperación de cartera
Integración con el Contact Center	• Plataforma: Salesforce Digital Engagement • Tipo de integración: Nativa (solución Salesforce) • Canales: Canales digitales integrados directamente en FSC
Lecciones aprendidas tras implantación	Adoptar las mejores prácticas de FSC desde el inicio permite sacar el mayor provecho a la herramienta, lo cual disminuye significativamente el riesgo del proyecto, acorta la curva de aprendizaje de los usuarios, y reduce los costos de capacitación y mantenimiento a largo plazo.
Número de usuarios del CRM y Contact Center	Más de 150 usuarios activos utilizando Financial Services Cloud y Digital Engagement como su canal de Contact Center.

Andina ART ha experimentado un crecimiento muy destacado en el mercado argentino de riesgos laborales, con un aumento del 646,1% hasta marzo de 2025. Ofrece servicios 100% online, atención 24/7 y gestión de riesgos, consolidándose como una de las compañías con mayor crecimiento del sector

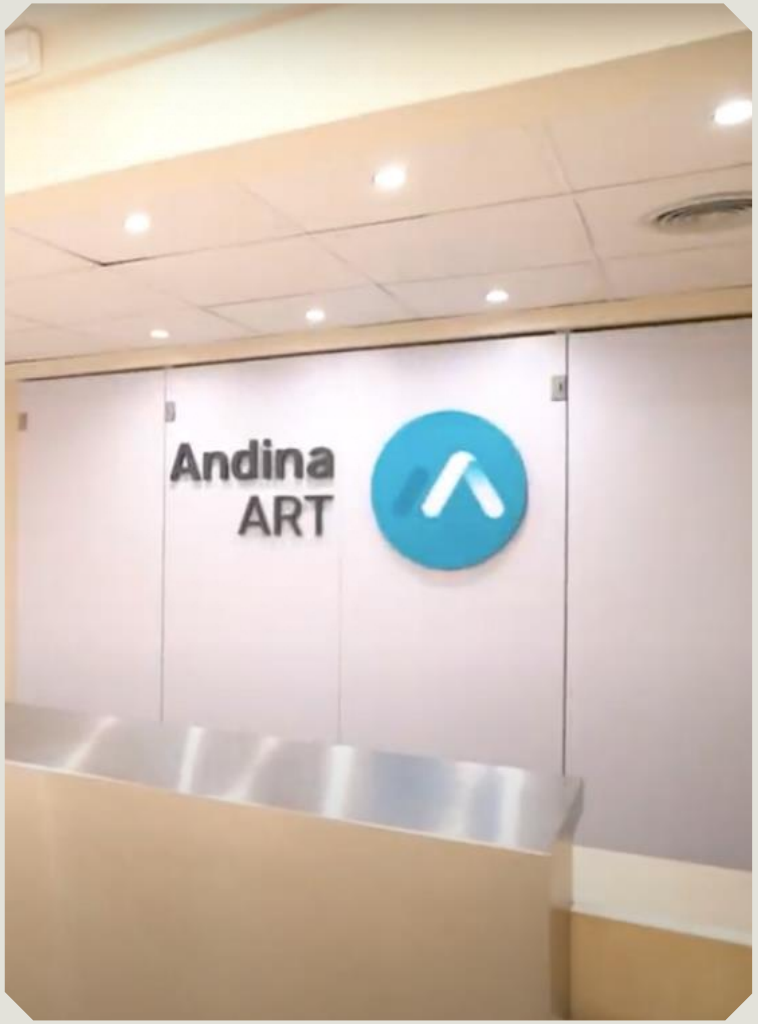

salesforce
financial services cloud

Octubre 2022
Actualidad

Top 10 ART en Argentina
En menos de 4 años de operación.

Lideres de crecimiento de ART en Argentina.

Modelo de atención 100% Online.

Andina ART

Componentes del CRM usados en la solución	• Financial Services Cloud (FSC) • Digital Insurance • Digital Engagement • Agentforce
Contexto inicial del cliente	ART en Argentina con la visión de construir una empresa completamente de operación digital sobre Salesforce, siendo disruptiva en un mercado tradicionalmente conservador. El proyecto inicial tuvo una mala implementación que requirió intervención de rescate.
Participación concreta del integrador (Nespon)	• Entrada en segunda fase del proyecto para rescatar la implementación inicial fallida • Reingeniería completa de la solución sobre FSC + Digital Insurance • Construcción de una operación 100% digital alineada con la visión del cliente • Habilitación de procesos de captación y atención digital de clase mundial
Objetivo buscado con el proyecto	Construir una empresa de operación completamente digital sobre Salesforce, convirtiéndose en una compañía disruptiva dentro de un mercado tradicional de ARTs en Argentina.
Impacto en el negocio tras la implantación	• Cumplimiento de la visión de operación 100% online • Optimización continua de procesos de negocio • Proceso de captación digital convertido en benchmark de la industria • Atención digital reconocida como referente local • Caso presentado en Dreamforce 2025 como ejemplo de innovación
Integración con el Contact Center	• Plataforma: Salesforce Digital Engagement + Agentforce • Tipo de integración: Nativa (solución Salesforce) • Canales: Operación 100% digital con atención automatizada mediante Agentforce
Lecciones aprendidas tras implantación	Adoptar las mejores prácticas desde el inicio permite sacar el mayor provecho a la herramienta, lo cual disminuye significativamente el riesgo del proyecto, acorta la curva de aprendizaje de los usuarios, y reduce los costos de capacitación y mantenimiento.
Número de usuarios del CRM y Contact Center	Más de 100 usuarios activos utilizando Financial Services Cloud, Digital Insurance, Digital Engagement y Agentforce.

¿Por qué Minsait?

08



MINSAIT

Alianza de compromiso y futuro con LDA

Destacamos los factores clave de la propuesta de valor de Minsait, que nos consolidan como el mejor socio para acompañar a LDA en los próximos años con alineación total entre iniciativas y proyectos, buscando sinergias y eficiencia en cada uno de ellos.

CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LDA Y PLAN DE TRABAJO CONTRASTADO

Contamos con numerosos años de experiencia junto a LDA, conociendo sus procesos e interlocutores, lo que nos permite realizar una propuesta en la que prima la optimización del *Time to Market* salvaguardando unos periodos amplios de certificación y gestión del cambio que garanticen un arranque controlado y gradual de las funcionalidades a migrar.

SOLVENCIA COMO COMPAÑÍA

Minsait pone a disposición de LDA su portfolio de oferta integral (Neg y tec) para la implantación del CRM, lo que habilita la posibilidad de disponer de un único interlocutor para los dos proyectos de transformación (CRM + CC), asegurando máximo alineamiento entre ambas iniciativas y constituyendo una alianza histórica basada en el máximo compromiso del Grupo Indra.

EQUIPO TOP CON LOS MEJORES PROFESIONALES DEL MERCADO

Minsait y Nespon habilitan sus mejores profesionales, con experiencia real en proyectos aseguradores, garantizando el máximo nivel de expertise del sector, cumpliendo con los requerimientos de presencialidad y garantizando una dedicación continuada.

nespon SOLUTIONS MINSAIT

PROPUESTA ECONÓMICA SIN COSTES OCULTOS

Nuestra propuesta, basada en Salesforece FSC, viabiliza un proyecto cerrado para LDA, debido al elevado nivel de cobertura estándar que aporta el producto y por nuestra orientación a impulsar la adopción de las mejoras prácticas de mercado. Limitamos a un margen razonable el listado de desarrollo custom a considerar en el proyecto.



Como **Partner de Salesforce** y gracias a nuestra **propuesta de valor**, queremos acompañar a Línea Directa en la **Implantación del CRM**, contribuyendo para que ambas iniciativas, **Genesys Cloud y SF-FSC**, abran un camino a una atención más inteligente, eficiente y personalizada.

MINSAIT

Tech for impact
