

Plan de transformación

CRM Salesforce

Línea Directa & NTT DATA
13 de Abril

SEGUNDA DEFENSA

© 2025 NTT DATA, Inc.

Índice



1. NTT DATA: capacidades y experiencia
2. Qué vamos a transformar
3. Cómo lo vamos a hacer
4. Cómo garantizamos el éxito
5. Anexos (Referencias, CVs, certificaciones, etc.)

© 2026 NTT DATA, Inc.

NTT DATA: capacidades y alianzas

NTT Data: Alianza con Salesforce

Partners de Salesforce desde **2001**

Presencia en **+30** países

+1300 Certificados

+350 Profesionales

4.7 / 5.0 Partner Satisfaction Score

Salesforce Reseller

Salesforce Provider

De plataforma tecnológica a motor de crecimiento medible

- **Estrategia & negocio**: Definimos roadmap, arquitectura y prioridades alineadas a KPIs de negocio.
- **Automatización e IA**: Ahorro de coste + Reducción de tiempos + Incremento de ingresos
- **Operación global y escalable**: Gobierno global y modelo productivo híbrido (on-site + nearshore + offshore)
- **Aceleradores y activos**: Frameworks propios, librería IA, KPIs sectoriales y activos reutilizables

La tecnología implementa. La estrategia transforma.

RECONOCIMIENTOS

CASOS DE ÉXITO

NTT Data: Alianza con Mulesoft

Partners de Mulesoft desde **2008**

+100 Certificados MuleSoft

+200 Profesionales MuleSoft

+40 Arquitectos en MuleSoft

+8 años Experiencia en Tecnología MuleSoft

Mulesoft Reseller

Nuestra práctica MuleSoft es un área multisectorial dentro de NTT DATA que proporciona soluciones de arquitecturas de integración a través de un profundo conocimiento del producto MuleSoft y su arquitectura

ADVISORY Y ESTRATEGIA
Estrategia de APIs y definición de modelos de gobierno, definición de blueprints de arquitectura

SOLUCIONES END-TO-END
Implementación de soluciones de integración end-to-end incluyendo diseño, implementación, desarrollo, automatización, combinando aceleradores y productos que agilizan el desarrollo de nuevas APIs bajo un modelo estandarizado, ágil y automatizado.

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Nuestro equipo especializado de arquitectos no sólo trabaja en la definición de las arquitecturas, sino también en la implantación de arquitecturas de integración complejas en modelos híbridos con modelos de seguridad de confianza cero.

C4E
Centro de especialistas (arquitectos, desarrolladores) que permiten a las diferentes unidades y equipos de desarrollo habilitar la plataforma MuleSoft, modelando la gobernanza, los activos, las mejores prácticas y habilitando soluciones que permitan la aceleración y reutilización de la plataforma MuleSoft.

RECONOCIMIENTOS

CASOS DE ÉXITO

NTT Data: IA en Salesforce

Construimos la IA que escala en entornos reales: de piloto a arquitectura empresarial.

- **Arquitectura**: Arquitectura agéntica escalable y optimizada para entornos productivos:
  - Orquestación inteligente de acciones
  - Optimización del consumo de tokens
  - Reducción de latencia en entornos complejos.
- **Capa Semántica**: La clave está en el contexto:
  - Traducción dinámica del lenguaje de negocio a modelos de datos complejos (CRM + Data Lake)
  - Análisis comparativos basados en métricas de negocio y cálculos avanzados
- **Automatización**: Automatización transaccional y operativa de procesos críticos:
  - Carritos asistidos
  - Operativa comercial (pre/durante/post-visita)
  - Mejora operativa en att. al cliente, reducción errores y tiempos
- **Gobernanza**: La observabilidad y el refinamiento son críticos tanto en producción como en fase de testing:
  Trazabilidad del razonamiento
  - Tagging automático por topics
  - Control de consumo
  - Control de versionado
  - Métricas para escalado y adopción

Framework agéntico reutilizable

IA empresarial preparada para producción

PAB

Partner Advisory

RECONOCIMIENTOS

CASOS DE ÉXITO

CERTIFICACIONES

590 Data 360 consultants — 200 · 170 · 45

966 Agentforce Specialist — 570 · 110 · 80

NTT Data: Gestión del Cambio

Experiencia en CRM

Un equipo experto, preparado para liderar el cambio junto a nuestros clientes

Implantaciones CRM con enfoque estructural y sostenible.

- **Personas** — Trabajo con **equipos multidisciplinares** en entornos internacionales
- **Transformación organizacional**
- **Aprendizaje & Desarrollo** — **Diseño de estrategias formativas** orientadas a adopción real.
- **Nuevas formas de trabajar** — **Incorporación de innovación y tecnología** centrada en el usuario.
- **Metodologías** — Agilidad con gobierno y control, **adaptado al contexto del cliente.**

EXPERIENCIA

- **Pool de expertos en Gestión del Cambio con múltiples certificaciones** en diversos marcos de referencia del sector
- **Experiencia en Salesforce** en entornos complejos y regulados
- Programas con **alto volumen de usuarios y Contact Center**
- Integración efectiva CRM + CCaaS
- Gestión del Cambio **en despliegues** por releases
- **Modelo estructurado y escalable** para entornos de convivencia tecnológica

CASOS DE ÉXITO

© 2026 NTT DATA, Inc.

¿Por qué NTT DATA?

Combinamos **conocimiento sectorial**, **capacidad tecnológica y experiencia en transformación** para acompañar a Línea Directa en un programa estructural, no solo en una implantación tecnológica. Nuestra propuesta se sustenta en:

Equipo multidisciplinar

Hemos conformado un **equipo multidisciplinar** compuesto por:

- **Conocimiento sector asegurador**
- **CRM + Arquitectura + Integración**
- **Gestión del cambio**
- **Especialistas en entornos CC**
- **UX y operación contact center**

Visión End2End integrada

Modelo End-to-End **CRM + Core + Contact Center**

- **Integración real entre CRM Strategy, Salesforce, Genesys e integración legacy.**
- **Diseño del proceso completo cliente (captación → gestión → retención).**
- **Gobierno transversal que evita optimizaciones parciales.**
- **Priorización basada en impacto global, no en silos tecnológicos.**

Herramientas propias

Disponemos de **herramientas y aceleradores** clave

- **Aceleración de desarrollo con IA**
- **Framework de definición y priorización funcional**
- **Patrones de integración**
- **Modelos de medición de eficiencia**
- **Enfoque Augmented CRM**

Referencias contrastadas

Experiencia demostrada en transformaciones complejas

- **Implantaciones CRM en aseguradoras de gran escala.**
- **Integraciones Salesforce con Contact Center**
- **Programas de transformación con +1.000 usuarios.**
- **Proyectos con alta exigencia regulatoria.**

1

Qué vamos a transformar

2

Cómo lo vamos a hacer

3

Cómo garantizamos el éxito

NTT DATA

© 2026 NTT DATA, Inc.

Qué vamos a transformar

Este programa no consiste en implantar un CRM…

Consiste en evolucionar el modelo operativo del canal directo, para que cada interacción con el cliente genere más valor comercial, más eficiencia y más conocimiento del cliente.

La **experiencia** de nuestros clientes	El **conocimiento** que tenemos de ellos	Nuestra **propuesta de valor** al cliente	La **forma de relacionarnos** con ellos	Cambio en nuestra **cultura** como **compañía**
OMNICANALIDAD REAL	**VISIÓN CLIENTE 360**	**VENDER+**	**EFICIENCIA OPERATIVA**	**MINDSET CULTURAL**
Frontal único del agente	**Cliente multipóliza como unidad de gestión**	**Oportunidades multiproducto**	**Menos pantallas y búsquedas**	**Operación guiada por datos**
Continuidad de conversación	**Histórico estructurado del cliente**	**Versionado de ofertas**	**Automatización de tareas repetitivas**	
Orquestación de la interacción	**Señales comerciales accionables**	**Asistencia comercial contextual**	**Trazabilidad end-to-end**	**Acompañamiento operativo**

© 2026 NTT DATA, Inc.

Impulsar el ciclo de vida de gestión del cliente

Este programa va a suponer una evolución en el ciclo de vida de gestión de los clientes de LDA, pasando de una operación centrada en pólizas a un modelo “client-centric”, estructurado y escalable

DE PÓLIZA A CLIENTE	DE GESTIÓN REACTIVA A FUNNEL ESTRUCTURADO	DE SILOS POR PRODUCTO A VISIÓN COORDINADA	DE MEMORIA DEL AGENTE A OPERACIÓN GUIADA	DE CENTRO DE COSTE A MOTOR DE VALOR
Cliente como unidad primaria de gestión	Separación clara entre oportunidad y póliza.	Coordinación multiproducto en venta, servicio y retención.	Resumen automático de interacción.	Recomendación multiproducto.
Visión multiproducto consolidada	Funnel comercial estructurado y trazable.	Métricas de valor cliente.	Asistente agente.	Scoring dinámico.
KPIs orientados a valor cliente (no solo prima).	Versionado de ofertas.	Gestión estructurada de churn.	Reducción del TMO.	Retención contextual.

INDUSTRIALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN TRANSVERSAL			
Parametrización en lugar de replicación.	Eliminación de duplicidades por ramo.	Reducción progresiva de deuda técnica.	Modelo escalable y sostenible.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Acompañar a LDA en la evolución del canal directo

Todo esto va a suponer una nueva etapa para el canal directo de LDA, pasando de un modelo de centro de coste a uno de motor de valor a través de evoluciones en paralelo con un único impacto

Cambio de Modelo

Modelo Transformado (Motor de Valor)	▪ Cliente 360º en tiempo real	▪ Agente empoderado	▪ Gestión estratégica
Modelo Actual (Centro de Coste)	▪ Cliente fragmentado	▪ Agente reactivo	▪ Gestión táctica

Ejecución del cambio

Evoluciones paralelas

- **CRM como frontal operativo**
- **Convivencia controlada con Galgo**
- **Modernización Contact Center**

Un único impacto

Agente con contexto único	**Procesos de venta y atención más rápidos y trazables**
Cliente 360 operativo para venta + cartera	**Mejora eficiencia y experiencia: TMO, FCR, conversión, calidad**

- **+2.000 usuarios** impactados con alta dependencia del sistema
- **Crecimiento sostenible**

© 2026 NTT DATA, Inc.

En qué nos vamos a apoyar

Para afrontar esta evolución, desde NTT, proponemos una transformación apalancada en una plataforma alineada con las necesidades presentes y futuras de LDA y adecuada al contexto actual de la compañía con control del **riesgo** operativo y sostenibilidad **económica**:

Plataforma adecuada al modelo LDA	Transformación adecuada al contexto LDA	
Plataforma con ecosistema y evolución nativa IA	**Transformación por bloques**	**Base sólida** antes de escalar
Amplia adopción en sector asegurador	**Despliegue progresivo**	Convivencia CRM–Galgo priorizando **estabilidad del CC**
Maximizar capacidades estándar	**Gobierno del modelo**	Control de **fronteras, integraciones, customización**
Capacidad de adaptación a cambios regulatorios y de negocio	**Gestión del cambio y Adopción real**	**Métricas** + **coaching** para la adopción por rol
Escalabilidad garantizada	**Optimización de costes**	Optimización de **licencias** por perfil + **IA** para reducir CAPEX/OPEX
Integración con Contact Center	**Especialización en CRM + Contact Center + Integración**	**Experiencia real** Salesforce + Genesys con capa de integración global

© 2026 NTT DATA, Inc.

Qué impacto queremos conseguir a nivel compañía

Esta transformación, generará un **impacto comercial, operativo, en el cliente, de control y gobierno …**

Impacto Comercial

- **Mayor ratio de conversión en interacciones de venta y retención**
- **Incremento del ticket medio mediante venta multiproducto**
- **Mejora cross-sell y upsell guiados por contexto del cliente**
- **Reducción de oportunidades perdidas por falta de seguimiento**

Impacto Operativo

- **Reducción del tiempo medio de gestión (TMO)**
- **Menor número de pantallas y búsquedas para el agente**
- **Automatización de tareas repetitivas mediante IA**
- **Mayor productividad y menor curva de aprendizaje del agente**

Impacto en Cliente

- **Visión cliente 360 operativa en todos los canales**
- **Continuidad de conversación entre teléfono y digital**
- **Ofertas y coberturas más claras y contextualizadas**
- **Procesos de pago y gestión más simples**

Impacto en Control y Gobierno

- **Trazabilidad completa de las interacciones**
- **Cumplimiento regulatorio reforzado (RGPD, auditoría, trazabilidad)**
- **Mayor capacidad de seguimiento del rendimiento comercial**
- **Decisiones basadas en datos en tiempo real**

© 2026 NTT DATA, Inc.

Qué implica esta transformación para el canal directo

Además, se impactará directamente en **más de 2.000 usuarios y en la forma de trabajar del canal directo**

IMPACTO EN LAS PERSONAS	OTRAS IMPLICACIONES
1.600 agentes de Contact Center (internos y externos)	La **consola CRM** se convierte en la herramienta principal del agente
200 usuarios operativos en flujos especializados	Los **procesos comerciales** pasan a **gestionarse de forma estructurada** (oportunidad, funnel, versionado…)
100 partners externos (referidos / leads)	La **gestión multiproducto** sustituye la visión por póliza
100 usuarios consultivos (acceso a ficha cliente y reporting)	La operación evoluciona hacia un **modelo data-driven y asistido por IA**

Qué incluye el programa para asegurar adopción

#1 Plan de comunicación estructurado desde el inicio

#2 Formación por rol operativo **+ coaching en campo** durante el despliegue

#3 Convivencia inicial con Galgo y herramientas actuales **durante la transición**

#4 Métricas de adopción y uso real del sistema

La transformación supondrá un reto el canal directo, por ello la gestión del cambio no debe ser un complemento al programa si no uno de sus ejes

© 2026 NTT DATA, Inc.

Alcance del programa de transformación

NTT DATA

1 Que vamos a transformar

Programa end-to-end: desde el diseño hasta la adopción

Modelo operativo	Arquitectura	Implementación	Gestión del cambio	CoE
Diseño TO-BE cliente-360	CRM – Core – Contact Center	Configuración del CRM	Plan de adopción	Transferencia
Rediseño de procesos clave	Integración API + eventos	Integración con sistemas	Formación por rol	Gobierno
Validación con negocio + UX	Modelo de datos cliente	Migración inicial	Métricas de adopción y uso	Evolución

Alcance operativo del programa

Procesos

12 procesos

- ✓ **Identificación / Consulta cliente**
- ✓ **Ficha cliente (visión 360º)**
- ✓ **Cotización**
- ✓ **Suplementos**
- ✓ **Verificación / Documentación pendiente**
- ✓ **Recobro**
- ✓ **Upselling & Cross-selling**
- ✓ **Chat**
- ✓ **Retención**
- ✓ **Recibos y pagos**
- ✓ **Cancelación y PNC**
- ✓ **Fidelización**
- ✓ **Portal**
- ✓ **Quejas y reclamaciones**

Integraciones

62 integraciones

- ✓ **22** integraciones **síncronas Salesforce ↔ Galgo**
- ✓ **28** integraciones **síncronas, Salesforce ↔ Proveedores / Partners**
- ✓ **6** integraciones periódicas/bajo demanda **Salesforce → Gestor documental**
- ✓ **6** integraciones **asíncronas / event-driven Galgo → Kafka → MuleSoft → Salesforce**

Carga de Datos

Aprox. 30 millones de registros

- ✓ **Carga inicial** (clientes activos, pólizas vigentes, renovaciones activas, leads y cotizaciones relevantes).
- ✓ **Validación y reconciliación** previo a cada Go-Live.
- ✓ **Reglas de transformación** definidas y aprobadas por LDA, implementadas por NTT DATA.
- ✓ **Modelo de carga desacoplado de la integración**

Colectivos

2.100 usuarios impactados

- ✓ **~1.600 agentes de Contact Center** (multitarea, adopción progresiva) (reforzado en la propuesta)
- ✓ **~200 usuarios operativos** (aprobaciones, flujos operativos, oportunidades)
- ✓ **~100 usuarios externos** (leads/referrals, partners)
- ✓ **~100 usuarios consultivos** (consulta ficha/reporting)

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo lo vamos a hacer







ENFOQUE	GESTIÓN DEL CAMBIO	METODOLOGÍA
FASEADO	ARQUITECTURA	IA
DESPLIEGUE	ACELERADORES	PLANIFICACIÓN
CONVIVENCIA	COBERTURA DE REQUISITOS	EQUIPO
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO	

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque


Para definir el plan de transformación hemos **analizado** el ejercicio de requisitos de LDA y **estructurado** el alcance en dominios funcionales de negocio.

Análisis del alcance funcional

Consolidación de los requisitos proporcionados por LDA

Agrupación en procesos y dominios funcionales

Identificación de capacidades transversales necesarias

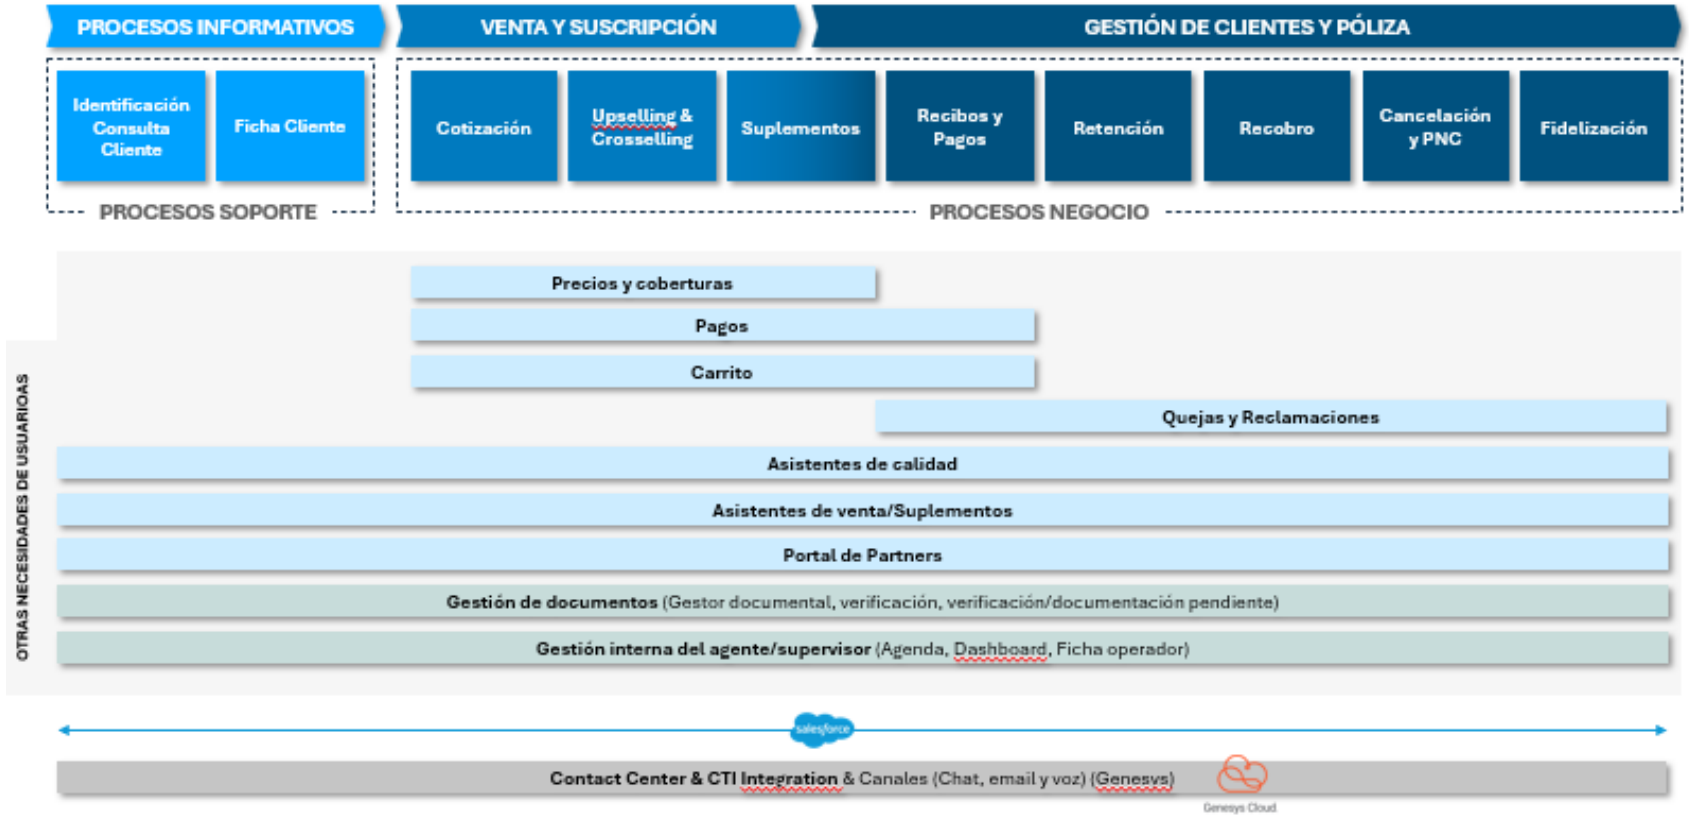

Como resultado del análisis hemos definido el mapa funcional del CRM objetivo para Línea Directa

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque

ENFOQUE DE TRABAJO

Del análisis funcional identificamos las **capacidades transversales** necesarias para habilitar el modelo cliente-360.

Identificación de bloques fundacionales


Revisión detallada de procesos clave (venta, atención, retención)

Identificación de capacidades transversales del CRM

Definición de bloques reutilizables comunes

Bloques fundacionales

Ficha de cliente	Agenda, tareas	Up/Crosselling / NBO / NBA	Recobros
Identificación cliente	Cotización y Emisión	Retención	Fidelización
Integración Telefonía	Verificación	Cancelación	Atención al cliente (Gestión de casos; Quejas y reclamaciones)
Dashboards	Suplementos	Recibos y Pagos	Canales digitales

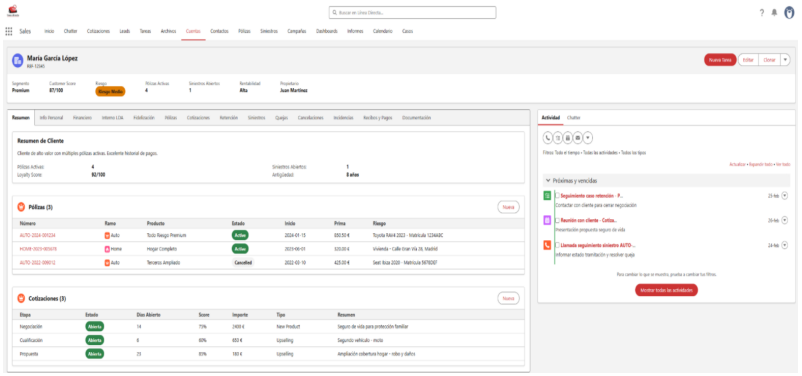

Ejemplo, la **ficha de cliente** tendrá información core de cliente que servirá a:

- Todos los procesos (venta, atención, retención)
- Los distintos negocios (hogar, coche, moto, salud…)

Deberá disponer de:

- Una estructura homogénea
- Unos campos comunes
- Unas reglas de evolución

Estos bloques constituyen la base sobre la que se construirán los distintos dominios de negocio.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Faseado


A partir de estos bloques fundacionales estructuramos el programa en **olas de negocio incrementales**.

Estructuración del programa en olas incrementales

Cada ola despliega un dominio funcional completo

Los bloques fundacionales habilitan esas olas

Cada ola genera valor operativo medible

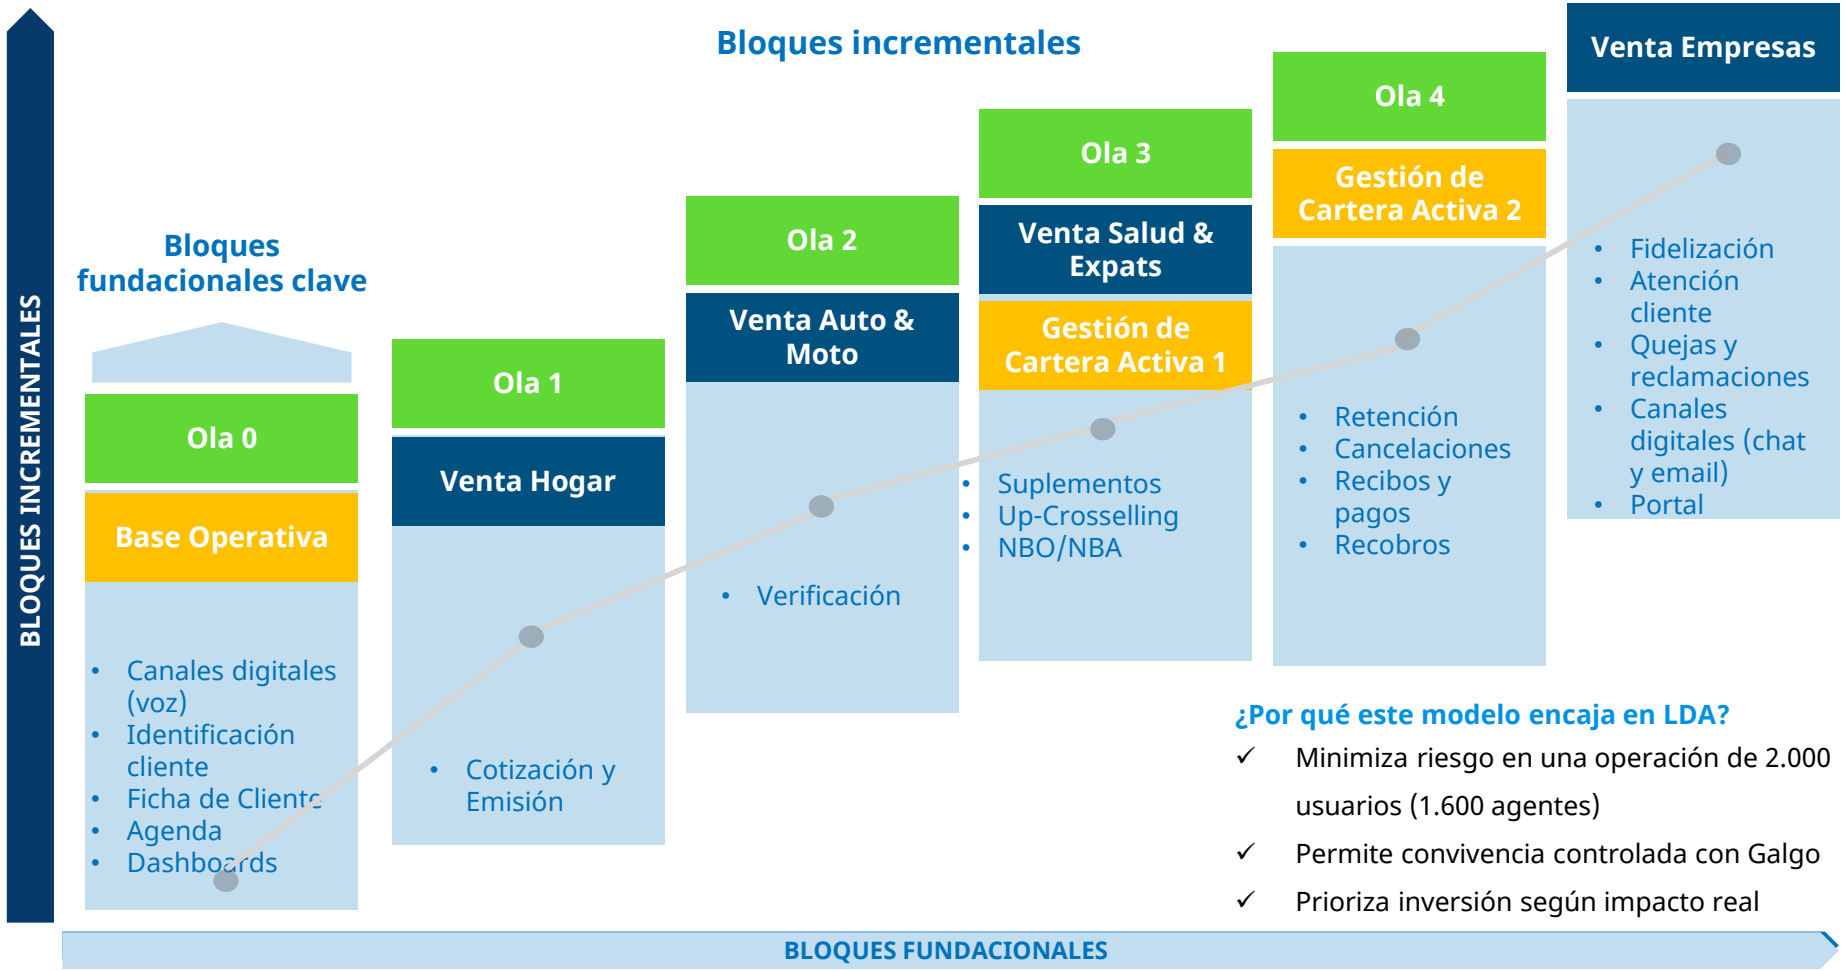

¿Por qué este modelo encaja en LDA?

- ✓ Minimiza riesgo en una operación de 2.000 usuarios (1.600 agentes)
- ✓ Permite convivencia controlada con Galgo
- ✓ Prioriza inversión según impacto real


Este enfoque permite una transformación progresiva, controlada y sin Big Bang operativo.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Despliegue técnico

ENFOQUE DE TRABAJO

El plan de transformación se despliega de forma progresiva para generar valor temprano sin comprometer la operación actual

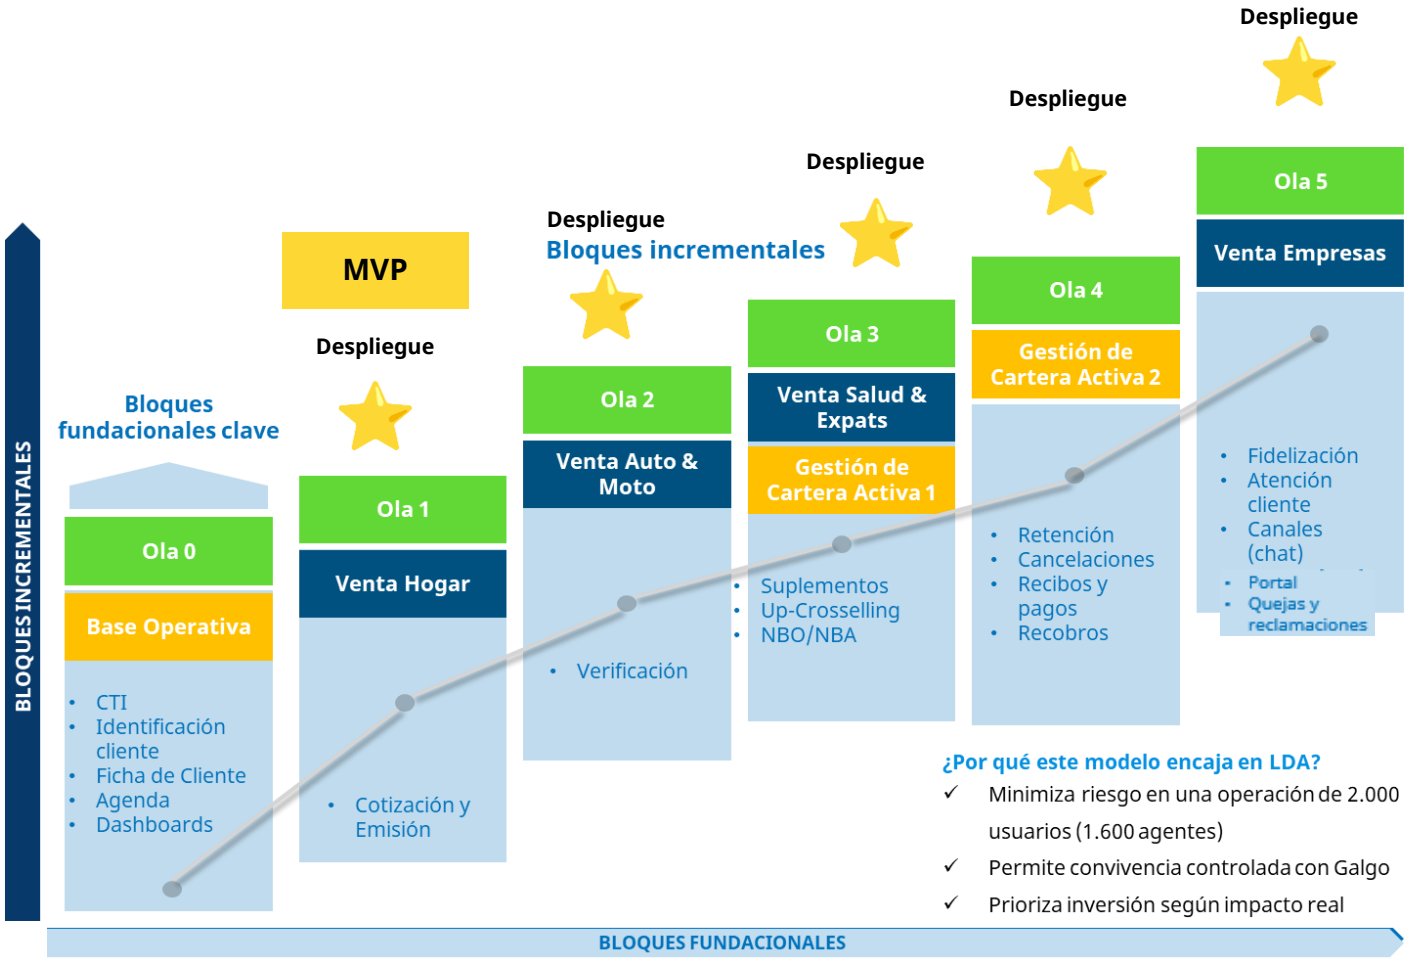

MVP Operativo: Hogar

La primera ola valida el modelo comercial completo en un ramo controlado (Hogar), permitiendo probar el modelo de oportunidad estructurada antes de escalarlo.

Despliegue por Ola

Cada ola culmina con un despliegue controlado que incorpora las nuevas capacidades a la operación real

Las capacidades se incorporan progresivamente en producción, minimizando el impacto en los más de 2.000 usuarios del canal directo

Durante todo el proceso se mantiene una convivencia controlada con Galgo, evitando cambios disruptivos en el core asegurador

En resumen, el despliegue se basa en un modelo incremental que permite generar valor desde las primeras entregas y evolucionar el modelo sin necesidad de un Big Bang operativo.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Despliegue operativo


NTT DATA
ENFOQUE DE TRABAJO

Estrategia de Go Live por olas (en alineación con Línea Directa)

Salida progresiva y controlada, alineada con el plan de despliegue de Genesys, equilibrando riesgo operativo, gestión del cambio y peso de negocio, minimizando la convivencia Old/New Front.

Aprovechar que **Genesys Cloud enruta por skill / línea de negocio**, y construir un modelo de **especialización progresiva por oleadas**, no por "big bang".

- Incremento progresivo de licencias
- Especialización funcional desde el inicio
- Routing inteligente en Genesys

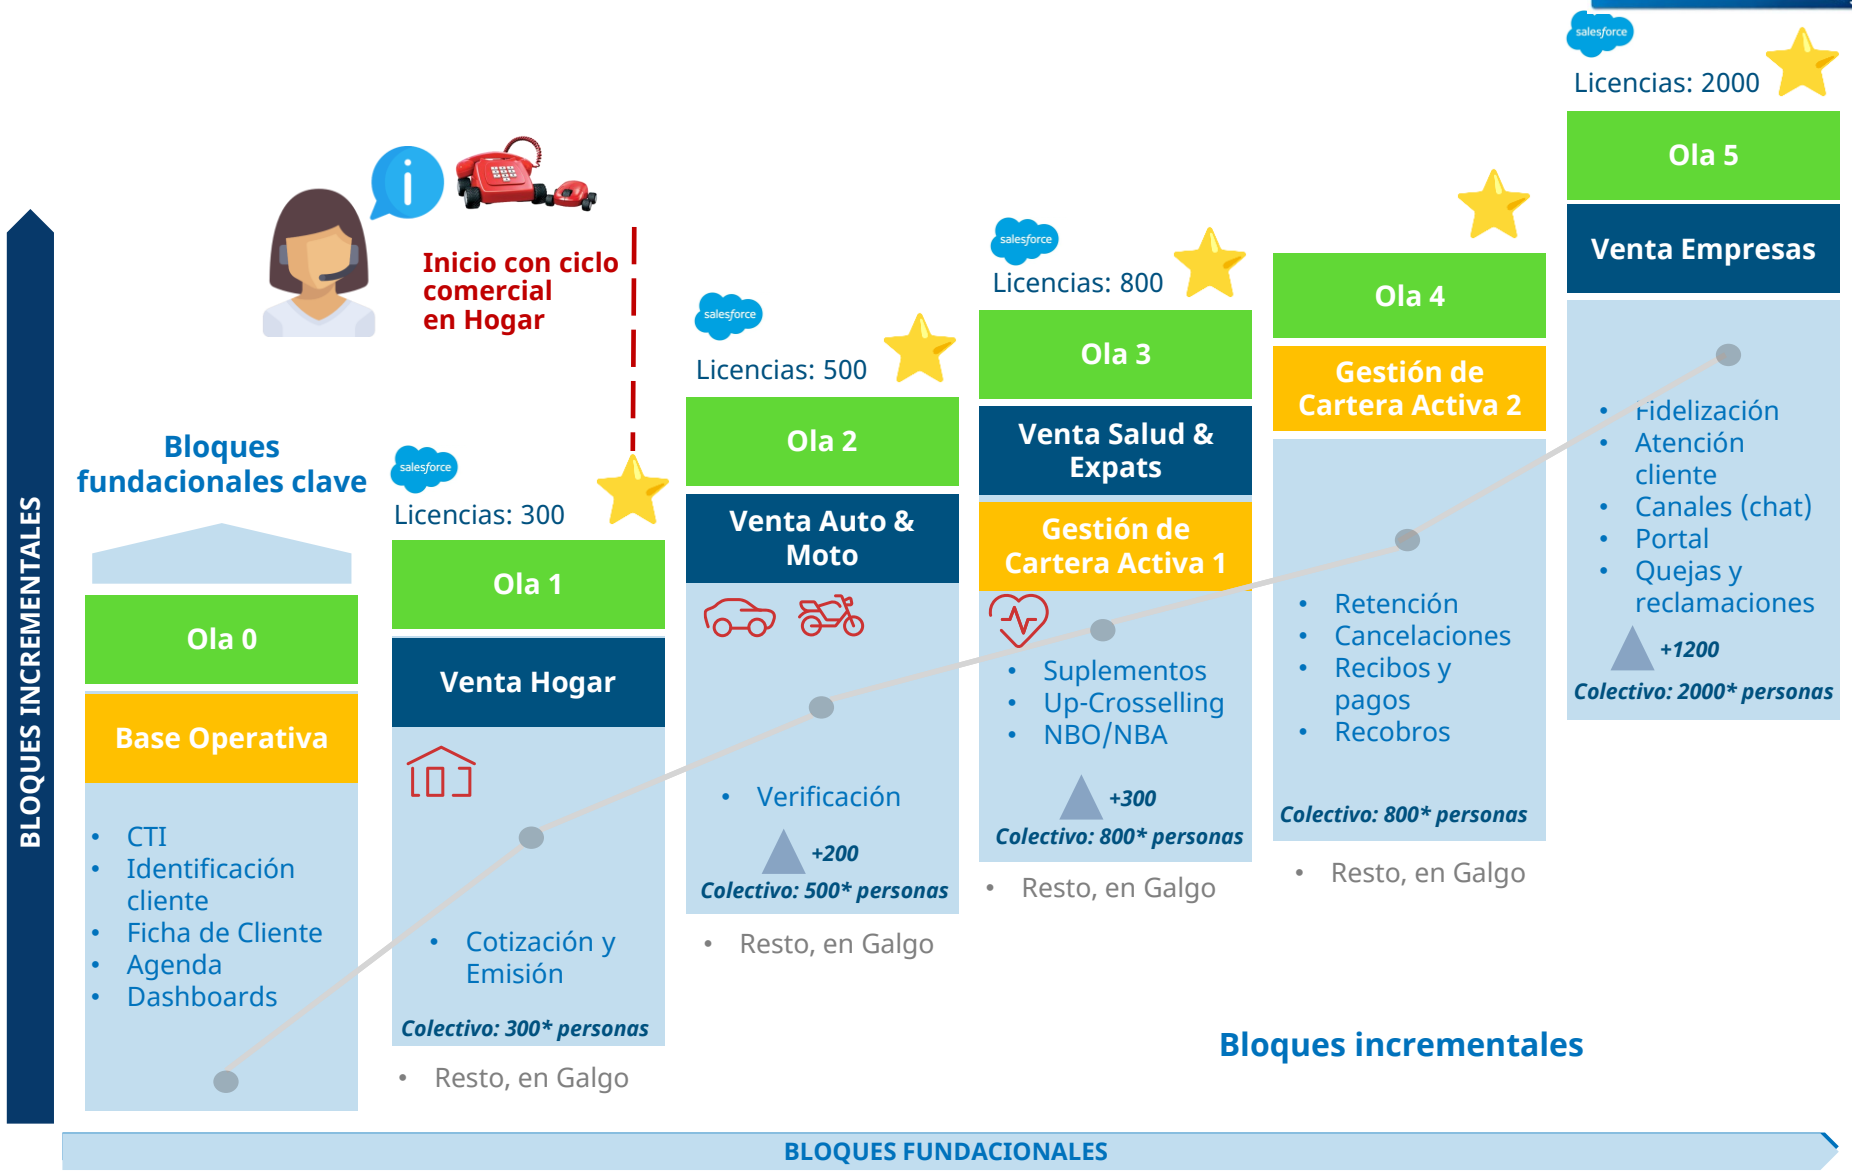

Este enfoque permite una transformación progresiva, controlada y sin Big Bang operativo.

***Consideraciones:** Se propone un número de usuarios acotado en cada ola para poder ir validando la adopción de cada ramo y escalable. El número total de usuarios por ola se definirá tras la fase de Inception.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Convivencia

En el escenario futuro CRM será el sistema maestro de relación y orquestación comercial y Galgo mantiene la maestría contractual y aseguradora. La maestría se define por responsabilidad funcional y no por persistencia física del dato y se realizará una **convivencia controlada con transición progresiva por oleadas**.

Escenario Inicio

Golden record del cliente MDM

Galgo como CRM y Core Asegurador

Entidades Maestro Galgo

Oportunidad	Interacciones	Aprobaciones
Cotización Comercial	Casos	NBA
Actividades	Reclamaciones	Contactos
Póliza	Pagos	Fidelización
Suplementos	Datos Bancarios	Producto
Siniestros	Riesgos	NBO
Cliente Contractual	Pricing	Recibos


Arranque de proyecto

Inception



Periodo de Implantación

Activación convivencia por oleada

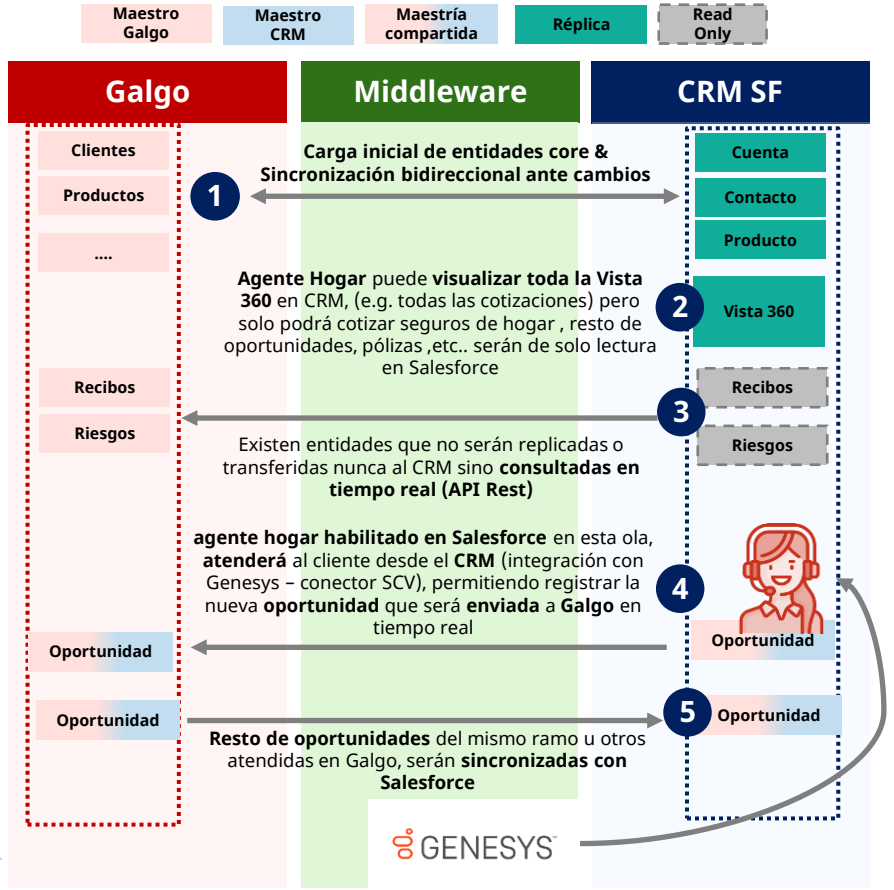

Ola 1 Venta hogar

Escenario Final

CRM como sistema maestro de relación y orquestación comercial

Entidades Maestro CRM

Cliente 360 | Multiproducto

Oportunidad	Interacciones	Aprobaciones
Cotización Comercial	Casos	NBA
Actividades	Reclamaciones	Contactos

Golden record del cliente MDM

Galgo como Core Asegurador

Entidades Maestro Galgo

Póliza	Pagos	Fidelización
Suplementos	Datos Bancarios	Producto
Siniestros	Riesgos	NBO
Cliente Contractual	Pricing	Recibos

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión del Cambio: Nuestra visión

El proyecto establece la necesidad de:

- **Diseñar y ejecutar un Plan Integral de Gestión del Cambio, alineado al calendario de releases.**
- **Definir un modelo de soporte post implantación con transferencia progresiva hacia un CoE CRM interno.**

Este requerimiento confirma que el éxito del programa dependerá no solo de la implantación técnica, sino de la adopción real del nuevo modelo operativo.

Naturaleza del cambio

La implantación del CRM Salesforce implica una transformación estructural que impacta:

- Un cambio de mentalidad y en formas de trabajo
- El front operativo del Contact Center.
- La evolución del modelo póliza → cliente 360º multiproducto.
- La convivencia progresiva CRM Salesforce –Galgo.
- La integración con Genesys Cloud y el ecosistema tecnológico.
- Más de 2.000 usuarios entre internos y externos.

Objetivo estratégico de la Gestión del Cambio

Asegurar una transición controlada, medible y sostenible que permita:

- Transformación del modelo operativo sin comprometer la operación
- Reducir fricción en el Contact Center.
- Consolidar nuevos hábitos de trabajo. Evolucionar la lógica de gestión de Línea Directa: de una operación centrada en pólizas a un modelo cliente-céntrico, estructurado y escalable.
- Transferir capacidades al CRM Salesforce para garantizar autonomía futura.

El **alcance de la Gestión del Cambio** está directamente vinculado al Plan de transformación propuesto deL modelo por bloques y por olas de negocio y abarca los siguientes puntos clave:



El principal riesgo del proyecto no es tecnológico, sino organizativo.
La Gestión del Cambio permite transformar sin comprometer la operación y consolidar el nuevo modelo operativo de forma sostenible.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión del Cambio: Nuestro enfoque diferencial

Acompañamos a las personas **transformando la adopción en compromiso y el compromiso en resultados duraderos.**

#CHANGEJOURNEY

Diseñamos journeys que conectan con las personas, impulsan la adopción y aceleran los resultados, combinando estrategia, tecnología y actitud abierta al cambio.

Red de cambio

Patrocinadores y embajadores del cambio (change champions) que comunican el propósito e impulsan la adopción desde dentro de la organización.

Motivación y compromiso

Comunicación y sensibilización

Historias y experiencias que **inspiran el cambio y movilizan a los equipos** conectando emocionalmente y motivando para fomentar la **participación** y un **impacto duradero**.

Momentos de la verdad

Análisis de impactos del cambio. Plan de Comunicación, Plan de Aprendizaje, Plan de monitorización y soporte.

Segmentación de colectivos

Experiencias de cambio personalizadas según colectivos como *rol*, *área, ramo* o *madurez digital*, adaptando mensajes, canales e itinerarios formativos para lograr mejor conexión y eficacia.

Discovery & Envisioning
Comprensión del contexto y visión del cambio

Diseño
Definición de la estrategia de GdC adaptada a las necesidades de LDA

Despliegue & Activación
Ejecución de las acciones antes, durante y después del lanzamiento

Evolución
Continuidad del cambio proporcionando herramientas para la adopción sostenida

Metodología propia

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión del Cambio: Narrativa de alto impacto

Generamos una **narrativa del cambio de alto impacto** y llevamos la experiencia de cambio a la práctica desde una perspectiva **innovadora**, que combina historias, juegos y formatos inmersivos que **transforman la adopción en vivencia y se adaptan a la cultura y necesidades de este proyecto de LDA**.




- Video avatar
- Infografías
- Píldoras formativas
- Cómic corporativo




- Video *TikTok*
- Podcast
- Mini Series
- Sitio Web
- Simulaciones gamificadas
- Experiencias inmersivas
- Canal de Teams dinamizado





















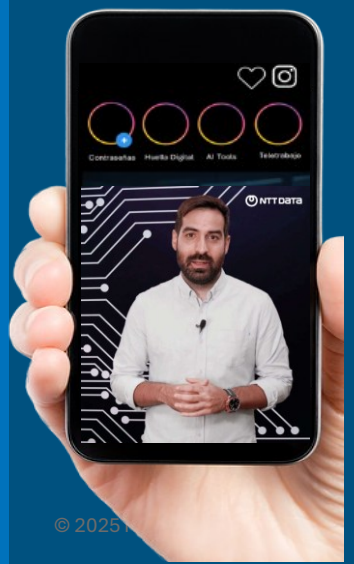













© 2025 NTT DATA

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque y metodología

Nuestro enfoque de Gestión del Cambio consta de **4 fases** y en cada una de ellas activamos las **5 palancas estratégicas del cambio.**
Planteamos una metodología de trabajo **compatible con la metodología híbrida establecida** para este proyecto(delivery Agile e incremental por olas, soportado por un marco de gobierno Waterfall que asegura control, trazabilidad y calidad en cada hito) y **estructurada en las siguientes 4 etapas, que se alinean con el Plan de Transformación del proyecto (**por dominios funcionales con valor visible). Se ejecutarán por el **equipo de Gestión del Cambio propuesto*** y se orquestarán las acciones conjuntamente bajo el marco del modelo de gobierno presentado.

0 Inception Fase al inicio de proyecto que es imprescindible para sentar las bases no sólo de la dinámica de trabajo en el proyecto y la relación entre las distintas partes participantes, sino también para el entendimiento, refinamiento y definición de las necesidades del negocio y de las personas involucradas en el proyecto y para la comprensión del propósito y del proceso de cambio.

Y a partir de la Ola 1, desde Gestión del cambio se abordarán 3 etapas reiterativas en cada ola, que son las siguientes:

1 Discovery

2 Implementación de la Gestión del Cambio: Diseño, Despliegue y activación

3 Soporte en la adopción: Evolución

PALANCAS ESTRATÉGICAS DEL CAMBIO \ FASES	Discovery & Envisioning Comprensión del contexto y visión del cambio	Diseño Definición de la estrategia de GdC adaptada a las necesidades de LDA	Despliegue & activación Ejecución de las acciones antes, durante y después del lanzamiento	Evolución Continuidad del cambio proporcionando herramientas para la adopción sostenida
Análisis de impactos del cambio *¿Cómo les afecta esta nueva herramienta y modelo operativo en su operativa diaria?*	• Análisis del punto de partida e identificación de gaps respecto al modelo objetivo • Identificación de colectivos impactados y análisis de impactos	• Plan de Gestión del Cambio • Roadmap de Gestión del Cambio		
Motivación y engagement *¿Cómo se impulsa la motivación en los colectivos?*		**Plan de despliegue de Red del Cambio:** • Roles clave y mensajes a transmitir • Actividades y dinámicas periódicas que motiven, informen e involucren a colectivos clave		Acciones de refuerzo
Comunicación & sensibilización *¿Cómo y que se les va a comunicar?*		**Plan de comunicación del cambio:** • Mensajes clave, narrativa del proyecto, branding interno • Comunicación segmentada según el perfil del usuario • Canales y calendarios		Acciones de refuerzo
Aprendizaje & formación *¿Sobre qué contenidos les vamos a formar?*		**Plan de Aprendizaje y transferencia del conocimiento:** • Formación por roles (operadores, supervisores, BO, perfiles mixtos) • Sesiones prácticas , simulaciones y manuales operativos • Mecanismos de verificación de la transferencia (evaluaciones)		Acciones de refuerzo
Monitorización & refuerzo *¿Cómo medidos el impacto de la GdC y la adopción?*		• Coaching operativo y acompañamiento en campo (CC presencial) Acciones de refuerzo • Métricas de adopción yreporting • Plan de sostenibilidad y transición alCoE Salesforce.		Acciones de refuerzo

Consideraciones: ** Ver en Anexo Equipo de proyecto el equipo de Gestión del Cambio propuesto.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Palancas de la gestión del cambio

Análisis de Impactos del cambio

¿QUÉ BUSCAMOS?

El objetivo es comprender la **situación inicial de Línea Directa (AS IS) y los elementos que se verán impactados por el cambio:** procesos, sistemas, cultura, personas y roles.
Se analiza la transición hacia las nuevas necesidades y formas de trabajo (TO BE) con CRM Salesforce.
Se evalúa la preparación de los usuarios para el cambio, identificando brechas entre la operativa actual y la futura, así como posibles resistencias y necesidades de formación.

Este análisis es fundamental para definir el plan de Gestión del Cambio y se realiza en la fase de Inception y en las sucesivas etapas de Discovery.

¿CÓMO LO HAREMOS?


- **Sesiones de focus groups, entrevistas y encuestas** para identificación, segmentación y análisis de los colectivos impactados.
- **Análisis del contexto organizacional y análisis documental** de la información relevante para el proyecto.
- Sesiones de trabajo para **identificar los impactos del cambio** (procesos, sistemas, cultura, personas y roles).
  - **Evaluación de la preparación** y disposición de los usuarios y la organización al cambio, recogiendo expectativas, necesidades, motores del cambio, posibles resistencias y niveles de madurez digital, para realizar el Informe de madurez ante el cambio.
  - **Análisis de brechas** entre la situación actual y la futura, con foco en la sistematización y automatización de procesos (identificación de gaps vs modelo operativo)
  - **Análisis de resistencias** (tipos y niveles) **y riesgos.**
- **Diseño del Diagnóstico de la situación inicial** – con los principales hallazgos y recomendaciones priorizadas -. **Diseño del Plan de Gestión del Cambio y el roadmap.**

ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL CAMBIO

PRINCIPALES ENTREGABLES

- **Diagnóstico de la situación inicial**
- **Mapa y Matriz Impacto/Influencia de partes interesadas***
- **Matriz RACI***
- **Matriz de riesgos**
- **Informe de madurez**
- **Plan de Gestión del Cambio**
- **Roadmap de Gestión del cambio**

ILUSTRATIVO

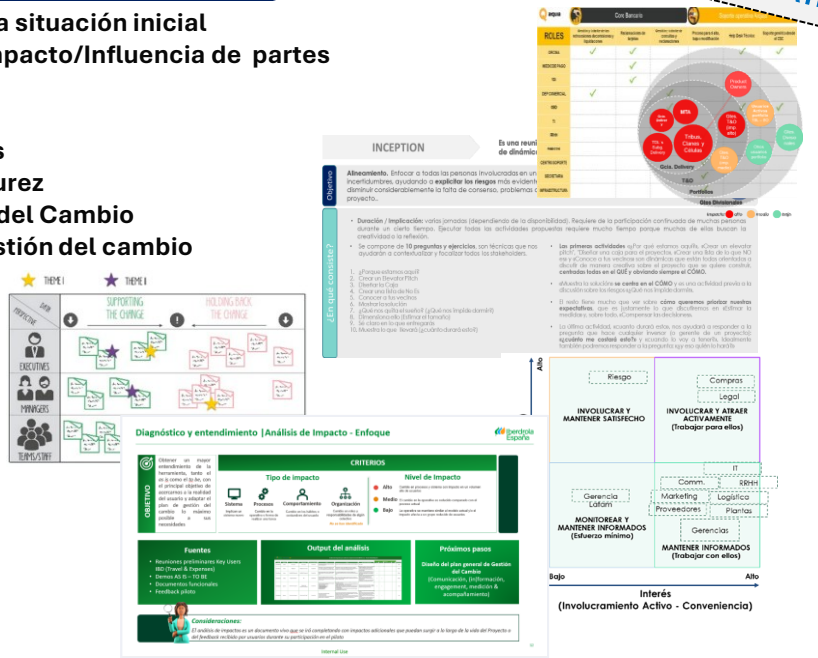

VALOR AÑADIDO

- Herramientas de Design Thinking y Lean Change Management para dinamizar las sesiones y capturar información.
- Análisis de todos los colectivos impactados y escucha activa de las expectativas y necesidades para adaptar la estrategia a su realidad.

Consideraciones: ** Ver en Anexo Listado de entregables específicos de Gestión del Cambio.*
Algunos de los entregables mencionados se incorporar dentro del informe de Diagnóstico de la situación actual.
** Ver en anexos Matriz RACI .*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Palancas de la gestión del cambio

— Motivación y Compromiso

¿QUÉ BUSCAMOS?

Identificar integrantes de la organización de diferentes áreas y a diferentes niveles que inspiren, fomenten y sostengan la adopción del cambio en el tiempo. **Patrocinadores y promotores de cambio (embajadores y champions) que sean puente con los diferentes equipos**, y brinden apoyo para lograr la correcta implementación del CRM Salesforce.

Creación de **líneas de acción de motivación** hacia los usuarios con el objetivo de conectar con los beneficios, **incentivar el uso de la herramienta y optimizar el aprovechamiento de su potencial con todas sus funcionalidades.**

¿CÓMO LO HAREMOS?

- **Análisis de colectivos** (por perfiles) en base a la motivación, expectativas y compromiso con el cambio. (Posición en la Curva del cambio).
- **Co-creación de la Red de cambio**: identificar los roles clave que apoyarán el cambio internamente y que conformarán la red de patrocinadores, embajadores/champions y agentes de cambio (usuarios clave y resto de usuarios finales)**.**
- Definición del **Plan de Red de cambio** y del **modelo de patrocinador y embajador** y dimensionamiento por área, geografía, proceso, etc.,
- Diseño del **Plan de Motivación y gestión de resistencias**: plan de actividades y participación, coaching y dinámicas periódicas a lo largo de la ejecución del proyecto que estarán destinadas a motivar, sensibilizar, informar e involucrar a los colectivos clave desde fases tempranas. Sesión de bienvenida, Kit del patrocinador, Kit del embajador, sesiones de seguimiento y refuerzo y canal colaborativo.

MOTIVACIÓN & ENGAGEMENT


PRINCIPALES ENTREGABLES

ILUSTRATIVO

- **Plan de la Red de Cambio**
- **Kit de bienvenida para el Patrocinador**
- **Kit de bienvenida para el Patrocinador**



Kit de bienvenida para la Red de Cambio



Canal colaborativo para la Red de Cambio

VALOR AÑADIDO

- **Trabajar el rol clave del sponsor,** para asegurar su **compromiso y visibilidad** a lo largo de todo el proyecto y promover la mejora continua.
- Recopilación y difusión de quick wins, historias de éxito y lecciones aprendidas

Consideraciones: ** Ver en Anexo Listado de entregables específicos de Gestión del Cambio.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Palancas de la gestión del cambio

Motivación y Compromiso

El éxito de la implantación del CRM Salesforce no depende únicamente de la formación y la comunicación, sino del **liderazgo visible** y del **compromiso activo** de referentes internos que impulsen la adopción desde dentro de la organización. Para ello, se articula una Red de Cambio estructurada en dos niveles: Sponsors y Champions.

SPONSORS

El **Sponsor** es un **líder de alto nivel** que **respalda y patrocina** el proyecto de cambio, toma decisiones ejecutivas y será la máxima autoridad en el proyecto.

¿CUÁL SERÁ SU FUNCIÓN?

- **Definir** la visión y objetivos
- **Actuar** como el principal comunicador del cambio y mantener una comunicación abierta y bidireccional en todos los niveles
- **Superar** obstáculos, facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones
- **Demostrar** su compromiso personal con el cambio.
- **Evaluar** el progreso y realizar ajustes para garantizar el éxito

¿POR QUÉ SU IMPORTANCIA?

Su liderazgo efectivo y apoyo constante son fundamentales **para superar los desafíos y lograr los objetivos del proyecto.**

CHAMPIONS

Los **Champions** son personas con **suficiente conocimiento** de los métodos de trabajo actuales (“As is”) y tienen el propósito de ayudar en la implementación de los nuevos métodos (“To be”)

¿CUÁL SERÁ SU FUNCIÓN?

- **Ayudar** a identificar personas adecuadas para involucrarlas en la implementación
- **Capacitarse** como formadores en la "Formación a Formadores"
- **Ayudar** a organizar formaciones
- **Actuar** como primera línea de ayuda ante desafíos, proporcionando información constante
- **Ser** un canal de comunicación dentro y para su equipo

¿POR QUÉ SU IMPORTANCIA?

Son una figura clave en el **impulso a la adopción de los cambios.** Es un canal informal de comunicación que aporta proximidad, provee feedback y genera conciencia del cambio.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Palancas de la gestión del cambio

— Comunicación y Sensibilización

¿QUÉ BUSCAMOS?

Transmitir de forma clara y efectiva la visión del cambio, el propósito y sus beneficios, utilizando recursos visuales y materiales que informen e inspiren a los usuarios.

El objetivo es **fomentar la participación y la motivación** desde el inicio, generando confianza en la nueva solución y poniendo en valor los beneficios y objetivos del proyecto de implantación del CRM Salesforce.

¿CÓMO LO HAREMOS?

- **Identificación de los objetivos y necesidades de comunicación**, así como de las **audiencias y canales** más adecuados.
- **Diseño y ejecución del Plan de comunicación con storytelling** que combine mensajes clave y claros, branding del proyecto, claims y presentaciones y materiales digitales accesibles para todos los usuarios y despliegue por olas
- **Elaboración de materiales de apoyo**: Video demo presentación del proyecto (Bienvenida), comunicados estratégicos y tácticos, sesiones informativas, "Un día en la vida de…" (por rol), demos funcionales (show&tell), infografías, newsletter y flashnews (estado del proyecto), FAQs, sitio del proyecto, **Aplicación de herramientas de IA generativa** para construir materiales atractivos y de alto valor.
- **Coordinación con el equipo interno de comunicación de LDA** para la difusión de los materiales y el acompañamiento durante la adopción. Detalle de responsabilidades y roles.
- **Evaluación de la efectividad de las acciones de comunicación**. Identificación y seguimiento de **Kpis de comunicación** (alcance - % usuarios impactados, ratio de apertura emails, %clics/interacciones, comprensión del cambio…), con posibilidad de ajustes y refuerzo según las necesidades detectadas.

COMUNICACIÓN & SENSIBILIZACIÓN

PRINCIPALES ENTREGABLES


- **Plan de Comunicación**
- **Comunicados estratégicos y tácticos**
- **Video de presentación del proyecto**

ILUSTRATIVO
















VALOR AÑADIDO

- Apoyo experto en la **creación de contenidos digitales y diseño gráfico**.

Consideraciones: ** Ver en Anexo Listado de entregables específicos de Gestión del Cambio.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Palancas de la gestión del cambio

— Aprendizaje y nuevas formas de trabajo

¿QUÉ BUSCAMOS?

El objetivo es **crear e implementar un plan de aprendizaje que asegure que los usuarios impactados adquieran los conocimientos y habilidades necesarios** para familiarizarse con CRM Salesforce, los nuevos procesos y las nuevas formas de trabajo. Y que **dispongan de los recursos necesarios para adaptarse a la nueva herramienta** y a los procesos, facilitando la mejora de la eficiencia operativa.

La formación debe facilitar la transición desde la operativa actual hacia la nueva plataforma, garantizando una adopción efectiva y sostenible.

¿CÓMO LO HAREMOS?

- **Definición de la estrategia y diseño del plan de Aprendizaje**, adaptado a las necesidades detectadas en la fase de Discovery.
- **Formación estructurada**, compuesta por sesiones teóricas y prácticas basadas en casos de uso reales e itinerarios formativos por rol. **Programa de Formación de Formadores y Formación a usuario final en cascada.**

  Tras cada fase funcional y previo a la fecha de despliegue, se realizará una Formación de Formadores para **dos grupos de 20-25 personas (~ 50 personas)** dirigida al colectivo de posibles formadores y usuarios clave que vayan a actuar como formadores (internos de LDA), para que puedan realizar la formación a usuario final en las diferentes olas. Este colectivo recibirá: Formación funcional completa sobre las nuevas capacidades y funcionalidades desplegadas en cada fase y por perfil de usuario, capacitación práctica en el uso de la herramienta, materiales formativos estructurados y orientación metodológica para la réplica formativa

  Se plantea una propuesta de estrategia de formación a usuario final por ola y en cascada en olas en función del número total de los colectivos a formar en cada ola, contando con la convivencia correspondiente con el sistema Galgo.
- **Elaboración de materiales formativos**: Training kit (playbook), manual de usuario, guías rápidas tipo "Journey Map" por perfil de usuario (proceso/rol), vídeo-píldoras con avatar demo y grabación de webinars, tips para formadores, FAQs, todos disponibles en un repositorio digital accesible para los usuarios y que se irán actualizando para cada ola. **Aplicación de herramientas de IA generativa** para construir materiales atractivos y de alto valor.
- **Entorno de formación** configurado para la práctica con casos de uso
- Definición y seguimiento de **KPIs de aprendizaje.**

PLAN DE APRENDIZAJE Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJO

¿CÓMO LO HAREMOS?

- **Sesiones de seguimiento** y **sesiones específicas de resolución de dudas** para acompañar la adopción.
- **Canal de soporte en Teams dinamizado**
- **Coordinación con el equipo interno de Personas/Formación** para la gestión, difusión y monitorización del Plan de Aprendizaje y los materiales formativos. El formato de e-learning será SCORM para su subida a la plataforma digital de LDA*. (*Esta subida y la administración de la plataforma de formación para este programa con la correspondiente actividad de alta y mantenimiento de usuarios y trazabilidad del avance de la formación será responsabilidad de LDA).
- Diseño y ejecución del plan de transferencia de conocimiento al CoE CRM.



- **Verificación de transferencia del conocimiento:**
  - **Proceso de certificación de formadores** y encuestas de evaluación para formadores, estableciendo % mínimo de superación y diseño de acciones de refuerzo y coaching para optar a la recertificación en caso de no lograrlo a la primera. En caso de no ser aptos, se localizarán otros posibles candidatos que se formarán ad-hoc.
  - **Encuestas de evaluación para usuarios finales** y acciones de refuerzo y coaching colectivo en función de los resultados.
  - **Encuestas de evaluación para miembros del CoE CRM** y acciones de refuerzo en función de los resultados.

Se plantean **DOS ESCENARIOS DE FORMACIÓN**

ESCENARIO 1*:

Formación de Formadores, a ser realizada por **NTT Data** + **Formación a Usuario Final,** responsabilidad de LDA.

ESCENARIO 2*:

Formación de Formadores, a ser realizada por **NTT Data** + **Formación a Usuario Final,** Por formadores **NTT Data**

El objetivo es dotar a LDA de autonomía en la transmisión del conocimiento y asegurar la sostenibilidad del modelo. Una vez capacitados, los formadores internos serán responsables de planificar en cascada la formación a los usuarios finales correspondientes a cada despliegue.
En ambos escenarios, la Formación de formadores será impartida por expertos de NTT Data (equipo propio), combinando expertos en la herramienta y expertos en la Gestión del cambio.

** En el Escenario 1 la ejecución de la Formación a usuario final será responsabilidad de LDA. No obstante, en caso de no disponer de la capacidad necesaria, NTT DATA propone la opción del Escenario 2 donde esta formación sería realizada por equipo NTT Data.*

Consideraciones: ** Ver en Anexo Listado de entregables específicos de Gestión del Cambio.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión del Cambio: Despliegue por olas

Plan de Aprendizaje – Despliegue por olas


Modelo iterativo de formación alineado al calendario de despliegue funcional.

Programa de formación en cascada en dos niveles: Formación de Formadores y Formación a usuario final en cada ola.



Tras cada fase funcional y previo a la fecha de despliegue, se realizará una **Formación de Formadores para dos grupos de 20-25 personas** dirigida al colectivo de posibles formadores y usuarios clave que vayan a actuar como formadores, para que puedan realizar la formación a usuario final en las diferentes olas, segmentada en 5 grupos.

En las olas posteriores se activa una **actualización de esta formación** que posteriormente se **replica en la formación a los usuarios finales**, asegurando coherencia y actualización continua. Y se complementa con **soporte, refuerzo y coaching.**

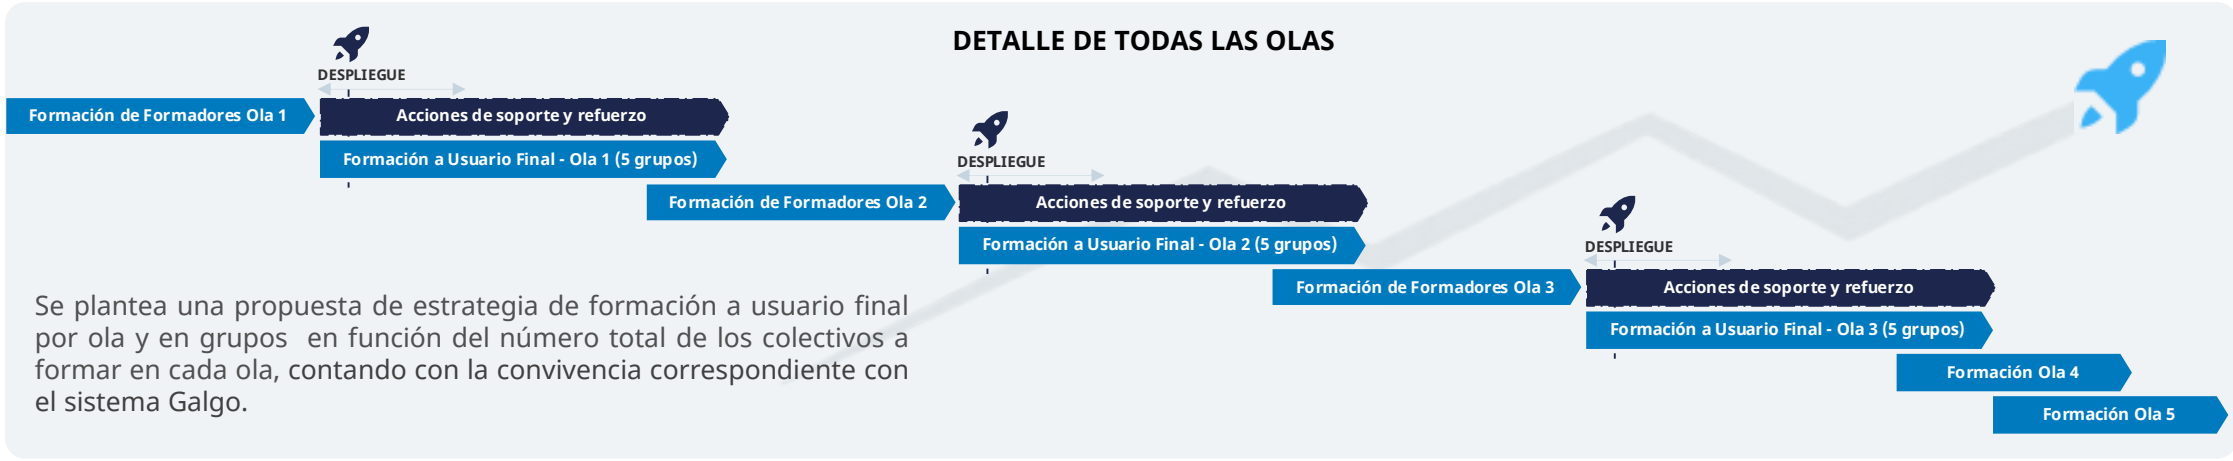

Se plantea una propuesta de estrategia de formación a usuario final por ola y en grupos en función del número total de los colectivos a formar en cada ola, contando con la convivencia correspondiente con el sistema Galgo.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Plan de aprendizaje – Formación de Formadores

OLA 1: Colectivo de Formadores y usuarios clave. Propuesta: 2 grupos de 20-25 usuarios. **(~ 50 personas).** Duración: 8 – 16 horas*
Perfil de Formadores y usuarios clave: perfiles expertos de cada área, con conocimiento profundo de procesos y credibilidad interna, capaces de enseñar con ejemplos reales y generar adopción*.
Alcance: Funcionalidades Ola 0 y Ola 1.

ILUSTRATIVO de una ola

Sesión de Introducción

- **Kick Off del programa de Formación de Formadores:** "Formación CRM Salesforce"
- Claves de transformación y adopción del cambio.
- Visión global de la herramienta y procesos cubiertos

Formato: Sesión presencial Ola 1/ Webinar Virtual síncrono, resto de olas*

Formación práctica

- **Sesiones virtuales introductorias** de los contenidos.
- **Práctica en entorno de formación** sobre la plataforma CRM Salesforce
- **Ejercicios de casos de uso** por rol o/y proceso

Formato: Virtual síncrono / presencial*

Autoaprendizaje

- **Video demo**
- **Guías rápidas** por rol/proceso
- **Manuales de usuario**
- **Documento FAQs**

Formato: Individual virtual asíncrono

Sesión de Q&A

- **Webinar de resolución de dudas** (previo al paso a producción)
- **Refuerzo** del conocimiento
- **Training tips**
- **Encuesta de evaluación** de la formación
- ***Evaluación de formadores***

Formato: Virtual síncrono / Presencial*

Paso a Producción

Acciones de soporte y refuerzo

- **Sesión Q&A*** Webinar de resolución de dudas y refuerzo del conocimiento (post producción, primera y tercera semana]
- **Diseño de acciones de refuerzo** (en caso de necesidad)*

Formato: Virtual síncrono / Presencial*

Diseño y creación de materiales

Monitorización de aprendizaje

Consideraciones: **El enfoque de contenido, número total de sesiones de formación, duración, formato virtual o presencial y calendario se indicará después de la fase de Inception considerando realizar las sesiones en los momentos de menor impacto en el negocio. Se ajustará en cada etapa de Discovery de cada fase, en base al impacto de las funcionalidades a desplegar. El número de usuarios es indicativo. Los formadores habrán de superar una evaluación para validar su capacidad y disposición como formadores. En caso de Escenario 2 los formadores serán personal experto y capacitado de NTT Data.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Plan de aprendizaje – Formación Usuario final

OLA 1: Colectivo de usuarios finales adaptado a usuarios correspondientes a ola 1. Propuesta: grupos de 25 usuarios*.
Duración: 8 – 12 horas*.
Alcance: Funcionalidades Fase 0 y Fase 1.

ILUSTRATIVO de una ola

Sesión de Sensibilización

- **Contexto del cambio.**
- Impacto por rol: **"¿Qué cambia para mi?"**
- **Mensaje** del sponsor.
- Contextualización del **modelo cliente 360º**.
- Presentación Formación CRM Salesforce
- Visión global de la herramienta y procesos cubierto

Formato: Virtual síncrono / presencial*

Formación estructurada

- **Sesiones virtuales introductorias** de los contenidos.
- **Práctica en entorno de formación** sobre la plataforma CRM Salesforce.
- **Ejercicios de casos de uso** por rol o/y proceso.
- Espacio para dudas.

Formato: Virtual síncrono /presencial*

Autoaprendizaje

- **Video demo**
- **Guías rápidas** por rol/proceso
- **Manuales de usuario**
- **Videopíldoras**
- **Documento FAQs**

Formato: Individual virtual asíncrono

Práctica Guiada

- **Simulación en entorno formativo.**
- **Casos reales del CC adaptados a cada rol.**
- **Validación de comprensión**
- **Sesión de Q&A**
- **Encuesta de evaluación** de la formación

Formato: Virtual síncrono / presencial*

Paso a Producción

Acciones de soporte y refuerzo

- **Sesión Q&A semanales** (3 – 4 semanas)
- **Microcontenido** según incidencias reales
- Diseño de acciones de refuerzo (en caso de necesidad)*

Formato: Virtual síncrono / Presencial*

Monitorización de aprendizaje

Consideraciones: **El enfoque de contenido, número total de sesiones de formación, duración, formato virtual (webinar Teams) o presencial y calendario se indicará después de la fase de Inception considerando realizar las sesiones en los momentos de menor impacto en el negocio. El número de usuarios es indicativo. Se ajustará en cada etapa de Discovery de cada fase, en base al impacto de las funcionalidades a desplegar y alcance de usuarios impactados en cada ola, lo que determinará el número de grupos a formar.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Pilares de la gestión del cambio

— Monitorización y Refuerzo

¿QUÉ BUSCAMOS?

Identificar la **efectividad** y **nivel de impacto** de cada una de las acciones de cambio llevadas a cabo a lo largo del proyecto, con el fin de localizar **tendencias, fortalezas, resistencias y áreas de mejora** (especial enfoque en la capacitación).
Para cada ola se propone seguimiento de los diferentes impulsores del cambio, adaptando los planes a través de un **seguimiento cuantitativo y cualitativo de los indicadores** clave de rendimiento, definidos según los objetivos establecidos (OKRs). Además, se prevén **acciones de soporte** posterior a la implementación para garantizar una transición completa.

¿CÓMO LO HAREMOS?


- Definición de la **estrategia de seguimiento y monitorización**
- **Definición, medición y seguimiento** de OKRs y KPIs por cada palanca de Gestión del Cambio y asociados a los KPIs de la herramienta y de negocio (*ver propuesta de KPIs en pg siguiente*).
- Diseño del **Cuadro de mando de gestión del cambio. Aplicación de herramientas de IA generativa** para análisis de datos
- **Diseño y lanzamiento de herramientas de *feedback*** (encuestas de pulso del cambio y canales de comunicación bidireccionales, ej.: Teams)
- Análisis de posibles **resistencias y propuesta de acciones de mitigación**
- **Refuerzo de comunicación sobre los materiales disponibles** (informativos y formativos) para facilitar la atención al usuario.
- Diseño y ejecución de acciones de **coaching**, en caso necesario.
- Activación de **canal de soporte funcional**, gestión de dudas, resolución de bloqueadores diario durante fase ***hypercare (1 mes)***. Escalado según modelo de gobierno.
- **Al fin de proyecto, Sesión de Cierre de proyecto** con transferencia de conocimiento y entrega de:
  - **Informe de Cierre de proyecto** con conclusiones, lecciones aprendidas y logros desde la perspectiva de Gestión del cambio
  - Entrega de versiones finales de los documentos y materiales realizados y alojamiento en el sitio de proyecto / repositorio centralizado.

MONITORIZACIÓN Y REFUERZO

PRINCIPALES ENTREGABLES

ILUSTRATIVO

Sesiones de Q&A



Cuadro de Mando de Gestión del cambio



FAQs actualizadas



Informe de cierre de proyecto

Documento que consolida resultados alcanzados, objetivos cumplidos y lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto.

VALOR AÑADIDO

- Realización de **sesiones retrospectivas periódicas**, recopilación de lecciones aprendidas y aplicación de buenas prácticas
- **Acompañamiento primeras semanas del CRM (on-the-job):** Durante la fase de Hypercare, presencia activa en campo con consultores funcionales Salesforce e IT/soporte técnico y equipo Gestión del cambio* como primer nivel de soporte. Champions, soporte de proximidad. Presencia selectiva: Despliegue por áreas clave y colectivos críticos. Shadowing y soporte a equipos en tiempo real, recogida de feedback, identificación de problemas, resolución ágil y refuerzo de procesos. Establecimiento y monitorización de KPIs de acompañamiento.

Consideraciones: ** Ver en Anexo Listado de entregables específicos de Gestión del Cambio.*
** Ver en Anexo Equipo de proyecto el equipo de Gestión del Cambio propuesto.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Pilares de la gestión del cambio

— Monitorización y Refuerzo : OKRs y KPIs

Los **OKRs y KPIs** definitivos y sus categorías se definirán conjuntamente con LDA en la fase de *Inception* y de Discovery, en el diseño del Plan de monitorización y soporte.

Se habrá de **medir el éxito real**, cruzar datos para analizar interrelaciones, analizar las incidencias funcionales repetitivas y diseñar acciones de mitigación o refuerzo en consecuencia.

Las **fuentes de datos** serán: CRM Salesforce, canal de soporte y herramienta de incidencias/soporte (ITSM), plataforma digital de formación de LDA, herramientas de comunicación interna de LDA, herramientas de encuestas/*feedback*, canales cualitativos/red de patrocinadores y *champions*, herramientas de BI/ *reporting*.

La trazabilidad de la información irá en función de las fuentes de datos utilizadas.

ID	Categoría	KPI	Qué mide	Para qué sirve en Gestión del Cambio (Identificar qué pasa y por qué pasa)	KPI de recurrencia (Pareto/Incidencias repetidas)*	Objetivo*	Definición de severidades*	Reporting periódico*
1	Adopción básica	Usuarios activos (Diarios/Semanales)	Nº de usuarios que acceden regularmente	Detectar nivel general de adopción y hábitos de uso	10-20% usuarios concentran 60-70% uso	*Valores objetivos (de reducción, de incremento o de recurrencia - Pareto- según el KPI) y tendencias, a definir conjuntamente con LDA en la fase de Inception y de Discovery, en el diseño del Plan de monitorización y soporte	*Semáforos (verde/ámbar/rojo). Valores/umbrales a concretar durante el diseño del Plan de monitorización y refuerzo	*A establecer frecuencia de medición y frecuencia de reporting en el Plan de monitorización y soporte. Opciones: diarias, semanales, quincenales, mensuales y superiores.
2	Adopción básica	Frecuencia de login	Nº de accesos por usuario	Identificar uso recurrente vs puntual. Disciplina de uso.	10-20% usuarios concentran 60-70% uso			
3	Adopción básica	Tiempo en la herramienta	Duración media de uso	Ver si el uso es superficial o real				
4	Adopción por colectivo	% adopción por colectivo / rol / ubicación	Nivel de uso por colectivo y comparativa entre áreas	Nivel de uso segmentado por colectivo/rol/ ubicación. Detectar colectivos con resistenciay focos de mejora				
5	**Uso funcional - Sales**	**Oportunidades creadas**	**Nº y % registradas en Salesforce**	**Medir uso real del CRM**	20% incidencias pipeline generan 75% errores			
6	**Uso funcional - Sales**	**Actualización de pipeline**	**Cambios en etapas, importes**	**Evaluar disciplina comercial**				
7	**Uso funcional - Sales**	**Actividades registradas**	**Calls, reuniones, emails**	**Ver trazabilidad de actividad**				
8	**Uso funcional - Service**	**Casos gestionados**	**Nº de casos en Salesforce**	**Medir adopción en atención**				
9	**Uso funcional - Service**	**Uso de knowledge/macros**	**Nº de usos**	**Medir madurez en herramientas**	20% procesos generan 80% ineficiencia			
10	**Comunicación**	Varios	Si se están enterando y entendiendo el cambio	Medir y diseñar acciones en consecuencia				
11	**Aprendizaje**	Varios	Capacidad para entender y usar Salesforce	Medir y diseñar acciones en consecuencia				
12	**Red de cambio**	Varios	Existencia de apoyo cercano para adoptar el cambio	Medir y diseñar acciones en consecuencia				
13	Eficiencia operativa: Reducción de tiempos operativos	Lead Time, Cycle time, Throughput, SLA.	Tiempo end-to-end del proceso, de una tarea, cantidad de trabajo completado	Evaluar la eficiencia de la adopción del cambio. Facilidad de uso del CRM. Productividad del usuario. Control de calidad de servicio				
14	**Calidad del dato**	**Registros completos**	**% de campos clave informados**	**Garantizar confianza en el sistema**				
15	Calidad del dato	Calidad de datos críticos	Datos de cliente/póliza correctos	Evitar rechazo del sistema				
16	Profundidad de uso	Uso de funcionalidades clave	Flows, dashboards, mobile, etc.	Medir adopción avanzada				
17	**Profundidad de uso**	**Uso de funcionalidades clave. Usuarios avanzados vs básicos**	**Flows, dashboards, mobile, etc. Segmentación de uso**	**Diseñar acciones de formación y refuerzo**				
18	**Profundidad de uso**	**Uso de dashboards**	**Consulta de reporting**	**Fomentar toma de decisiones data-driven**				
19	Impacto en negocio	Ratio de conversión	Ventas cerradas vs oportunidades	Validar valor del CRM				
20	Impacto en negocio	Cross/Up-selling	Ventas adicionales	Medir impacto comercial				
21	**Riesgos de adopción**	**Usuarios inactivos**	**Sin login en X días**	**Identificar resistencia**				
22	**Riesgos de adopción**	**% procesos end-to-end y uso de herramientas externas**	Procesos completos en Salesforce vs uso de herramientas externas y reportes fuera del sistema	**Sustitución de legacy. Falta de confianza. Detectar no adopción real**				
23	Experiencia usuario	Customer Effort Score	Esfuerzo percibido y reducción de tareas manuales	Detectar fricción y valor percibido	15% fricciones generan 70% quejas			
24	Experiencia usuario	Incidencias reportadas	Tickets de usuario	Barreras de adopción				
25	Capacidad	Autonomía usuario	Resolución sin soporte	Madurez				
26	**Alineamiento**	**Uso por managers**	**Uso dashboards**	**Impulso liderazgo**				
27	**Satisfacción del usuario y propensión al cambio**	**NPS / CSAT / feeeback cualitativo**	**Satisfacción y compromiso. Evaluación cuantitativa y cualitativa (en base a Encuesta definida - escala y frecuencia-).**	**Identificar acciones de mejora asociadas y segmentadas.**				
28	Curvas de aprendizaje, rendimiento, gobierno y seguimiento	Evolución temporal Adopción 3-6 meses	Tendencias de uso y sostenibilidad	Medir progreso del cambio				

ILUSTRATIVO

© 2026 NTT DATA, Inc.

Plan de sostenibilidad y transición al Centro de Excelencia CRM

Objetivo: Asegurar la adopción sostenida de Salesforce y la transición planificada desde el inicio del proyecto, desde el equipo de proyecto hacia un modelo operativo estable - CoE CRM-, garantizando autonomía del negocio y mejora continua.

Modelo de Transición

- Proyecto → Hypercare → Transición → CoE Autónomo
- Soporte intensivo → Soporte compartido → Responsabilidad interna LDA
- Transferencia progresiva de conocimiento y responsabilidades.

Al final de cada ola:

Se realizará una fase de **hypercare de un mes de duración** para la monitorización y el soporte en la adopción post Go-Live. Se ejecutarán acciones de soporte y refuerzo, en base al análisis de KPIs de adopción. En caso de ser necesarias acciones específicas de mentoring o coaching, se considerarán dentro del Plan de monitorización y refuerzo.

Se realizará una **Sesión Retrospectiva** y se entregarán las versiones finales de los materiales generados en dicha fase y grabaciones disponibles de las sesiones de formación realizadas.

Se impartirá una **sesión de capacitación para poder traspasar estos conocimientos al CoE de CRM de LDA e integrarlos en el BAU, por lo que la transferencia del conocimiento se irá realizando de manera progresiva e incremental en cada ola.**

ACTIVIDADES

- Diseñar y activar un modelo de gobierno para el CoE CRM que regule decisiones, prioridades y evolución del CRM (Comité de producto y Comité operativo) para transferir la responsabilidad a negocio e IT y formalizar roles.
- Red de cambio (champions) activa: Asumir la responsabilidad de seguir gestionando la adopción del cambio para mantener un soporte cercano a los usuarios, reducir las incidencias e impulsar la mejora continua.
- Crear una Comunidad de usuarios como espacio continuo de colaboración y aprendizaje a través de un canal digital a ser dinamizado de manera continua
- Medir en base a los indicadores de éxito que se habrán definido

ACTIVIDADES

- Transferir responsabilidad a negocio de seguir gestionando el uso del CRM Salesforce y la adopción del cambio
- Desenganche progresivo del proyecto:
  - Transferencia de conocimiento (documentación + formación)
  - Reducción escalonada del soporte externo: Shadowing / reverse shadowing previo a la salida total del equipo de proyecto con validación final de la autonomía

1º. Proyecto acompaña → CoE ejecuta. Soporte compartido.
2º. CoE ejecuta → proyecto supervisa. Estado final: soporte CoE CRM.

Consideraciones: ** Ver en Anexo Modelo de responsabilidad de perfiles con la definición de roles, RACI, KPIs y staffing del CoE CRM para operación futura.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución



Arquitectura de la solución

Arquitectura de integración

Coexistencia con GALGO

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Stack tecnológico elegido



CRM Core	Omnicanal Interno	Canal Externo	Capa de Integración	Seguridad & Cumplimiento	Inteligencia
Core transaccional Modelo **cliente** Modelo **multipóliza** Gestión **oportunidad** **Retención** cliente-level	**Consola** única agente Contexto cliente **360** Persistencia y **trazabilidad omnicanal** **Identificación** automática	Portal seguro para partners Gestión s / referrals Consulta estado oportunidad Subida documentación Interacción controlada con CRM	**Orquestación** CRM Core Galgo Datalake **Desacoplamiento** progresivo del legacy	**Identity** Federation Gestión de **accesos externos** Cumplimiento requisitos **regulatorios** **GDPR**	Recomendación de **acciones** Automatización de **tareas** **Resúmenes** automáticos **Asistente** al agente
CRM como cerebro operativo y modelo de datos maestro relacional	**Front único para Contact Center**	**Acceso controlado a capacidades CRM sin exponer el core**	**Exposición controlada de servicios**	**DORA-ready y auditoría trazable end-to-end**	**IA embebida en el flujo operativo**

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: FSC vs Sales&Service



Recomendación NTT	Que aporta FSC	Arquitectura preparada para el futuro
Evitamos sobredimensionar el CRM sin perder capacidad de evolución	**FSC aporta adicionalmente frente a Sales & Service**	**El negocio está en constante evolución**
✓ CRM como capa de relación, no como core ✓ Galgo mantiene lógica aseguradora ✓ Eliminamos duplicidades → ↓ coste licencias ✓ Inversión en experiencia, eficiencia e IA	✓ El CRM asume lógica aseguradora (pricing, riesgo, cartera) ✓ Se centraliza el modelo financiero/patrimonial en CRM ✓ Se requieren procesos sectoriales end-to-end dentro del CRM	Si el día de mañana queremos mover el core asegurador al CRM, ya dispondremos de: ✓ Modelo desacoplado (API + servicios) ✓ Datos extensibles Podríamos incorporar FSC sin rehacer

Sustituimos capacidades clave de FSC mediante aceleradores propios	KPIs (Impacto Esperado)		
Nuestros aceleradores cubren el valor de FSC en este alcance sin incorporar la complejidad completa de la vertical	**FSC puede mejorar adicionalmente estos KPIs en escenarios donde el CRM asume mayor lógica sectorial**		
Modelo cliente/multipóliza extendido	**KPI**	**Sales&Service**	**FSC (potencial adicional futuro)**
fX acelerada sin OmniStudio (↓ complejidad)	↑ Conversión	+5% a +10%	+2% a +5% adicional
IA aplicada a operación	↓ Time-to-Market	-20% a -30%	similar
Nos inspiramos en las verticales como FSC pero lo implementamos de forma selectiva	↓ AHT / TMO	-10% a -20%	-5% adicional
	↑ Prima Media	+5% a +10%	+2% a +5% adicional

Conclusión
Sales & Service maximiza valor para el alcance actual, optimizando coste y complejidad, mientras mantenemos abierta la evolución a FSC cuando el negocio lo requiera

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Comparativa de Omnistudio y resto de capacidades de la plataforma




Opción	Cuándo la recomendamos	Fortalezas	Limitaciones / Consideraciones	Licencia adicional	% soporte generación con aceleradores NTT DATA
Dynamic Forms	Formularios simples sobre un único objeto en páginas Lightning	Muy bajo esfuerzo, estándar, buen rendimiento	Poco flexible para lógica compleja, navegación. Se facilita reutilización con nuestros aceleradores	No	**100%**
Screen Flow	Wizards y procesos multi-step sin UX muy exigente	Low-code, navegación nativa, integración declarativa, buen equilibrio	Menor control visual y de comportamiento que LWC	No	**100%**
Screen Flow + LWC	Cuando se necesita combinar navegación declarativa con UX/control avanzado	Mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y mantenibilidad	Requiere gobierno de componentes reutilizables (facilitado con nuestro acelerador)	No	**100%**
Omnistudio	Casos con experiencia guiada avanzada, jerarquías complejas, externalización y branding más sofisticado	FlexCards, Omniscripts, Data Mapper, buena modularidad declarativa	Overhead de framework, packaging/deployment más específico, no ideal para todos los casos (Validar rendimiento en procesos pesados de intercambio y presentación de datos)	**Sí** (Industries)	**65%** (el acelerador genera parcialmente el esqueleto y guia en la construcción. Considera base construida , facilitando reutilización, gobierno y mantenimiento)
LWC	Casos con alta exigencia de rendimiento, flexibilidad, test automatizado y control técnico	Máxima robustez, reutilización, testabilidad, control UX, mejor gobierno a largo plazo	Mayor esfuerzo inicial y necesidad de disciplina técnica. Estas limitaciones quedan reducidas con el uso de nuestros aceleradores.	No	**100%**

Enfoque NTT Data

NTT Data sigue un enfoque en la elaboración de formularios y procesos guiados alineado con **las best practices de Salesforce**: para formularios y procesos guiados priorizamos Flow o una combinación de Flow + LWC, maximizando configuración, extensibilidad y alineamiento con el estándar. Omnistudio es una opción válida cuando aporta valor por experiencia guiada, diseño avanzado o exposición externa, pero no es la mejor alternativa para todos los casos: introduce una capa de framework adicional y requiere gobierno centralizado para promover reutilización, rendimiento y mantenibilidad.

Los aceleradores NTT DATA consideran las best practices y framework disponibles de producto para generar la mayor solución posible basada en dynamics forms, triggered o screen flows, LWC y omnistudio en caso de estar disponible con la licencia.

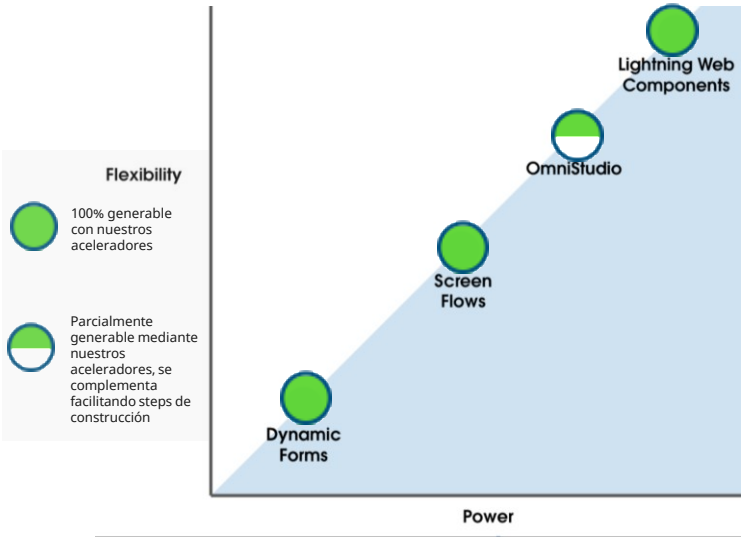

© 2026 NTT DATA, Inc.

Aceleradores




A parte de la suite de herramientas corporativas de las que ya disponemos, en NTT DATA trabajamos en construir **aceleradores específicos en algunas plataformas y tecnologías**, como es el caso de Salesforce, que nos permitan aportar valor a nuestros clientes en todo el ciclo de vida. Los aceleradores se entregan como activos reutilizables, con compromiso de mantenimiento, actualización continua y disponibilidad de los prompts y ficheros de contexto y best practices utilidados para LDA tras la finalización del proyecto.

axet

ChatGPT

Generación Automática de Prototipos Navegables y Traducción a Salesforce

Propósito	Generación automática y gobernada de prototipos navegables con look&feel Salesforce a partir de historias de usuario, asegurando alineación directa con componentes Salesforce (Flows, LWC, objetos).
Qué Acelera	• **Validación** UX temprana • Reducción **retrabajo** funcional • **Traducción** directa a lógica Salesforce • **Aceleración** Inception / Blueprint • **Reducción del riesgo** de redefinición funcional en UAT
Qué Incluye	• **Motor** de generación LWC y Flows • **Librerías** de componentes aseguradores • **Conversión** automática historias → estructura técnica • **Validación** de coherencia funcional.
Nuestro Framework	• **Arquitectura:** Orquestación inteligente de acciones. • **Capa Semántica:** Traducción dinámica de lenguaje funcional a objetos y flows. • **Automatización:** Generación de componentes reutilizables. • **Gobernanza:** Versionado y control de cambios.



-25% Tiempo de diseño de UX

-50% Bloqueos por desalineación UX–negocio

- Reducción estructural del **retrabajo** en UAT
- Eliminación de **bloqueos** por desalineación funcional
- **Aceleración** de fases fundacionales (Inception / Blueprint)

Generación de Casos de Uso IA Adaptados al Negocio

Propósito	Identificación automática y priorización de casos de uso IA alineados con métricas reales de negocio (conversión, TMO, churn, eficiencia)
Qué Acelera	• **Detección** de oportunidades IA en procesos comerciales y operativos • **Simulación** de impacto económico • **Priorización** por ROI y complejidad • Integración con modelo operativo CRM
Qué Incluye	• **Catálogo** de casos sector asegurador • **Matriz** impacto vs complejidad • **Framework** de scoring dinámico • **Templates** Agentforce integrables
Nuestro Framework	• **Capa Semántica:** Traduce KPIs y métricas en lógica de recomendación. • **Automatización:** Activa casos como carrito asistido, retención contextual o resumen automático. • **Gobernanza:** Trazabilidad del razonamiento y control de consumo.




-20% Tiempo de definición de casos de uso IA

5-10% Eficiencia operativa

- Identificación temprana de **quick wins**
- Mayor alineación **negocio–tecnología**
- **Reducción riesgo** de "IA cosmética"

Generación Automática de Modelo Extendido

Propósito	Generación automática y gobernada del modelo de datos extendido a partir del lenguaje de negocio, asegurando coherencia estructural desde el Blueprint.
Qué Acelera	• **Traducción** de procesos TO-BE a modelo de datos • Identificación de **entidades, relaciones y atributos** • Definición de **external IDs** • **Reducción de inconsistencias** estructurales entre CRM, Core y Data Lake
Qué Incluye	• **Motor agéntico** de generación asistida del modelo extendido • **Librerías** sector asegurador • **Patrones** multipóliza y oportunidad multiproducto • **Validaciones** automáticas de inconsistencias
Nuestro Framework	• **Arquitectura**: Modelo escalable optimizado para entornos productivos. • **Capa Semántica**: Traducción dinámica del lenguaje de negocio a estructuras de datos complejas. • **Gobernanza**: Control de versiones del modelo y trazabilidad de decisiones.



-30% Tiempo de diseño de modelo

-50% Tiempo de construcción de modelo

- Reducción **retrabajo** estructural
- Mejora **coherencia** CRM–Core
- Disminución **riesgo** técnico en fases iniciales

Acelerador FÉNIX

Fénix es un acelerador que permite la generación automática de documentación técnica a partir de servicios MuleSoft existentes.

Problema habitual

- Documentación desactualizada o inexistente.
- Dependencia del desarrollador original.
- Alto esfuerzo manual en auditorías y mantenimiento.
- Riesgo en evolutivos y onboarding de nuevos equipos.


Solución Fénix

- Analiza automáticamente el servicio MuleSoft.
- Genera diagrama de flujo, secuencia técnica e Inventario de componentes.
- Genera documentación estructurada y reutilizable en minutos.

Impacto en el proyecto LDA

- Reducción significativa del tiempo de documentación técnica.
- Mejora en la trazabilidad y gobierno de integraciones.
- Aceleración en análisis de impacto ante cambios.
- Menor riesgo operativo y mayor mantenibilidad.





Consideraciones: ** Ver en Anexo Aceleradores el detalle de cada acelerador.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Licenciamiento necesario



Modelo de licenciamiento **alineado a roles reales y cobertura funcional del alcance**:

Tipo de usuario	Volumetría estimada	Licencia propuesta	Rol en el sistema	Qué hacen en el CRM
Agentes Contact Center (internos y externos)	1.600	Service Cloud (con SCV)	Operación comercial y atención	• Gestión de clientes 360° • Cotización y seguimiento oportunidades • Atención omnicanal (voz, chat, email) • Gestión del ciclo de vida del cliente • Upselling / Cross-selling • Uso asistente IA
Usuarios operativos Back Office	200	Licencia alineada a rol funcional (Sales / Service)	Soporte operativo y aprobaciones	• Validación y aprobación de cotizaciones • Gestión de excepciones • Procesos de retención y cancelación • Control de documentación • Análisis de cartera y seguimiento producción
Partners / usuarios externos	100	Experience Cloud	Canal externo controlado	• Alta de leads / referrals • Consulta estado oportunidad • Subida documentación • Interacción controlada vía APIs • Acceso limitado a información asignada
Usuarios consultivos / managers	100	Sales Cloud (o licencia light/Platform)	Supervisión y análisis	• Consulta ficha cliente • Reporting y dashboards • Seguimiento conversión y cartera • Análisis KPIs comerciales
Administradores / CoE CRM (Desarrollo y mantenimiento)	10–20	Licencia full + permisos admin	Gobierno y evolución plataforma	• Configuración modelo datos • Gestión roles y perfiles • Automatizaciones y flows • Gestión releases y despliegues

Genesys permite derivar a SF un % de interacciones entrantes o terminaciones del llamante, de esta forma podemos ir derivando tráfico a SF acorde al volumen del colectivo que entra

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Licenciamiento necesario



Modelo de licenciamiento **técnico necesario**:

Licencia plataforma	Volumetría estimada	Licencia propuesta	Rol en el sistema	Qué hacen en el CRM
Capacidades IA	Pdte. acotar durante Discovery *1	IA (Agentforce / Einstein)	• Operación comercial y atención • Soporte comercial	• Además de sus tareas base, emplean componentes y asistentes IA en el CRM como asistencia, recomendaciones y argumentarios, y automatizaciones
Plataforma Mulesoft	N/A	A definir por LDA (vCores, etc.)	Api Manager y Orquestación de comunicaciones	• Orquesta todas las comunicaciones entre Salesforce, Galgo y sistemas externos • Transformación de protocolos entre sistemas (DB2, REST/CIS, Kafka, SFTP,etc.) • Gestión de errores y reintentos • Gobernanza, versionado, políticas, SLA, throttling.
Salesforce Shield	N/A	Bundle (Platform encryption, Event monitoring & Field Audit trail	Seguridad avanzada y cumplimiento	• Protección de datos sensibles mediante cifrado en reposo (Platform Encryption), auditoría avanzada de accesos y trazabilidad de cambios en datos críticos. • Compliance DORA y RGPD
Data Masking	N/A	Licencia Plataforma	Protección de datos en entorno no productivo	• Enmascaramiento de datos sensibles cuando se copian entornos productivos a sandbox para desarrollo o pruebas.
Privacy Center	N/A	Licencia Plataforma	Gestión de privacidad, derechos y preferencias	• RGPD compliance
Entornos de Salesforce	N/A	Entornos adicionales a determinar según edición	Soporte ALM	• Implantación CRM - Ciclo de vida del software • Implantación CRM - Gestión del cambio

***1 el dimensionamiento óptimo de créditos IA** depende de volumetrías reales. Se recomienda calcular el consumo de en fase de discovery y gestionar con Salesforce paquetes de FlexCredits flexibles que permitan su uso a lo largo de toda la vida del contrato, pudiendo ser adaptado según las necesidades reales del negocio y evolución de la solución. Se incluye hoja de Anexo con el enfoque de IA planteado.*


2 Dimensionamiento de integraciones (llamadas y eventos) : Las volumetrías reales de integraciones (APIs y eventos) se validarán en fase de Inception/Discovery a partir de datos reales de uso y concurrencia. Se incluyen estimaciones iniciales y patrones de integración en el anexo técnico. La arquitectura propuesta está dimensionada para soportar picos de carga (TPS) y escalado progresivo por ola.*

3 En fase de Discovery se definirá la edición de salesforce que mejor se adapte a las necesidades de LDA (Enterprise / Unlimited , etc.) así como las features necesarias a adquirir como add-on que no estén incluidas en la edición. (e.g. entornos adicionales, add-on IA, PE, etc.)

La arquitectura queda preparada para incorporar FSC si el negocio evoluciona.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Sistemas Clave

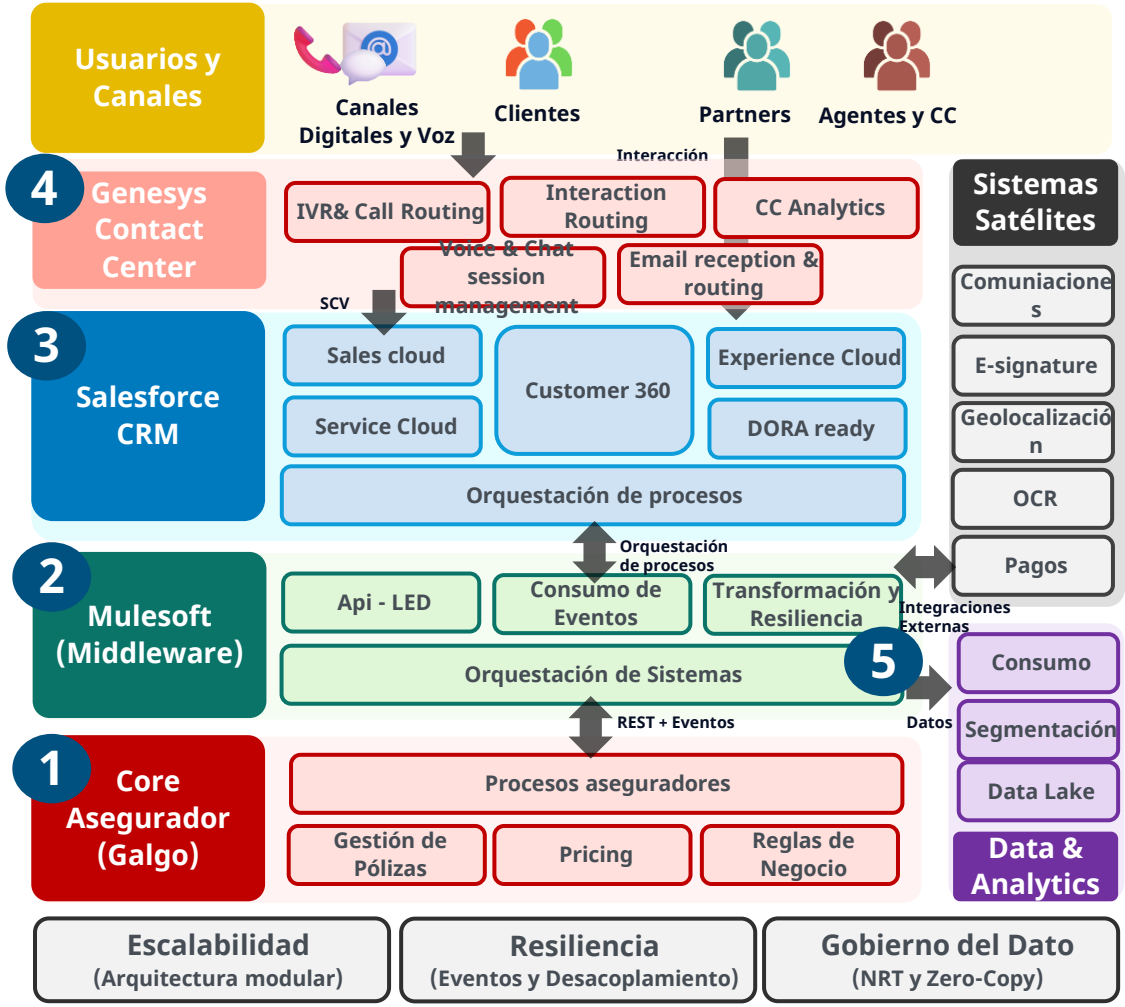

Aspectos clave de la Arquitectura

1 Galgo como maestro Core transaccional

Sistema de referencia para pólizas, pricing y reglas de negocio.
El core ejecuta las decisiones aseguradoras críticas y mantiene la lógica transaccional del negocio.

2 Middleware - Capa de Integración

Integración desacoplada entre CRM, core y sistemas satélites
El middleware gestiona publicación de eventos, transformación y resiliencia entre plataformas.
Arquitectura híbrida basada en APIs y eventos:

Galgo → CRM: eventos (CDC/Kafka) near real-time
CRM → Galgo: APIs síncronas (API Manager) real-time con opción a uso de Pub/Sub API (PE) para sincronizar cambios

3 CRM como Maestro de Relación y Oportunidad

Salesforce gestiona la relación con clientes, el proceso comercial y la atención. Actúa como capa de interacción y orquestación de procesos sobre el core asegurador.

4 Genesys CC integrado en el CRM mediante conector SCV

Genesys gestiona la atención y el enrutamiento de interacciones de voz y canales digitales (chat, mensajería). Integración nativa mediante conector Service Cloud Voice (SCV). En el caso del **chat**, las conversaciones se gestionan sobre objetos estándar de Salesforce (Messaging Session) gestionado por el conector, donde se persiste el histórico completo de interacción. Sobre este modelo, se habilitan de forma nativa capacidades de IA del CRM como generación automática de resúmenes, sugerencias de respuesta basadas en Knowledge y asistencia en tiempo real al agente.


5 Sistemas satélite y Data & Analytics

Enfoque desacoplado con apoyo en middleware para la mayoría de sistemas externos.
La integración con **Data & Analytics** se definirá en Discovery, manteniendo **inicialmente** el **mismo modelo de publicación de datos** que actualmente utiliza **Galgo** hacia el **Data Lake.**

Consideraciones: ** Ver en Anexo Arquitectura Técnica: Integración con el CC el detalle de la integración con el CC.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de la solución: Principios

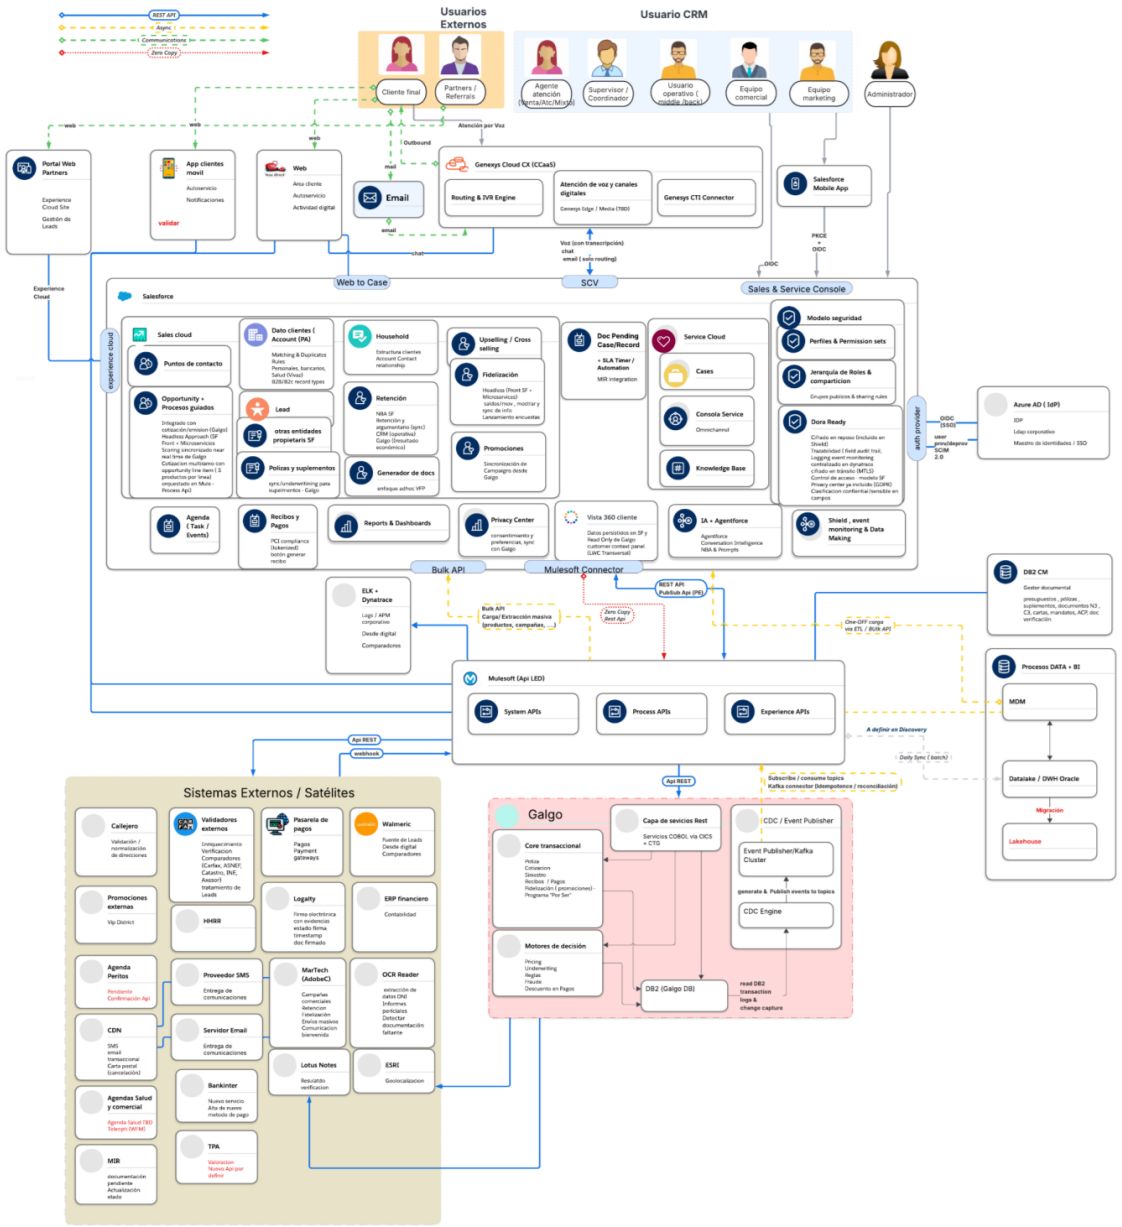

Desacoplamiento progresivo (convivencia)

Galgo evoluciona como *core transaccional*; el CRM se introduce por olas

Mainframe como sistema maestro

Las entidades core (póliza, recibos, pagos, riesgo, etc.) mantienen maestro en Mainframe.

Resiliencia by design

Idempotencia, reintentos, DLQ, trazabilidad end-to-end y reconciliación de datos con apoyo en middleware.

Cumplimiento regulatorio y seguridad embebidos

Security by design (autenticación, cifrado, auditoría) y alineación con DORA desde la definición.

CRM como System of Engagement

Salesforce/concentra la experiencia: 360º, actividad, agenda, casos/oportunidades e interacciónes

Zero copy y minimización de deplicados

Arquitectura orientada a minimizar duplicados priorizando consulta de datos en origen.

Modelo de Identidad, Autenticación y Autorización End-to-End

Se propone un Modelo federado con Entra ID (SSO). OIDC/SAML 2.0 para identidad de usuarios , OAuth2/JWT para autorización entre Salesforce y MuleSoft. APIs securizadas hacia Galgo (mTLS/OAuth) gestionado por Api Manager de Mulesoft. Se seguirá modelo RBAC en CRM (en base a perfiles y permission sets) , políticas en middleware, trazabilidad end-to-end y cumplimiento regulatorio.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica: Entornos



La siguiente tabla describe el modelo de entornos propuesto para Salesforce y los sistemas integrados, alineando los distintos niveles de desarrollo, pruebas y producción entre CRM, capa de integración y sistemas core, garantizando un ciclo de vida controlado y pruebas end-to-end completas. Se ha introducido un nivel de Formación que estará disponible durante toda la vida del Proyecto y la solución.

Nivel	Salesforce (NTT/LDA)	MuleSoft (NTT/LDA)	Genesys Cloud (LDA – otro provoeedor)	Galgo / Core (LDA)	Otros
Desarrollo	**Developer / Developer Pro Sandboxes** (Dev1..DevN) (*1)	Mock APIs / Sandboxes iPaaS	DEV	DEV/INT (según disponibilidad LDA)	DEV / Sandbox o **Mocks**
INT/QA	**Partial Copy Sandbox**	INT	QA (segregado por datos)	INT	INT/QA o **Mocks**
Certificación (UAT)	**Full Copy Sandbox**	CERT/UAT	UAT (con datos controlados)	UAT/CERT	UAT/CERT o **Mocks**
Preproducción	**Full Copy Sandbox (Staging)**	PRE	PRE	PRE	PRE
Producción	**Production Org**	PROD	PROD	PROD	PROD
Training	**Full / Partial Copy dedicado a formación** (*1)	Mock APIs / INT	QA (segregado)	INT/UAT (si procede)	N/A
Hotfix	**Hotfix Sandbox (Developer Pro)**	PRE	PRE	PRE	PRE

RBAC y PoLP

- **Principio de Mínimo Privilegio:** Cada usuario accede exclusivamente a lo necesario para su rol
- **Segregación de Funciones (SoD):** Separación absoluta entre roles de Desarrollo, Despliegue y Operación.
- **Control PROD:** Acceso restringido a entornos productivos; prohibido el acceso directo para perfiles de desarrollo, salvo excepciones autorizadas

Autenticación y Seguridad API

- **Identificación Segura:** Implementación obligatoria de **SSO + MFA** para el acceso a cualquier entorno.
- **Control acceso centralizado:** Accesos de administrador centralizados y bajo justificación de negocio con trazabilidad total.
- **API:** Políticas robustas de seguridad gestionadas en API Manager (OAuth, IP Whitelisting, Rate Limiting).


*1. Entornos auxiliares Salesforce (DEV y TRAINING).
Los entornos Dev se consideran auxiliares/temporales y pueden quedar fuera del circuito estándar de CI/CD (según el modelo acordado). El entorno Training se actualiza por necesidades de formación y no necesariamente en cada release.


*2. Entornos de terceros y sistemas LDA (Core/Galgo, ECM, DWH, proveedores).
Si en fase de diseño se identifica que algún sistema/proveedor no dispone de la estructura de entornos propuesta (DEV/INT/UAT/PRE), se aplicará una estrategia de contrato de interfaz (API/Events) y desarrollo en paralelo mediante Mocks/APIs simuladas en MuleSoft, garantizando pruebas E2E progresivas cuando el entorno real esté disponible.

*3 Se incluye un anexo con el alcance y tareas de integración continúa contempladas dentro del alcance. Ver anexo Integración continua y Arquitectura de Integración: Alcance general propuesto.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de integración: Principios

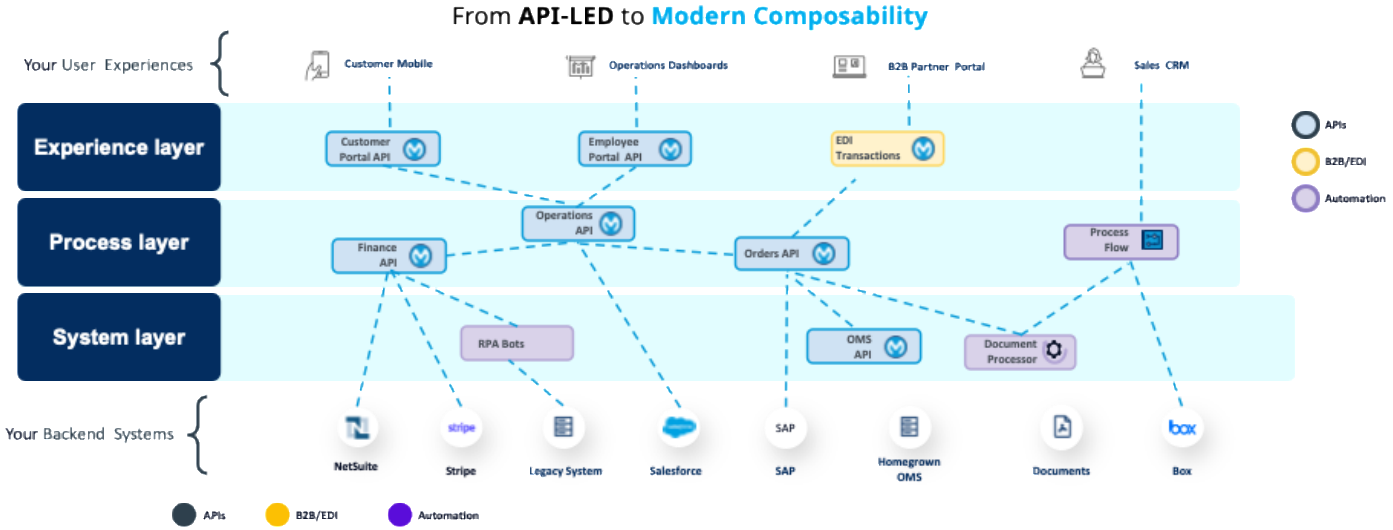

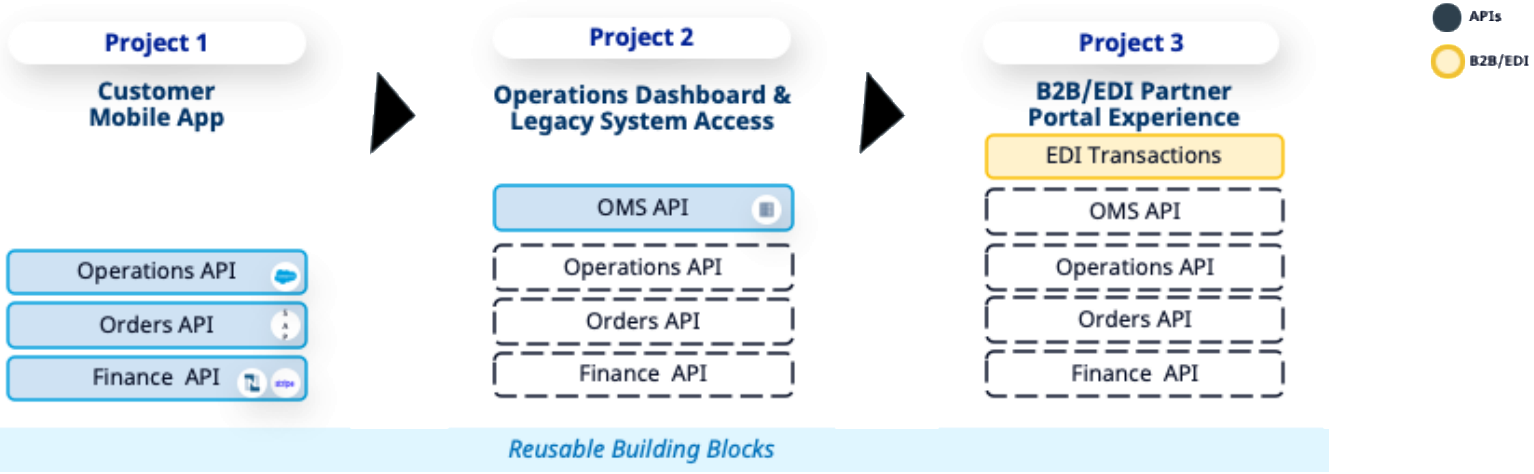

Principios de Integración

Modelo de integración desacoplado

Eliminación de integraciones punto a punto y centralización en API Manager.

Sincronización near real-time

Eventos CDC + APIs síncronas con control de latencia y consistencia.

Mecanismos formales de control

Gestión estructurada de errores, reintentos automáticos y reconciliación CRM–Galgo.

Gobierno técnico transversal

Comité Design Authority validando estándares, contratos y evolución arquitectónica.

Seguridad y trazabilidad integradas

Registro auditable, control de accesos y cumplimiento RGPD/DORA.

Escalabilidad garantizada

Modelo cloud preparado para soportar **crecimiento en usuarios, procesos y volumen** sin rediseños


Observabilidad end-to-end

Trace-ID distribuido, monitorización activa y métricas p95 bajo SLA.

** **Consideraciones:** * Ver en Anexo Arquitectura Técnica: Data Flow & Mastery y en Anexo Arquitectura de Integración: Interfaces el listado completo de interfaces y de entidades a sincronizar con galgo, incluyendo sentido, patrón, fase de construcción, conectores/middleware, datos y frecuencia.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Coexistencia con Galgo: Principios

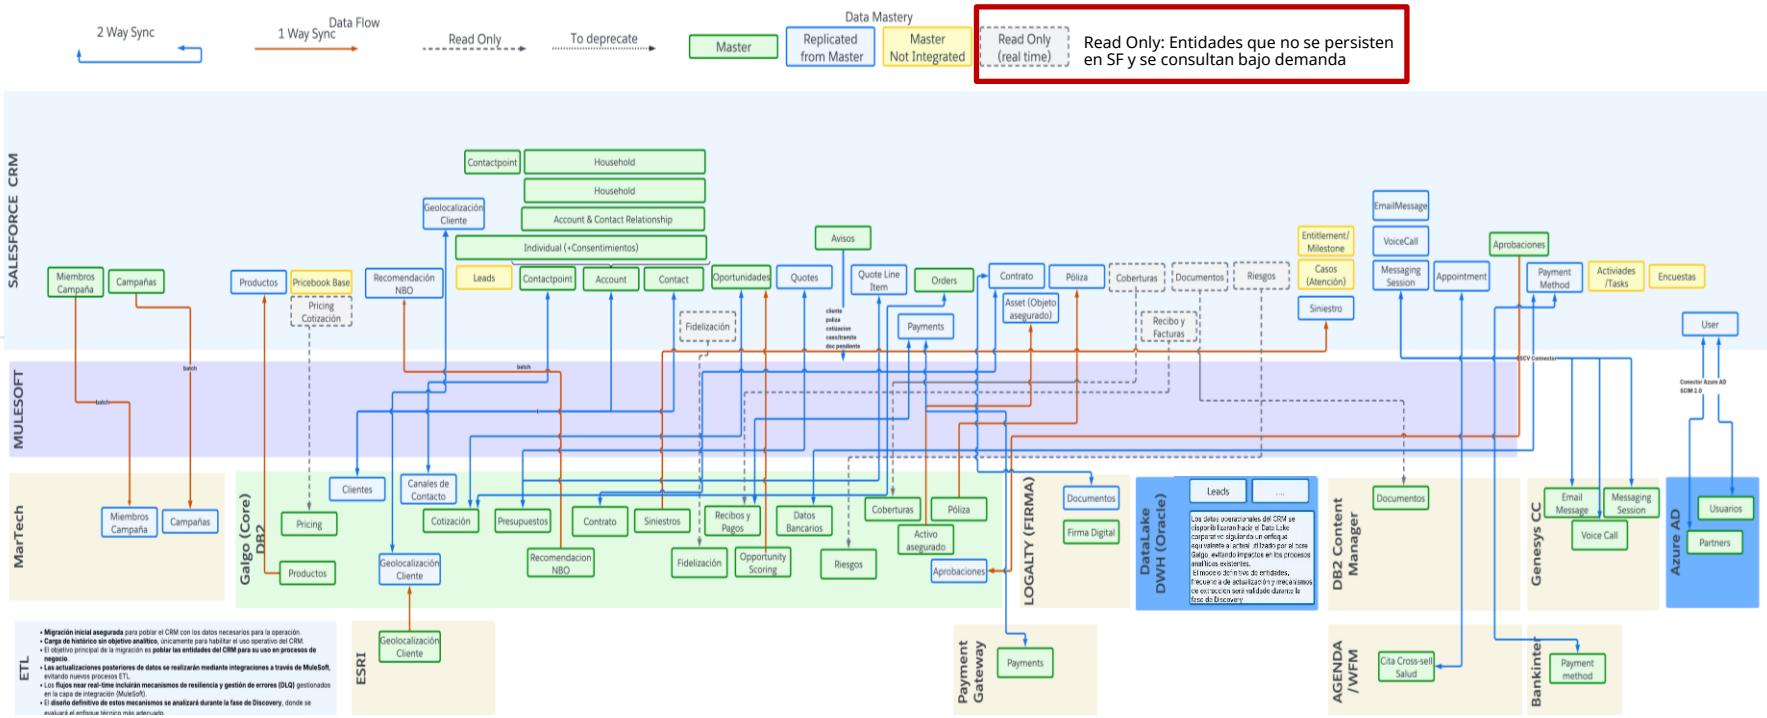

Convivencia progresiva

La implantación del CRM se realiza **por oleadas funcionales**, **evitando** un enfoque ***big bang*** y garantizando **continuidad operativa con Galgo**.

Sincronización y Consistencia

Durante la convivencia se habilitan **sincronizaciones controladas y lectura en origen** para asegurar consistencia entre plataformas.

Modelo DataFlow & Mastery

El modelo define para cada **entidad** su **sistema maestro**, **replicaciones necesarias**, **si requiere carga inicial** y **flujos de integración** entre CRM, core y sistemas satélite.

Potencial uso de Data cloud (Data 360)

Data Cloud no ha sido considerado en el alcance actual, al no identificarse como requisito explícito y partiendo de la asunción de que LDA dispone de un maestro de cliente (MDM) consolidado y de calidad. No obstante, no se cierra su adopción: en caso de que durante la fase de discovery se detecten limitaciones en estructuración de datos de cliente , recomendamos su evaluación, ya que puede aportar valor en la **resolución de identidad** y en la **transición de una visión centrada en póliza a una visión 360 de cliente**. Adicionalmente, en este proyecto si se asume un **uso implícito de Data Cloud y Flexcredits** asociado a **capacidades de Agentforce** (trust layer, monitorización y búsqueda semántica) con bajo consumo de créditos. En caso de adopción, su integración con el ecosistema se articularía mediante MuleSoft.

Escenario Final

CRM como sistema maestro de relación y orquestación comercial

Entidades Maestro CRM

Cliente 360	Multiproducto	
Oportunidad	Interacciones	Aprobaciones
Cotización Comercial	Casos	NBA
Actividades	Reclamaciones	Contactos

Golden record del cliente MDM

Galgo como Core Asegurador


Entidades Maestro Galgo

Póliza	Pagos	Fidelización
Suplementos	Datos Bancarios	Producto
Siniestros	Riesgos	NBO
Cliente Contractual	Pricing	Recibos


© 2026 NTT DATA, Inc.

Coexistencia con Galgo: Visión Integración


Escenario 1 — Salesforce ↔ Galgo (Síncrono, tiempo real)

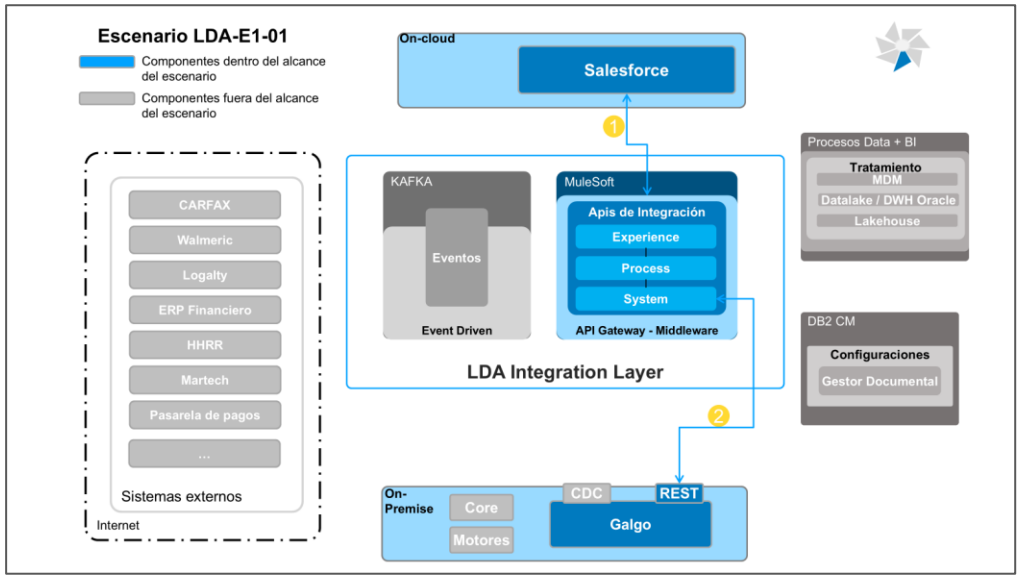


Escenario 2 — Salesforce ↔ Proveedores / Partners (Síncrono)

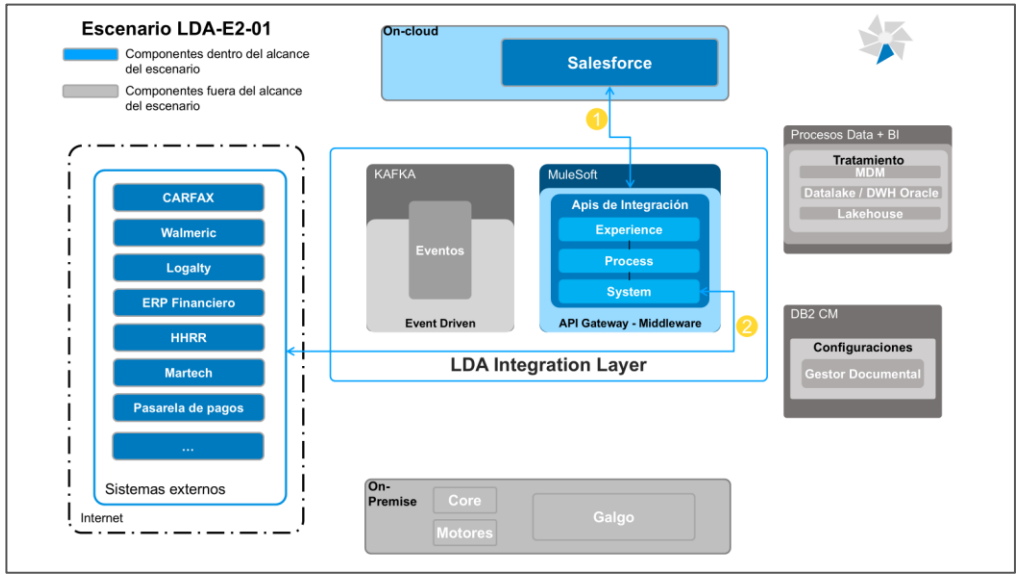

Escenario 3 — Salesforce → Gestor documental (Periódico / Bajo demanda)

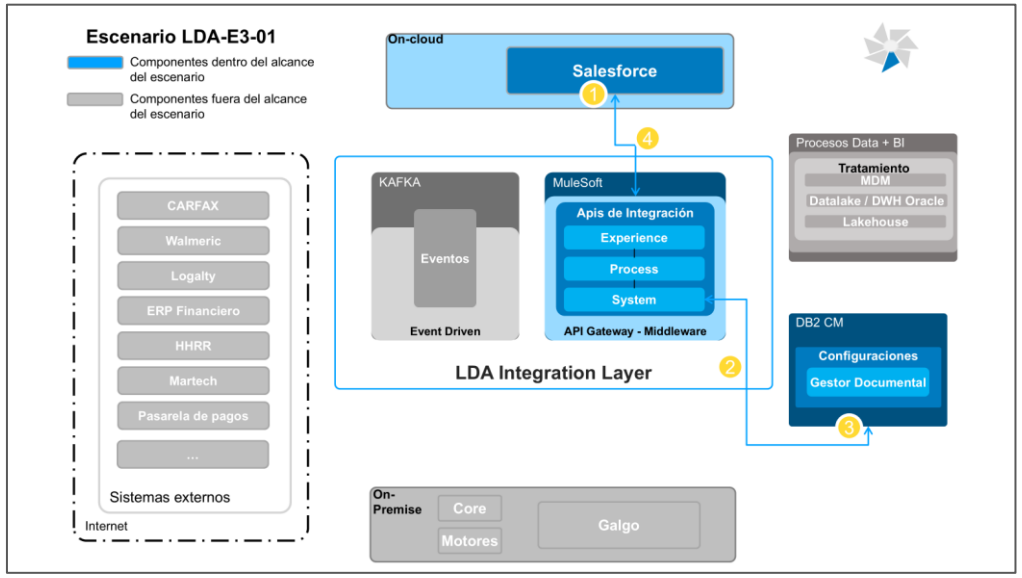

Escenario 4 — Galgo → Kafka → MuleSoft → Salesforce (Asíncrono / Event-Driven)

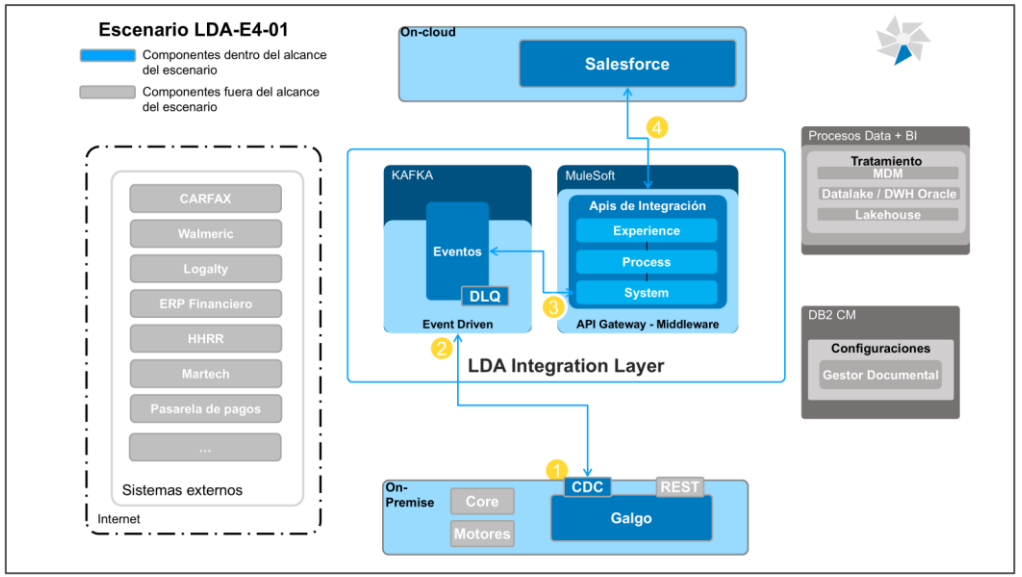

© 2026 NTT DATA, Inc.

Coexistencia con Galgo: Carga inicial



ENFOQUE DE LA CARGA INICIAL

Un proceso controlado para asegurar calidad y estabilidad desde el arranque del CRM

PERÍMETRO DE DATOS

Clientes: **3.6M**
Pólizas: **6M**
Cotizaciones: **7M**
Formalizaciones 2025: **1M+**
Renovaciones vigentes: **4M**
Verificaciones: **2.7M**
Retenciones: **2.2M**
Fidelización: **1.2M**
Leads: **1.7M**
Recibos y Pagos: **58.5M***

ENTENDER DATOS

Sistemas origen

Análisis de datos en GALGO

Identificación de dominios y entidades a migrar

PREPARAR CARGA

Modelo datos

Modelo de transformación de datos

Criterios de calidad y validación

DISEÑAR MIGRACIÓN

Procesos ETL

Desarrollo de procesos de migración

Controles de calidad y gestión de errores

CARGA INICIAL

Go-Live

Ejecución de la carga inicial en CRM

Validación y reconciliación de datos

Consideraciones: ** La carga inicial se limita a los dominios estrictamente necesarios para la operación del CRM, garantizando calidad, validación y coherencia antes del Go-Live.*
** Ver en Anexo Migración de datos el detalle del procedimiento, herramientas, validación de calidad y rollback plan.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cobertura de requerimientos

Proceso	Descripción	Enfoque técnico	Estándar	Custom *Flows, config.*	A medida *LWC, APEX, integraciones*
Canales Digitales	Integración Genesys + CRM (voz, chat, email), screen-pop, registro interacciones, routing inteligente	Integración CTI + omnichannel + eventos + APIs	60%	25%	15%
Dashboards	KPIs operativos y comerciales (agente + supervisor)	Reporting híbrido: Genesys (CC) + Salesforce (negocio)	70%	20%	5%
Ficha Cliente	Vista unificada cliente + pólizas + interacciones	Data model estándar (Account/Person Account) + custom + integraciones	65%	15%	20%
Cotización	Proceso guiado multiproducto con pricing desde core	Screen Flows + objetos estándar + APIs	45%	30%	25%
Carrito	Configuración multiproducto sin CPQ	LWC + Flows + modelo ligero	40%	25%	35%
Valoración Salud	Orquestación proceso externo médico	Objeto custom + integración	55%	30%	15%
Verificación	Validaciones post-venta (citas, fotos, etc.)	Flows + integraciones externas	30%	35%	35%
Documentación	Gestión documental + Estados póliza	Objeto custom + integraciones	50%	35%	15%
Up/Cross-selling	Recomendaciones + NBO + IA	NBO/NBA + Agentforce	60%	25%	15%
Suplementos	Modificación pólizas	Flows + objeto custom + integración core	45%	30%	25%
Recibos y pagos	Gestión recibos + pagos vía pasarela	Integración APIs + mínima lógica en CRM	40%	30%	30%
Retención	Gestión estrategias retención	Objeto custom + reglas + APIs	40%	30%	30%
Recobro	Gestión impagos y recuperación	Flows + integración pagos + notificaciones	50%	30%	20%
Cancelación	Baja póliza + PNC	Case + Flows + lógica custom	40%	30%	30%
Fidelización	Programas + promociones + impacto en procesos	Integración + NBO + visualización	40%	30%	30%
Portal	Portal partners (leads, oportunidades, approvals)	Experience Cloud estándar + APIs	80%	15%	5%
Quejas / Reclamaciones	Quejas multicanal + trazabilidad + comunicación al cliente y resolución con posible impacto económico	Service (case) + Flows + APEX + integraciones	55%	25%	20%

***Consideraciones:**

El proceso de Quejas y Reclamaciones se detalla en la slide siguiente.

** Ver en Anexos Cobertura de requisitos donde se incluye detalle sobre la cobertura de procesos.*

En concreto para ver más información del Portal ir al Anexo Detalle fichas requisitos: Portal.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Quejas y Reclamaciones

Se añade la propuesta de cobertura del flujo de Quejas y Reclamaciones según los requerimientos recibidos.

Descripción de los subprocesos


- El proceso de gestión de **quejas e insatisfacciones multicanal**, iniciado desde distintos puntos de contacto (email, web, teléfono, organismos externos), permitirá registrar, clasificar y gestionar incidencias tanto de **clientes, no clientes o terceros perjudicados**.
- El proceso contempla la **asociación a pólizas, expedientes o cotizaciones**, la gestión de casos en paralelo, la consolidación o reapertura de incidencias, así como la **trazabilidad completa del ciclo de vida** desde su creación hasta su resolución.
- Incluye capacidades de **clasificación (queja / insatisfacción), asignación automática, gestión por estados, derivaciones entre áreas**, así como la comunicación al cliente y, en su caso, la **gestión de compensaciones económicas**.
- Contemplará enlaces a htas. LDA como gestión de quejas con BPM, gestor documental, Galgo, proveedores externos.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- La solución se construirá sobre el objeto estándar **Case como entidad principal**, extendido mediante objetos custom (afectados, pagos, por ejemplo) y configuraciones específicas para soportar la complejidad del proceso.
- Se plantea apoyar la gestión de estados en las configuraciones de etapas de casos y en donde sea necesario extender usando **Screen flows y record-triggered flows para gestión de estados y automatismos**.
- El estándar de Service Cloud cubriría **las reaperturas de caso, asignación de casos a usuarios o grupos** y otras reglas de negocio. Se utilizará APEX para codificar aquellas validaciones que sea necesario gestionar a medida, como por ej reglas de deduplicados más complejas de lo que soporta el estándar.
- Se plantea el uso de las páginas estándar de Salesforce para la **gestión guiada y formularios dinámicos,** añadiendo Lightning web components en determinados puntos para facilitar requisitos visuales que sean imprescindibles para negocio.
- Se contemplan integraciones entrantes para la **recepción y alta de casos (OCU / OMIC / sede electrónica),** y salientes como la **sincronización a demanda con la bbdd de Perjudicados, Gestor documental, pasarela de pagos, y herramienta de comunicaciones CDN** para el envío de notificaciones a cliente, permitiendo además al usuario seleccionar el canal de envío.

Premisas

- Salesforce centralizará la recepción y gestión de quejas y reclamaciones.
- Galgo se mantiene como sistema maestro para pólizas, estados contractuales y lógica de negocio.
- La documentación se almacenará en el gestor documental corporativo, manteniendo Salesforce la referencia y trazabilidad
- La gestión de pagos y compensaciones se ejecutará en sistemas externos, siendo Salesforce responsable de guardar la trazabilidad y completitud de los mismos.

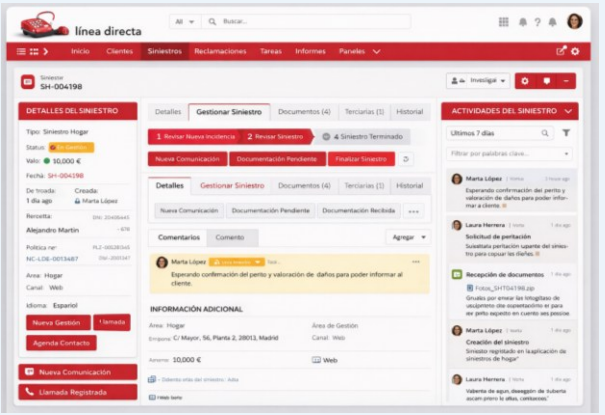

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cobertura de requerimientos

Premisas comunes a la cobertura de requerimientos propuesta:

Arquitectura / Integración y lógica negocio

- **Core LDA (Galgo)** se considera **maestro del dato** en casi todos los procesos, así como responsable de la realización de **cálculos complejos** (pricing, riesgo, recobro, fidelización…) cuya lógica reside en LDA
- En **Salesforce** se plantea la **orquestación + UI + lógica ligera** a través de flows y validaciones
- La **integración intensiva** se realiza vía **APIs + eventos (near real-time)** si bien se cuenta con datos cargados en el CRM por migración inicial o batch
- Se contempla **integraciones con múltiples sistemas**: Genesys, pagos, documental, fidelización, etc

Documentación y comunicaciones

- **Documentos contractuales**: Se contempla que sean generados en el core
- **Comunicaciones**: Se consideran a través de CDN / sistemas externos
- Salesforce mantiene el **tracking y orquestación** de los procesos asociados

UX / Operación

- Uso intensivo de:
  - **Screen Flows**
  - **LWC** (componentes custom)
- Foco en **agente de Contact Center**
- **Omnicanalidad integrada con CTI**

General

- **Se considerarán incluidas en el alcance** todas las actividades de **configuración (setup)** necesarias para la puesta en marcha de la plataforma, incluyendo, entre otras, la creación y gestión de usuarios, asignación de licencias, definición de roles, perfiles y permisos, así como cualquier otra configuración base requerida para garantizar el correcto funcionamiento del CRM.

IA

- En contexto del pliego, se ha priorizado el uso de las siguientes capacidades IA, orientado a optimización del contact center, automatización de interacciones, y activación comercial inteligente :
  - NBO/NBA estándar con opción de conectar la herramienta a motor de recomendaciones externo
  - Agentforce (opcional)
- Dependencia de: Calidad de datos e Histórico disponible
- Enfoque estratégico:
  - Se propone un enfoque de adopción progresivo y adaptado a la madurez de la IA en LDA, apoyándonos en un framework propio de nuestro equipo NTT Data Strategy que nos permite evaluar capacidades, datos y business case. A partir de este análisis y del conocimiento de las capacidades nativas de Salesforce (Agentforce, NBA/NBO,etc.), Genesys Cloud (IA conversacional) y otros posibles modelos propios, proponemos siempre la combinación óptima de solución en función del caso de uso, disponibilidad del dato, capacidades y coste.
  - El framework descrito facilita la identificación de casos de uso con impacto directo en eficiencia operativa y generación de valor, priorizados según madurez y retorno esperado.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Soporte y Mantenimiento

NTT DATA propone un **servicio gestionado de AM sobre Salesforce y Mulesoft** que permita **garantizar la continuidad del servicio, cumplir SLAs exigentes y evolucionar la plataforma de forma controlada y alineada con el negocio**.

Mantenimiento Correctivo
Gestión, análisis y resolución de incidencias funcionales y técnicas

Adaptativo
Implantación de mejoras funcionales de bajo impacto, ajustes regulatorios o de proceso

Preventivo
Optimización de rendimiento, revisión de flujos, reglas, integraciones…

Soporte
Soporte funcional y técnico a usuarios, gestión de incidencias y seguimiento end-to-end

Mantenimiento Evolutivo
Incorporación de nuevas funcionalidades

Despliegues
Preparación, soporte y seguimiento de despliegues

Gobierno y Reporting
Seguimientos de SLA, control de backlog y reporte KPI

SERVICIO GESTIONADO

- **Servicio de AM integral**, con responsabilidad end-to-end
- Gestión unificada de **correctivo, soporte, evolutivo y adaptativo**, según capacidad de línea base
- Soporte funcional a usuarios (L2) y resolución de incidencias funcionales
- **Priorización estructurada** por criticidad e impacto en negocio
- Operación **proactiva y preventiva**, orientada a estabilidad y reducción de incidencias
- **Evolución controlada** de la plataforma, alineada con objetivos de negocio
- **KPIs, SLAs y reporting** Como eje del control del servicio, incluyendo seguimiento de cumplimiento SLA, tiempos de resolución (MTTR), volumen de incidencias por prioridad y defectos en producción
- **IA como palanca** de eficiencia económica y operativa

Modelo de transición a AM y garantía

- Garantía de 12 meses tras el go-live de cada hito, cubriendo defectos sin consumo de bolsa de mantenimiento
- Hypercare de [4 semanas / 1 mes] tras cada ola, para estabilización inicial
- Durante este periodo, los defectos se gestionan como incidencias de garantía con prioridad alta
- Incorporación progresiva al servicio de AM mediante modelo ramp-up, alineado con la estabilización de cada release
- El servicio de garantía y hypercare no consume la capacidad de la línea base de mantenimiento

COMPROMISOS DEL SERVICIO (Anual)

4.800h
Línea base
2,5 FTEs

5000h
Evolutivo
(bolsa horas)

L2-L3
Cobertura SF + Mulesoft

- Correctivo
- Adaptativo
- Preventivo
- Soporte

60 h
Pool arquitectura NTT DATA

8x5
Cobertura del servicio

SOLUCIONES MEJORADAS CON IA NTT DATA

maïa talk flows oasis gaia plugin



© 2026 NTT DATA, Inc.

Soporte y Mantenimiento

NTT DATA propone un modelo de **soporte gestionado basado en capacidad dedicada**, orientado a garantizar la **estabilidad operativa** del CRM, absorber la demanda de incidencias y **evolucionar la plataforma** de forma controlada y alineada con el negocio.

Modelo de Soporte:

L1	L2	L3	Modelo de relación
Responsable: Línea Directa • Registro y categorización en ServiceNow • Validación funcional inicial • Priorización preliminar	**Responsable: NTT Data** • Resolución técnica Salesforce • Configuración y desarrollos adaptativos • Soporte integraciones (Kafka / API Manager / Genesys) • Soporte despliegues • Soporte funcional a usuarios y resolución de dudas operativas Cobertura: **8x5 laboral; 24x7** para incidencias críticas	**Responsable: NTT Data** • Casos críticos de arquitectura • Incidencias complejas de integración • Coordinación con fabricante si aplica	• Punto único de contacto (Service Manager) • Comité operativo semanal (seguimiento incidencias y backlog) • Comité mensual de servicio (SLA, KPIs, evolución) • Comité de gobierno (si aplica) • Coordinación continua con equipos LDA (IT, negocio, CC)

Compromiso de Servicio (SLA´s Orientativos)

Prioridad	Ejemplo en entorno asegurador	Respuesta	Resolución	Cómputo
Crítica (P1)	Imposible operar	≤1h	≤4h	24x7
Alta (P2)	Funcionalidad degradada	≤2h	≤8h laborables	8x5
Media (P3)	Error no bloqueantel	≤4h	≤2 días	8x5
Baja (P4)	Mejora menor	≤1 día laborable	Planificado	8x5

Modelo de Gestión de demanda

Registro → Clasificación → Escalado → Resolución → Cierre

- Registro, clasificación y asignación vía ServiceNow
- Priorización semanal conjunta. Gestión de escalados
- Comité mensual de seguimiento SLA y backlog
- Seguimiento KPI ≥ 95% cumplimiento SLA

Escalado: L1 → L2 → L3 → Fabricante

Clasificación:			
Incidencias (P1-P4)	Defectos garantía	Consulta funcionales	Evolutivos (backlog)

Gestión por Capacidad Base:

- Capacidad base de **≈400h/mes**, con **200h dedicadas a correctivo** (20 tickets/mes) y el resto a microevolutivo y soporte adaptativo.
- La demanda se prioriza por criticidad e impacto en negocio.
- Si la carga supera el **110–115% durante 2 meses consecutivos**, se revisará el dimensionamiento conjuntamente.

Complejidad	Probabilidad	h	Esfuerzo / mes	Tickets
Alto	25%	18	90	5
Medio	50%	9	90	10
Bajo	25%	4	20	5

Consideraciones: ** Ver en el régimen de penalizaciones aplicable se detalla de forma completa en el anexo correspondiente de la propuesta.*

© 2026 NTT DATA, Inc.


Metodología: Modelo de ejecución y Fases de Trabajo

La implantación del CRM exige velocidad, validación temprana con negocio y convivencia con Galgo y CC.
Nuestra propuesta combina **agilidad real con gobierno estructural** para proteger alcance, coste, convivencia y adopción, sin comprometer velocidad.

Proponemos una metodología híbrida: delivery Agile e incremental por olas, soportado por un marco de gobierno Waterfall que asegura control, trazabilidad y calidad en cada hito.

Dual-Track Agile	Stage Gates	Ejecución por olas
Alcance congelado por ola	Cambios gestionados formalmente	Desviaciones controladas desde el diseño

El despliegue se estructura en olas autónomas, con control de dependencias y sin paralelización de construcción, para **proteger calidad y estabilidad** en convivencia con Galgo y CC.

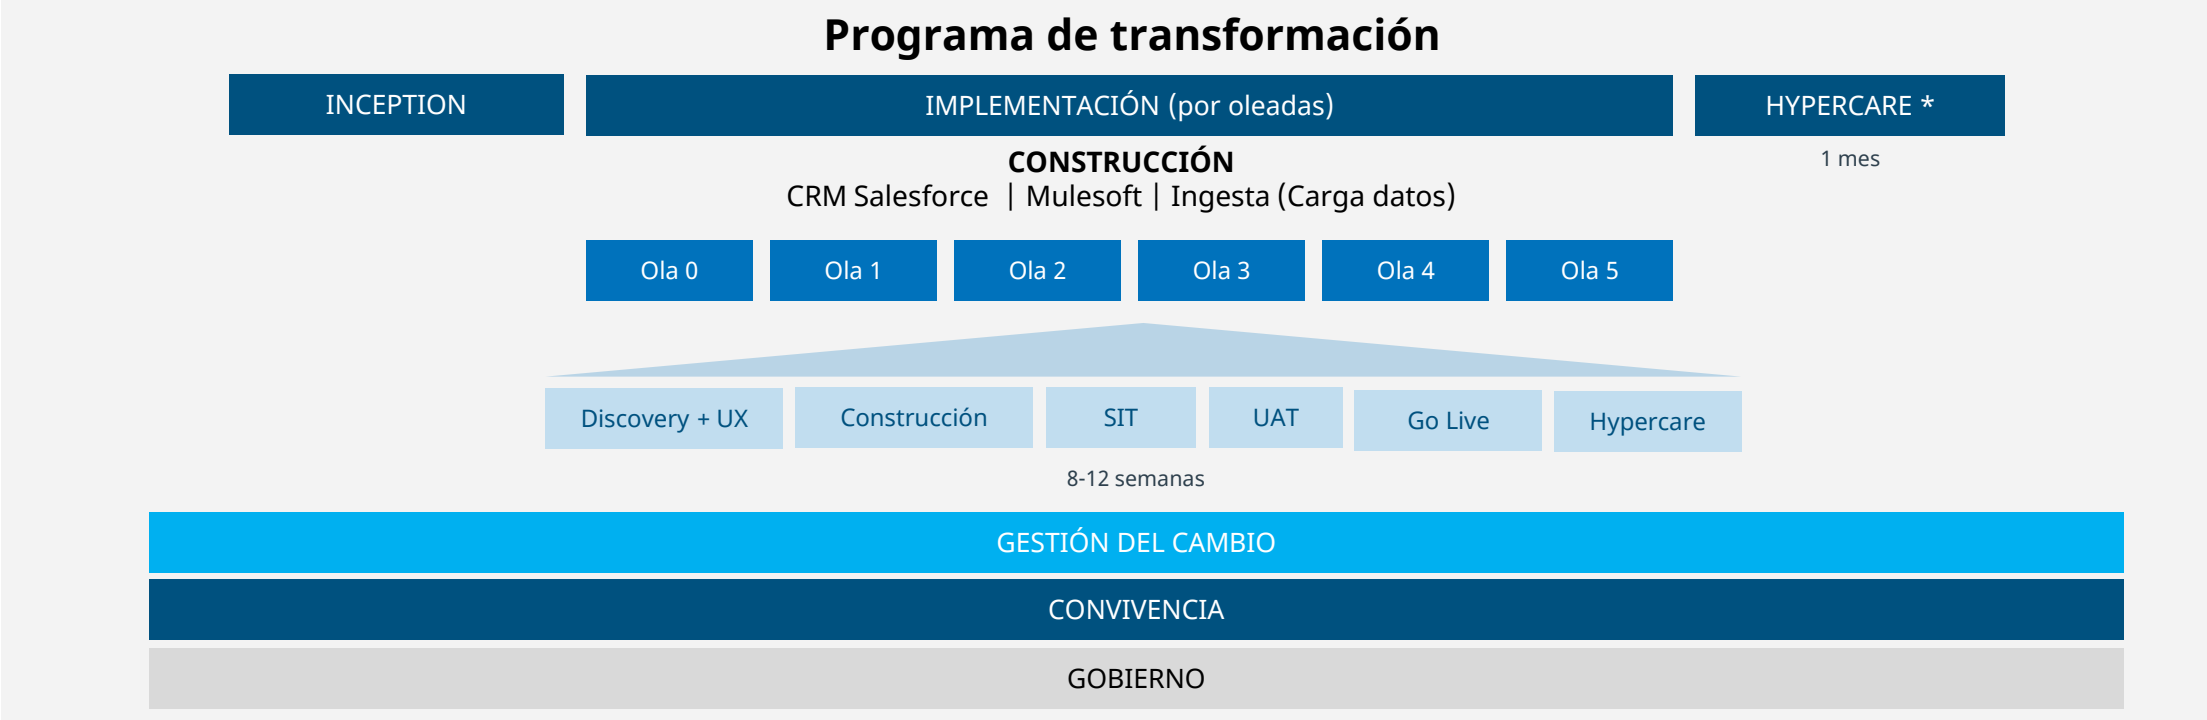

© 2026 NTT DATA, Inc.

Metodología: Inicio





Activación formal del programa y del modelo de gobierno, asegurando alineamiento estratégico, claridad de responsabilidades y reglas de control **desde la Semana 1.**

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. **Activación modelo de gobierno**
   Modelo de gobierno formal + Design Authority + definición roles clave + RACI inicial + calendario de foros y cadencias
2. **Alineamiento estratégico**
   Revisión objetivos + prioridades de negocio + criterios de éxito + restricciones clave (convivencia Galgo / CC)
3. **Reglas de control y ejecución**
   Definición reglas de control de alcance + modelo de gestión de cambios + criterios Go/No-Go + mecanismos de escalado
4. **Planificación Macro**
   Roadmap preliminar por olas + dependencias críticas identificadas + planificación inicial de recursos
5. **Comunicación y expectativas**
   Mensajes clave del programa + identificación stakeholders críticos + definición modelo de reporting y seguimiento

OBJETIVOS

Establecer estructura de control de inicio
- Activar gobierno
- Clarificar responsabilidades
- Evitar ambigüedades operativas

Alinear expectativas y prioridades
- Unificar visión negocio–IT
- Alinear con stakeholders de sistemas
- Calidar foco inicial
- Acordar criterios de éxito

Reducir riesgo organizativo temprano
- Detectar dependencias críticas
- Identificar posibles fricciones
- Anticipar bloqueos

Garantizar transparencia y confianza
- Definir modelo de seguimiento
- Establecer reporting claro
- Acordar mecanismos de decisión

ENTREGABLES (*)

Modelo de gobierno activado
- Modelo de gobierno
- RACI
- Cadencia foros
- Mecanismo de escalado

Acta formal de Kickoff
- Objetivos del programa
- Alcance preliminar
- Prioridades acordadas
- Criterios de éxito


Roadmap preliminar validado
- Secuencia inicial de olas
- Dependencias críticas identificadas
- Definición de DoR/DoD

Plan de comunicación y seguimiento
- Modelo de reporting
- Frecuencia de comité
- Indicadores iniciales

Consideraciones: ver listado de entregables en el *Anexo Lista de Entregables* de este documento

© 2026 NTT DATA, Inc.

Metodología: Inception





Fase de **acotación estratégica y técnica previa a la construcción**, orientada a reducir incertidumbre y fijar el scope.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. **Gobierno**
   Activación modelo de gobierno + Design Authority + definición RACI + foros y cadencias + control de alcance
2. **Business**
   Mapa de procesos TO-BE (CRM) + reglas macro + blueprints + Definición de fronteras CRM-Galgo
3. **Arquitectura SF**
   Decisiones estándar vs custom + modelo de seguridad + SLDS + modelo de maestros + principios de escalabilidad + uso IA
4. **Integraciones**
   Catálogo APIs/eventos + patrón por entidad justificado + observabilidad + gestión de resiliencia
5. **Gestión del Cambio**
   Assessment stakeholders / Impacto organizativo + estrategia de Convivencia progresiva + plan mínimo viable de adopción.
6. **Migración**
   Estrategia carga inicial + incremental + deduplicación + datos sintéticos + identificación de riesgos de sincronización

OBJETIVOS

Fijar decisiones estructurales antes de definir

- Validar Blueprint de alto nivel
- Definir fronteras y modelo de maestros
- Aprobar arquitectura de solución
- Confirmar patrón de integración por entidad crítica

Congelar alcance macro y proteger contrato

- Congelar Scope Box de la primera ola
- Identificar exclusiones explícitas
- Establecer control de cambios (Defer / Swap / CR)
- Acordar mecanismo de congelación por ola

Identificar dependencias y riesgos críticos

- Alineamiento con Galgo, CC y LDA
- Dependencias técnicas/organizativas
- Identificación de riesgos de integración y sincronización
- Mapa de Releases
- Validación de viabilidad de la primera oa

Preparar ejecución y adopción

- Priorización del backlog por olas
- Definir colectivos impactados por Fase 1
- Estrategia mínima de adopción para la primera reléase
- Confirmar criterios de Go/No-Go

Alcance TO-BE y arquitectura aprobada

- Blueprint alto nivel
- Arquitectura global
- Fronteras /maestros
- Scope Box primera ola 1 (DoR)
- Estrategia migración
- Documento formal de control de cambios

Gobierno

- Modelo de gobierno activado
- RACI por ámbito
- Calendario de foros
- Mecanismo de escalado

Identificar dependencias y riesgos críticos

- Mapa de Dependencias
- Registro de riesgos priorizado
- Validación de viabilidad de la primera ola


Preparar ejecución y adopción

- Assessment stakeholders
- Plan mínimo de adopción
- Criterios Go/No-Go

Consideraciones: ver listado de entregables en el *Anexo Lista de Entregables* de este documento

© 2026 NTT DATA, Inc.

Metodología: Olas



Cada ola entrega **valor operativo validado, con integración end-to-end y estabilización** antes de iniciar la siguiente.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. **Discovery + UX** (2-3 Semanas)
   Validación funcional + prototipos navegables + diseño técnico (integraciones / datos / seguridad)
2. **Construcción** (3-6 Semanas)
   Configuración / desarrollo + integraciones + migración incremental asociada + aplicación estándares técnicos
3. **Pruebas integradas SIT** (1-3 Semanas)
   Validación end-to-end CRM–Galgo-CC (rendimiento / resiliencia) + pruebas de integración y sincronización
4. **Pruebas UAT** (1-2 Semanas)
   Pruebas con usuarios clave + validación reglas de negocio y UX + aceptación formal de ola + confirmación Go/No-Go
5. **Go Live**
   Despliegue controlado + coordinación con CC y operación + monitorización intensiva + activación soporte reforzado
6. **Hypercare**
   Estabilización + reducción incidencias recurrentes + soporte prioritario + transferencia efectiva al CoE + preparación BAU

OBJETIVOS

Entregar valor operativo validado

- Validar funcionalidad con negocio antes y después de construir
- Integrar CRM con Galgo, CC y sistemas core sin impacto en estabilidad
- Asegurar aceptación formal de la ola

Garantizar calidad técnica e integración real

- Validación end-to-end CRM–Galgo–CC
- Verificar sincronización, rendimiento y resiliencia
- Corregir incidencias antes de Go-Live

Proteger estabilidad y convivencia

- Validar el plan de despliegue
- No paralelizar construcción de olas
- Integración validada antes de iniciar la siguiente
- Control de desviaciones dentro del alcance congelado

Asegurar adopción y transición

- Validar experiencia UX con usuarios clave
- Activar soporte reforzado post Go-Live
- Transferir conocimiento al CoE y preparar BAU

ENTREGABLES (*)

Funcionalidad integrada y validada

- Backlog HUs (DoR)
- Prototipos navegables
- Matriz requisitos
- Plan de Pruebas
- Manual de usuario
- Integraciones
- Migración

Aceptación formal de ola

- Acta de aceptación funcional / pruebas
- Confirmación criterios Go/No-Go
- Validación de estabilidad post despliegue

Estabilización y soporte

- Informe de incidencias y resolución
- Métricas de estabilidad inicial
- Plan de seguimiento post Go-Live

Transferencia y continuidad

- Material sesiones de transferencia al CoE
- Repositorio documental vivo
- Versionado arquitectura por release

Consideraciones: ver listado de entregables en el *Anexo Lista de Entregables* de este documento

© 2026 NTT DATA, Inc.

IA: Enfoque

AUGMENTED CRM - Reinventa tu CRM de forma acelerada por IA

Augmented CRM es un modelo de entrega con IA que impacta en todas las fases del **SDLC** (*software development lifecycle*):

- ✓ **Discovery:** actas, decisiones, riesgos, backlog; aceleración de análisis tipo fit-gap y trazabilidad.
- ✓ **Diseño:** asistentes para diseñar integraciones/eventos, prototipado UX/UI, contratos API, modelos de datos (con revisión humana).
- ✓ **Construcción:** generación asistida de implementaciones programáticas y declarativas, configuraciones y modelo de datos; revisión y patrones.
- ✓ **QA:** generación de planes de prueba/casos, datos sintéticos donde aplique; apoyo a la automatización.
- ✓ **Run:** triage asistido, análisis de incidencias, knowledge base enriquecida.

Activamos conjuntamente el **modelo de trabajo que acelera el proyecto con IA** desde el día 1.

A lo largo de todo el proyecto...

INICIO	INCEPTION	DISCOVERY + UX	CONSTRUCCIÓN	SIT + SAT	GO LIVE	HYPERCARE
GOBIERNO	CALIDAD DE REQUISITOS	DISEÑO SOLIDO	ACELERACIÓN TÉCNICA	REDUCCIÓN DE RIESGO	ADOPCIÓN	OPTIMIZACIÓN CONTINUA

Aplicando IA conseguimos... Augmented CRM

▪ Activación marco de gobernanza IA ▪ Definición de KPIs de eficiencia por fase ▪ Setup entorno seguro ▪ Activación base de conocimiento ▪ Modelo de reporting	▪ Transcripción automática actas ▪ Generación automática de historias de usuario ▪ Detección automática de conflictos entre requisitos ▪ Documentación AS-IS automática ▪ Estimación paramétrica basada en históricos	▪ Fit/Gap automatizado vs OOB Salesforce ▪ Generación automática de prototipos navegables ▪ Traducción de pantallas a LWC ▪ Mapeo inteligente Galgo ↔ Salesforce	▪ Generación automática metadata Salesforce ▪ Generación código Apex/LWC ▪ Refactor automático ▪ Generación de documentación asociada a las integraciones acelerada.	▪ Generación automática de casos de test ▪ Automatización regresión ▪ Predicción de defectos ▪ Datos sintéticos RGPD compliant ▪ Optimización suite regresión	▪ Generación automática manuales por perfil ▪ FAQs dinámicas ▪ Comunicación audiovisual atractiva	▪ Triage automático incidencias ▪ Detección proactiva de anomalías
gaia talk	gaia talk	plugin	oasis plugin	cover	gaia	flows talk

© 2026 NTT DATA, Inc.


Metodología: Hypercare

HYPERCARE

#3 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO

Fase de **estabilización intensiva tras el Go-Live**, orientada a asegurar continuidad operativa, consolidar adopción y transferir el conocimiento al CoE antes de pasar a BAU.

ACTIVIDADES PRINCIPALES



1. **Monitorización intensiva**
   Seguimiento KPIs operativos + monitorización/ sincronización integraciones + revisión logs e incidencias
2. **Resolución prioritaria de incidencias**
   Gestión rápida de incidencias críticas + análisis causa raíz + corrección técnica + validación con negocio
3. **Soporte funcional reforzado**
   Acompañamiento a key users + resolución de dudas operativas + ajustes menores (dentro del alcance aprobado)
4. **Seguimiento de adopción**
   Medición uso real + identificación fricciones + refuerzo formativo puntual + validación curva de aprendizaje
5. **Transferencia al CoE**
   Sesiones técnicas + entrega documentación + walkthrough arquitectura/integraciones + validación autonomía equipo CoE

OBJETIVOS

Garantizar estabilidad operativa
- Confirmar funcionamiento end-to-end CRM–Galgo–CC sin impacto en negocio

Reducir riesgo post-implantación
- Eliminar incidencias recurrentes
- Estabilizar procesos críticos
- Asegurar rendimiento adecuado

Consolidar adopción real
- Asegurar uso efectivo por parte de usuarios
- Validar que el nuevo modelo operativo funciona en la práctica

Preparar transición a BAU
- Asegurar que el CoE asume el control con conocimiento, documentación y autonomía

ENTREGABLES (*)

Informe de estabilización
- Resumen incidencias
- Métricas de resolución
- Análisis causa raíz
- Acciones correctivas implementadas

Validación de estabilidad
- Confirmación de KPIs operativos
- Validación rendimiento e integraciones
- Cierre formal de fase Hypercare


Documentación actualizada
- Manuales técnicos (Arquitectura final, Modelo de datos, Integraciones) y funcionales
- Manual de usuario
- Prototipos pantallas

Acta Transferencia al CoE
- Sesiones realizadas + conocimiento transferido
- Validación de autonomía
- Confirmación paso a BAU

Consideraciones: ver listado de entregables en el *Anexo Lista de Entregables* de este documento

© 2026 NTT DATA, Inc.

Metodología: Transferencia al CoE





Aseguramos que el equipo interno de **LDA adquiere autonomía** operativa, técnica y evolutiva para **gobernar la plataforma CRM** tras el programa de implantación.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Formación técnica y funcional por rol
2. Documentación completa de la solución
3. Mentoring operativo durante la transición
4. Transferencia de backlog y roadmap
5. Activación del modelo operativo del CoE CRM

CAPACIDADES QUE ASUME EL COE

- Administrar la plantaforma CRM
- Gestionar las releases
- Evolucionar el backlog funcional
- Operar integraciones y datos

MODELO DE TRANSICIÓN

Programa de transformación
Transformación de procesos e implantación progresiva del CRM

Hypercare
Estabilización de la Plataforma CRM

Activación del CoE
CoE opera, gestiona y evoluciona

Shadow Delivery

Shadow delivery durante las olas.
El CoE aprende el modelo CRM mientras se construye **sin impactar el ritmo del programa de transformación**.

- ➢ Formación y adopción
- ➢ Workshops técnico y arquitectura
- ➢ Acceso a backlog y roadmap

Co-Delivery

- Soporte de incidencias conjunto
- Administración CRM compartida
- Gestión de backlog conjunta
- Despliegue de releases menores

Handover Operativo


- Transferencia de backlog y roadmap

***Consideraciones:** * Los perfiles y dimensionamiento del CoE CRM se detallan en la slide de anexo de equipo de LDA.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Planificación

La implantación se articula mediante un **enfoque progresivo por olas**, precedido por una **fase de definición inicial** y acompañado por **gobierno del programa y gestión del cambio** para asegurar una adopción controlada del nuevo CRM.

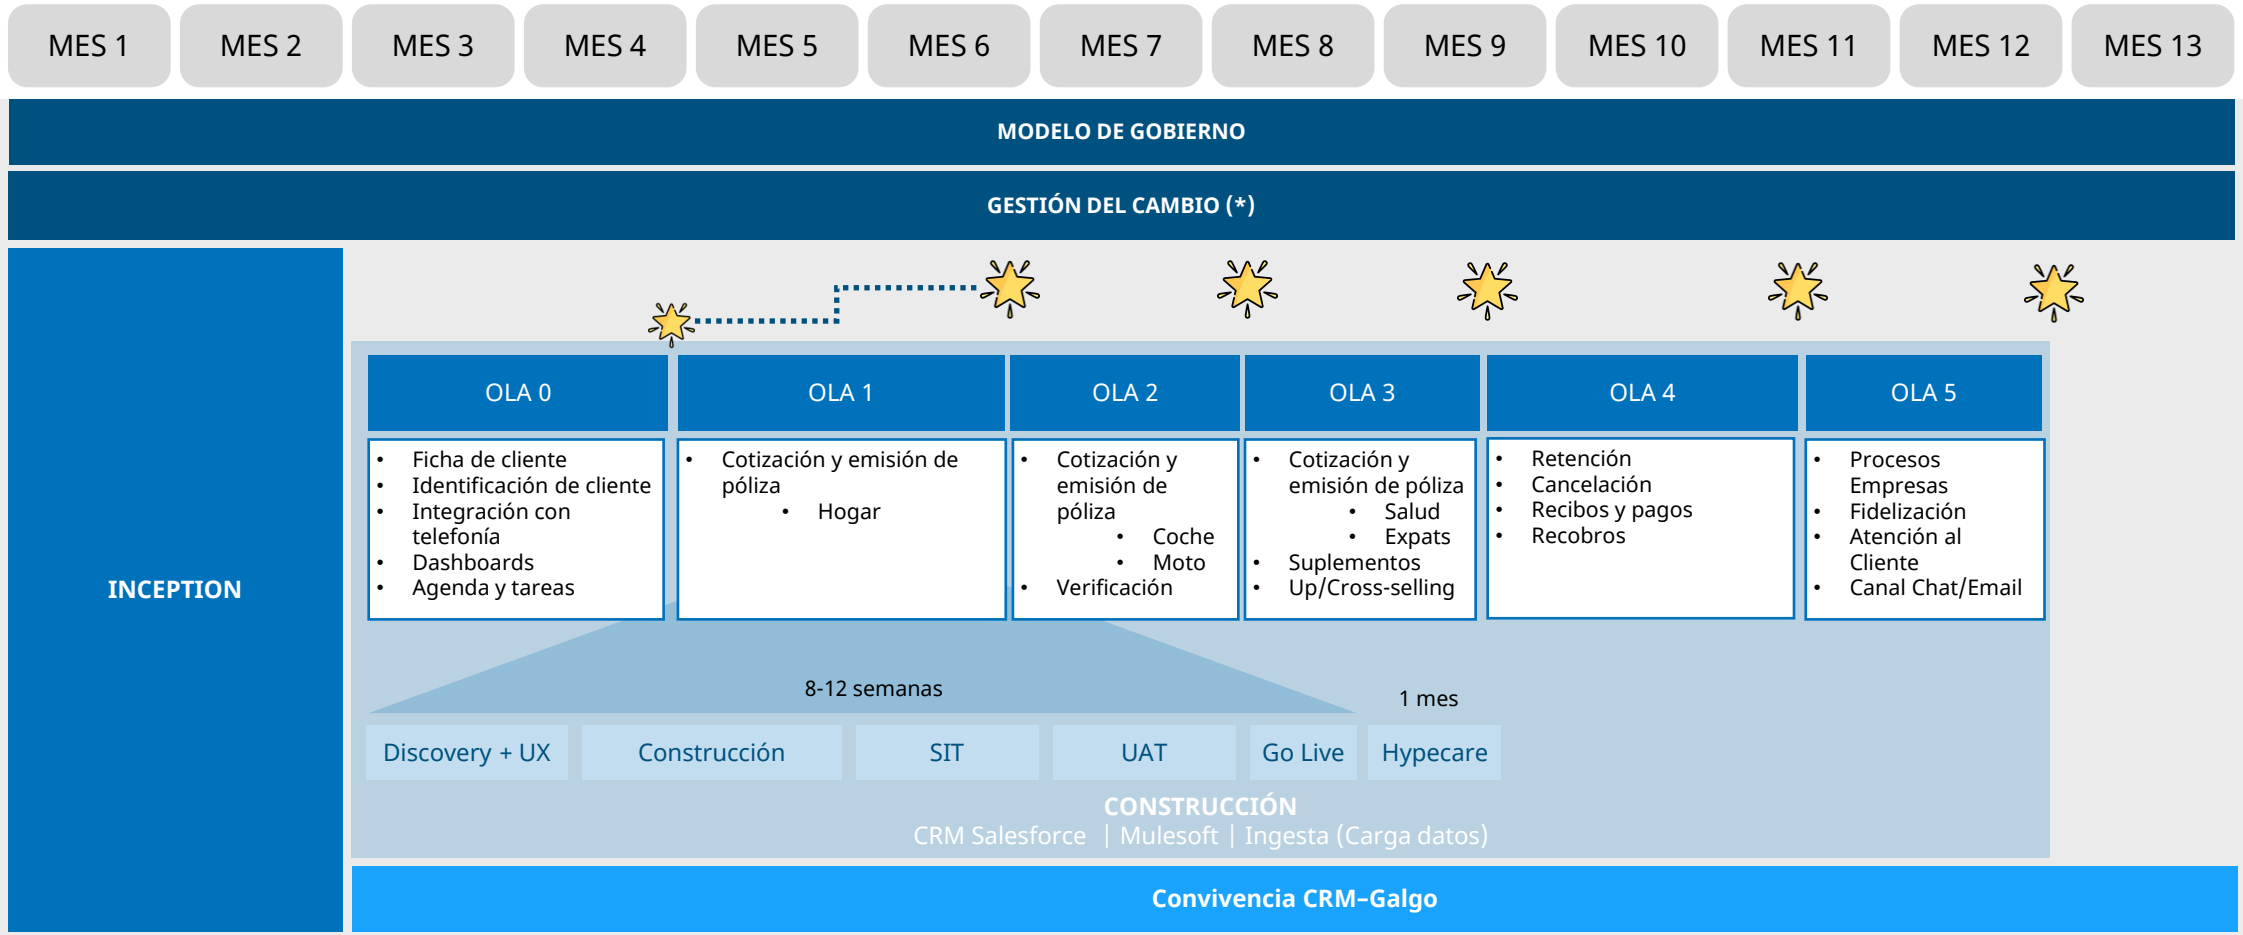

(*) Se incluye *anexo con KPIS de eficiencia de implantación* y mantenimiento para la solución propuesta.

(**) El plan de implantación y la secuencia de olas estarán sujetos a los resultados de la fase de *Inception*, donde se validarán el alcance, las dependencias técnicas y organizativas, así como el modelo de integración por entidad. La planificación final se ajustará en función de:

- la disponibilidad y madurez de las integraciones con sistemas core (Galgo, middleware, terceros),
- la coordinación con iniciativas paralelas (especialmente Contact Center y Data), y
- la asignación de responsabilidades definida en la matriz RACI entre LDA, CoE, partner y terceros.


Cualquier variación en estas dependencias o en el modelo de responsabilidades podrá implicar ajustes en el calendario, priorización de olas, alcance de cada reléase y precio asociado.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Equipo

#3 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO

Un equipo multidisciplinar diseñado para gobernar la complejidad CRM–CC–Core



GOBIERNO DEL PROGRAMA

Insurance Director | Manager | Project Manager

Steering Comité | Comité Operativo | Design Authority | Stage Gates formales

Sponsor ejecutivo (5-10%)
Responsable Programa CRM (40-60%)

BUSINESS & DISCOVERY — 3 pers

- Business Consulting Manager
- Sr Business Consultants
- UX Lead

Figuras clave para liderar el Dual-track agile y acompañamiento durante el programa de transformación desde el conocimiento sectorial.

Diseño TO-BE, traducción a historias, validación con negocio

GESTIÓN DEL CAMBIO — +3 pers

- Change Manager
- Change Consultants
- Formadores / BPS

Adopción progresiva por ola y acompañamiento operativo.

Assessment inicial | Métricas de adopción | Coaching en campo | Coordinacion con personas

Aseguramos adopción real en +2.000 usuarios.

ARQUITECTURA & TECNOLOGÍA — +12 pers

Tres dominios técnicos integrados

- Salesforce (Modelo operativo y experiencia agente)
- Integración (Orquestación CRM–Galgo–Genesys RT/near-RT)
- Data (Carga inicial de datos)

Responsables de diseñar y gobernar la arquitectura híbrida garantizando sincronización, resiliencia y protección del Core.

Arquitectura hibrida: CRM – Integraciones – Carga de datos - Genesys

HYPERCARE & TRANSICIÓN COE — +3 pers

- Equipo multidisciplinar de estabilización
- Equipo multidisciplinar de soporte (L2/L3)

Transferencia técnica estructurada

Formación COE

Garantizar la continuidad y autonomía futura de LDA

NTT DATA

Modelo de trabajo alineado con cultura LDA

Inception/Discovery+UX + Gestión Cambio → Presencial | Construcción → híbrido

Gobierno y comités → Cadencia estructurada → Coordinación CRM-CC continua

EQUIPO MULTIDISCIPLICAR

+25 personas

Sistemas

- Responsable Arquitectura IT (20-30%)
- Responsable Integracion CORE (Galgo) (20-30%)
- Responsable Data / Lakehouse (15-25%)

Negocio

- Product Owner Negocio (50-80%)
- Personas y Comunicación + Equipo responsable de Gestión del Cambio (30-40%)
- Key Users (20-40%)

COE CRM LDA

Responsable CoE CRM / CRM Lead (40–60%)
Arquitecto CRM (30–50%)
Responsable de Gobierno & Releases (20–40%)
Responsable de Backlog / Demand Manager (30–50%)
Responsable de Datos CRM (20–40%)
Responsable de Adopción & CM (20–40%)

LDA

En el anexo se incluye una matriz RACI recomendada para los distintos perfiles que forman parte del CoE LDA.

Garantizamos la estabilidad del equipo mediante asignación de perfiles dedicados y plan de continuidad, con procedimiento de sustitución inmediata y transferencia de conocimiento ante la baja de un perfil clave.

Se puede consultar modelo de trabajo de cada persona del equipo NTT DATA en anexos – *Equipo del programa*

Se pueden consultar los CVs de cada persona propuesta de NTT DATA en anexos – *CVs*

Se puede consultar dedicación esperada del equipo LDA en Anexos - *Dedicación equipo LDA*

El modelo de trabajo, ubicación, porcentaje de presencialidad y cobertura horaria se definen por perfil y fase del proyecto. Se prioriza la presencialidad de los **perfiles clave** en Inception, despliegue del plan de aprendizaje y fases iniciales de post Go-Live. El detalle completo por rol se incluye en el anexo de *equipo*.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de cambios de alcance

El programa incorpora un mecanismo formal de gestión de cambios que garantiza **transparencia, trazabilidad y control** progresivo del alcance tras el freeze de cada ola.

1 Principio estructural

Toda petición nueva posterior al freeze de una ola se clasifica antes de ejecutarse

2 Gobierno del cambio

			Decisión formal	
Nivel estratégico	STEERING COMMITEE	Gestión de impactos que implican cambio de coste	Mejora en el alcance	Nueva necesidad
Nivel estructural	DESIGN AUTHORITY	Gestión de cambios con impacto estructural técnico	Mejora en alcance	
Nivel táctico	COMITÉ OPERATIVO	Clasificación inicial del impacto (defecto, mejora, nueva necesidad)	Defecto	
Nivel operativo	EQUIPOS DE TRABAJO	Se levanta el impacto		

3 Evidencia y trazabilidad

- Registro formal de cambios (log CR)
- Acta de decisión (aprobado / deferido / rechazado)
- Impacto documentado en alcance, plazo y coste
- Actualización de baseline cuando aplique

Clasificación de cambios

Defecto	• Error respecto a lo aprobado (AC / diseño validado) • No modifica alcance • Se corrige dentro de la ola
Mejora en alcance	• Ajuste funcional menor • Puede gestionarse mediante Swap o Defer • Se mantiene dentro del Scope Box aprobado
Nueva necesidad	• Funcionalidad no contemplada en el Scope Box • Cambio estructural • Nuevo proceso o ampliación relevante

(*) ver en Anexo Premisas, dependencias y gestión de riesgos de la implantación el detalle de la gestión de cambios de alcance, priorización e impacto en plazo/coste.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de dependencias

Las dependencias se **clasifican y se gobiernan según su naturaleza y nivel de impacto**, evitando escalados innecesarios y garantizando control progresivo.

1 Principio estructural

Ninguna dependencia crítica se ejecuta sin clasificación y validación en su foro correspondiente.

2 Gobierno del cambio

Nivel estratégico	STEERING COMMITEE	Gestión de dependencias que implican cambio de coste	Dep. estratégica
Nivel estructural	DESIGN AUTHORITY	Gestión de dependencia con impacto estructural técnico	Dep. estructural
Nivel táctico	COMITÉ OPERATIVO	Clasificación i de y gestión de dependencia operativa transversal	Dep. Operativa Transversal
Nivel operativo	EQUIPOS DE TRABAJO	Se levanta la dependencia	Dep. Interna de equipo

3 Evidencia y trazabilidad

- Registro formal de dependencias (log)
- Clasificación por naturaleza y nivel de criticidad
- Acta de decisión del comité correspondiente
- Impacto documentado en alcance, plazo y coste
- Actualización de roadmap o baseline cuando aplique

Clasificación de dependencias

Dependencia estratégica	• Impacta alcance macro, coste o roadmap global
Dependencia estructural	• Impacta arquitectura, integración o modelo de datos
Dependencia operativa transversal	• Impacta coordinación entre streams
Dependencia interna de equipo	• Bloqueos técnicos puntuales

Tipos de dependencias

La criticidad determina la urgencia de escalado.


Alta	Media	Baja
Bloquea ola o impacta Gate	Afecta planificación pero no bloquea	Seguimiento interno

(*) ver el detalle de supuestos, dependencias críticas por fase y su impacto en la implantación en Anexo Gestión de dependencias , Anexo Premisas, Anexo Gestión de riesgos,y Anexo Consideraciones al alcance.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de riesgos

Se identificará anticipadamente aquellos factores que pueden poner en peligro el éxito del servicio y establecer con anterioridad un plan de trabajo que permita minimizar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en el caso de producirse.

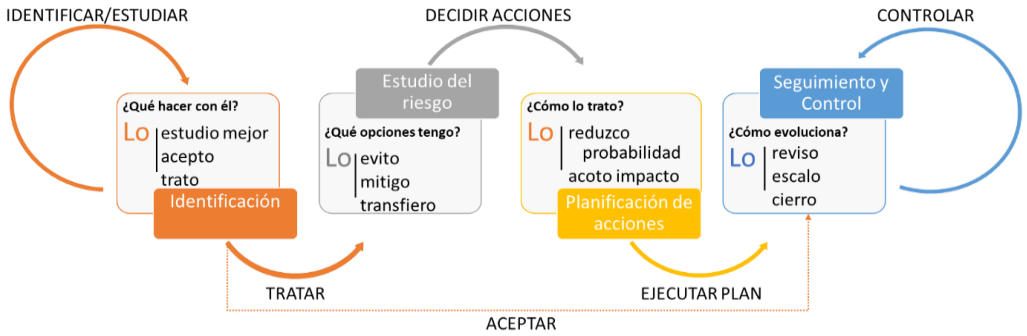

ESTABLECER EL RIESGO (*)

- ✓ Identificación de riesgos: determinar todas las acciones y situaciones que pueden suponer un riesgo potencial para el proyecto.
- ✓ Evaluación de riesgos: determinación de los efectos e impacto en las áreas del potencial riesgo.
- ✓ Definición de medidas y planes de contingencia: establecer para cada riesgo una serie de medidas que sirvan para resolver o desactivar los riesgos, o modificar la situación del proyecto estableciendo un nuevo escenario de riesgos. Los planes de contingencia deben incluir valoraciones de umbral de riesgo a partir del cual se aplicarán las medidas correctoras.


GESTIONAR EL RIESGO

- ✓ Implementación de monitorización: identificación y control de riesgos, lanzamiento de planes de contingencia, monitorización de los efectos producidos por estos planes, informando a LDA y al equipo de proyecto.
- ✓ Comunicación y continua mejora: análisis de la efectividad de las mejoras puestas en marcha, comunicación de matriz de riesgos y planes de mejora.

La **cuantificación** del riesgo se realizará en función del impacto que tenga sobre el servicio y su probabilidad de producirse, lo que marcará en parte las líneas de acción a realizar.

El **modelo de escalado** vendrá marcado de manera natural por el salto de grado de una amenaza pasando de estar supervisado en un primer nivel al siguiente inmediatamente superior.

Cada nivel de interlocución (estratégico, gestión y operativo) cuenta con una visión de zonas de color por grados (1-3) en función de la cuantificación del riesgo.

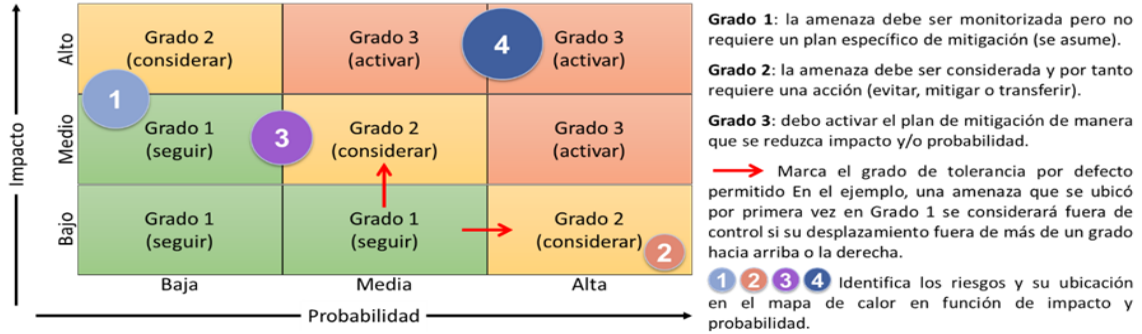

Grado 1: la amenaza debe ser monitorizada pero no requiere un plan específico de mitigación (se asume).

Grado 2: la amenaza debe ser considerada y por tanto requiere una acción (evitar, mitigar o transferir).

Grado 3: debo activar el plan de mitigación de manera que se reduzca impacto y/o probabilidad.

→ Marca el grado de tolerancia por defecto permitido En el ejemplo, una amenaza que se ubicó por primera vez en Grado 1 se considerará fuera de control si su desplazamiento fuera de más de un grado hacia arriba o la derecha.

1 2 3 4 Identifica los riesgos y su ubicación en el mapa de calor en función de impacto y probabilidad.

(*) Ver Anexo Premisas, dependencias y gestión de riesgos de la implantación para el detalle de la matriz de riesgos, mitigaciones y dependencias asumidas por LDA.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito

Garantizamos el éxito combinando despliegue progresivo, valor temprano, adopción real y una ejecución probada

CONTROL DE RIESGO OPERATIVO	GENERACIÓN DE VALOR TEMPRANO	ADOPCIÓN REAL	EJECUCIÓN PROBADA Y GOBIERNO
Despliegue progresivo por olas	**Activamos MVP cliente-360 desde el inicio**	**Formación y coaching por rol operativo**	**Experiencia probada CRM + Contact Center**
MVP Inicial en entorno controlado	**Validamos el modelo comercial en Hogar**	**Despliegue acompañado por ola**	**Gobierno técnico con Design Authority**
Convivencia controlada con Galgo	**Escalamos por dominios de negocio**	**Red de embajadores del cambio**	**Aceleradores propios (IA, integración, UX)**
Integración desacoplada (API + eventos)	**Medimos impacto por ola**	**Métricas de uso y adopción reales**	**Gobierno end-to-end negocio + IT**
No rompemos la **operación**	No esperamos al final para generar **valor** de negocio	No es una implantación, es **uso** real	Ya lo hemos hecho y **sabemos controlarlo**

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito

Impulso de la Banca Comercial

BBVA

Transformación digital del canal Oficina de BBVA mediante Financial Services Cloud para 17.000 usuarios, con integración de Marketing Cloud y evolución hacia Service y Telefonía. Enfocado en una visión 360º del cliente, mejora de la visión del gestor y capacidades de reporting, incluyendo gestión comercial, riesgos, sostenibilidad, formalización y postventa.

Además, el uso potencial de Agentforce aporta un elemento diferencial, optimizando tiempos de gestión y aumentando la conversión en venta y postventa.

Financial Services

Rol: Service Owner Commercial Management & CRM
Nombre: Ignacio Gomez Abarca
Contacto: ignacio.gomez.abarca@bbva.com

Integración con Genesys Cloud

CaixaBank PAYMENTS & CONSUMER

Evolución del modelo de atención en CaixaBank Payments & Consumer (CPC), combinando Dynamics 365 y Salesforce.

- Incluye la gestión operativa y evolutiva (AM) de Dynamics
- El desarrollo del front de atención y captación sobre Dynamics (Proyecto Odisea)
- Implantación progresiva de Salesforce como plataforma objetivo (MVP y Fase 1 en curso, con evolución hacia capacidades de IA y sustitución completa de Dynamics). Reporting y explotación de la información de servicio.

Genesys Cloud · Salesforce for Service · Salesforce Platform

Rol: Responsable de transformación e innovación digital CAIXABANK PAYMENTS AND CONSUMER
Nombre: Virginia Borruel
Contacto: vrubinstein@caixabankpc.com

Transformación integral CRM-CC

PROSEGUR ALARMAS

- Dentro de la iniciativa de transformación digital, se ha implantado una solución multicanal que cubre los siguientes procesos de negocio de MPA Prosegur Alarmas: **Captación, Venta, Operaciones, Atención y Fidelización**


Genesys Cloud · Salesforce for Sales · Salesforce for Service · Salesforce for Marketing · Salesforce Field Service · CPQ · Mulesoft

Rol: Director Desarrollo IT
- Nombre: Alvaro Cruzate Romero
- Contacto: 620044445

Rol: Director de Procesos y Sistemas Comerciales
- Nombre: Susana Maria Aller Garcia
- Contacto: 676627199

*Se puede consultar casos de éxito adicionales de NTT DATA en anexos – **Casos de exito***

Anexos

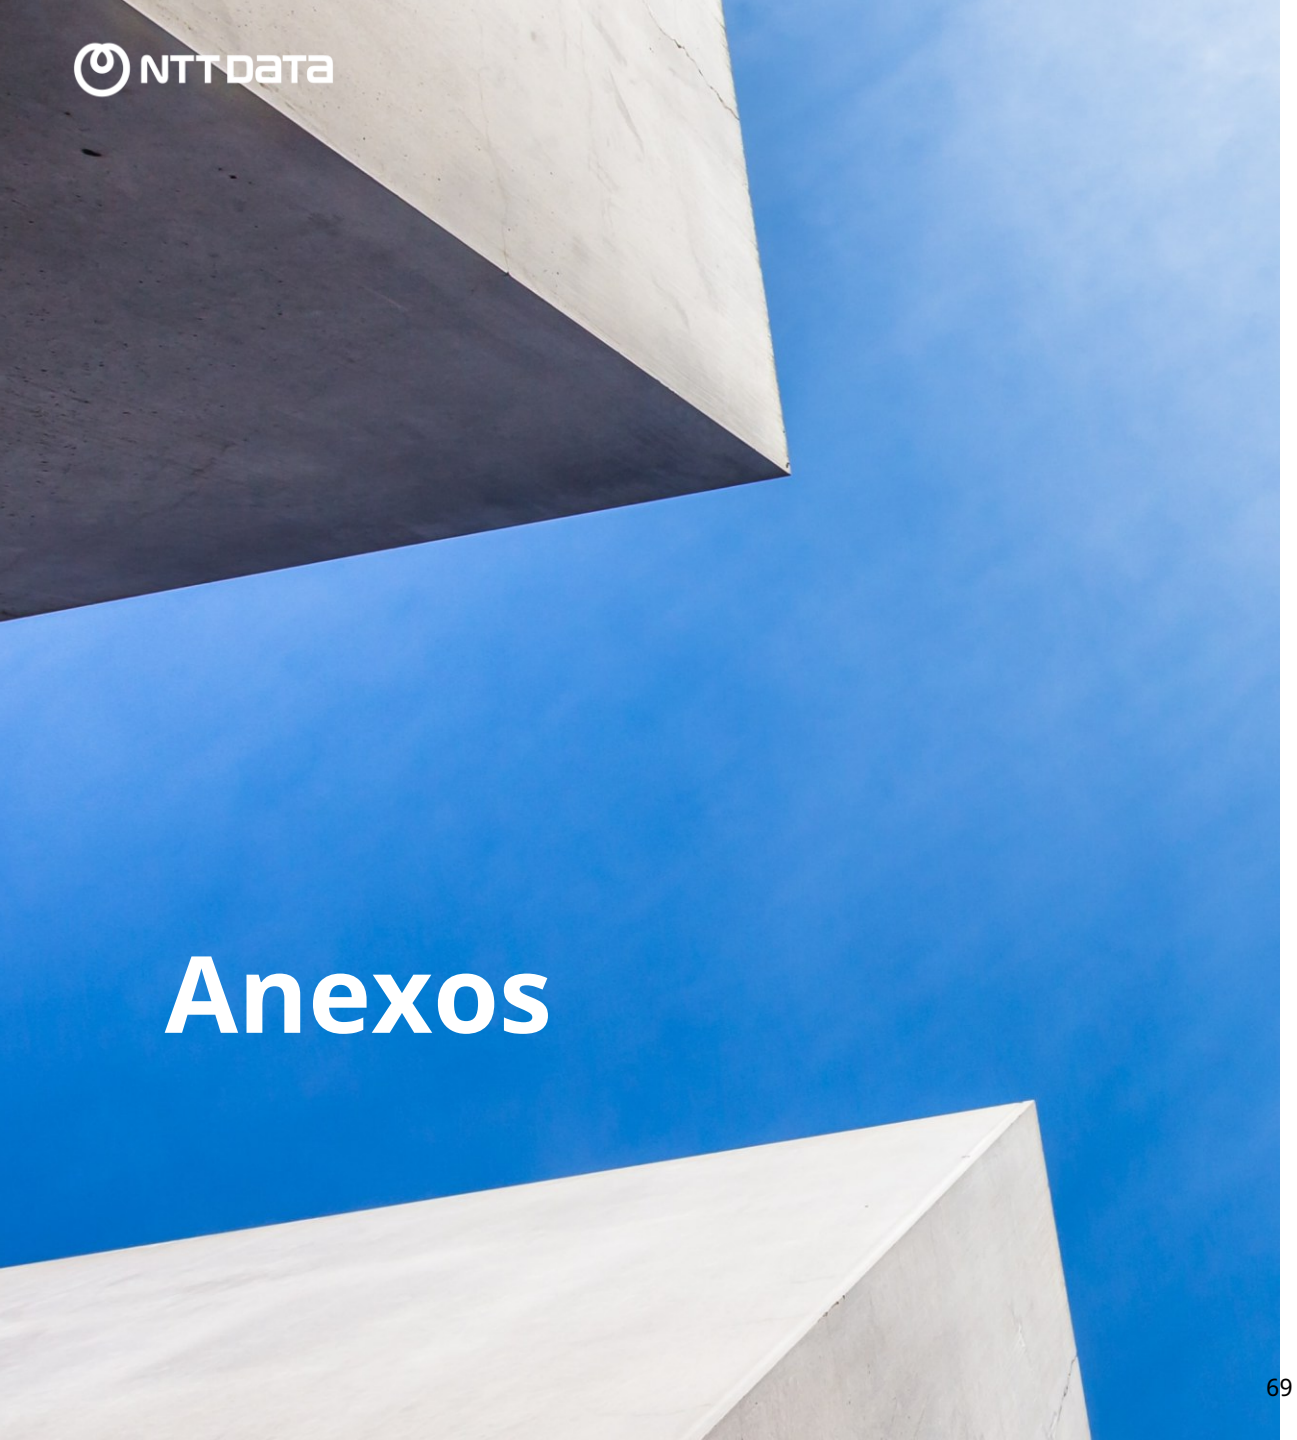

Anexos


Faseado

© 2026 NTT DATA, Inc.

Faseado

A continuación, se muestra en detalle el contenido de cada ola.

	Fundacional (Base Operativa)	Venta Hogar	Venta Motor (Auto / Moto)	Venta Salud/Expats	Gestión de Cartera Activa	Omnicanalidad y Fidelización
	Crear la base cliente 360 y sustituir el frontal operativo sin riesgo.	Implantar modelo oportunidad multiproducto en un ramo controlado.	Escalar modelo comercial a ramos core de volumen.	Gestionar ciclo de vida activo del cliente.	Estructurar la gestión del ciclo de vida de la póliza y proteger la rentabilidad de la cartera.	Consolidar CRM como plataforma relacional única.
CONTENIDO DE NEGOCIO	• Identificación unificada cliente • Ficha Cliente 360 (visión multipóliza) • Agenda estructurada y dashboard • Historial interacciones • Integración CTI con Genesys • Primeros asistentes IA (resumen llamadas)	• Oportunidad estructurada • Carrito multiproducto • Cotización Hogar completa • Emisión • Versionado de ofertas • Integración pricing core • Firma digital	• Cotización Coche y Moto • Verificación y documentación pendiente • Multicierre • Gestión de riesgo integrada • Persistencia en core	• Suplementos (motor y hogar) • Upselling y cross-selling • Gestión multipóliza coordinada • Recibos y pagos • Recobro estructurado • NBO/NBA	• Gestión estructurada de retención • Procesos de cancelación y precancelación • Control y gestión de recibos • Seguimiento y gestión de impagos • Procesos de recobro • Visión económica integrada por cliente	• Chat integrado • Empresas • Atención al cliente • Programas fidelización • Encuestas NPS • Customer journeys • Métricas cliente 360 • Procesos empresas
IMPACTO ASEGURADOR	• Base cliente-level • Reducción TMO inicial	• Profesionalización del funnel • Mayor conversión • Eliminación de Excel y procesos manuales	• Escalado del modelo multiproducto • Mayor control sobre descuentos	• Incremento ticket medio • Reducción fricción operativa	• Reducción churn • Mayor trazabilidad operativa	• Mayor satisfacción cliente • Activación relacional continua • CRM como plataforma estratégica

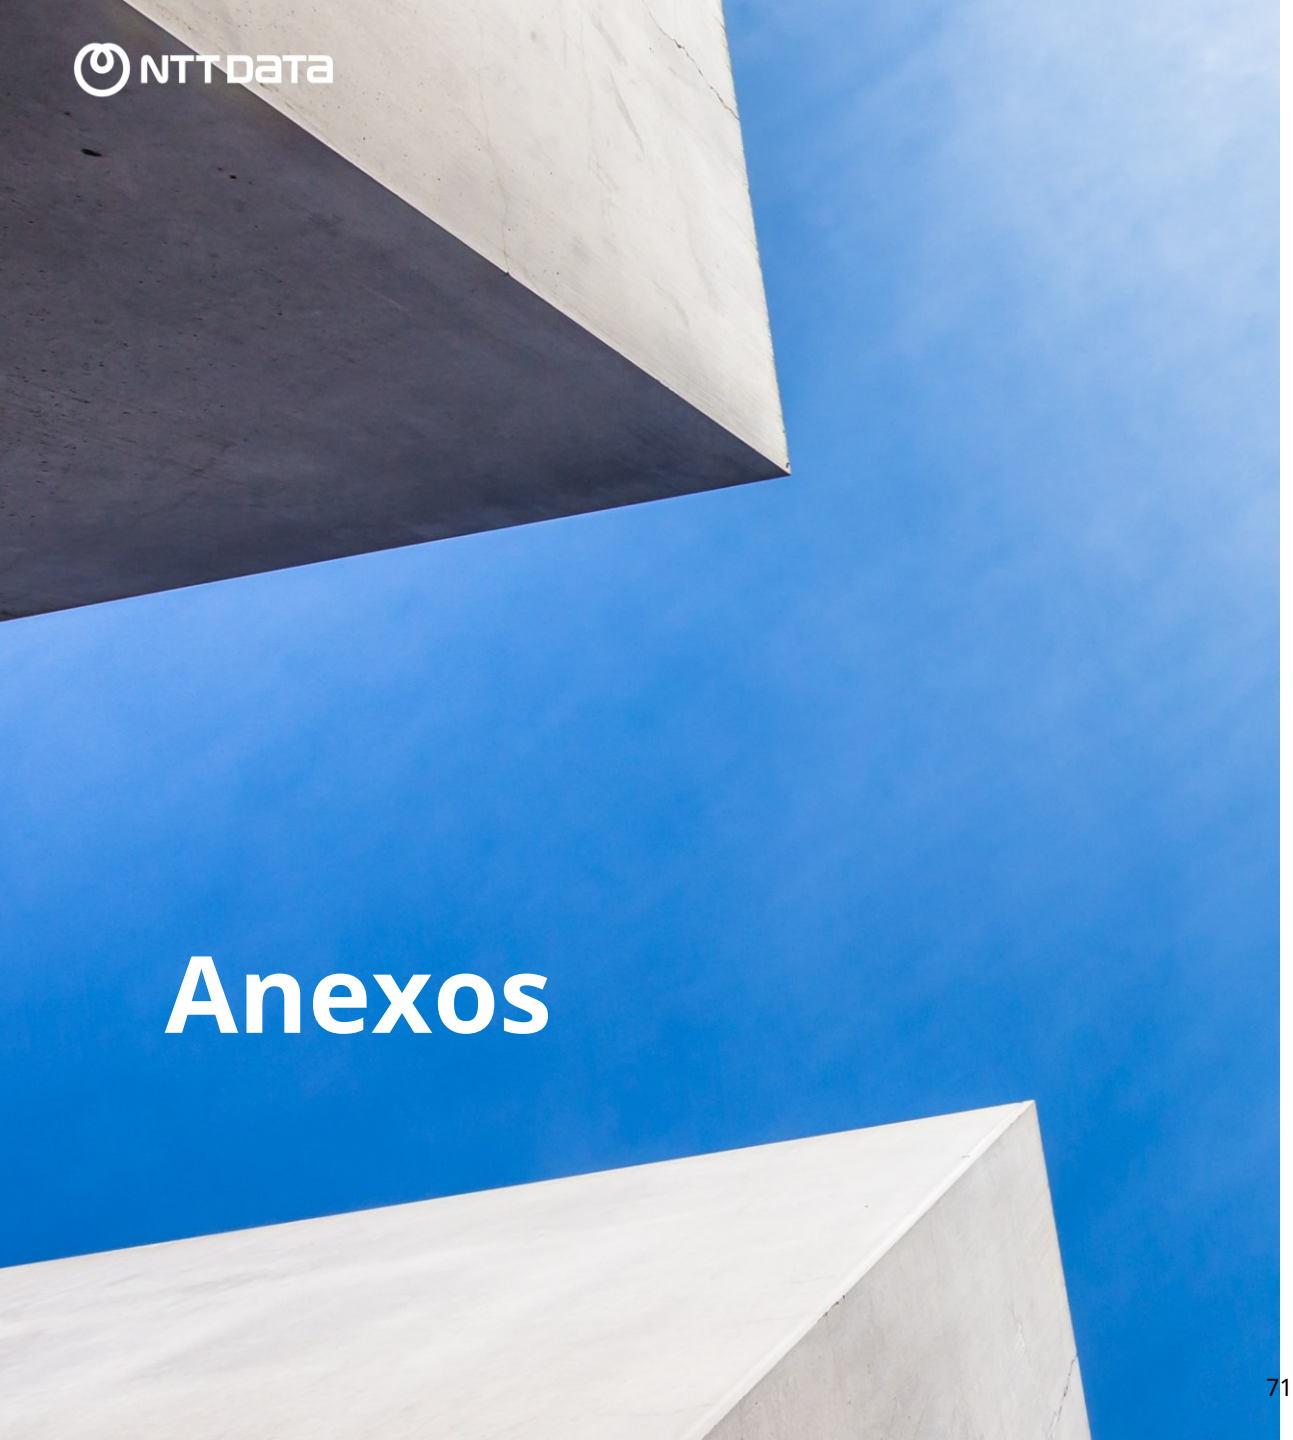

Anexos

Stack tecnologico

© 2026 NTT DATA, Inc.

Stack tecnológico: FSC vs Core

NTT DATA propone un **enfoque de arquitectura proporcional al alcance**, evitando sobredimensionamiento sin comprometer evolución futura:

Cobertura Alcance		
Necesidad del alcance RFP	**Capacidad Salesforce estándar**	**Enfoque NTT (sin FSC)**
Modelo cliente **multipóliza**	Data model configurable	• Acelerador NTT generación automática de modelo extendido (IA)
Gestión **oportunidad** compleja	Sales Cloud	• Extensiones metadata + flows
Procesos guiados venta / retención	Flow / Screen Flow	• Acelerador NTT de generación automática de prototipos navegables y traducción a lenguaje Salesforce (IA) • Acelerador NTT de generación de casos de uso IA adaptados al proceso y al negocio
Versionado cotización	Custom objects + automation	• Modelo controlado integrado con core
Vista **360** cliente	Service + related lists	• Modelo relacional optimizado
Workflows complejos	Flow / Apex	• Orquestación ligera + desacoplamiento
Integración omnicanal con **Genesys Cloud**	Service Cloud Voice / APIs	• Integración CTI desacoplada + persistencia omnicanal
Integración con **Galgo** y otros sistemas	APIs / eventos	• Orquestación MuleSoft + desacoplamiento progresivo

Enfoque propuesto

- El alcance actual se centra en **CRM operacional asegurador**.
- Sales & Service/Service Voice permiten cubrir el alcance actual con una **arquitectura eficiente y evolutiva**.
- Los casos de uso aseguradores pueden construirse sobre Salesforce Core mediante **extensión del modelo estándar, manteniendo control sobre complejidad y licenciamiento**.
- Las **capacidades de IA** (predictiva y generativa) son transversales a la plataforma Salesforce y no dependen del vertical elegido.
- Nuestros **aceleradores** permiten:
  - Cubrir **procesos guiados** sin añadir capas adicionales de complejidad (Omnistudio).
  - Extender el **modelo de datos** estándar para el contexto asegurador
  - Desplegar **casos de uso de IA** adaptados al negocio de una manera ágil

La arquitectura queda preparada para incorporar FSC si el negocio evoluciona.

FSC sería recomendable ante una **evolución hacia gestión patrimonial, consolidación financiera o asesoramiento regulado.**

© 2026 NTT DATA, Inc.

Stack tecnológico: Licenciamiento necesario

Modelo de licenciamiento **alineado a roles reales y cobertura funcional del alcance**:

Tipo de usuario	Volumetría estimada	Licencia propuesta	Rol en el sistema	Qué hacen en el CRM
Agentes Contact Center (internos y externos)	1.600	Service Cloud (con SCV)	Operación comercial y atención	• Gestión de clientes 360° • Cotización y seguimiento oportunidades • Atención omnicanal (voz, chat, email) • Gestión del ciclo de vida del cliente • Upselling / Cross-selling • Uso asistente IA
Usuarios operativos Back Office	200	Licencia alineada a rol funcional (Sales / Service)	Soporte operativo y aprobaciones	• Validación y aprobación de cotizaciones • Gestión de excepciones • Procesos de retención y cancelación • Control de documentación • Análisis de cartera y seguimiento producción
Partners / usuarios externos	100	Experience Cloud	Canal externo controlado	• Alta de leads / referrals • Consulta estado oportunidad • Subida documentación • Interacción controlada vía APIs • Acceso limitado a información asignada
Usuarios consultivos / managers	100	Sales Cloud (o licencia light/Platform)	Supervisión y análisis	• Consulta ficha cliente • Reporting y dashboards • Seguimiento conversión y cartera • Análisis KPIs comerciales

© 2026 NTT DATA, Inc.


Stack tecnológico: Licenciamiento necesario

Modelo de licenciamiento **técnico necesario**:

Tipo de usuario	Volumetría estimada	Licencia propuesta	Rol en el sistema	Qué hacen en el CRM
Administradores / CoE CRM	10–20	Licencia full + permisos admin	Gobierno y evolución plataforma	• Configuración modelo datos • Gestión roles y perfiles • Automatizaciones y flows • Gestión releases y despliegues
▪ **Usuarios Contact Center** ▪ **Usuarios operativos**	Pdte. acotar durante Discovery	IA (Agentforce / Einstein)	• Operación comercial y atención • Soporte comercial	• Además de sus tareas base, emplean componentes y asistentes IA en el CRM como asistencia, recomendaciones y argumentarios, y automatizaciones
Plataforma Mulesoft	N/A	A definir por LDA (vCores, etc.)	Api Manager y Orquestación de comunicaciones	• Orquesta todas las comunicaciones entre Salesforce, Galgo y sistemas externos • Transformación de protocolos entre sistemas (DB2, REST/CIS, Kafka, SFTP,etc.) • Gestión de errores y reintentos • Gobernanza, versionado, políticas, SLA, throttling.
Salesforce Shield	N/A	Bundle (Platform encryption, Event monitoring & Field Audit trail	Seguridad avanzada y cumplimiento	• Protección de datos sensibles mediante cifrado en reposo (Platform Encryption), auditoría avanzada de accesos y trazabilidad de cambios en datos críticos. • Compliance DORA y RGPD
Data Masking	N/A	Licencia Plataforma	Protección de datos en entorno no productivo	• Enmascaramiento de datos sensibles cuando se copian entornos productivos a sandbox para desarrollo o pruebas.
Privacy Center	N/A	Licencia Plataforma	Gestión de privacidad, derechos y preferencias	• RGPD compliance
Entornos de Salesforce	N/A	Entornos adicionales a determinar según edición	Soporte ALM	• Implantación CRM - Ciclo de vida del software • Implantación CRM - Gestión del cambio

En fase de Discovery se definirá la edición de salesforce que mejor se adapte a las necesidades de LDA (Enterprise / Unlimited , etc.) así como las features necesarias a adquirir como add-on que no estén incluidas en la edición. (e.g. entornos adicionales, add-on IA, PE, etc.)

La arquitectura queda preparada para incorporar FSC si el negocio evoluciona.

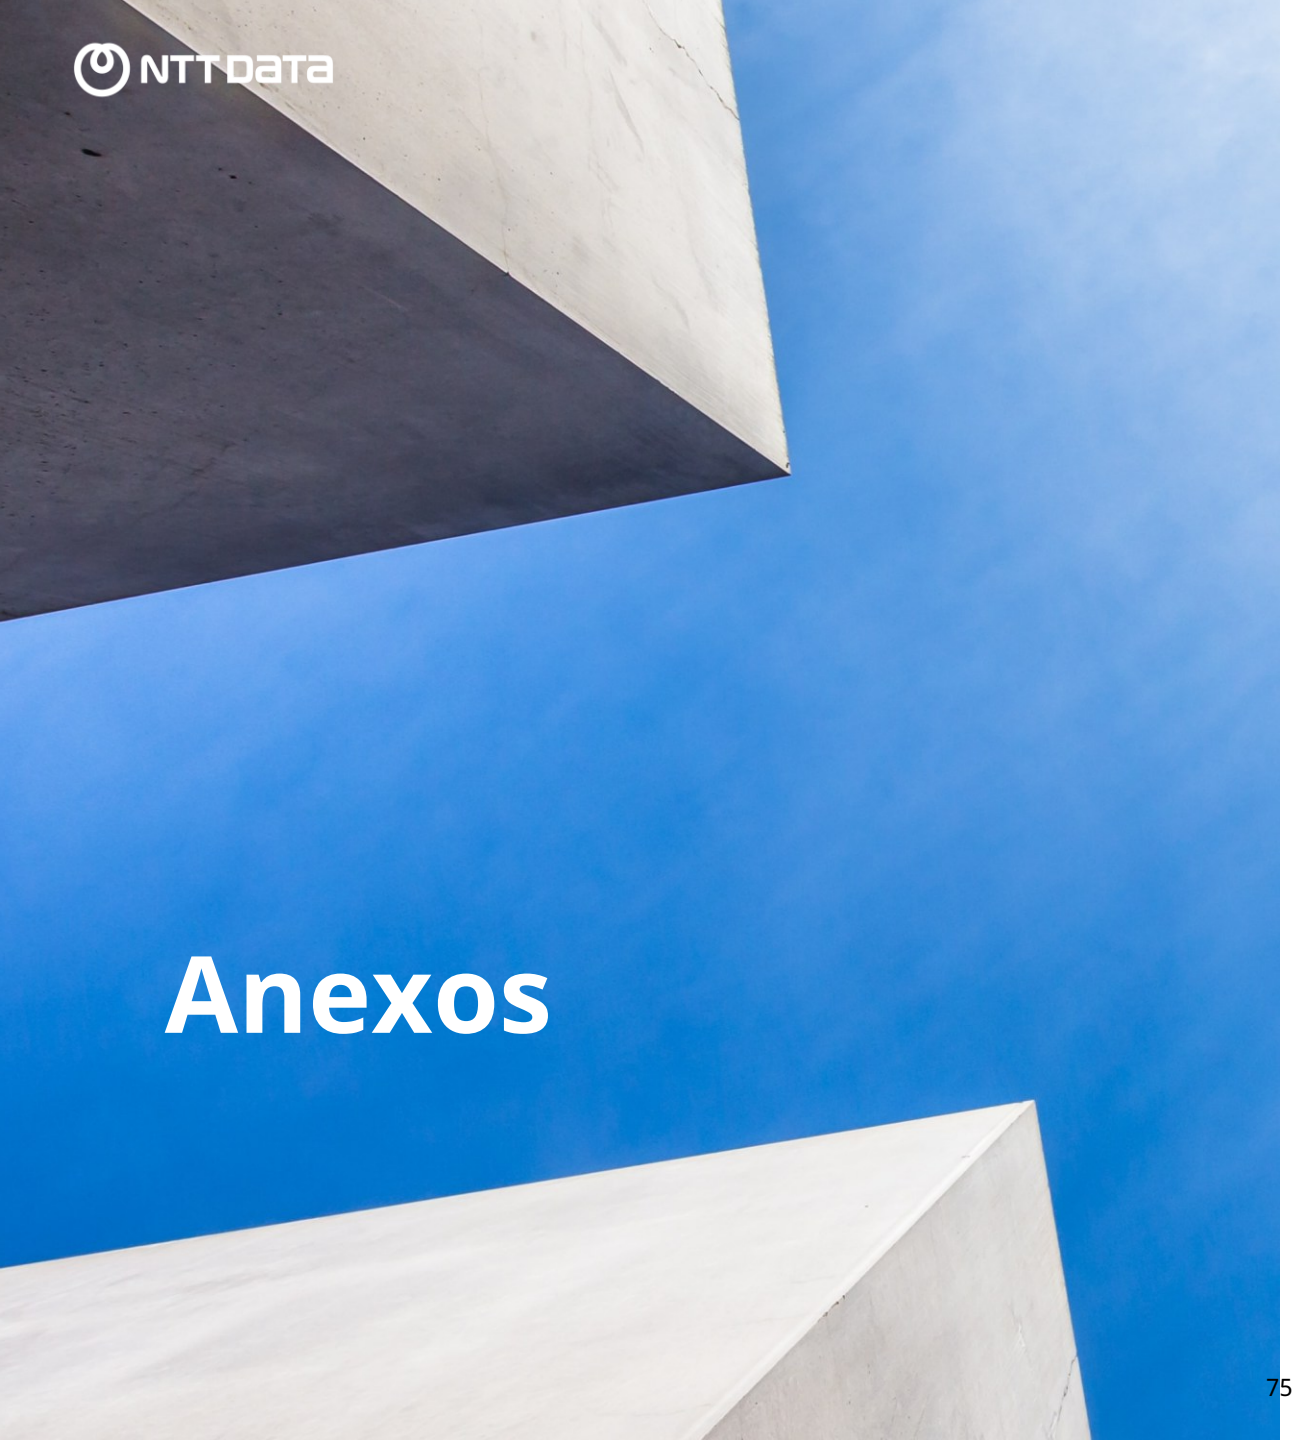


Anexos

Arquitectura Funcional y Técnica


© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura funcional

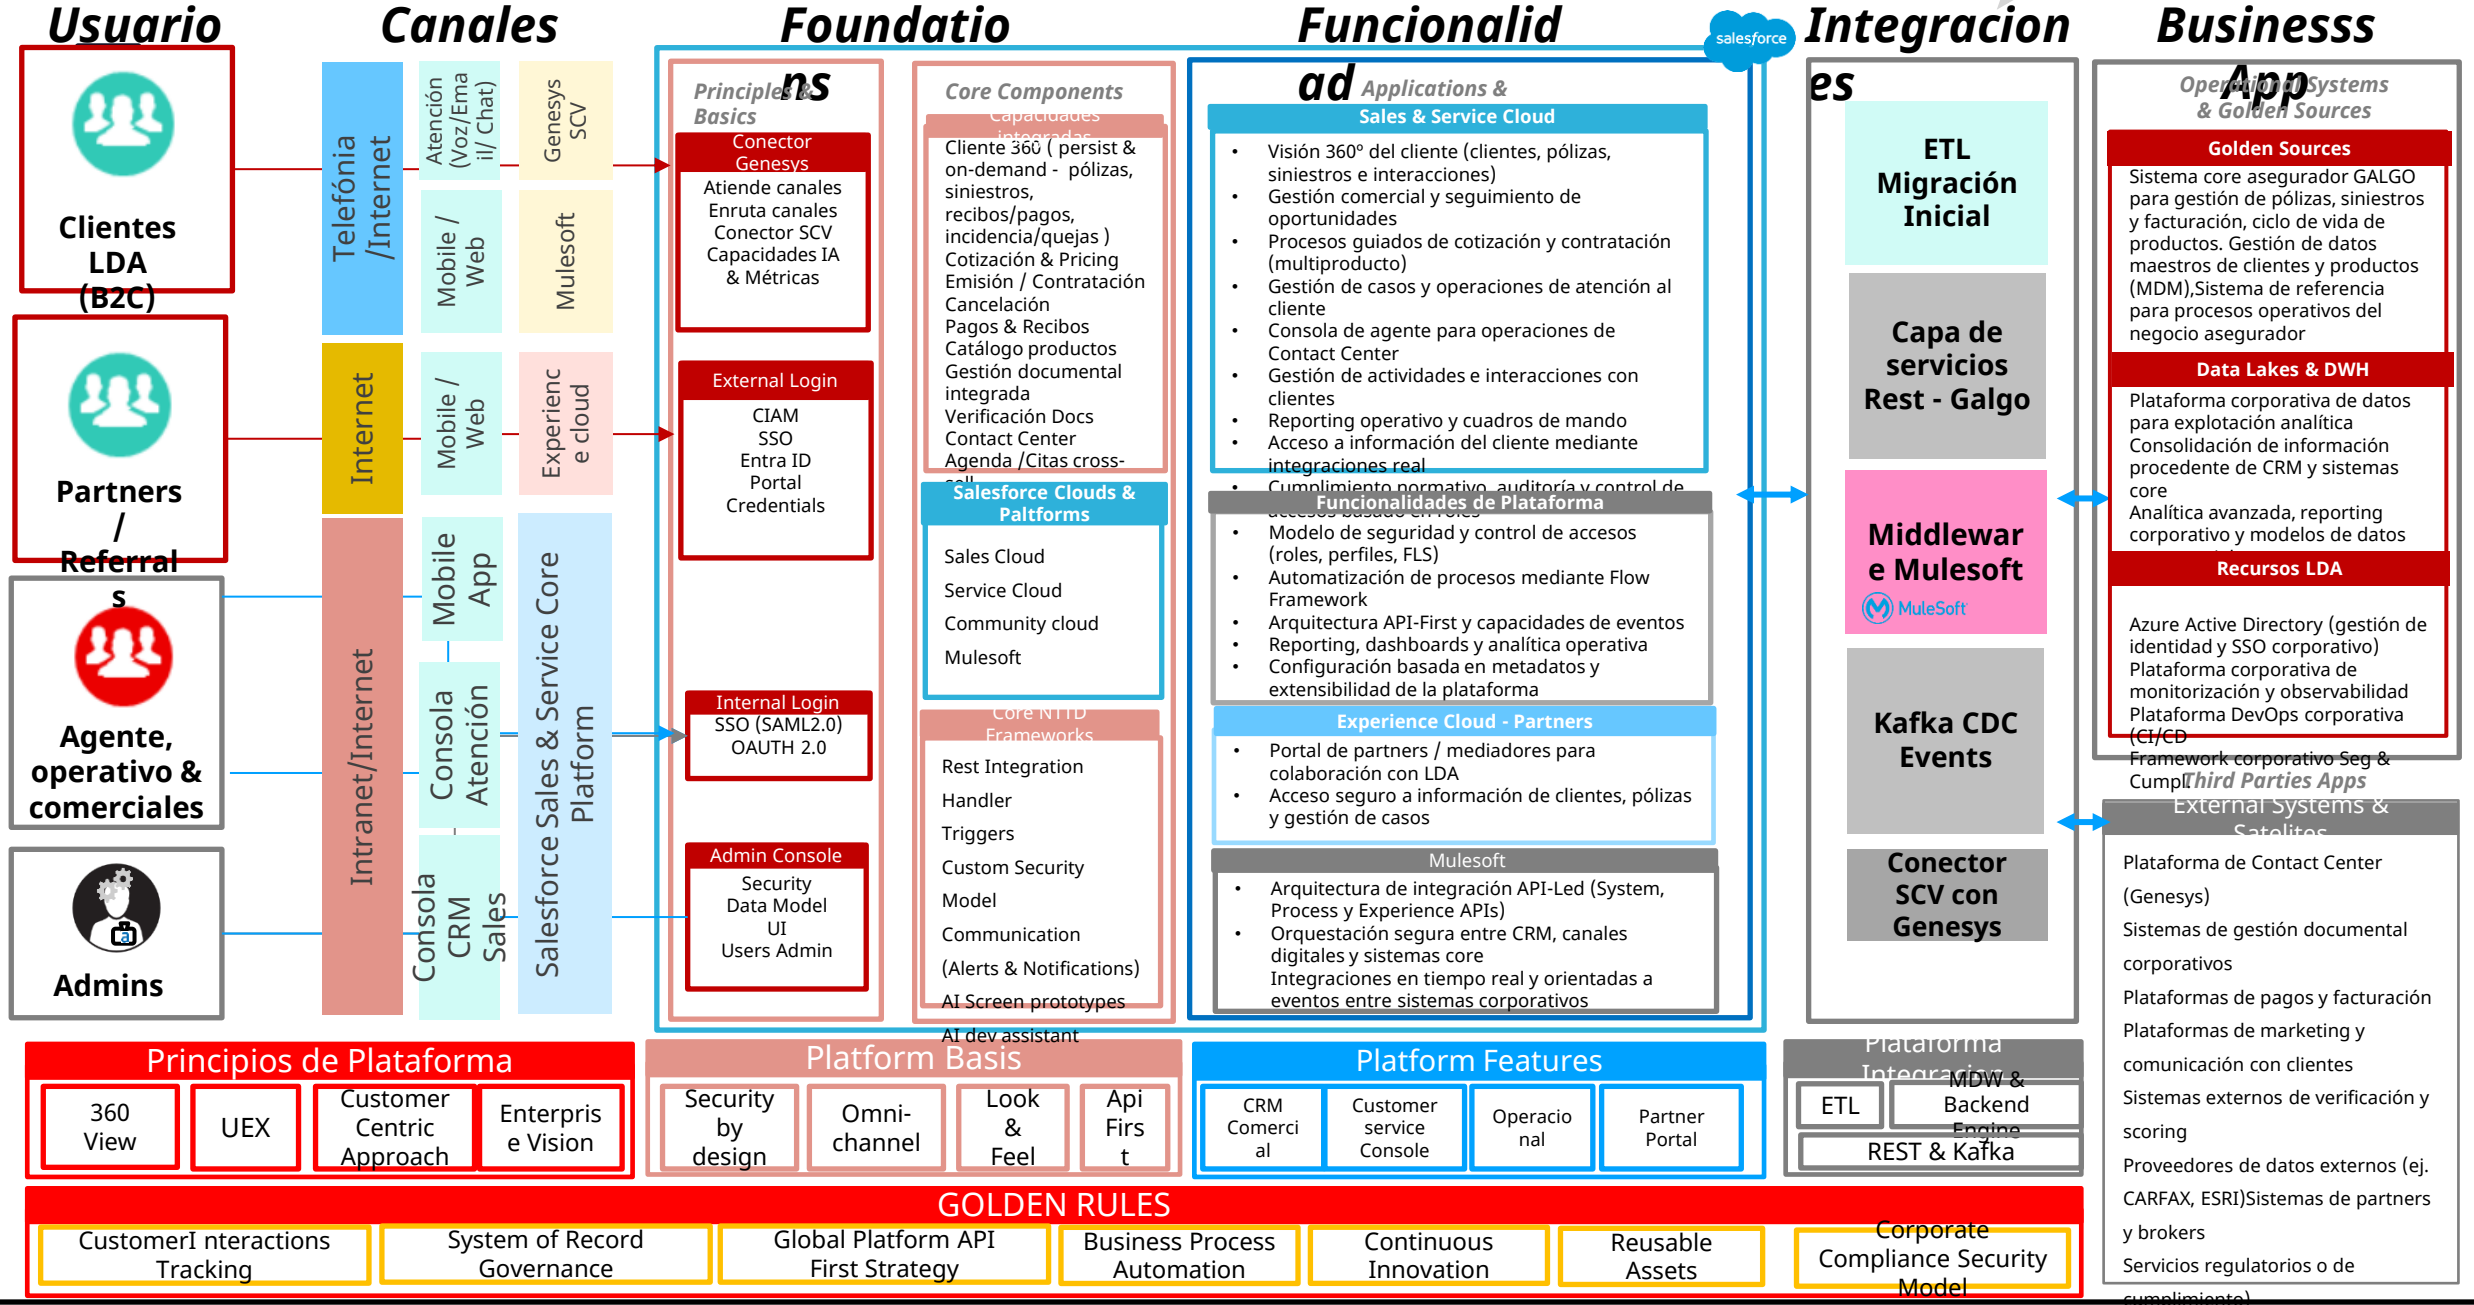

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica

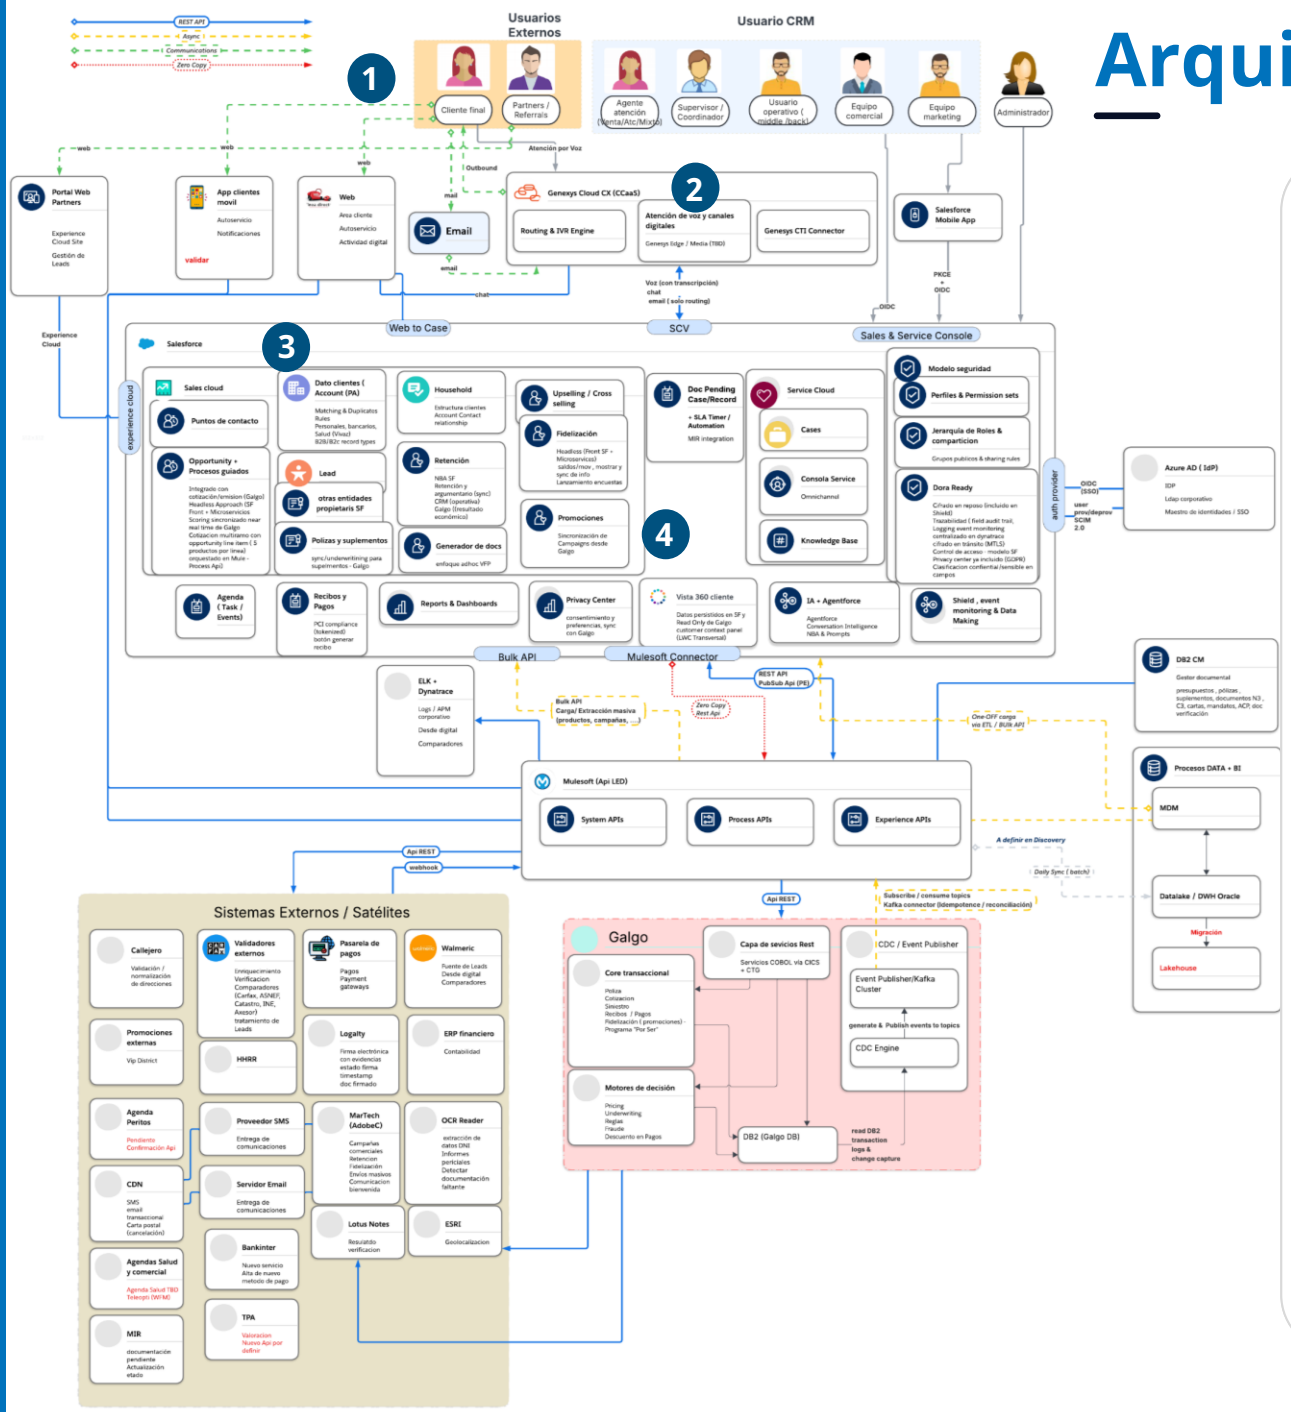

Bloques de arquitectura

1 Usuarios y Canales

- Acceso omnicanal de clientes
- Portal Experience cloud para partners nativamente integrado en Salesforce
- Interacción a través de web, app móvil, Canales digitales (chat,email) y voz.
- Canales de atención (voz, chat,email) gestionados por Genesys e integrados mediante conector SCV
- Experiencia consistente entre canales digitales y atención asistida.
- Captura de solicitudes, consultas y eventos de cliente hacia el CRM.
- Base para iniciar procesos comerciales, operativos y de atención.

2 Genesys Cloud (CCaaS)

- Gestión centralizada de todos los canales de atención.
- Routing inteligente de interacciones. mediante IVR y reglas de negocio.
- Integración con Salesforce mediante conector CTI – SCV.
- Gestión de voz, chat y email con contexto del cliente.
- Transcripción automática y análisis de sentimiento de conversaciones.
- CRM actúa como sistema de gestión mientras Genesys orquesta la interacción.

3 Salesforce CRM Core (Sales + Service Console)


- Plataforma central para la gestión comercial y operativa.
- Consola unificada para agentes, supervisores y equipos comerciales.
- Gestión de oportunidades, casos, actividades y procesos de cliente.
- Soporte a procesos de venta, atención, retención y seguimiento.
- Vista contextual del cliente integrada en todos los procesos.
- Punto de orquestación funcional entre canales, core asegurador y sistemas externos con apoyo de middleware.

4 Vista Cliente 360 + Modelo de Relación

- Modelo unificado de cliente para particulares y empresas.
- Gestión de identidad, deduplicación y calidad de datos.
- Relaciones cliente-hogar mediante modelo Household.
- Visión 360 del cliente con datos operativos y comerciales. (algunos persistidos y otros (read-only) en tiempo real.
- Base para personalización de interacciones y decisiones de negocio.
- Soporte a segmentación, campañas y gestión de cartera.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica

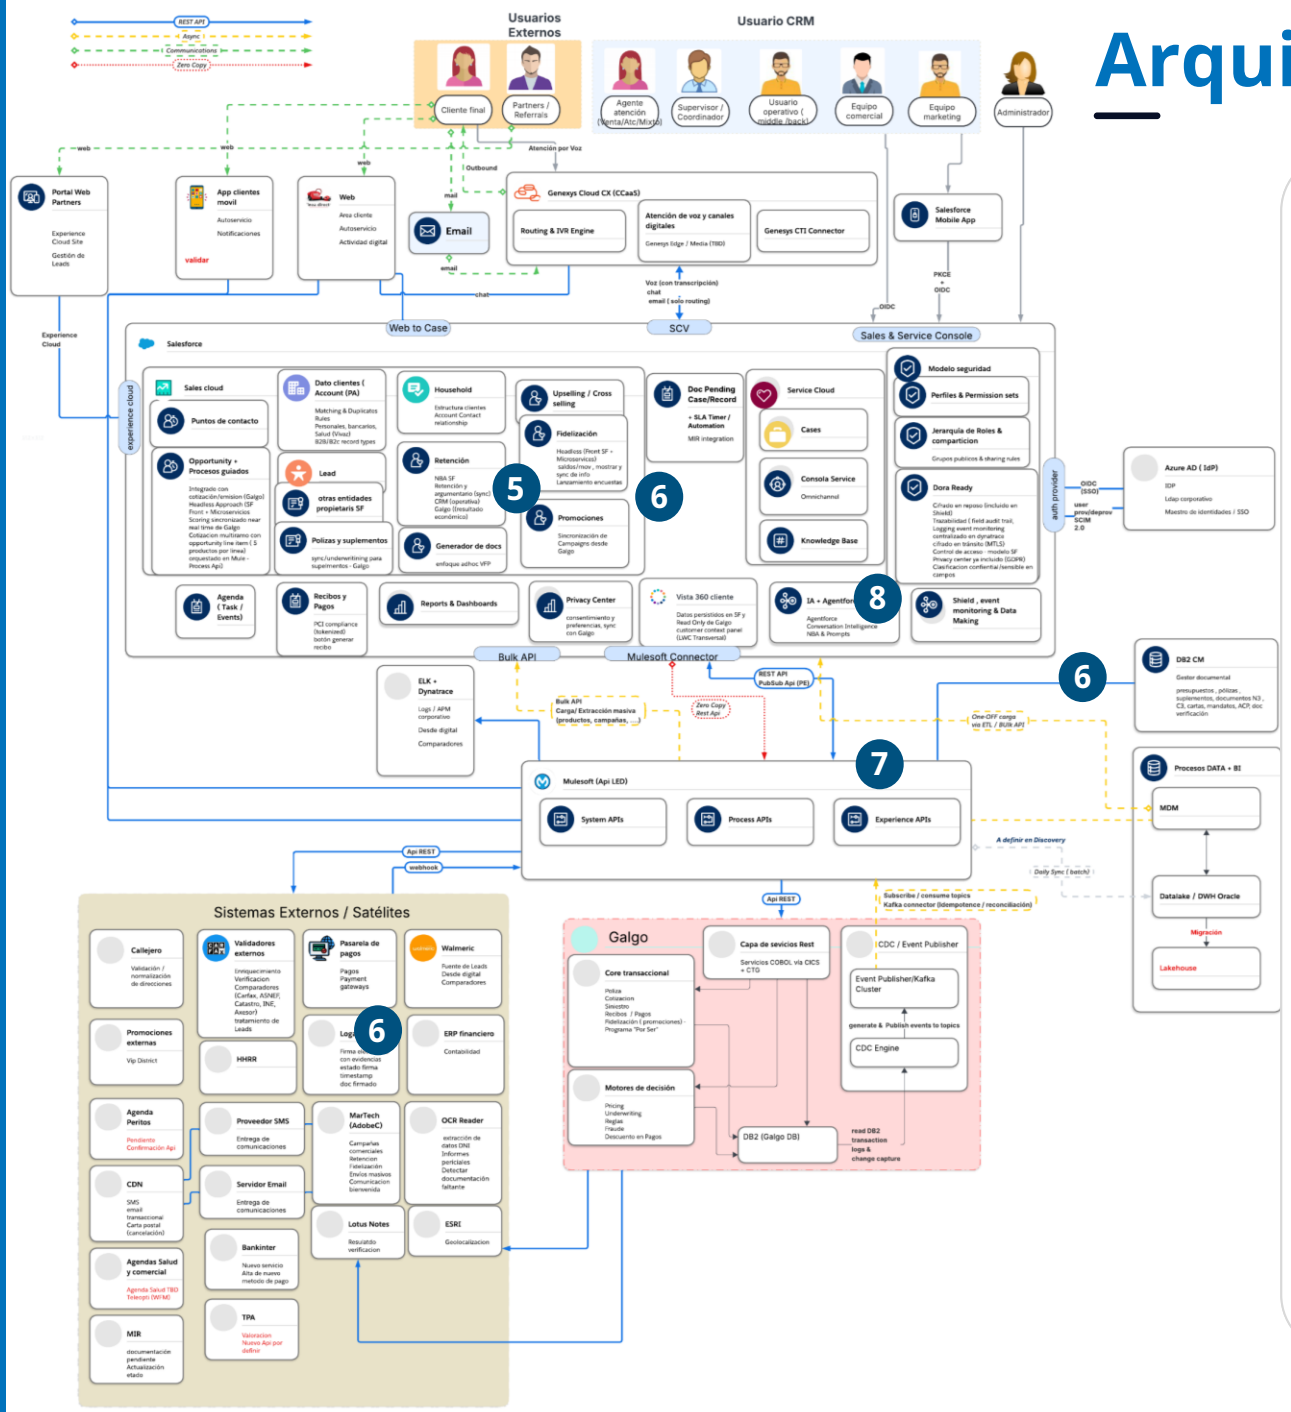

Bloques de arquitectura

5 Procesos CRM de Negocio

- Gestión de procesos comerciales y operativos desde el CRM.
- Soporte a cross-selling, upselling y fidelización de clientes.
- Orquestación de promociones internas y externas.
- Gestión de agenda comercial y coordinación con equipos especializados.
- Activación de campañas, encuestas y acciones de retención.
- Integración con motores de decisión del core para reglas de negocio.

6 Documentación, Evidencias y Firma

- Gestión de documentación asociada a clientes y pólizas.
- Integración con gestor documental corporativo para custodia de archivos. (DB2 CM)
- Captura de evidencias digitales (fotos y vídeos) durante procesos de verificación (almacenados en DB2CM y referenciados desde CRM
- Gestión de estados de documentación pendiente y validaciones.
- Firma digital de contratos mediante portal externo especializado (Logalty)
- Garantía de trazabilidad y cumplimiento normativo en procesos documentales.
- Generación de doc con VFP en Salesforce. Se evaluará en Discovery si la complejidad requiere de producto adicional.

7 Integración y orquestación (Mulesoft Api-led)


- Capa de integración que desacopla completamente el CRM del core asegurador y de los sistemas externos.
- Arquitectura API-led basada en System, Process y Experience APIs.
- Orquestación de procesos y transformación de datos entre plataformas.
- Gestión de resiliencia mediante retries, idempotencia, DLQ y control de errores.
- Consumo de eventos Kafka y exposición de APIs REST hacia el ecosistema.
- Punto central de gobierno e implementación de integraciones.

8 IA & Agentforce

- La solución incorpora capacidades de inteligencia artificial como componente transversal de la arquitectura.
- Se prioriza el uso de capacidades nativas de la plataforma Salesforce mediante Einstein y Agentforce.
- Las funcionalidades de IA apoyan procesos de atención, recomendación, resumen y asistencia al agente.
- El uso de la IA en la solución se rige por principios de control, trazabilidad y supervisión humana.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica

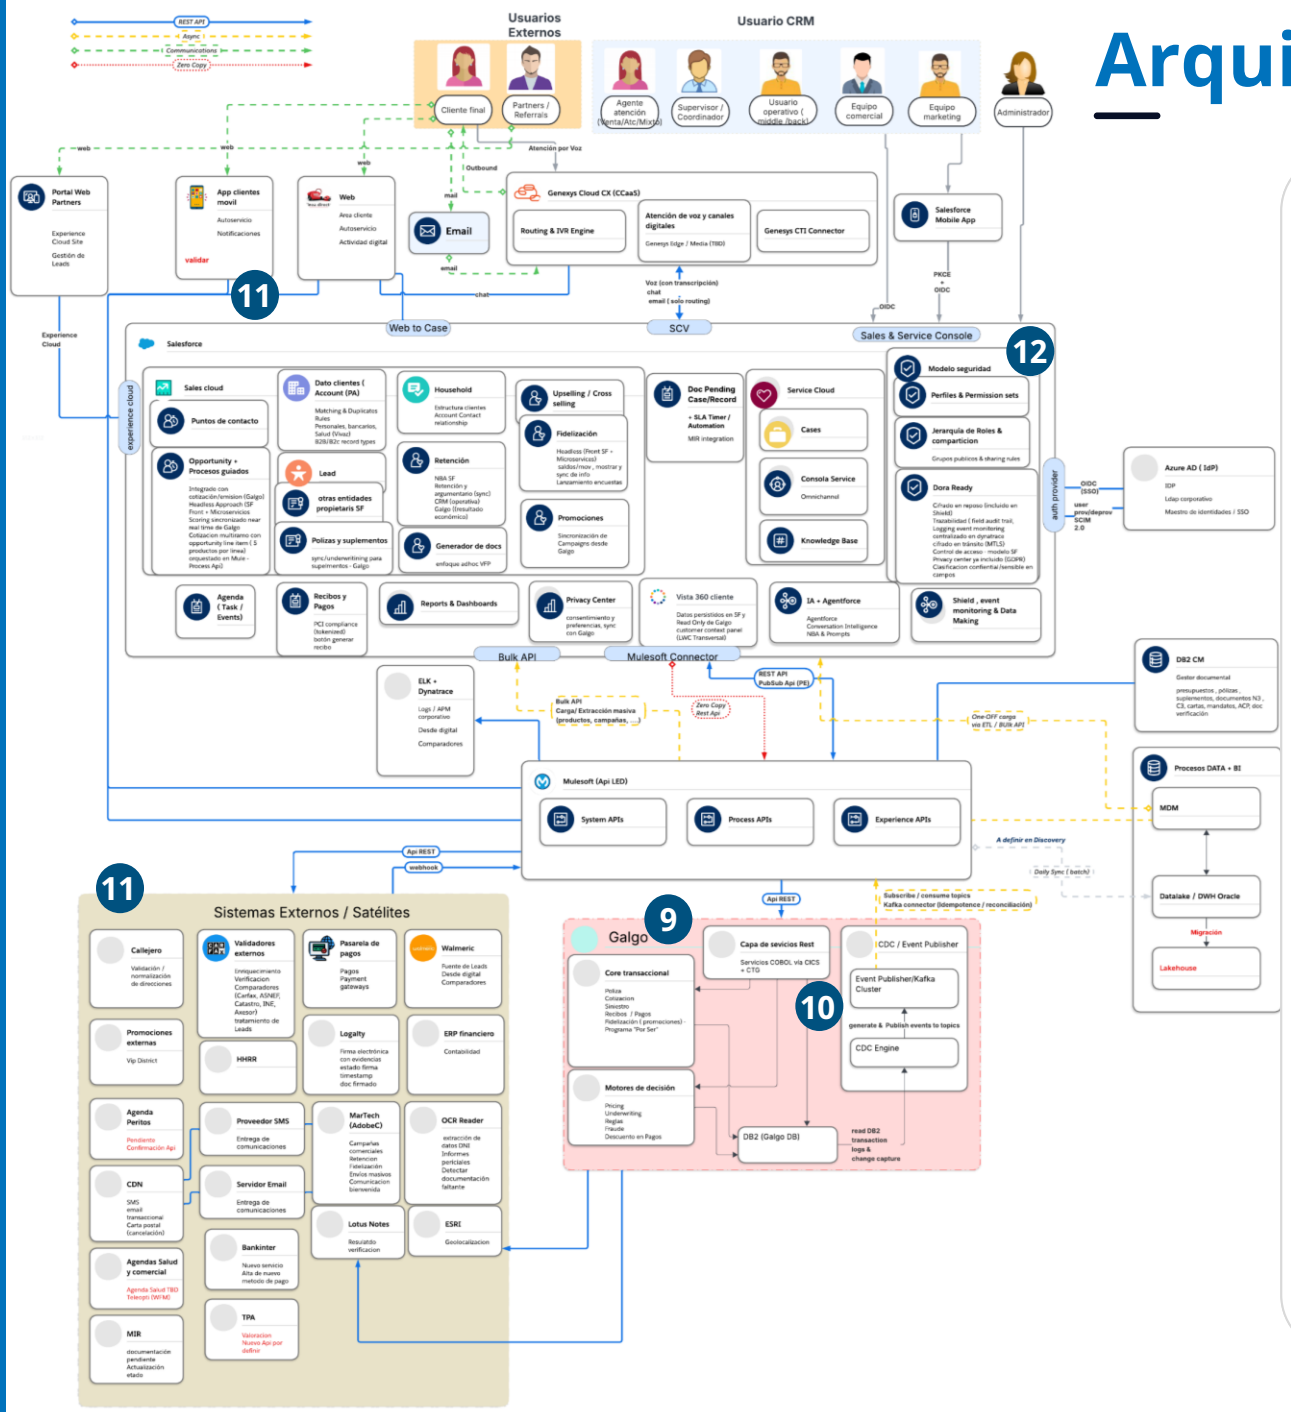

Bloques de arquitectura

9 Core Asegurador Galgo / Mainframe

- Sistema core responsable de la lógica de negocio aseguradora.
- Motores de decisión y pricing implementados en COBOL.
- Gestión de pólizas, suplementos, recibos, underwriting y reglas de negocio.
- Exposición de servicios mediante capa de APIs y servicios transaccionales.
- El CRM consume capacidades del core sin replicar lógica de negocio.
- Se define un enfoque recomendado por cada entidad y proceso a sincronizar (real time/batch, con/sin persistencia)

10 CDC y Streaming de eventos (Kafka)

- Publicación de eventos de negocio desde el core mediante CDC.
- Distribución de eventos a sistemas consumidores de forma desacoplada.
- Consumo de eventos en MuleSoft para sincronización con el CRM.
- Soporte a procesamiento near real-time y arquitectura orientada a eventos.
- Gestión de idempotencia y tolerancia a duplicados en el consumo.

11 Sistemas Externos y servicios satélite


- Conjunto de sistemas especializados integrados con la plataforma CRM.
- Incluye validadores externos, pasarela de pagos, geolocalización, marketing y comunicaciones,etc.
- Integración con sistemas corporativos como DB2 Content Manager, Lotus Notes o MIR.
- Nuevos sistemas como Bankinter o TPA han sido incluidos para integrarse Via API.
- La mayoría de integraciones se realizan a través de la capa Middleware (MuleSoft)
- Permite extender capacidades sin acoplar el CRM a sistemas legacy.

12 Seguridad, Identidad y Cumplimiento

- Gestión centralizada de identidad mediante Entra ID como proveedor de identidad.
- Autenticación basada en estándares OIDC / OAuth2 para aplicaciones y APIs.
- Modelo de seguridad de Salesforce basado en perfiles, roles y permisos.
- Protección de datos mediante Salesforce Shield y cifrado en reposo.
- Trazabilidad, auditoría y control de accesos para cumplimiento regulatorio.
- Cumplimiento de requisitos DORA, GDPR y gestión de datos sensibles.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica

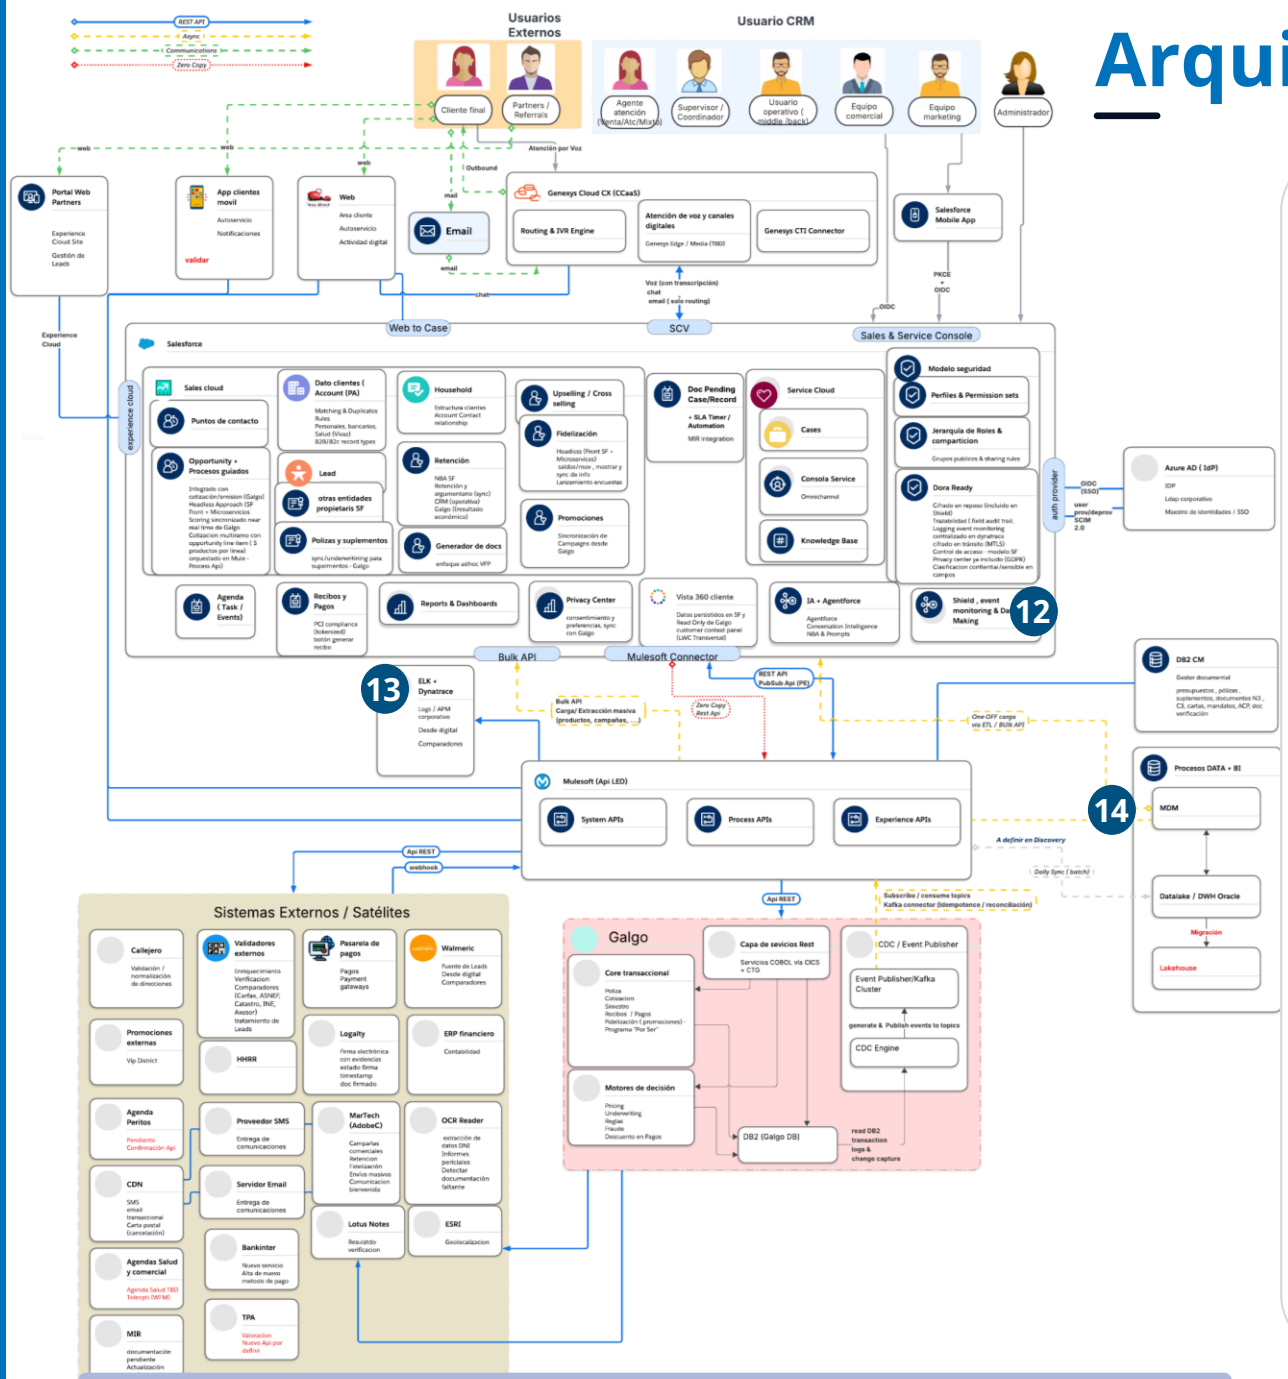

Bloques de arquitectura

13 Observabilidad y Monitorización

- Monitorización centralizada de la plataforma y las integraciones.
- Recopilación de logs, métricas y trazas mediante capacidades Salesforce (event monitoring & Audit Trail) y Mulesoft.
- Integración con Dynatrace y ELK para análisis operativo a través de Mulesoft.
- Trazabilidad end-to-end de transacciones mediante identificadores de correlación.
- Detección temprana de incidencias y soporte a operación continua.

14 Datos, Analítica y Lakehouse

- Se mantendrá la integración con Lakehouse y DWH corporativo para reporting y explotación analítica.
- La arquitectura separa claramente procesamiento transaccional (CRM/Core) y procesamiento analítico (Lakehouse/DWH)
- El CRM actuará como fuente adicional de datos operacionales, manteniendo la coherencia con los modelos actuales de explotación (con apoyo de mulesoft, a definir durante Discovery).

15 Gobierno TI y Operación (ITSM)

- La solución se alinea con los procesos corporativos de gobierno TI basados en ServiceNow.
- El sistema CRM se registrará como Configuration Item dentro de la CMDB corporativa.
- La gestión de cambios se realizará mediante los procesos estándar de ServiceNow.
- No se contempla integración técnica directa entre Salesforce y ServiceNow en esta fase.
- El modelo operativo seguirá un enfoque ligero basado en procedimientos manuales.
- La arquitectura permite evolucionar hacia una integración más avanzada si fuese necesario.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica: Premisas

Premisas técnicas

Core asegurador como sistema maestro

- El core asegurador continúa siendo el sistema maestro para pólizas, pricing y reglas de negocio.
- El CRM actúa como sistema de interacción y orquestación de procesos.
- Las decisiones críticas se ejecutan siempre en el core.

Integración mediante capa middleware

- Todas las integraciones entre CRM y sistemas corporativos se realizan a través del middleware.
- La capa de integración gestiona transformación, orquestación y resiliencia.
- Se evita la creación de integraciones punto a punto.

Consumo de eventos Kaffka

- Los eventos generados por el core serán publicados mediante Kafka.
- El middleware actuará como consumidor y adaptador de estos eventos hacia el CRM.
- Se contemplan mecanismos de idempotencia y control de duplicados.

Sistemas satélite integrados mediante APIs

- Los sistemas externos se integran principalmente mediante APIs REST.
- La capa de integración abstrae las particularidades técnicas de cada sistema.
- Esto permite evolucionar sistemas satélite sin impactar directamente al CRM.

Gestión documental corporativa y generación de documentos

- La custodia de documentos se mantiene en el gestor documental corporativo.
- El CRM únicamente consulta o referencia documentos mediante APIs.
- Se ha estimado la generación de plantillas de documento no complejas con VFP, incluido en el modelo de licencias propuesto. En Fase de Discovery se evaluará si se requiere producto/add-on adicional en caso de no cumplirse la premisa de baja complejidad.

Integración con DataLake

- La nueva solución disponibilizará los datos operacionales hacia el Data Lake corporativo manteniendo un enfoque equivalente al actual utilizado por Galgo, evitando impactos en los procesos analíticos existentes.
- En una primera versión se limitará la extracción a un conjunto acotado de entidades CRM (p. ej. clientes, oportunidades, interacciones, actividades y casos).
- El modelo definitivo de publicación y consumo de datos se validará durante la fase de Discovery.
- En Discovery se definirán entidades, mecanismos de extracción (batch/eventos/API) y frecuencia de actualización hacia el Lakehouse.
- La publicación de datos seguirá los estándares corporativos de gobierno del dato, garantizando trazabilidad y compatibilidad con el modelo analítico actual.

Decisiones arquitectónicas Clave

CRM como plataforma de interacción

- Salesforce se posiciona como plataforma de interacción con clientes y usuarios internos.
- El CRM gestiona experiencia, procesos comerciales y atención al cliente.
- La lógica de negocio crítica permanece en el core asegurador.
- Se adopta Sales Cloud y Service Cloud como base funcional del CRM, priorizando un modelo ligero y flexible de interacción, ya que las capacidades específicas de gestión de pólizas y lógica aseguradora permanecen en los sistemas core de la compañía, no justificándose a priori el uso de FSC.
- Este enfoque evita duplicar capacidades de negocio propias del core y permite una integración más clara y gobernada entre plataformas, optimizando uso de licencias.

Arquitectura API-led para integraciones

- La capa de integración se implementa mediante arquitectura API-led (Modular y escalable)
- Las integraciones se estructuran en System APIs, Process APIs y Experience APIs. Esto facilita incorporación de nuevos sistemas y canales.
- Este modelo facilita reutilización y la evolución del ecosistema sin grandes cambios estructurales.

Enfoque headless para integración de componentes

- La integración con capacidades Core existentes se plantea mediante enfoque headless.
- Las funcionalidades se exponen como servicios consumidos desde la interfaz del CRM.
- Esto permite una experiencia de usuario integrada y desacoplada del frontend legacy, minimizando dependencias y riesgos de incompatibilidad.

Iframe como alternativa temporal condicionada

- El uso de iframe se contempla únicamente como alternativa táctica.
- Su adopción dependerá del resultado del análisis técnico en fase de diseño.
- En caso de utilizarse, se definirá un plan de evolución y transición a CRM


Integración y gestión de datos

- **Principio Zero Copy**. Se prioriza evitar duplicación innecesaria de datos, consultando la información en origen siempre que sea posible y almacenando en CRM solo los datos necesarios para la operativa.
- **Evaluación de integración event-driven Salesforce**. En Discovery se evaluará el uso de Pub/Sub API y Platform Events de Salesforce como complemento al enfoque REST para integraciones entre el CRM y middleware con requisitos de volumen, latencia o desacoplamiento.
- **Dependencia de middleware.** La arquitectura asume una capa de middleware para la orquestación de integraciones; en caso de no estar disponible inicialmente, o ser parte de otro proyecto independiente, podría requerirse un ajuste de esfuerzo para habilitar integraciones temporales o adaptaciones desde el CRM

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica: Integración con el CC

Se contempla como parte del alcance, la **Integración de Salesforce Service Cloud con Genesys Cloud** para habilitar una experiencia unificada de atención al cliente a través de los canales de voz, chat y email, sincronizando las interacciones y los casos en el CRM.

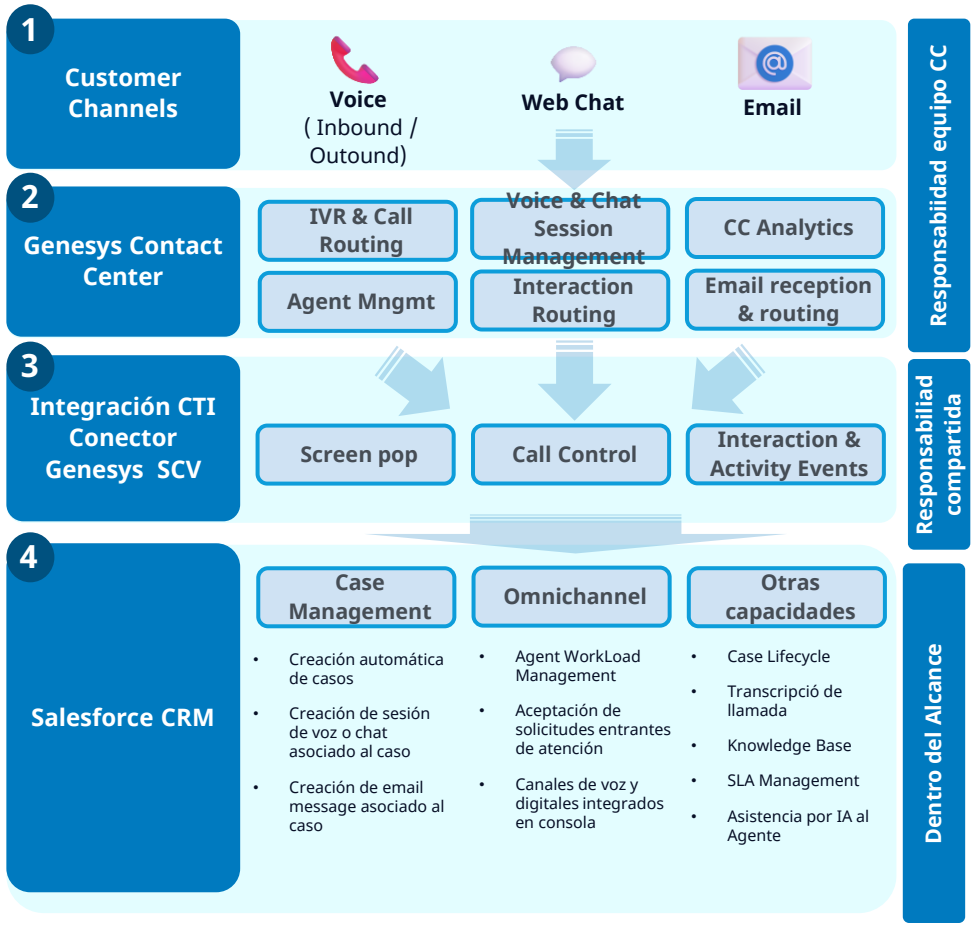

Bloques de la solución

1 Customer Channels

- Canales de contacto: telefonía, chat web y correo electrónico
- Punto de entrada único para interacciones de clientes
- Integración con plataforma de contact center Genesys
- Inicio de interacciones sincronizadas posteriormente en CRM

2 Genesys Cloud (Contact Center)

- Plataforma principal de contact center y gestión de interacciones
- Enrutamiento de llamadas, chats y correos entrantes
- Gestión de agentes, sesiones de voz y chat
- Integración CTI con Salesforce para sincronizar interacciones

3 Integración CTI – Salesforce

- Se contempla conector SCV para integración entre Genesys y Salesforce
- Screen pop con contexto de cliente en CRM
- Sincronización automática de llamadas y sesiones de chat
- Envía eventos de interacción al CRM

4 Atención en CRM

- Los canales son atendidos/recepcionados por Genesys e integrados directamente en la consola de servicios donde se visualizará el email creado, chat en curso, o llamada en curso con transcripción en tiempo real
- Consola omnicanal para gestión de solicitudes entrantes
- Automatización, conocimiento y asistencia al agente con IA

© 2026 NTT DATA, Inc.


Arquitectura Técnica: Data Flow & Mastery

Dominio	Entidad	Sistema Maestro	Origen	Destino	Tipo de flujo	Tecnología	Observaciones
Cliente	Account (Person Account)	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo), Lakehouse	Near real-time	MuleSoft API	Cliente gestionado en CRM
Cliente	Contact	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo), Lakehouse	Near real-time	MuleSoft API	Datos de contacto
Cliente	ContactPointAddress / Email / Phone	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Near real-time	MuleSoft API	Canales de contacto
Cliente	Individual	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Near real-time	MuleSoft API	Datos personales y privacidad
Cliente	Household	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Near real-time	MuleSoft API	Agrupación de cliente
Cliente	AccountContactRelation / Party Role	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Near real-time	MuleSoft API	Relaciones entre entidades
Comercial	Lead	Salesforce	Salesforce	Lakehouse	Batch / Event	MuleSoft Job	Captación de clientes
Comercial	Opportunity	Salesforce	Salesforce	Core (cotización), Lakehouse	Near real-time	MuleSoft API	Gestión del proceso comercial
Comercial	Quote	Galgo	Salesforce	Core (Galgo)	Real-time & kafka de vuelta	MuleSoft API /kafka	Solicitud de cotización, se inicia peticion en sf y galgo como maestro manda actualizaciones
Comercial	Quote Line Item	Galgo	Salesforce	Core (Galgo)	Real-time & kafka de vuelta	MuleSoft API /kafka	detalle de cotización, util en presupuestos multiramo. se inicia peticion en sf y galgo como maestro manda actualizaciones
Comercial	Campaña	Salesforce	Salesforce	Lakehouse, Martech	Batch	MuleSoft Job	Gestión de campañas
Comercial	Miembros de campaña	Salesforce	Salesforce	Lakehouse, Martech	Batch	MuleSoft Job	Participación en campañas
Producto	Product2	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Batch / Event	Kafka / MuleSoft	Catálogo de productos publicado desde Galgo
Producto	Pricebook2 / PricebookEntry	Salesforce	Salesforce	No sincroniza	N/A	N/A	Pricebook base técnico en CRM – Base (no utilizable)
Producto / Cotización	Entidades Motor Pricing Galgo	Core (Galgo)	Galgo	Salesforce	Real-time	MuleSoft API	Consulta de pricing durante cotización (read only)
Pólizas	Póliza	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Event-driven	Kafka	Maestro de pólizas
Pólizas	Coberturas	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Real-time	MuleSoft API	Consulta de coberturas (read only)
Pólizas	Asset (objeto asegurado)	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Event-driven	Kafka	Activo asegurado
Siniestros	Claim	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Event-driven	Kafka	Gestión de siniestros

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica: Data Flow & Mastery

Dominio	Entidad	Sistema Maestro	Origen	Destino	Tipo de flujo	Tecnología	Observaciones
Servicio	Case	Salesforce	Salesforce	-	Local	Salesforce	Gestión de incidencias
Servicio	Entitlement / Milestone	Salesforce	Salesforce	-	Local	Salesforce	Gestión de SLA
Interacción	Interaction / Conversation (voice call , messaging session, mail)	Salesforce	Genesys	Salesforce	Near real-time	API / Connector	Registro de interacciones
Actividades	Task / Event	Salesforce	Salesforce	Lakehouse	Batch	MuleSoft Job	Actividades del cliente
Experiencia	Survey	Salesforce	Salesforce	Lakehouse	Batch	MuleSoft Job	Encuestas de satisfacción
IA / CRM	NBO_Recommendation__c	Core	Core	Salesforce	Batch	MuleSoft Job	Recomendaciones para NBA
Documentos	Registro documental (metadata + enlace)	DB2 CM	DB2 CM	Salesforce	On-demand	REST API	Documentos fuera de CRM
Workflow	Approval	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Near real-time	MuleSoft API	Flujos de aprobación
Comercial	Opportunity Scoring	Core (Galgo)	Core (Galgo)	Salesforce	Event-driven	Kafka → MuleSoft	Score de oportunidad
Contrato	Solicitud alta/modificación/cancelación	Core (Galgo)	Salesforce	Core (Galgo)	Real-time	MuleSoft API	CRM inicia operación
Geolocalización	Geolocalización cliente	ESRI (vía Galgo)	Salesforce	Galgo → ESRI	Real-time	MuleSoft API	Patrón SF → Galgo → ESRI
Salud	Appointment / Cita Cross-sell	Sistema agenda/WFM	Salesforce	WFM / Agenda Salud	Bidireccional	MuleSoft API	CRM orquesta disponibilidad
Pagos	Payment Method	Bankinter	Salesforce	Bankinter	Real-time + callback	MuleSoft API / Webhook	Tokenización fuera de CRM
Pagos	Payments / Recibos y facturas	Payment Gateway	Salesforce	Gateway / Galgo	Real-time	MuleSoft API	Integración financiera, eventos eviados desde sf y consulta desde galgo (read only
Underwriting	Consulta Riesgos	Core / motores LDA	Salesforce	Core / motores	Real-time	MuleSoft API	Consulta bajo demanda
Operación	Doc Pending / MIR (mara en referencias doc)	MIR	Salesforce	MIR	Bidireccional	MuleSoft API	Estados OK/Asumido + SLA
Valoración	TPA (nuevo)	TPA	Salesforce	TPA	Real-time + async	MuleSoft API / Events	API pendiente disponibilidad
Fidelización	Fidelización	Galgo	Galgo	Salesforce	Read-only	REST API / Kafka	Vista en CRM (read only), lógica en Core. No se descarta algun update relacionado con otras entidades via kafka
Riesgos	Riesgos (perfil/score)	Galgo	Galgo	Salesforce	Read-only	REST API	Consulta durante cotización
Operaciones	Orders	Salesforce	Salesforce	Core (Galgo)	Event / API	MuleSoft API	Solicitudes comerciales
Atención	Avisos	Salesforce	Salesforce	Core / Contact Center	Event / API	MuleSoft API	Notificaciones operativas

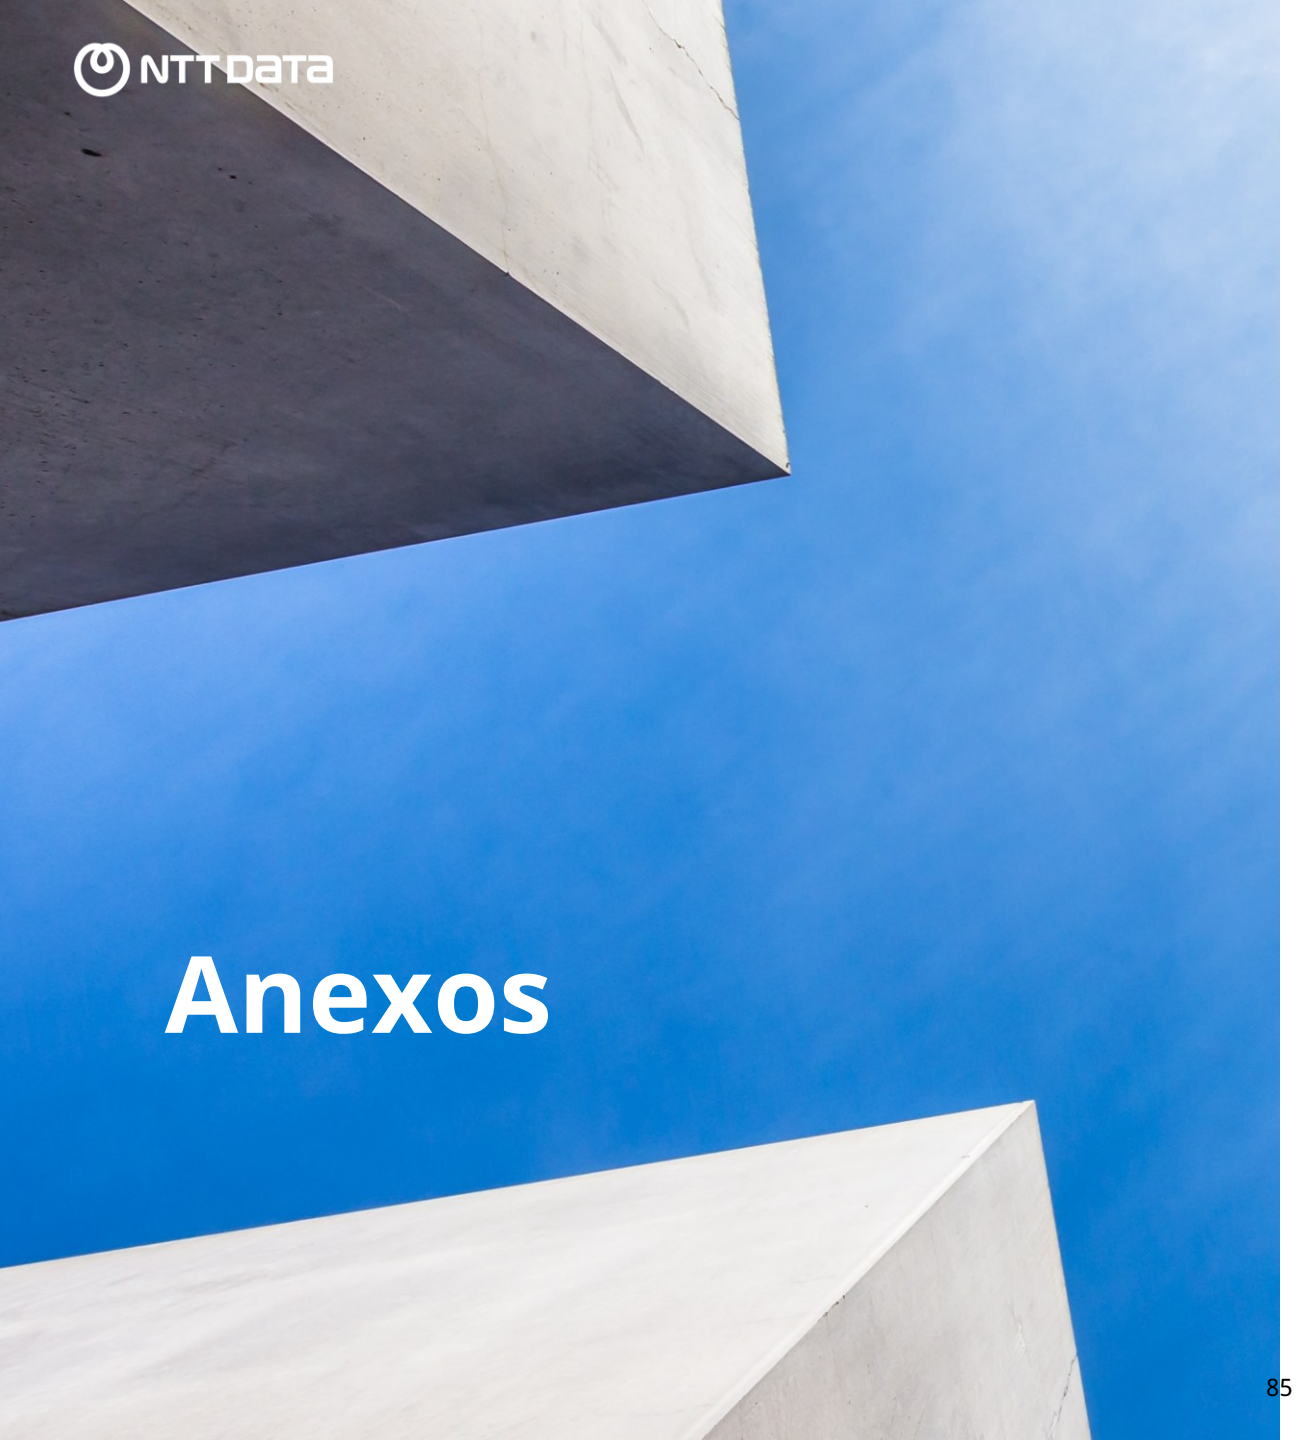

Anexos

Integración continua

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura Técnica: Integración continua

NTT DATA propone el uso de **herramientas DEVOPS y automatización** para una correcta gestión del ciclo de vida de la aplicación, de forma escalable y segura:


- ✓ Se propone seguir un desarrollo basado en fuentes (source driven development) donde se usará **repositorio GIT** como maestro de fuentes.
- ✓ Esta herramienta permitirá detectar cambios, validarlos y ser finalmente desplegados contra cada entorno mediante el uso de SFDX.
- ✓ Se propone el uso de **GitHub** como repositorio de código.
- ✓ Se propone el uso de **GitHub Actions** para la construcción del pipeline de integración.

Dentro del alcance **se han contemplado las siguientes tareas**:

- ✓ Configuración de repositorio GIT con estructura de ramas alineada con los sandboxes generados.
- ✓ Configuración de pipeline de integración continua mediante GitHub Actions (descrito en la siguiente página del documento).
- ✓ Despliegue de scripts básicos para interacción de orquestador con sfdx y otras herramientas de soporte para el ciclo CI.
- ✓ La configuración y ejecución del Análisis Estático de Código, considerando las siguientes herramientas: PMD, Salesforce Code Analyzer y jslint.
- ✓ Un documento de configuración y metodología de despliegue.
- ✓ Detalle con el listado de componentes no soportados por el API de metadatos y que tendrán que ser desplegados de forma manual.

Adicionalmente, se detallan algunas **consideraciones relevantes** a tener en cuenta:

- ✓ Se definirá durante la fase de Discovery la estrategia de entornos y ramificación que mejor se adapte al escenario de LDA.
- ✓ Se considera que las herramientas indicadas han sido proporcionadas por LDA , previo a la fase de implementación.
- ✓ El proceso repositorio y pipeline de integración estará listo para ser utilizado al inicio de la fase de Implementación.
- ✓ No se considera como parte del alcance la creación de pruebas automatizadas.

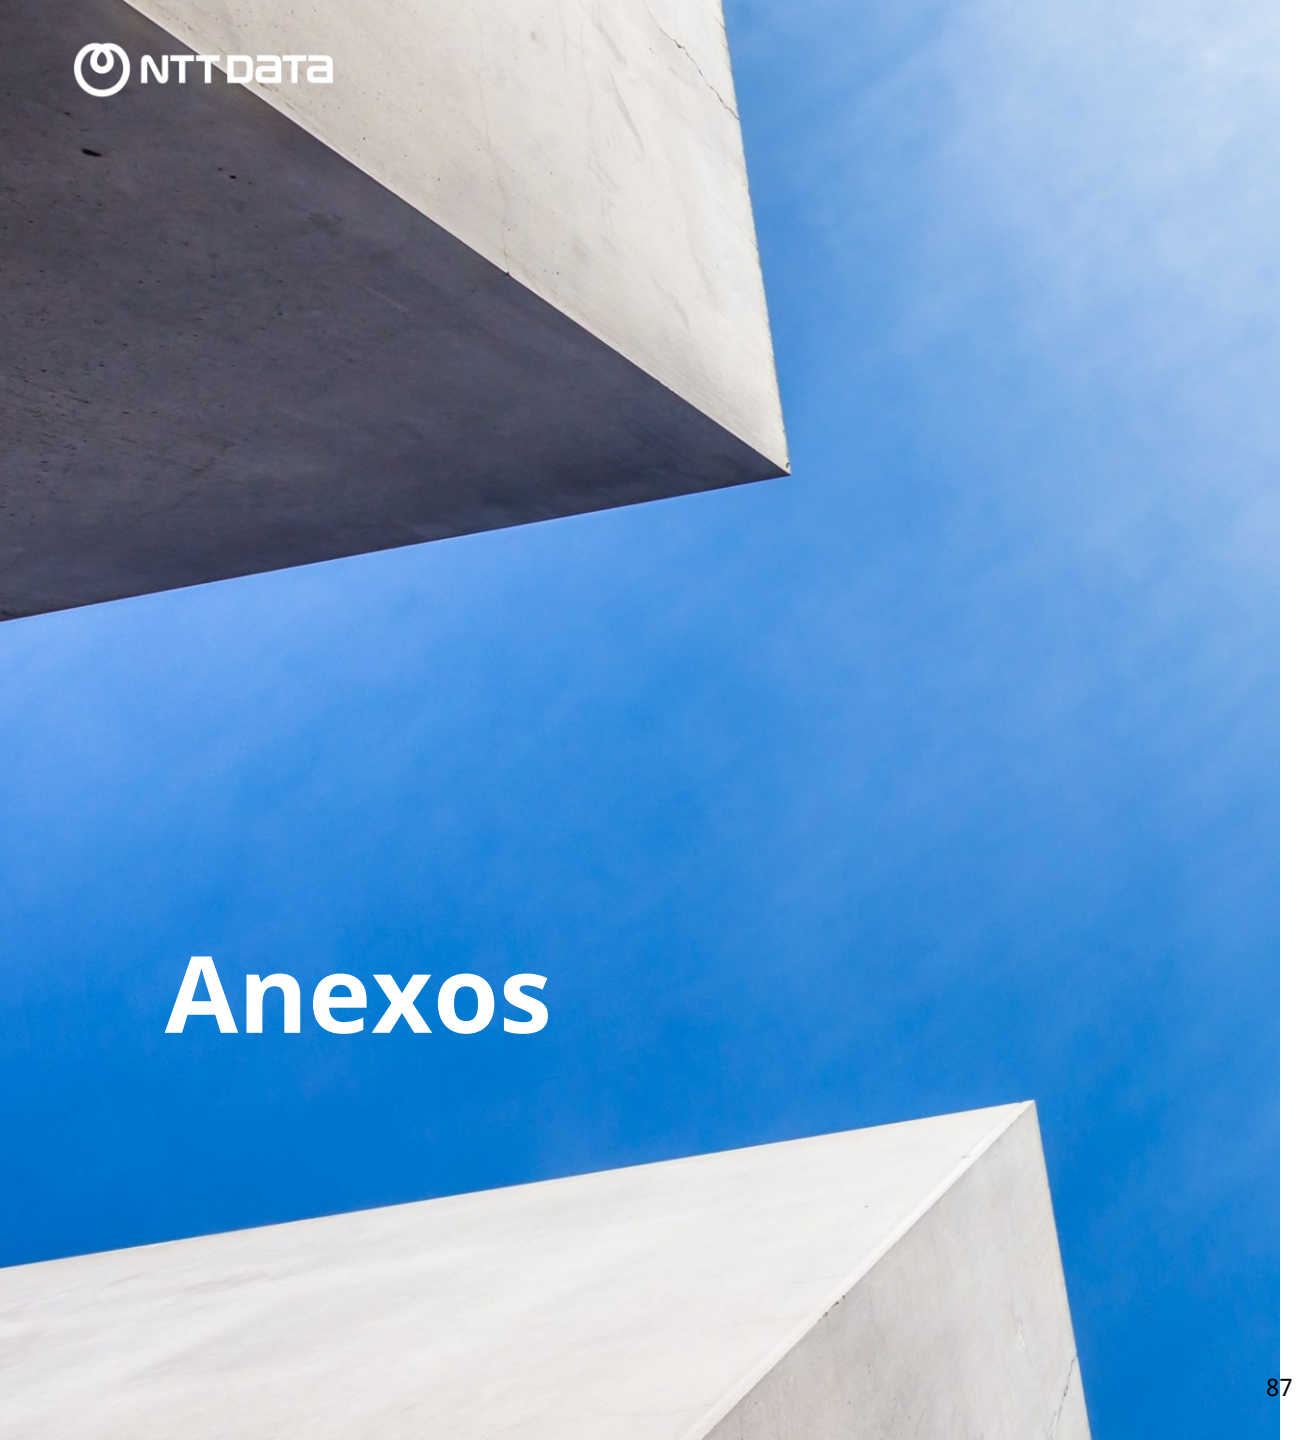

Anexos

Arquitectura de integración - Alcance

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de Integración: Alcance general propuesto

El siguiente alcance propuesto por NTT DATA clarifica las actividades **incluidas y excluidas en la capa de integración del proyecto**

✅ Incluido en el alcance	❌ Fuera del alcance
Desarrollo de APIs e Integraciones	**Setup Plataforma MuleSoft / Anypoint**
Desarrollo de APIs (Experience / Process / System)	Business Groups
Implementación de lógica de negocio	Configuración entornos (dev/test/prod)
Construcción de flujos de integración	Private Spaces / VPC
Integración con sistemas backend (SAP, Salesforce, OMS, etc.)	Red, firewall y conectividad
Configuración funcional en APIs	SSO, usuarios y roles
Aplicación de políticas de seguridad estándar	**Seguridad corporativa y gobierno**
Configuración de políticas específicas por API	Modelo organizativo y roles
Parametrización técnica necesaria	Flujos de aprobación
Testing técnico	Modelo de seguridad corporativo
Pruebas unitarias	Estándares y naming conventions
Pruebas de integración	Implementación C4E / Oficina Técnica
Validación técnica del servicio	**DevOps y CI/CD**
Documentación técnica	Pipelines CI/CD
Documentación funcional/técnica	Estrategia versionado / branching
Especificaciones RAML / OpenAPI	**Monitorización y operación**
Diagramas de integración	Anypoint Monitoring
Soporte en validación técnica	KPIs y dashboards
Ajustes derivados de pruebas	Gestión de logs
Corrección de defectos	Soporte operativo continuo

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de Integración: Interfaces

ID interfaz	Proceso	Fase	Nombre flujo interfaz	Dirección	Tipo	Middleware / Connector	Estado API	Datos/SLA/Latencia / Detalle Notas
INT-001	Alta de cliente (potencial)	Ola 0	Enriquecimiento datos cliente externos	CRM → Proveedores externos	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Propaga aceptación al Core
INT-002	Alta de cliente (potencial)	Ola 0	OCR DNI	CRM → OCR/IDP	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Cambios operativos enviados a Core
INT-003	Alta de cliente (potencial)	Ola 0	Validación de dirección / callejero	CRM → Callejero	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Inicio de suplemento y validaciones
INT-004	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta cancelaciones	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Alta de medio de pago y estado de solicitud
INT-005	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta fidelización	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	KPIs operativos; histórico opcional
INT-006	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta incidencias	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Carga / migración de campañas internas
INT-007	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta más detalle póliza	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Notificaciones transaccionales (SMS / email)
INT-008	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta quejas	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Alta, modificación o cancelación de cita
INT-009	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta recibos y pagos	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Confirma oferta con impacto contractual
INT-010	Ficha Cliente 360	Ola 0	Consulta siniestros	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Consulta documental y referencia en CRM
INT-011	Ficha Cliente 360	Ola 0	Envío oportunidad / nueva negociación	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Solo disponibilidad
INT-012	Ficha Cliente 360	Ola 0	OCR informes periciales	CRM → OCR/IDP	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Solo lectura; sin persistencia en CRM
INT-013	Ficha Cliente 360	Ola 0	Sincronización cabecera póliza	Galgo → CRM	Event-driven	Kafka + MuleSoft	Disponible	Workspace operador. Consulta bajo demanda desde Core
INT-014	General / Cross procesos	Ola 0 + evolución en siguientes	Publicación documental a ECM	CRM → DB2 CM	Batch / Programado	MuleSoft Jobs / API	Disponible	Workspace y argumentario del operador
INT-015	Canal digital (capa transversal)	Ola 5 (evolutivo desde la 0)	Eventos web / portal / app	Canales digitales → CRM / Galgo	Near real-time / Batch	MuleSoft API	Por confirmar	Solo lectura; sin persistencia en CRM
INT-016	Cotización	Ola 1 - 3	Consulta riesgos	CRM → Motores riesgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Vista 360; Solo lectura; sin persistencia en CRM
INT-017	Cotización	Ola 1 - 3	Descuentos y campañas en pricing	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	VIP District u otros, Consulta de disponibilidad de promociones
INT-018	Cotización	Ola 1 - 3	Evaluación de riesgo / underwriting	CRM → Motor riesgo	Real-time + Async	MuleSoft API + Events	Por confirmar	Vista 360; Solo lectura; sin persistencia en CRM

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de Integración: Interfaces

ID interfaz	Proceso	Fase	Nombre flujo interfaz	Dirección	Tipo	Middleware / Connector	Estado API	SLA/Latencia / Detalle Notas
INT-019	Cotización	Ola 1 - 3	Opportunity Scoring	Galgo → CRM	Event-driven	Kafka + MuleSoft	Disponible	Solo lectura; sin persistencia en CRM
INT-020	Cotización	Ola 1 - 3	Orquestación flujo guiado cotización	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Vista de deuda y estado de cobro
INT-021	Cotización	Ola 1 - 3	Sincronización catálogo productos	Galgo → CRM	Batch / Event	Kafka / MuleSoft	Disponible	Solo lectura para apoyar decisión
INT-022	Cotización	Ola 1 - 3	Tarificación / pricing	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Solo lectura; sin persistencia en CRM
INT-023	Cotización	Ola 1 - 3	Validación externa al crear oportunidad	CRM → Proveedores / Galgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Calidad / Métricas de supervisión y productividad
INT-024	Cotización	Ola 1 - 3	Validación interna al crear oportunidad	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Derivación de caso renovación según reglas de negocio
INT-025	Cotización	Ola 1 - 3	Valoración médica	Core / sistema externo → CRM	Event-driven	Kafka + MuleSoft	Por confirmar	Ajuste de pricing por campaña
INT-026	Dashboard	Ola 0– 5 (transversal)	Carga métricas / reporting	Sistemas origen → CRM / reporting	Batch	MuleSoft Jobs / API	Por confirmar	PCI/tokenización fuera de CRM
INT-027	Recibos, pagos y recobro	Ola 4	Generar recibo	CRM → Core Recibos	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Confirmación de emisión y estado, CRM inicia, Core ejecuta
INT-028	Recobros, recibos y pagos	Ola 4	Actualización cambios operativos	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Validación/enriquecimiento online; respuesta en alta para completar datos
INT-029	Supervisión (capa transversal)	Ola 0– 5 (transversal)	Dashboards operativos	Sistemas origen → CRM	Batch	MuleSoft Jobs / API	Por confirmar	Canal según datos de contacto
INT-030	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (motor)	Comunicaciones transaccionales CDN	CRM → CDN	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Oportunidad iniciada en CRM, se confirmará en discovery si sincronizar a Galgo en esta fase
INT-031	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (motor)	Confirmación cita perito	CRM → Agenda perito	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Refresco de estado en CRM
INT-032	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (motor)	Consulta agenda perito	CRM → Agenda perito	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Actualización de estados del suplemento
INT-033	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (motor)	Geolocalización ESRI	CRM → Galgo / ESRI	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Sincronización periódica , Bienvenida / activación
INT-034	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (motor)	Validación documental	CRM → Galgo / servicio documental	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Retorno de decisión y estado
INT-035	Contratación / Emisión	Ola 1 - 3	Emisión de póliza	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Actividad digital para 360 y acciones
INT-036	Contratación / Emisión	Ola 1 - 3	Inicio firma electrónica	CRM → Proveedor firma	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Nuevo negocio / plazos, Operación puntual; idempotencia

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de Integración: Interfaces


ID interfaz	Proceso	Fase	Nombre flujo interfaz	Dirección	Tipo	Middleware / Connector	Estado API	SLA/Latencia / Detalle Notas
INT-037	Contratación / Emisión	Ola 1 - 3	Retorno evidencias firma	Proveedor firma → CRM	Async / Webhook / Polling	MuleSoft API / Webhook	Por confirmar	Patrón vía Galgo , Geocoding / validación de dirección
INT-038	Gestión documental (capa transversal)	Ola 0– 5 (transversal)	Consulta / archivo documentos	CRM → ECM / documental	Real-time	REST API / MuleSoft	Disponible	Inicio de firma y tracking
INT-039	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (Motor)	Integración MIR (Doc Pending)	CRM ↔ MIR	Bidireccional	MuleSoft API	Por confirmar	Sincronización de citas y disponibilidad. CRM orquesta disponibilidad
INT-040	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (Motor)	Integración Nuevo TPA	CRM ↔ TPA	Real-time + Async	MuleSoft API / Events	No disponible	Estados OK/Asumido y control SLA en proceso
INT-041	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (Motor)	Resultado verificación Notes	Notes → CRM	Real-time / Polling	MuleSoft API / Jobs	Por confirmar	Interfaz crítica dependiente de API
INT-042	Verificación / Doc Pendiente	Ola 0 + Ola 2 (Motor)	Verificación tipo App (evidencias)	Web App LDA → CRM	Async / Event	MuleSoft API / Webhook	Por confirmar	Dispara proceso documental
INT-043	Cancelación	Ola 4	Envío documental email / postal	CRM → Proveedor email/postal	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Extracción de datos de DNI y devolución de campos al CRM
INT-044	Cross-sell Salud	Ola 3	Integración agenda salud / comercial	CRM ↔ WFM / Agenda Salud	Bidireccional	MuleSoft API	Por confirmar	Extracción de datos y devolución de campos al CRM
INT-045	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Aceptación renovación	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Actualiza score para UX y reporting
INT-046	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Alta suplemento	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Llamadas por pasos del proceso
INT-047	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Derivación a equipo técnico	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Envío de datos para activación, segmentación y BI
INT-048	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Estado suplemento	Galgo → CRM	Event-driven	Kafka + MuleSoft	Disponible	Movimiento de documentos y enlace en CRM . Enlace en sf al doc y metadatos en CRM, doc almacenado en DB2CM
INT-049	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Recalcular prima suplemento	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Resultado de tarificación de suplemento
INT-050	Gestión relación activa	Ola 3 - 4	Validación externa suplemento	CRM → Proveedor externo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Sin SLA en CRM; solo reflejo de estado
INT-051	Cancelación	Ola 4	Estado cancelación póliza	Galgo → CRM	Event-driven	Kafka + MuleSoft	Disponible	Evidencias y estados en CRM
INT-052	Cancelación	Ola 4	Módulo documentación precancelación	CRM → Módulo documental	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Replicación de cabecera de póliza en CRM

© 2026 NTT DATA, Inc.

Arquitectura de Integración: Interfaces

ID interfaz	Proceso	Fase	Nombre flujo interfaz	Dirección	Tipo	Middleware / Connector	Estado API	SLA/Latencia / Detalle Notas
INT-053	Cancelación	Ola 4	Solicitud cancelación póliza	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Catálogo Product2, asumismos que un proceso regulatorio determinar fecha de liberación de nuevo catálogo y se lanzará evento kafka con el que mule consulta catálogo y lo sincroniza en batch con salesforce
INT-054	Operación económica	Ola 4	Consulta recibos/pagos	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Validaciones y ejecución en Core
INT-055	Operación económica	Ola 4	Ejecución pago	CRM → Pasarela / Backoffice	Real-time + Async	MuleSoft API / Webhook	Por confirmar	Cálculo de prima y desglose
INT-056	Retención	Ola 4	Confirmación oferta retención	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Validación y normalización de dirección en alta/edición
INT-057	Retención	Ola 4	Consulta ficha retención	CRM → Galgo	Real-time	MuleSoft API	Disponible	Consulta de estado documental y faltantes
INT-058	Fidelización	Ola 5	Alta tarjeta Bankinter	CRM → Bankinter	Real-time + Callback	MuleSoft API / Webhook	Por confirmar	Validación (reglas de entrada) externa en entrada a cotización
INT-059	Fidelización	Ola 5	Carga promociones internas	Origen corporativo → CRM	Batch	MuleSoft Jobs	Disponible	Consulta online , patrón similar cotización
INT-060	Fidelización	Ola 5	Consulta promociones externas	CRM → Galgo / proveedor externo	Real-time	MuleSoft API	Por confirmar	Validación técnica en entrada a cotización
INT-061	Fidelización	Ola 5	Estrategias de comunicación	CRM / Core → Adobe / Lakehouse	Batch	MuleSoft Jobs	Disponible	Estado / resultado de valoración
INT-062	Fidelización	Ola 5	Programas y acciones a Martech / DWH	CRM / Core → Adobe / Lakehouse	Batch	MuleSoft Jobs	Disponible	CRM guarda URL/metadatos; no binarios
INT-063	Quejas y Reclamaciones	Ola 5	Alta de quejas y reclamaciones	OCU/ OMIC / Sede electrónica CRM	Real-time	Mulesoft API (Endpoint)	A desarrollar	Se habilita um servicio em mulesoft que estos sistemas podrán consumir para enviar al CRM las quejas y reclamaciones
INT-064	Quejas y Reclamaciones	Ola 5	Alta de quejas de no clientes	Salesforce BBDD perjucicados	Real-time	Mulesoft Api	A desarrollar	Salesforce invocará a um api de Mulesoft para enviar a dicha base de datos las quejas de no clientes.

Nota: El catálogo de interfaces presentado es una estimación basada en los requisitos e información actual. Durante la fase de *Discovery* se definirá el número definitivo de interfaces y operaciones por cada interfaz.

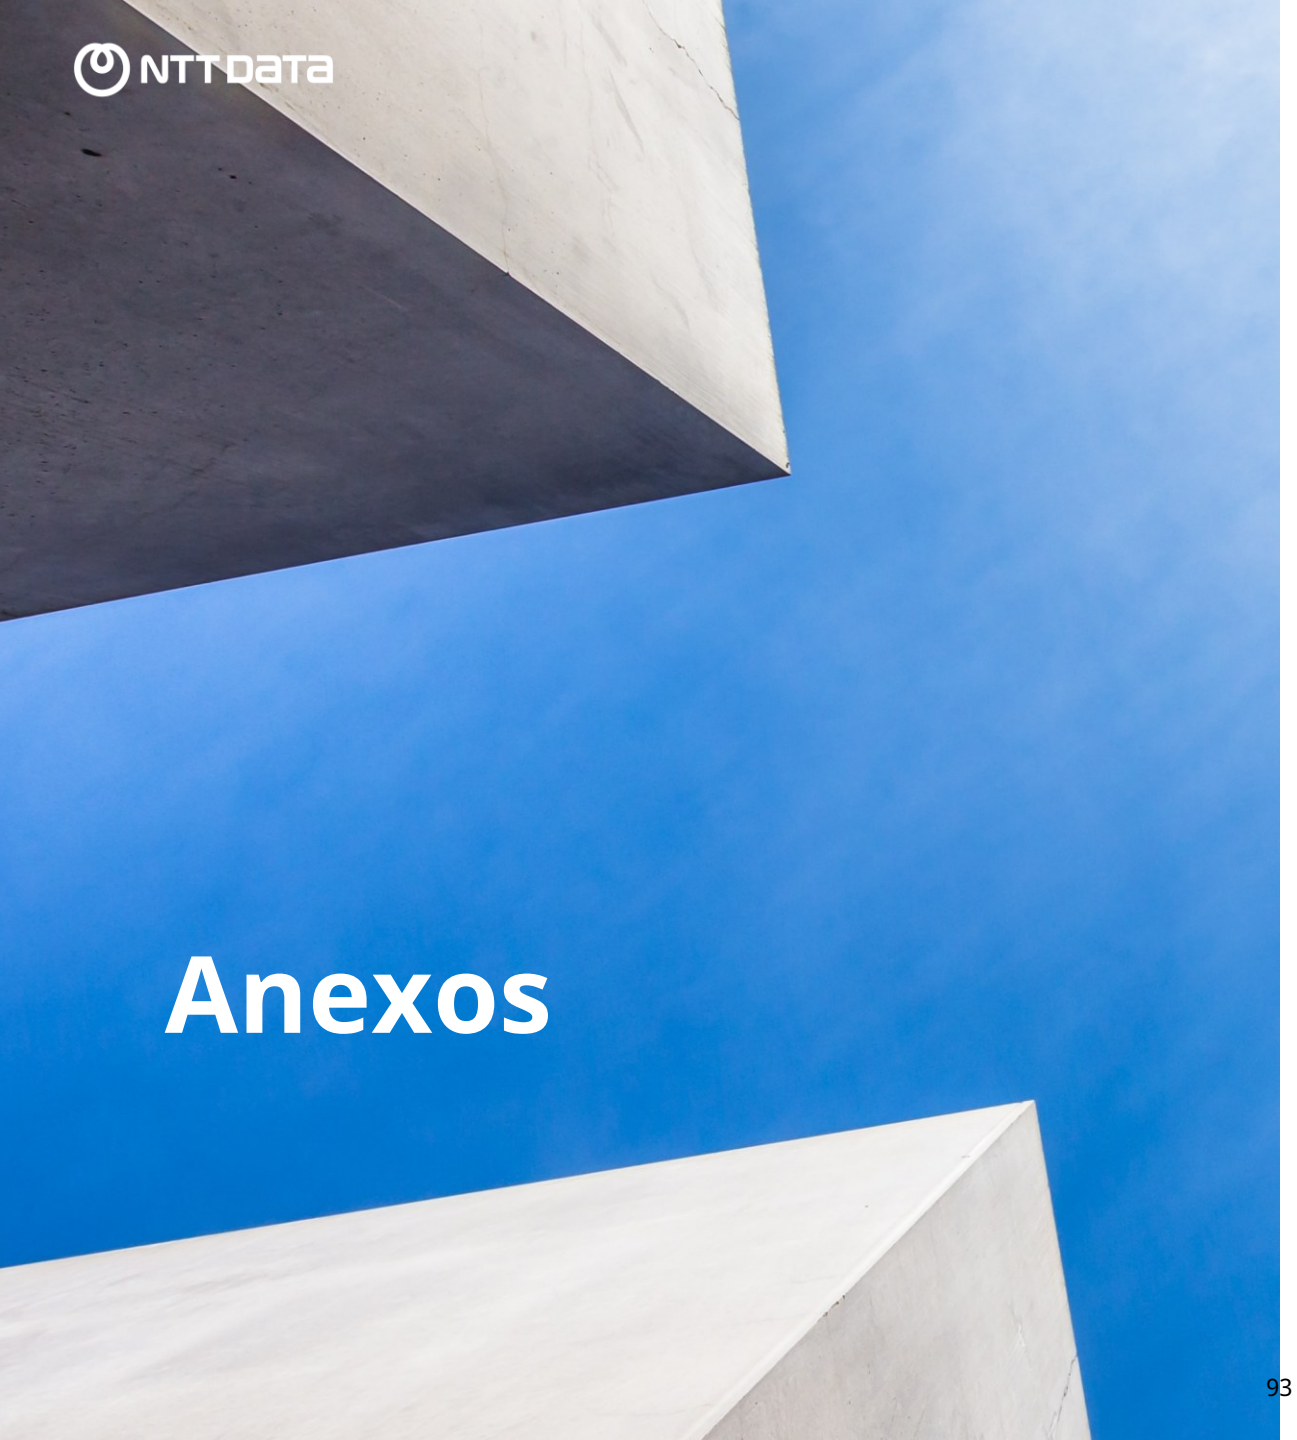

Anexos


Migración de datos

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Enfoque

ENFOQUE DE MIGRACIÓN

Proponemos un **plan estructurado** para migrar datos desde los sistemas existentes en GALGO hacia el CRM Salesforce. El enfoque se basa en fases claras que **aseguran integridad y calidad de datos**, minimizando riesgos y tiempos de carga.

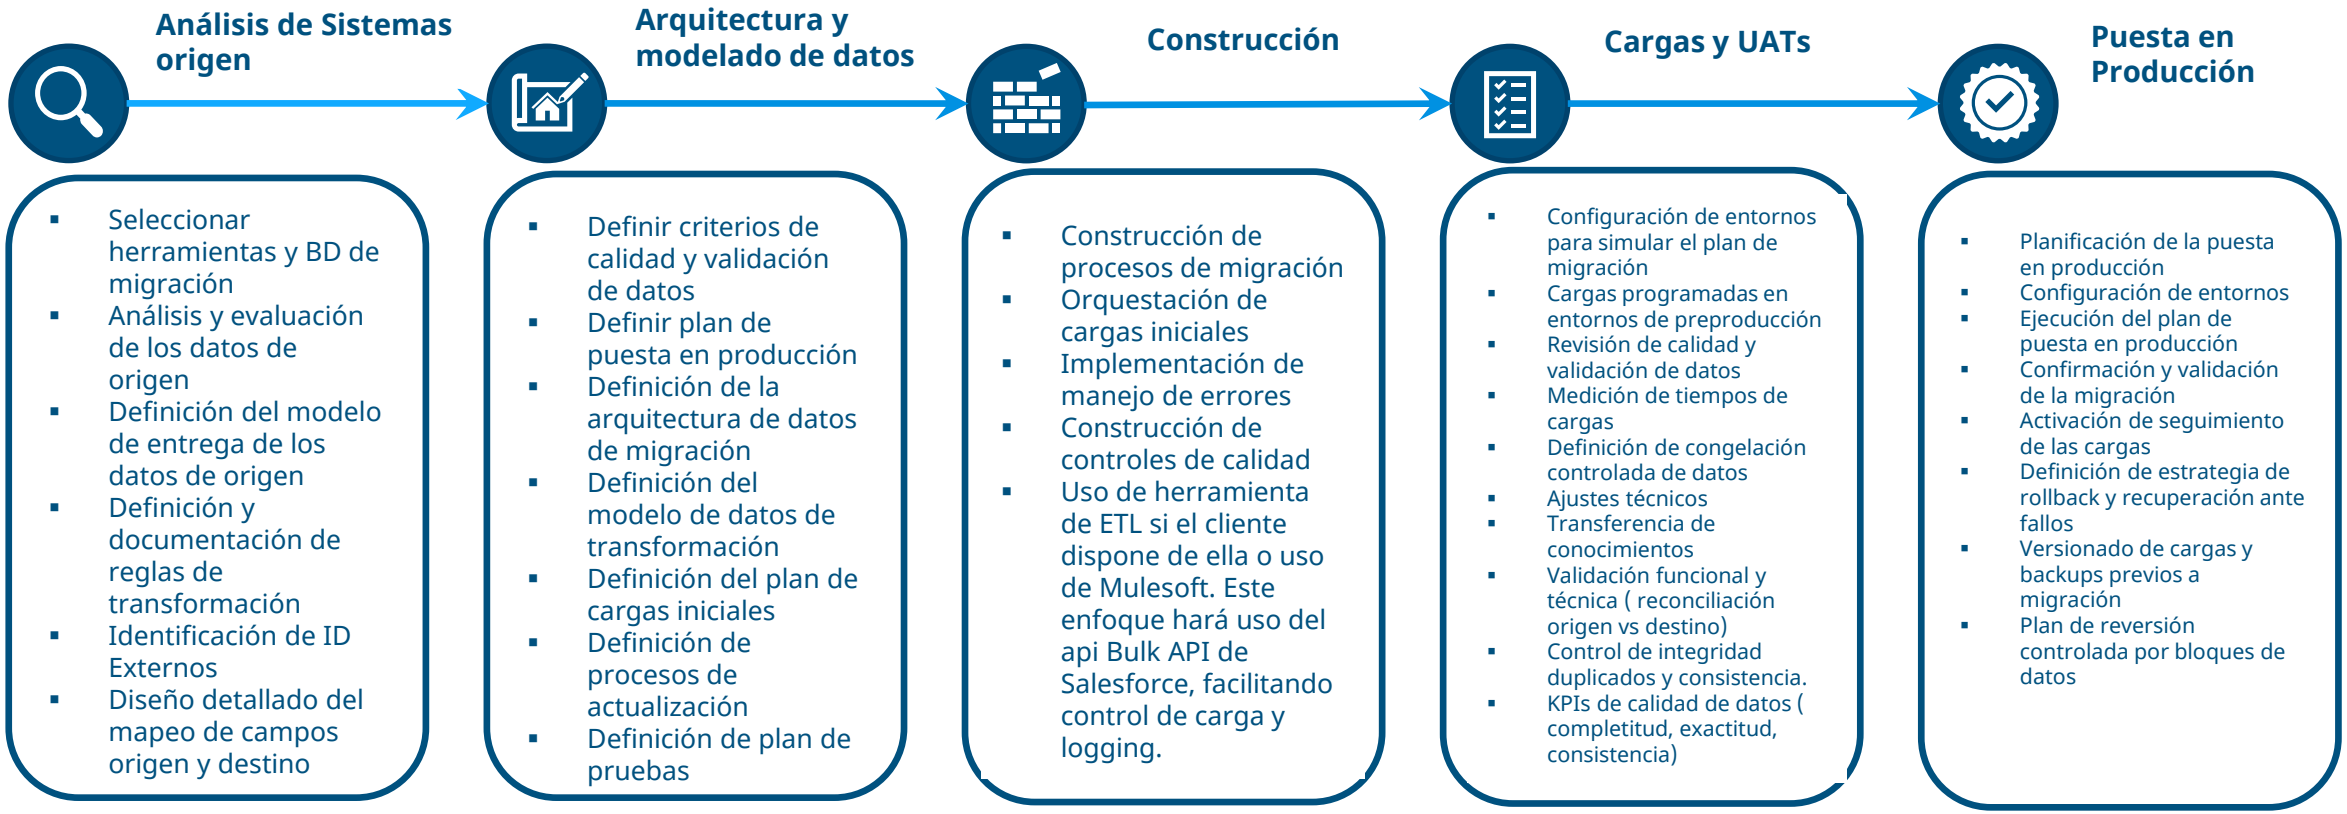


- **Alcance de migración**: Durante la fase de Discovery se identificarán los **dominios y objetos estrictamente necesarios** para la operación del negocio. El proceso de migración **se ejecutará únicamente sobre estos elementos**, evitando la carga de datos innecesarios que puedan impactar en la calidad o el rendimiento de la solución. Queda fuera de alcance del trabajo de migración la carga completa del histórico financiero

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Arquitectura

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE DATOS: DB2 ➡ SALESFORCE

El ámbito de Datos tiene como finalidad asegurar que el nuevo CRM disponga de **información íntegra, coherente y validada** desde el momento de su puesta en producción, garantizando además la **estabilidad** del dato durante la convivencia con los sistemas Core. Dicho ámbito se centra exclusivamente en la migración inicial de datos desde Galgo, junto con el control y aseguramiento de la calidad del dato

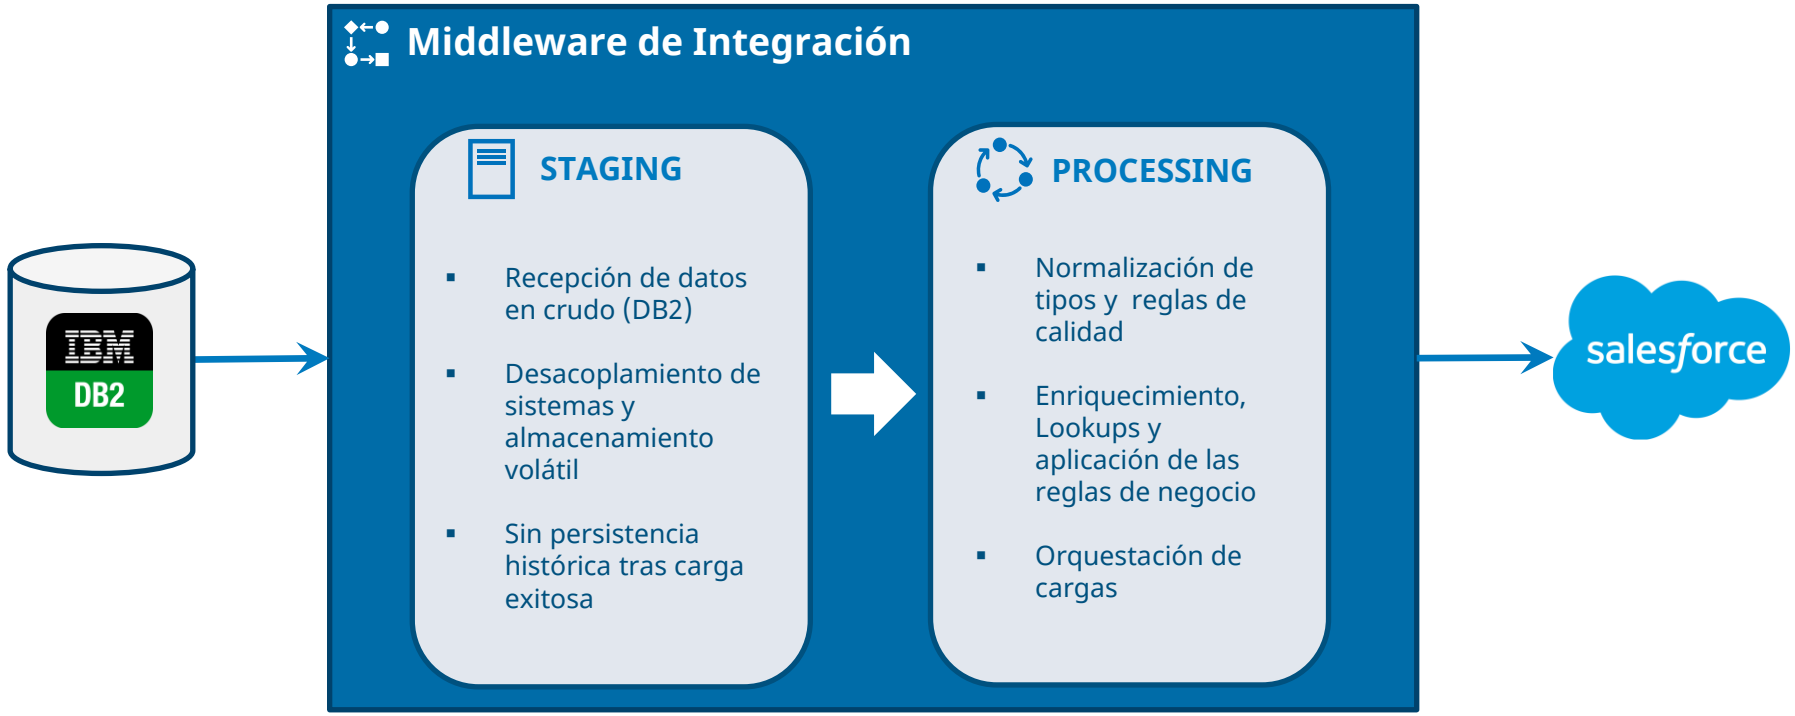

- **Elección de la herramienta de integración**: Se decidirá durante la fase de Discovery, donde **NTT Data**, tras realizar el análisis detallado de la arquitectura actual de **LDA** y evaluar las herramientas de integración corporativas, presentará **la propuesta técnica** que mejor se adapte al ecosistema de **LDA** para optimizar esta integración.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Alcance

ALCANCE

- Migración inicial de datos desde Galgo sin objetivo analítico.
- La migración solo tiene como objetivo poblar las tablas del CRM con los datos de Galgo
- Control y aseguramiento de la calidad del dato en el proceso.
- Análisis y evaluación de los datos de origen.
- Definición de la estrategia de migración.
- Documentación y aplicación de las reglas de transformación.
- Ejecutar los mapeos origen-destino
- Desarrollo de procesos de extracción, transformación y carga.
- Cargas en entornos de prueba y preproducción.
- Ensayos completos de migración.
- Plan de puesta en producción.
- Ejecución productiva.
- Validación técnica y funcional posterior.
- Diseño y activación de plan de reversión.
- Definición de métricas de calidad.
- Validaciones previas y posteriores a la migración.
- Controles de completitud e integridad referencial.
- Reconciliación de volúmenes.
- Reconciliación de atributos críticos.
- Definición de criterios de aceptación.
- Elaboración de informes de calidad.
- Seguimiento reforzado durante el período de estabilización tras la puesta en producción.

FUERA DE ALCANCE

- Migración completa del histórico financiero (58,5 millones de registros).
- Histórico cerrado sin impacto operativo actual.
- Remediación masiva del legado no identificada previamente.
- Asegurar la integridad y calidad de los datos de origen.
- Diseño detallado de mapeos origen–destino.
- Definición de reglas de transformación.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Premisas

PREMISAS

Premisas de Alcance:

- La migración se limita a información activa y operativa.
- Solo se migrarán las tablas que sean necesarias para el CRM
- No se incluye limpieza estructural masiva del histórico.
- El histórico financiero completo permanece en el sistema Core.
- Las reglas de negocio son definidas y validadas por Línea Directa.
- Los mapeos origen-destino son definidos y validados por Línea Directa
- La reconciliación se limita a entidades y atributos críticos acordados.
- No se contempla implantación de una solución corporativa de gestión maestra de datos.

Premisas Técnicas

- Disponibilidad, estabilidad y calidad de los datos de origen.
- Entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción operativos.
- Ventana de puesta en producción definida y acordada.
- Volúmenes dentro de los rangos facilitados.
- Acceso a responsables funcionales para validación.

Premisas Organizativas

- Designación de responsables de datos por parte de Línea Directa.
- Validación formal de los mapeos antes de su ejecución.
- Capacidad de toma de decisiones ágil ante discrepancias.
- Participación activa del negocio en la validación final.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Modelo de responsabilidad

MODELO DE RESPONSABILIDAD DE INTEGRACIÓN (RACI)

La siguiente matriz RACI propuesta por NTT DATA aclara las **responsabilidades de las distintas partes implicadas en el proyecto**:

Actividades del proyecto	LDA	Integrador	Conjunto
Disponibilidad, estabilidad y calidad de los datos de origen	Responsable	Informado	—
Entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción operativos	Responsable	Informado	—
Ventana de puesta en producción definida y acordada	—	—	Responsable
Accesos a responsables funcionales para validación	Responsable	Informado	—
Designación de responsables de datos por parte de Línea Directa	Responsable	Informado	—
Definición de reglas de negocio para la transformación	Responsable	Informado	—
Validación de reglas de negocio para la transformación	Consultado	—	Responsable
Definición de mapeos origen-destino	Responsable	Informado	—
Validación de mapeos origen-destino	Consultado	—	Responsable
Elección del Middleware para la integración	—	—	Responsable
Análisis de tablas orígenes	Consultado	Responsable	—
Definir criterios de calidad y validación de datos	—	—	Responsable
Definición de la arquitectura y el modelo de datos de transformación	Informado	Responsable	—
Definición del plan de cargas iniciales	Informado	Responsable	—
Definición de procesos de actualización	Informado	Responsable	—
Definición de plan de pruebas	Informado	Responsable	—
Construcción de procesos de migración, orquestación y controles de calidad en la migración	Informado	Responsable	—
Ejecución del plan de puesta en producción	Informado	Responsable	—
Confirmación y validación de la migración	—	—	Responsable
Activación de seguimiento de las cargas	Informado	Responsable	—

Niveles de responsabilidad

Responsable

¿Quién realizará las obras?

Consultado

¿Quién aporta los conocimientos y la orientación de los expertos?

Informado

¿A quién hay que informar de los progresos?

© 2026 NTT DATA, Inc.

Migración de datos: Principios

Modelo de Migración

Proponemos **un modelo de migración controlado, gobernado y progresivo**, orientado a garantizar estabilidad operativa desde el primer día del CRM.
La migración se concibe como el proceso estructurado de **carga inicial** de la información necesaria para la puesta en producción, asegurando coherencia, trazabilidad y validación formal antes del Go-Live. Se establece una separación clara entre la **definición funcional del dato**, responsabilidad de **Línea Directa** y la **Implementación técnica** de la migración, responsabilidad de **NTT DATA**. Una vez el sistema se encuentre en operación, la actualización continua de la información entre sistemas se gestionará mediante la arquitectura de integración definida para tal fin.

Principios de alcance

- Migración enfocada en **información activa y operativa**.
- Priorización de **clientes activos y pólizas vigentes**.
- Limitación del histórico financiero a horizonte acordado.
- Exclusión de replicación masiva de histórico sin impacto operativo.
- **Reglas de transformación** definidas y validadas por **LDA** antes de su implementación.

Calidad y validación

- Controles de completitud e integridad referencial.
- Reconciliación volumétrica entre sistemas.
- Validación de atributos críticos.
- Umbrales de aceptación acordados.
- Ensayos completos previos a producción.
- La validación funcional final del dato migrado será responsabilidad de LDA.

Estrategia técnica

La solución técnica se ha planteado de forma **flexible y adaptable** al ecosistema tecnológico que se acuerde con **LDA**, garantizando alineamiento con los **estándares corporativos**.
El proceso de carga inicial se apoyará en:

- Entorno intermedio para transformación y validación.
- Procesos automatizados de extracción, transformación y carga.
- Versionado formal de mapeos.
- Plan de reversión definido antes del Go-Live.
- Registro y trazabilidad de todas las ejecuciones.
- Se priorizará la estabilidad y el control sobre la velocidad de carga.

Reconciliación y consistencia

Se implementará un **modelo estructurado** de reconciliación que incluirá:

- Definición de sistema de referencia por dominio.
- Reconciliación completa tras la carga inicial.
- Seguimiento intensivo durante el periodo de estabilización.
- Gestión estructurada de discrepancias.
- Supervisión periódica durante la convivencia.
- La reconciliación actúa como mecanismo de control de coherencia, no como sistema de sincronización operativa.

Gobierno y control

- Validación formal de mapeos antes de ejecución.
- Comité de resolución de reglas y decisiones de datos.
- Gestión controlada de cambios.
- Separación clara de responsabilidades entre ejecución técnica y validación funcional.
- Documentación completa y transferencia de conocimiento.



Anexos

Cobertura de requisitos

© 2026 NTT DATA, Inc.


Detalle fichas requisitos: Canales Digitales

Descripción

Chat: El proceso se inicia desde la web / app y todos los casos deben integrarse en el CRM.
- El chat será atendido por IA o derivado a un agente cuando no pueda resolverse solo.
- El agente podrá emitir chats desde el propio CRM, con funcionalidades como autocorrector y dictado por voz.

Voz: Se reflejará la información de las llamadas en el CRM, abriendo la ficha del cliente cuando se identifique, mostrando resumen de llamadas, notificaciones inteligentes, reglas automáticas de emisión/bloqueo, gestión y transferencia de citas, agenda compartida y creación de eventos desde distintos procesos.

Email: El CRM gestionará los emails entrantes para generar casos de atención, enrutándolos a los equipos y recogiendo la información necesaria para su gestión.

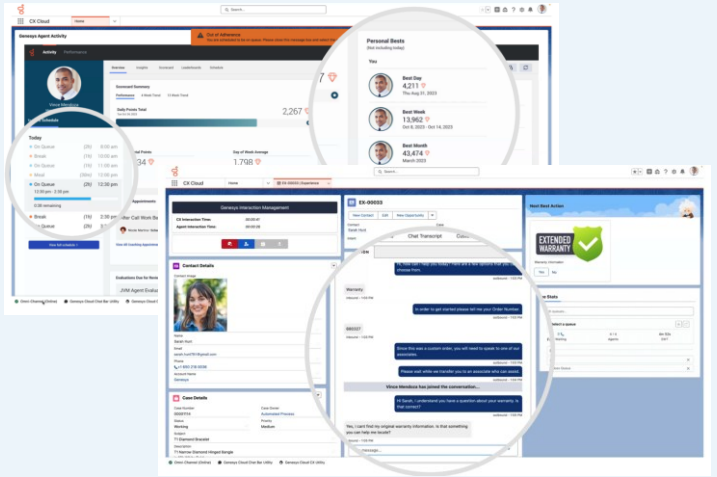

Solución propuesta – Enfoque técnico

Genesys Cloud

- **Integración en tiempo real**: Consumo de eventos de Genesys (llamada entrante, atendida, finalizada, chat iniciado, cita creada, emails entrantes) y *screen-pop* automático en CRM con contexto 360º del cliente (pólizas, oportunidades, scoring, fidelización y otros). Registro automático de interacciones (metadatos, duración, grabaciones, resultado). Apertura de alta de o Cliente potencial en llamadas sin cliente identificado.
- **Enrutamiento inteligente**: Skill-based routing y priorización según scoring, propensión de venta o estado de cliente, y escalado automático de IA a agente con traspaso de contexto conversacional.
- **Agenda y omnicanalidad**: Sincronización bidireccional de agenda entre CRM y Genesys, y gestión unificada de llamadas, chat y futuras interacciones desde el CRM.
- **KPIs y supervisión**: Explotación de métricas en tiempo real (TMO, conversiones, sentimiento); uso de dashboards para operador y supervisor con alertas inteligentes.
- El CRM mostrará histórico conversacional por cliente tras el volcado de llamadas, emails y chats en los objetos correspondientes y su visualización en la ficha de Cliente

Premisas

- La propuesta considera desarrollos desde el lado Salesforce para habilitar la integración con el CTI en Genesys: Configuración de conector, usuarios y autenticación de la integración, flows y procesos, omnichannel, objetos a habilitar en el CRM, soporte a las pruebas a realizar desde el lado de Genesys.
- Los requerimientos que de manera estándar deban ser implementados desde Genesys (por ej, Bloqueo automático de llamadas) deberán ser abordados por el integrador de CTI, quedando en principio fuera del alcance de esta propuesta.
- La generación de recomendaciones según contexto de cliente en llamadas entrantes, si fuera necesario, se valorará aparte durante la fase de Discovery.

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Fase 0

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Dashboards

Descripción

- Dotar a los usuarios de la plataforma de un **set inicial de informes y paneles** para poder medir tanto la **actividad como la productividad de los agentes.**
- **Para operadores:** paneles con KPIs comerciales y operativos en tiempo real sobre distintas métricas como llamadas, TMO, actividad por hora y totales por período, incluyendo ausencias y tiempos de espera, con filtros y parametría por rol
- **Para supervisores**: paneles con visión agregada e individual del rendimiento del equipo, comparativas en tiempo real y alertas inteligentes basadas en análisis de sentimiento de llamadas y chats.
- Se contempla la visualización de rendimiento respecto a incentivos y notificaciones automáticas bajo determinados criterios, y reflejo en los panales de puntos como la gestión de cambios de turno.

Solución propuesta – Enfoque técnico


Genesys Cloud

- Genesys Cloud dispone de vistas dinámicas que muestran **métricas históricas y en tiempo real para la gestion del Call Center**, que permite el monitoreo de las colas, los agentes, las interacciones, las campañas salientes, las devoluciones de llamadas programadas y la gestión de la fuerza laboral. Se diseñará y personalizarán las diferentes vistas según se defina con LDA durante la fase de Discovery.
- Genesys Cloud disponibiliza distintos **catálogos de métricas *** sobre las que es posible configurar los reportes. Los gestores, supervisores y agentes pueden usar vistas y paneles dinámicos para ver el **rendimiento y métricas** del Call Center.
- Se diseñará el consumo de informes a **nivel individual y/o agregado** según la organización de servicio-supervisor-agente, acorde al diseño acordado en Discovery.
- Implementar un set de informes con lógicas más complejas o que requieran de customización adicional que no se pueda llevar a cabo haciendo uso de los informes iniciales.

** Más información en https://help.genesys.cloud/articles/metric-definitions/*

Premisas

- Los KPIs de telefonía serán los calculados por Genesys; desde Salesforce no se recalcularán estas métricas.
- Cualquier desalineamiento entre Salesforce y Genesys se resolverá tomando Genesys como referencia.
- Los dashboards con métricas 'Contact Center' se consumirán en Genesys, mostrándose embebido en pestaña del CRM el módulo de informes de Genesys (Analytics Workspace). En el CRM se planteará la visualización de indicadores clave, si fuera necesario, y los dashboards con métricas sobre ciclo comercial y reclamaciones u otros datos CRM, hasta 9 KPIs.
- *En apartado "*Detalle fichas requisitos: IA & Asistente de Venta*" se detalla la aproximación para el análisis de sentimiento en llamadas*

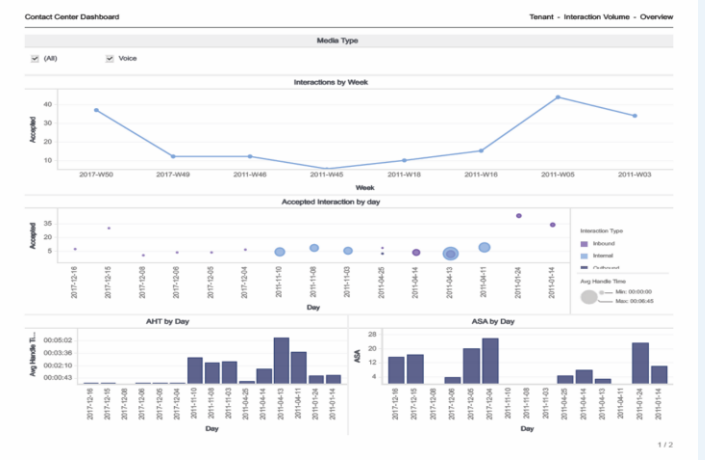

COMPLEJIDAD

Baja

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Fase 0

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Ficha cliente

PROCESOS INFORMATIVOS

Identificación Consulta Cliente | Ficha Cliente

PROCESOS SOPORTE

Descripción

- Se creará una Ficha de cliente **para los distintos tipos de clientes** (clientes, potenciales, ex clientes…), distinguiendo datos a visualizar según **tipología de cliente** (personas, empresas, expats…) y perfil de cada usuario.
- Los usuarios podrán consultar datos del cliente – personales, económicos, indicadores relativos al negocio de LDA y **toda la información relacionada con gestión de pólizas** – cotizaciones, carrito, suplementos, precio y coberturas -, gestión como recobros, fidelización o pagos y recibos, atención al cliente – incidencias, quejas y reclamaciones, interacciones.
- La ficha permitirá al usuario ver los datos básicos **independientemente de las etapas o ventanas** por las que necesite navegar para gestionar los distintos procesos relacionados con el cliente, manteniéndose visible en todo momento.


Solución propuesta – Enfoque técnico

- La Ficha Cliente se estructurará sobre **Account / Person Account como objeto core**, extendido mediante customizaciones y otros objetos, relacionado con Pólizas, Oportunidades, datos de Fidelización, Quejas, Reclamaciones, Siniestros, Suplementos, Cancelaciones, Life Events o Recibos y Pagos, consolidando un modelo de datos 360º transversal a todos los procesos: Cotización, retención, cancelaciones, fidelización, atención al cliente.
- Se habilitará en paralelo el objeto std , permitiendo la carga y alta manual de s en el sistema, con procesos de aprobación y configuración ligera / lógica reducida.
- Contará con **integraciones bidireccionales con servicios externos y Galgo** para visualizar los datos de esos sistemas.
- **La solución incluirá** componentes Lightning dinámicos con avisos contextuales sobre información del cliente, histórico unificado (siniestros, casos, NBO, presupuestos) y acceso directo a otras funcionalidades como Retención o Suplementos.
- **El modelo se gobernará** mediante Record Types, Sharing Rules y Lightning Pages, permitiendo segmentación comercial avanzada (INE, renta zona, tipología vivienda, competencia, fidelización) y soporte a argumentación y venta cruzada.
- Incluirá **timeline unificando interacciones**: llamadas, chats, emails, tareas, eventos, notas.
- La solución incluirá **reglas de calidad de dato** (duplicate rules, validation rules, autocompletado con confirmación) y procesos auxiliares para evitar duplicado de registros en la plataforma.

Premisas

Se habilitará por objeto vistas de consulta / edición y alta manual, y, por objeto:

- Validation rules (12 max)
- Campos adicionales (30 max)
- Sharing rules (4 max)
- Page layouts (6 max)
- Record Types (6 max)
- List views (6max)
- Asignación Record Pages por perfil
- Configuración de Duplicate Rules (Cuentas, Contactos, Figuras)
- Quick actions (6 max) estándar

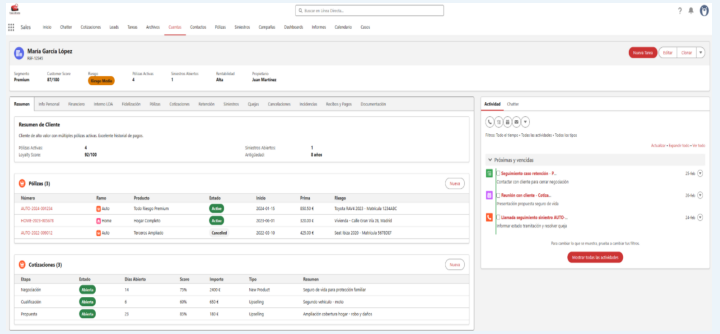

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR


Out of the Box


FASE

Hogar	Fase 1	Salud	Fase 3
Coche	Fase 2	Expats	Fase 3
Moto	Fase 2	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de cotización





Descripción de los subprocesos

- El proceso comenzará con la **creación de una oportunidad en la ficha de cliente**, donde podrán añadirse varios productos, cada uno con un flujo independiente según el riesgo. Las oportunidades permiten versionado, duplicado y edición de productos, con histórico de cambios y estados definidos (etapas y resultado final).
- El sistema ofrece **recomendaciones**, *scoring* e integraciones internas y externas para validaciones y evaluación del riesgo.
- La pantalla de precio centralizará campañas, descuentos, bonificaciones y formas de pago, **conectando con motores de cálculo** y permitiendo recálculo, comparación y generación de póliza.
- Incluye **carrito**, selección de métodos de pago, gestión de recibos y archivos PDF, integración web/app y verificación.
- Las **pólizas resultantes gestionarán estados y subestados según ramo** y validaciones técnicas.
- Las etapas de upselling/crosselling, suplementos, verificación y documentación, y valoración médica, se describen aparte.

Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈⚡

- El proceso de cotización será recogido en un **Screen Flow** por cada tipo de producto y riesgo a asegurar, que contemplará distintas etapas (creada, en negociación…), el paso por los distintos subprocesos, y orquestará las llamadas API al core LDA para recuperar la información necesaria en cada paso (precios, coberturas, descuentos…) siempre que no figure ya precargada en Salesforce.
- Se habilitará **distintos objetos estándar** para consolidar las diferentes entidades, como oportunidades, pólizas, productos, quotes y otros, y **objetos custom** para datos auxiliares necesarios para modelar los procesos completos.
- Se **autocompletarán datos del cliente** y posibles roles, con validaciones dinámicas y campos dependientes.
- Se incluirá el lanzamiento del **proceso de firma** de cliente en las etapas donde sea necesario, creando una solicitud de firma en el CRM, invocando el proveedor de firma (**Logalty**) y gestionando el aviso de firma y el documento ya firmado para su posterior almacenamiento en gestor documenta / persistencia en Salesforce de sus metadatos.

- *El detalle del carrito se describe en la siguiente slide.*

Premisas

- En cada objeto del proceso se habilitarán las vistas, validaciones, quick actions, etc, ya descritos en procesos anteriores.
- La integración con firma digital se implementará en los procesos o etapas de cotización, pago y documentación, o cancelación / precancelación.
- Los documentos 'core' contractuales se generarán en el maestro del dato y el CRM los recuperará y orquestará su envío si aplica. Los que contemplen plantillas fijas por funcionalidad, contenido informativo o de avisos, sí se generarán en el CRM según enfoque.

COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE


Hogar	Fase 1	Salud	Fase 3
Coche	Fase 2	Expats	Fase 3
Moto	Fase 2	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.


Detalle fichas requisitos: Proceso cotización

Se detalla el planteamiento **orientativo** del flujo de Cotización para ilustrar el enfoque contemplado en la propuesta:

Flujo Cotización

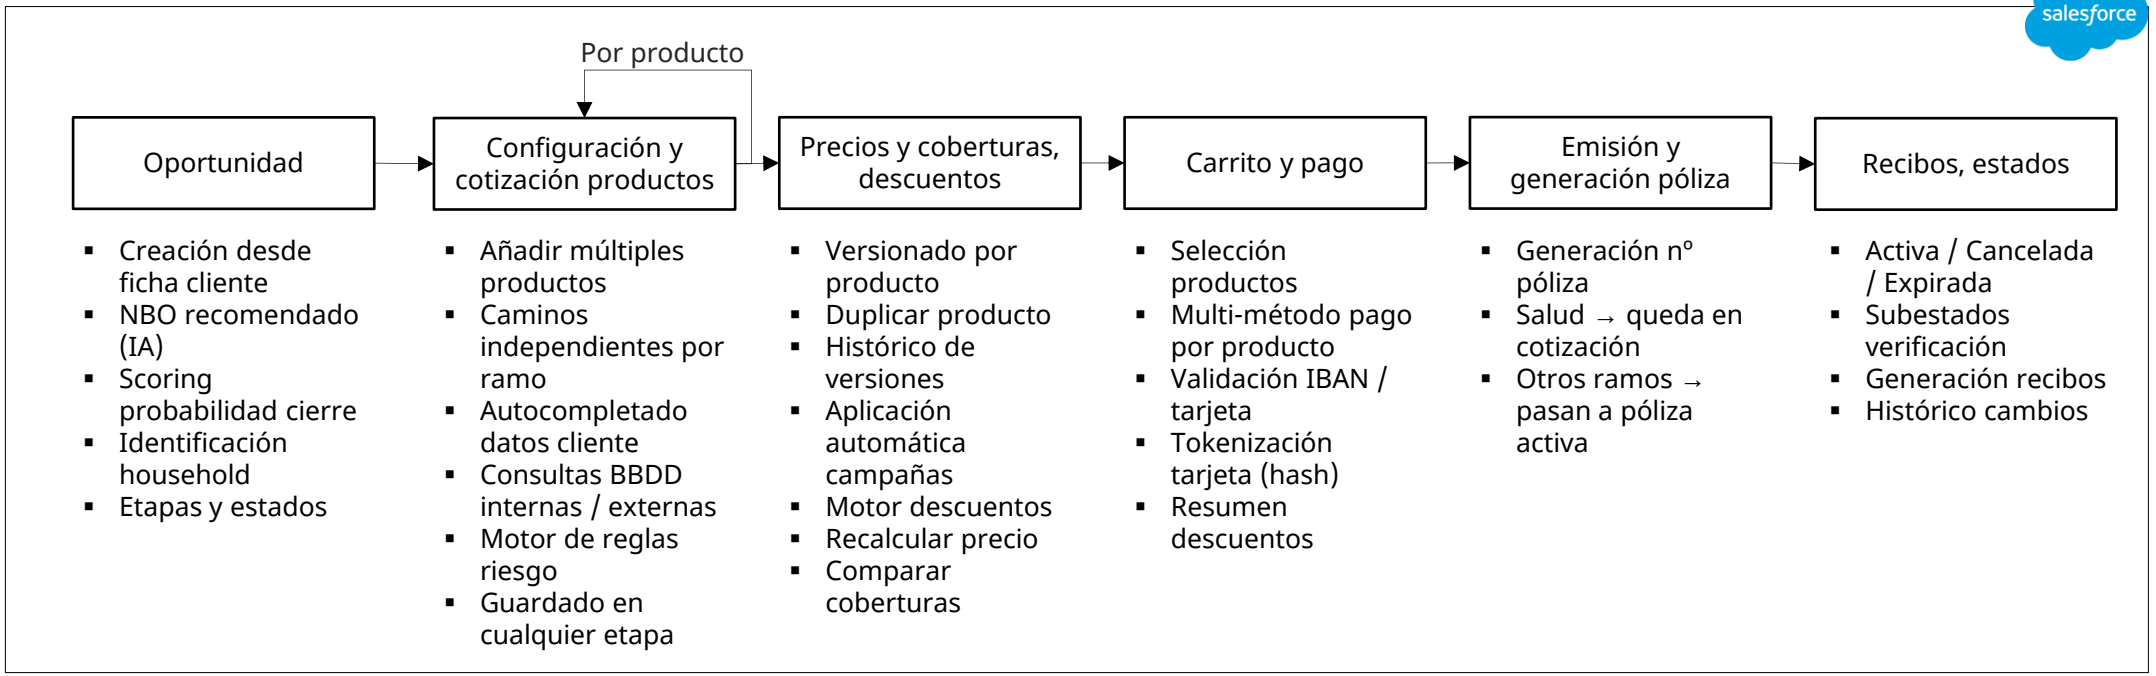


Integraciones NRT



© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso cotización

Haciendo zoom en la orquestación entre CRM y sistemas, ilustraríamos el planteamiento, de manera **orientativa**, con el esquema siguiente:



	Oportunidad	Configuración y cotización productos	Precios y coberturas, descuentos	Carrito y pago	Emisión y generación póliza	Recibos, estados y resumen
Usuario	▪ Crea oportunidad	▪ Añade producto		▪ Selecciona método de pago		
CRM Salesforce	▪ Autocompleta datos ▪ Recomienda NBO	▪ Crea versión	▪ Muestra recálculo de importes ▪ Permite versionar	▪ Comunica con la pasarela de pago	▪ Actualiza información ▪ Lanza proceso firma y recibe las actualizaciones	▪ Actualiza información ▪ Muestra enlaces que apliquen a Suplementos, Verificación…
Sistemas LDA	▪ Cálculo de probabilidad *(motor scoring)*	▪ Evaluación riesgo *(motor riesgo)*	▪ Campañas cliente / producto *(campañas / promociones)* ▪ Aplica descuentos y recalcula *(core)*	▪ Lógica de pago de algunos productos *(core)* ▪ Recibe la consolidación del pago *(core)*	▪ Genera póliza, documentación *(core, gestor documental)* ▪ Envía documentación a cliente *(CDN)*	▪ Genera recibos de los pagos *(core)* ▪ Calcula lógica para mostrar enlaces a otros procesos o indicadores *(core)*
Sistemas Externos		▪ Validaciones *(BBDD Externa)*	▪ Campañas cliente / producto *(BBDD Externa)*	▪ Gestiona estado de pago y lo comunica al CRM (pasarela de pago)	▪ Gestiona firma (Logalty)	

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de cotización - Carrito



Descripción de los subprocesos


- El proceso de cotización multiproducto estará soportado por un **carrito operativo guiado** que permita configurar productos, coberturas y precios en tiempo real, garantizando integración con el core de LDA y respetando su rol como maestro.
- La configuración guiada permitirá añadir diferentes productos de distintos ramos, seleccionar coberturas, incluir validaciones en tiempo real.
- El objetivo es facilitar la venta asistida desde el Contact Center con una experiencia ágil, manteniendo la coherencia con el sistema maestro y evitando duplicidad de lógica en el CRM.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- El carrito se modelará con las capacidades estándar de Salesforce: **LWC para visualización y gestión de datos** en pantallas, **Screen Flows** para etapas, integraciones, parametría y objetos standard y custom, y flows para aprobaciones y control de versión que pudieran ser necesarios.
- El **estado del carrito se mantiene a nivel transaccional en Salesforce,** permitiendo guardar el proceso en cualquier etapa, consultar el detalle de los productos o aplicar descuentos u otras operaciones, antes de persistirse, generar póliza si aplica y enviar los resultados a LDA para su consolidación y formalizar la cotización definitiva allí.
- El carrito podrá editarse, recalcular contenido, y se integrará via API con el core LDA.
- Una vez confirmada la operación, el carrito se registrará en diversos objetos relacionados como oportunidades, quote o quote line item.

Premisas

- Se considera el carrito como la base para configurar de forma guiada el contenido y pricing de la cotización conjunta, sin añadir la complejidad y el coste de un CPQ completo: No se consideran funcionalidades propias de CPQ, no incluye motor avanzado de configuración complejo, no gestiona pricing, y no incorporará gestión avanzada de conjuntos de productos dinámicos con dependencias masivas.
- El maestro de Cotizaciones, precios y otros se considera siempre en LDA.

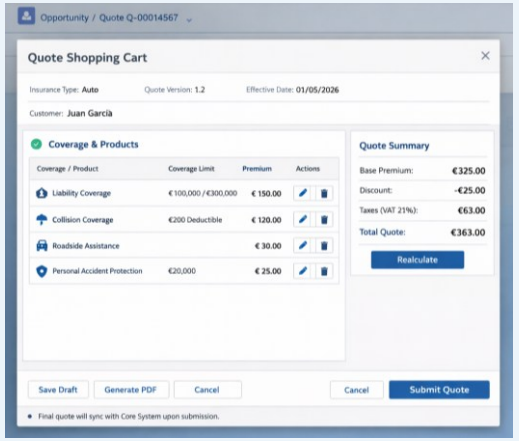

COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 1	Salud	Fase 3
Coche	Fase 2	Expats	Fase 3
Moto	Fase 2	Empresa	Fase 5


© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de cotización – Valoración salud



Descripción de los subprocesos

- La etapa de valoración médica es **gestionada por un equipo específico** con distintos roles y puede iniciarse desde una cotización o desde una póliza (suplementos); **los casos deben visualizarse en un panel** con información clave (estado, producto, cita), aunque los operadores solo acceden al resultado, no al detalle médico.
- Los **casos se envían a una herramienta interna de LDA** con toda la información recopilada, y el **CRM recibe el resultado**, generando avisos para su gestión.
- La **agenda de valoradores se integra con CTI para asignación de citas** y emisión de llamadas. El resultado puede ser “ok” o “ko” (con alternativas o cancelable), permitiendo según el caso modificar asegurados, productos o cancelar. Si es “ok”, se cierra la cotización o se actualiza la póliza, gestionando pagos, documentación y emisión de recibos.



Inicio → Consulta → Citas → Valoración → Resultado

Pólizas o Cotizaciones en valoración

Sincronización con emisión de Póliza o Cotización

Solución propuesta – Enfoque técnico

- El proceso de Valoración Médica se soportará en Salesforce mediante un objeto custom de **valoración**, relacionado con **Quote** y objeto de **Pólizas**, que gestionará el estado, cita, resultado y trazabilidad del caso, garantizando la segregación de datos sensibles por perfiles.
- La operativa se implementará mediante **Screen Flows y Record-Triggered Flows**, permitiendo iniciar la valoración desde cotización o suplemento, gestionar citas integradas con agenda/CTI y enviar automáticamente los casos a la herramienta interna de LDA.
- La **integración bidireccional con LDA** permitirá recibir el resultado (OK / KO) y, en función del mismo, habilitar la modificación, cancelación o aprobación de la póliza o cotización, automatizando la actualización de estados, generación de avisos o eventos, emisión documental y generación de recibos.

Premisas

- El análisis clínico y dictamen se realizará en la herramienta interna de LDA, mientras que Salesforce gestionará la orquestación del proceso y recibirá el resultado mediante integración.
- El proceso se soportará sobre los objetos descritos, garantizando trazabilidad completa y segregación de datos sensibles por perfiles, si bien puede ser necesario contar con más objetos auxiliares para soportar el proceso.
- La gestión de citas e interacciones se integrará con la agenda/CTI corporativa, y el envío/recepción de información se realizará mediante APIs con control de errores y reintentos.

COMPLEJIDAD

Baja

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	N/A	Salud	Fase 3
Coche	N/A	Expats	N/A
Moto	N/A	Empresa	N/A

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de cotización – Verificación



Descripción de los subprocesos


- La verificación se plantea **tras el pago en productos de motor** (cotización o suplemento) cuando las reglas internas lo exigen, con plazo máximo de cierre. Se determina automáticamente el tipo (presencial, foto web, app, video), condicionado por reglas. Se muestra cabecera de póliza, tipos disponibles y requisitos obligatorios según modalidad.
- **Gestión de citas y ejecución:** Para presencial se deberá integrar la agenda externa del perito, mostrando slots, autocompletando dirección (editable) y confirmando fecha, hora y lugar. Para video/foto/app se capturan datos obligatorios y se conectan sistemas internos de comunicaciones, y se generarán recordatorios y citas automáticas previas.
- Se **gestionarán estados** (sin procesar, pendientes, verificada, ok/no ok, asumida, no verificada); se registrarán informes, motivos en picklist, supervisión y acciones ante no verificada (nueva verificación, asumir o cancelar).
- **Integraciones y seguimiento:** Integración con sistema LDA (GV), agenda de peritos, proveedor de geolocalización y plataforma CDN de comunicaciones. Histórico completo del proceso, resumen de hitos, gestión de avisos por vencimiento y reasignación automática si no se recibe documentación en plazo.

Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈

- El proceso se soportará sobre los **objetos custom y estándar** de Salesforce para recoger los procesos de verificación y distintas validaciones a realizar sobre los datos que recupere y que deba generar y lanzar y se integrará en los procesos CRM de Cotización y Suplementos.
- Se usarán **Flows** para modelar las etapas y orquestar llamadas a sistemas LDA para aprovisionamiento de datos y cálculos / lógica que no se realicen en el CRM.
- Se implementarán las integraciones con **Geolocalización** como soporte a la gestión de citas, agenda de peritos para verificaciones presenciales, **sistema GV de LDA** para datos de verificación, herramienta **CDN** para envío de comunicaciones a cliente, y **sistema LDA de comunicaciones** para verificaciones tipo foto y app.

Premisas

- La integración con ESRI para **geolocalización**, y la integración con **agenda de los peritos** para gestión de citas de verificación presencial se valorará durante la fase de Discovery, si bien se entiende que serán sistemas que se podrán integrar via API y que al igual que el resto de integraciones se dispondrá de credenciales, accesos, y documentación.
- No se incluye la integración con plataforma de Notes; se analizará durante la fase de Discovery, valorándose entonces.



COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	N/A	Salud	N/A
Coche	Fase 2	Expats	N/A
Moto	Fase 2	Empresa	N/A

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de cotización – Documentación pendiente



Descripción de los subprocesos


- Se habilitará una etapa de **Documentación Pendiente** en cotizaciones y suplementos de motos (producto motor-motos), activada por condiciones técnicas internas, que actualizará automáticamente el estado de la póliza e indicará los documentos requeridos.
- El proceso permitirá gestionar la recepción y almacenamiento de documentación **mediante integración con sistemas internos (MIR y gestor documental),** así como el envío y seguimiento de comunicaciones multicanal al cliente.
- Según el resultado (ok, no ok o asumida), el sistema **actualizará la póliza automáticamente** o permitirá derivar al proceso de cancelación o anulación correspondiente.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- El proceso de Documentación Pendiente (de manera tentativa) podría soportarse en Salesforce mediante un objeto custom **documentación pendiente**, relacionado cotizaciones y otros objetos, que gestionará el tipo de documentación requerida, estado y trazabilidad del expediente.
- Su activación se realizará automáticamente mediante **Record-Triggered Flows** según reglas técnicas aplicables a productos de motor (motos), actualizando el estado de la póliza cuando corresponda.
- La gestión operativa se implementará mediante **Screen Flows**, permitiendo registrar la recepción o no recepción de documentos y notificar al equipo correspondiente, con integración con **MIR** para el cambio de estado, el **Gestor Documental** para el almacenamiento y la plataforma **CDN** para comunicaciones multicanal.
- En función del resultado (ok, no ok, asumida, doc. pendiente…), el sistema actualizará la póliza o habilitará la derivación al proceso de cancelación o anulación correspondiente.

Premisas

- Se considera (según documentación recibida) que el proceso de Verificación aplica solo al ramo de Motos.
- La determinación de requisitos documentales y reglas técnicas se gestionará en el sistema core y se integrará en Salesforce para su orquestación.
- El estado contractual de la póliza tendrá como sistema maestro MIR, sincronizándose con Salesforce mediante integración bidireccional.
- La documentación aportada por el cliente se almacenará en el gestor documental corporativo, quedando en Salesforce la referencia y trazabilidad del expediente.
- Las comunicaciones al cliente se emitirán desde la plataforma interna CDN, registrándose en Salesforce el histórico (timeline).

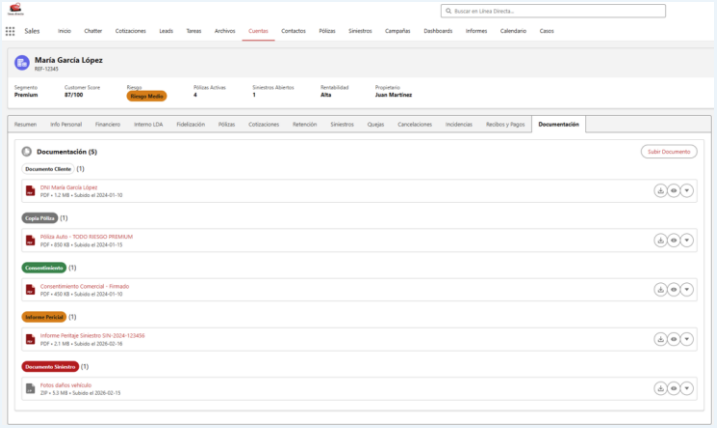

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	N/A	Salud	N/A
Coche	N/A	Expats	N/A
Moto	Fase 2	Empresa	N/A


© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de upselling & crosselling



Descripción de los subprocesos

- El proceso de **Upselling / Crosselling se inicia desde** las recomendaciones en la **Ficha de Cliente** y se integra en la sección de precio y coberturas de cada Cotización o Suplemento.
- El módulo **contemplará el historial del cliente**, criterios técnicos de suscripción y criterios comerciales, **combinando reglas parametrizables y modelos inteligentes** según contexto (propensión o cotización).
- Los productos se mostrarán por prioridad, con motivo y argumentario inteligente visible para el operador.
- Debe registrarse aceptación o rechazo y su motivo para futuras acciones.
- Desde la recomendación se puede iniciar **cotización o suplemento**. En **salud**, permite agendar o transferir llamada con confirmación automática, y desde cualquier producto se podrá crear cita asociada, con mensaje de contexto.
- Las coberturas muestran riesgo, pago y precio actualizado automáticamente, confirmándose con **impacto en póliza**.

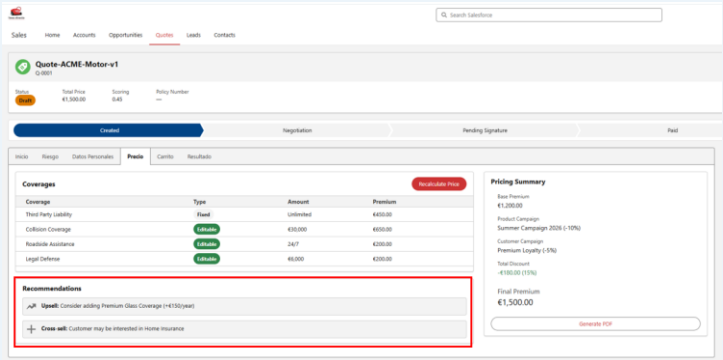

Solución propuesta – Enfoque técnico

- Se usará el **módulo standard de NBO / NBA como motor de decisión**; evaluará las reglas técnicas y comerciales, junto con otros datos, priorizando productos y mostrando productos recomendados al usuario; y generando oferta.
- Se habilitará el objeto **recomendaciones,** y otros de soporte para decisiones u otras entidades necesarias; las visualizaciones se soportarán a través del standard y **Lightining components** donde sea necesario.
- Cada recomendación contendrá texto y acciones para redirigir a otros procesos o **lanzar automatismos o flujos**.
- Se plantea el uso de **Agentforce** para añadir una capa de **IA Agéntica para evaluar el contexto**, preparar argumentarios y proponer acción a realizar. Una aproximación podría ser la siguiente:

Inicio	NBA	Agent IA	LWC	Flow/APEX	Feedback
	Ejecuta reglas o procesos	Evalúa contexto, prepara argumentario y propone acción	Muestra la recomendación (es) para que el usuario seleccione	Tras la selección del usuario, se lanza el automatismo	Los resultados retro alimentan las reglas o el contexto del agente

Premisas

- Agentforce se plantea como solución robusta y potente, escalable y para fuentes de datos de cierta magnitud. Otros enfoques como **NBA – Reglas** y **Recomendaciones** sin IA Agentforce pueden dar también un desempeño notable.
- El uso de IA predictiva es una opción disponible, si bien necesita de un histórico de información y cuenta con algunas limitaciones
- Durante el Discovery se analizará consumo y coste de las distintas opciones y se consensuará la más adecuada.

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 3	Salud	Fase 3
Coche	Fase 3	Expats	Fase 3
Moto	Fase 3	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso de upselling & crosselling - NBO

Se propone plantear la lógica LDA de Upselling / Cross-Selling en las capacidades nativas de Salesforce – NBO -, asegurando una integración sólida en el proceso una vez modelado en el CRM.

Descripción del módulo

IA Predictiva – NBO estándar	IA Generativa – Capa personalizada
• **Machine learning**, reglas de negocio, modelos de propensión / scoring; modelo gobernado y parametrizable • **Determina la mejor acción, oferta o recomendación** en función del perfil, comportamiento y contexto del cliente, garantizando recomendaciones elegibles y alineadas con negocio	• **Einstein GPT, Agentforce**, Gen AI for Sales / Service • **Apoya al agente identificando la mejor oferta** a partir de mayor contexto de partida, y **cómo comunicarlo** al cliente, generando argumentarios, gestionando objeciones y contextualizando en tiempo real.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- **Datos y Gobierno del Modelo:** Se contempla estructurar el contexto cliente y póliza (productos, coberturas, siniestros, interacciones) junto con catálogo y reglas parametrizables que deberán ser analizadas y migradas a Salesforce de forma que queden configuradas dentro de las piezas estándar que soportan el módulo NBO. Cada recomendación se registra con producto, prioridad, motivo y estado (ofrecida/aceptada/rechazada), asegurando trazabilidad, histórico y control del modelo.
- **Motor de Decisión:** Reglas implementadas con NBO o Flow + Metadata, combinando criterios técnicos (elegibilidad y suscripción), criterios comerciales (campañas y objetivos) y priorización dinámica según contexto; a partir de aquí, genera la Next Best Offer ordenada y contextualizada.
- **Ejecución:** Se integraría en precio y cobertura del proceso de Cotización para generar los productos susceptibles de ser propuestos al cliente como up-crosselling. En caso de seleccionar alguno, se actualizaría la cotización / suplemento, o precios y cobertura en caso de ser necesario, y al finalizar la cotización en el CRM y consolidar el resultado en core LDA – Galgo, se enviaría el resultado del up-crossell, enriqueciendo el histórico del cliente. De igual manera, se registrarán rechazos


IA: incorporar IA generativa como apoyo comercial, generando argumentarios en tiempo real a partir de fuentes definidas, o añadiendo capa agéntica al inicio del proceso, ordenando la información, preparando el argumentario y proponiendo mejor acción (up / cross), producto o incluso acción asociada a la propuesta de dicho producto.

Premisas

- Se emplearán piezas estándar del modelo NBO y la parte de IA generativa / agentes se implementaría con las capacidades nativas de Salesforce Einstein / Agentforce
- Las NBO deben estar embebidas en los puntos naturales del proceso (Ficha Cliente, Cotización, Renovación) y permitir acción directa: cotizar, suplementar, actualizar póliza
- La lógica de Upsell/Cross-sell debe centralizarse en capacidades nativas de NBO/NBA, evitando reglas dispersas en otros sistemas.


© 2026 NTT DATA, Inc.


Detalle fichas requisitos: Proceso suplementos



Descripción de los subprocesos

- Se habilitará un proceso de **Suplementos** que permitirá realizar **modificaciones contractuales sobre pólizas existentes**, incluyendo cambios en datos, riesgo, coberturas, forma de pago o precio, respetando los periodos de renovación y las reglas técnicas y regulatorias aplicables.
- El proceso permitirá la **simulación y versionado de cambios**, con recalculo automático de prima, validaciones técnicas y posibles derivaciones a suscripción o supervisión cuando corresponda.
- Una vez confirmado, se **actualizará automáticamente la póliza**, se generará la documentación necesaria y se gestionarán los impactos económicos y el histórico del suplemento.





Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈

- El proceso se soportará sobre objeto de **Pólizas** como base contractual y un objeto custom **relativo a gestión de pólizas** para gestionar los suplementos, incluyendo versionado, histórico y control de estados.
- La lógica se implementará mediante **Screen Flows, Record-Triggered Flows y Apex**, gestionando validaciones técnicas por ramo, control de fechas de vigor, cálculos de prima y derivaciones a verificación o suscripción cuando aplique.
- La solución permitirá **comparativa de versiones**, generación documental automática y sincronización con sistemas maestros, garantizando trazabilidad completa del suplemento y su impacto contractual y económico.

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 3	Salud	Fase 3
Coche	Fase 3	Expats	Fase 3
Moto	Fase 3	Empresa	Fase 5

Premisas

- Se considera el sistema de LDA **maestro del dato** de cada entidad (póliza, cotización, coberturas, condiciones técnicas), así como de la lógica que pueda aplicar.
- Salesforce actuará como orquestador del proceso, sincronizando información con el maestro del dato en cada etapa.
- Los objetos custom y std empleados contemplarán campos adicionales, quick actions, sharing rules, listviews, validation rules, diferenciación por record types y asignación a perfiles con los máximos indicados en Premisas de ficha de cliente.


© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso recibos y pagos



Descripción de los subprocesos

- Se habilitará un proceso de Recibos y Pagos que permitirá **consultar y gestionar los recibos de una póliza** desde la ficha del cliente, incluyendo su emisión, diferimiento, cambio de estado y visualización detallada de importes, descuentos, recargos y rechazos.
- El proceso incluirá la **gestión de cobro mediante distintos métodos de pago**, como tarjeta integrada con pasarela externa, transferencias y preavisos, así como la administración de tarjetas y validaciones sobre titularidad y roles.
- La funcionalidad garantizará la trazabilidad completa del **ciclo de vida del recibo**, incluyendo histórico de acciones, duplicados, envío de documentación, gestión de copagos y consulta de anualidades anteriores.

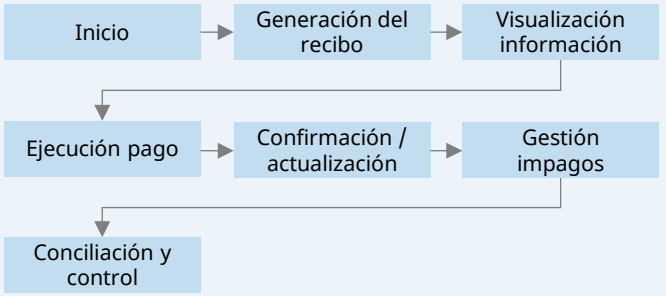

Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈

- Se habilitarán **objetos estándar y custom** necesarios para soportar la información y procesos / validaciones auxiliares en el CRM, configurando Quick Actions, reglas de validación, permisos, visualización por record types si es necesario, y otras capacidades de modelado para cubrir el alcance descrito.
- Desde el CRM se lanzarán las **llamadas necesarias al maestro de recibos** para visualizar la información necesaria en cada momento, sea en listados, o en datos de un recibo concreto. La ejecución del pago, igualmente, se delega en el backend a través de APIs.
- Se implementará en el CRM la **opción de generar PDF** con información existente, usando en principio capacidades estándar de Salesforce (visualForce en concreto), y se incluirá con Flows el posterior envío del fichero al cliente por email, almacenando posteriormente el archivo y el email en el histórico de interacciones del cliente (timeline).
- Se implementará la **integración** correspondiente para habilitar la redirección a la **pasarela de pago**.

Premisas

- Se considera que la pasarela de pagos contemplará los distintos medios de pago y que está disponible a través de API REST.
- La lógica de los cálculos necesarios para activar o deshabilitar distintas opciones en las ventanas se considera también que se aprovisionará desde LDA-backend via API. Si es necesario realizar o migrar algún cálculo al CRM, se valorará durante la fase de Discovery, revisando junto con LDA si se considera cambio de alcance.
- Se contempla como escenario de pago el envío de enlace al cliente para iniciar el pago, asumiendo que este envío se realizará via integración con CDN y la generación del enlace se realizaría desde la propia pasarela de pago.
- Los documentos 'core' contractuales se generarán en el maestro del dato y el CRM los recuperará y orquestará su envío si aplica. Los demás, que contemplen plantillas fijas por funcionalidad, contenido informativo o de avisos, sí se considera que se generarán en el CRM según se describe

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR


Out of the Box


FASE

Hogar	Fase 4	Salud	Fase 4
Coche	Fase 4	Expats	Fase 4
Moto	Fase 4	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso retención



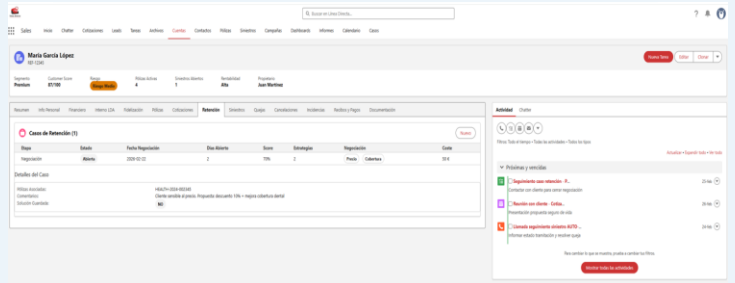

Descripción de los subprocesos

- El proceso de retención podrá iniciarse **desde la ficha de cliente, el listado de pólizas o una póliza concreta**, accediendo a la ficha de retención, que mostrará indicadores clave (encuestas, rentabilidad, siniestros), datos de cabecera y el listado completo de pólizas, diferenciadas visualmente.
- El usuario debe completar distintos datos, **activando campos dinámicos, argumentario inteligente y benchmark**.
- Las estrategias, precargadas y priorizadas según la pirámide de retención y el producto, no son acumulativas y pueden implicar negociación de precio, coberturas o incentivos en especie, con **posibles procesos de suplementos** y supervisión.
- Debe integrar cálculos automáticos (prima, rentabilidad, incentivos) y **vinculación con fidelización**.
- El proceso **permitirá registrar resultado** (salvada, baja o pendiente), gestionar motivos legales, visualizar históricos, costes totales y conectar con agenda, comentarios, recibos y campañas, optimizando usabilidad y accesibilidad.

Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈⚡

- El proceso de Retención se soportará sobre un objeto custom **Retenciones** como entidad principal, relacionado con **Ficha de Retención** (detalle operativo) y con el objeto estándar **Cases** para la gestión de incidencias asociadas.
- El modelo contemplará segmentación mediante **Record Types**, control de estados, automatización con **Record-Triggered Flows** y validaciones de transición.
- La seguridad se basará en **roles, Sharing Rules y perfiles**, garantizando visibilidad por unidad, canal o ramo.
- La capa de presentación se configurará mediante **Lightning Record Pages, Page Layouts diferenciados y Quick Actions**, asegurando usabilidad y trazabilidad completa del proceso.
- Los datos generados por los sistemas de LDA (pirámide de retención, estrategias precargadas, listado de pólizas, y otros) serán aprovisionados en la ficha de Retención a través de llamadas APIs al sistema maestro.
- Los datos resultado de la retención se sincronizarán de vuelta con el sistema maestro, registrándose en paralelo en el CRM.

Premisas

- Se visualizará la transcripción de la llamada considerando las capacidades estándar de la integración con Genesys.
- Se considera los sistemas LDA como maestro del dato de lógicas de negocio y cálculos. Si alguno debe recaer en el CRM, se deberá valorar antes de considerarlo dentro de la propuesta.
- Los objetos custom y std empleados contemplarán campos adicionales, quick actions, sharing rules, listviews, validation rules, diferenciación por record types y asignación a perfiles con los máximos indicados en Premisas de ficha de cliente.

COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR


Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 4	Salud	Fase 4
Coche	Fase 4	Expats	Fase 4
Moto	Fase 4	Empresa	Fase 5


© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso recobro



Descripción de los subprocesos

- Se habilitará un proceso de **Recobro** que se iniciará desde la ficha del cliente ante el rechazo de un recibo, registrando el tipo de rechazo e integrándose con modelos internos y bases de datos externas para su validación y gestión.
- El proceso incluirá la gestión de preavisos y comunicaciones al cliente (SMS, email, llamadas), integración con el centro de notificaciones y mantenimiento del histórico completo de acciones y eventos asociados a cada recibo.
- La funcionalidad permitirá la regularización del pago, mediante autopago, vinculación manual o aplicación de saldo de fidelización, registrando el resultado final del recobro y garantizando la trazabilidad del proceso.

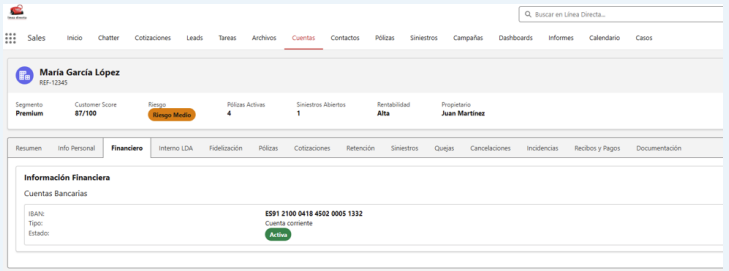

Solución propuesta – Enfoque técnico 💗📈

- El proceso de Recobro se soportará sobre un **objeto custom**, **extendido** con eventos de gestión y estados de recobro, permitiendo registrar rechazos, preavisos y resultado final del cobro.
- Se implementará mediante **Screen Flows** y **Record-Triggered Flows** que gestionen alertas, tareas, comunicaciones y actualización automática del estado del recibo.
- La solución **integrará pasarela de pagos**, modelo interno de recobro y plataformas de notificación, garantizando trazabilidad completa de acciones y comunicaciones.
- El proceso **permitirá aplicar saldo de fidelización**, registrar pagos manuales y mantener histórico detallado por recibo y cliente.

Premisas

- Los **cálculos y reglas del modelo de recobro** (plazos, recargos, priorización y criterios de gestión) se realizarán en el sistema core (LDA) y se aprovisionarán en Salesforce mediante integración.
- El estado financiero del recibo y la conciliación contable se gestionarán en el sistema origen, reflejándose en Salesforce a través de sincronización bidireccional.
- La **ejecución de pagos y validación de rechazos** se realizará mediante integraciones con pasarela de pago y sistemas LDA maestros de la información correspondiente, actualizando Salesforce con el resultado de la operación.
- Las comunicaciones transaccionales al cliente se realizarán integrando via API con la aplicación **CDN de LDA**, mientras que las comunicaciones comerciales se realizarán con herramienta de campañas **Adobe de LDA**.
- Se contempla como escenario de pago el envío de enlace al cliente para iniciar el pago, asumiendo que este envío se realizará via integración con CDN y la generación del enlace se realizaría desde la propia pasarela de pago.

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR


Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 4	Salud	Fase 4
Coche	Fase 4	Expats	Fase 4
Moto	Fase 4	Empresa	Fase 5


© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso cancelación



Descripción de los subprocesos

- Se habilitará un proceso de **Precancelación y Cancelación** que permitirá gestionar solicitudes de baja manuales o automáticas desde la ficha de retención, finiendo motivo, submotivo y fecha de efecto según la situación de la póliza.
- El proceso incluirá la **generación y envío de documentación**, control de incoherencias (impagos, recibos rechazados), posibilidad de modificar o eliminar la precancelación y actualización del estado de la póliza a baja cuando corresponda.
- La funcionalidad contemplará la gestión de la **Prima No Consumida (PNC),** aplicada manualmente en cotización y automáticamente en renovación, garantizando su devolución y la trazabilidad del impacto económico asociado.

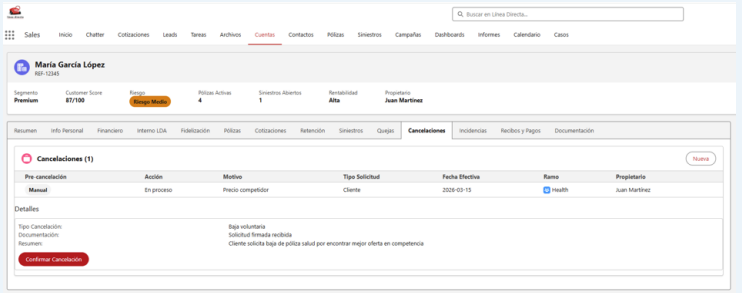

Solución propuesta – Enfoque técnico

- El proceso se soportará sobre el objeto estándar **Case,** extendido con Record Types y objetos auxiliares para gestionar **Precancelación** y **Cancelación**, diferenciando motivo, estado y situación de póliza.
- La lógica se implementará mediante **Screen Flows, Record-Triggered Flows y Apex**, controlando fechas de vigor, incoherencias (impagos/recibos), generación automática de tareas, documentación y envío multicanal.
- La **Prima No Consumida (PNC)** se contemplará en cotización (cálculo manual) y en renovación (automatizada vía flows/batch en APEX), garantizando impacto contable, actualización de estado a “Baja” y trazabilidad completa del ciclo.
- Se consideran **integraciones con gestor documental LDA** para la consulta de documentación (previa consulta para aprovisionar Ids documentales necesarios para enlazarla desde CRM), sincronización de documentación generada en el CRM desde plantillas (tentativamente para aquellas que se deban modelar en el CRM).
- Los envíos al cliente de documentación relativa a la cancelación, sean online o programados, se realizarán integrando con la herramienta CDN de LDA, a través de API REST.
- Se incluirá la **de cliente** en las etapas donde sea necesario, creando una solicitud de firma, invocando a Logalty y gestionando el resultado y el documento firmado / metadatos para su almacenamiento en gestor documental / CRM.

Premisas

- Se considera los sistemas LDA como maestro del dato de lógicas de negocio y cálculos. Si alguno debe recaer en el CRM, se deberá valorar antes de considerarlo dentro de la propuesta.
- Los objetos custom y std empleados contemplarán campos adicionales, quick actions, sharing rules, listviews, validation rules, diferenciación por record types y asignación a perfiles con los máximos indicados en Premisas de ficha de cliente.

COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR


Out of the Box

FASE

Hogar	Fase 4	Salud	Fase 4
Coche	Fase 4	Expats	Fase 4
Moto	Fase 4	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso fidelización



Descripción de los subprocesos


- Se considera que la fidelización se activa **al dar de alta al tomador en el programa**, desde distintos puntos del CRM, y dispara una estrategia de bienvenida a través de mensajes por distintos canales.
- Incluye módulos de información del programa y **detalle de movimientos e histórico de altas/bajas**.
- Contempla **promociones internas y externas**, aplicables en cotización mediante código oredirigidas a entorno digital.
- Determinados programas como “Por ser” tendrán **impactos definidos en otros módulos del CRM** como por ej. Renovaciones, o en nuevos presupuestos. También integra estrategias en retención, precancelación y suplementos.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- Se visualizarán los **indicadores de Fidelización en Ficha de cliente**, al igual que la lista relacionada con la información del cliente en los distintos programas, recuperando la información del sistema de Fidelización a través de consultas API.
- Se situarán acceso al portal de Fidelización – visión gestor - en ficha de cliente; disparará un Screen Flow en el que se recuperará el detalle de los programas de fidelización del cliente y los que figuren como disponibles, mostrándolos en pantalla al gestor. Tanto la información como la lógica o cálculos tanto de los indicadores de ficha de cliente como los que se muestren en el detalle del proceso para el cliente, se recuperarán del sistema maestro de fidelización (interno y externo a LDA) via API y llamadas a demanda a dichos sistemas.
- Los programas de fidelización **impactarán en los procesos** en los que deban contemplarse para el cálculo de éstos: Cotización y Suplementos, Renovaciones, Precancelación, si bien dicho impacto se orquestará desde el propio core LDA, que sincronizará la información que reciba de las distintas gestiones en el CRM, con la lógica y procesos internos de LDA.
- La estrategia de comunicación con cliente se plantea realizando la llamada desde el CRM a **Adobe** para el envío de emails / SMS relativos al alta del cliente en programas de Fidelización, según los triggers que se definan para esto en el CRM. La información o cálculos para evaluar cuándo y cómo lanzar estas integraciones se recibirán del sistema maestro en LDA.
- Se propone el uso de **capacidades NBA/NBO** de Salesforce para modelar **recomendaciones de fidelización** que se muestren en la primera ventana de detalle de fidelización, considerando histórico de cliente y reglas migradas inicialmente a Salesforce, adaptándose a la arquitectura del módulo de reglas NBA/NBO.

Premisas

- Se considera migrar al CRM el proceso de Fidelización digital, y no embeberlo en Salesforce, debido a las implicaciones técnicas y de experiencia de usuario que puede resultar de incrustar el portal en un iframe en la plataforma. No obstante, si existe directriz en contra de esto, se revisará y valorará el mejor enfoque durante la fase de Discovery

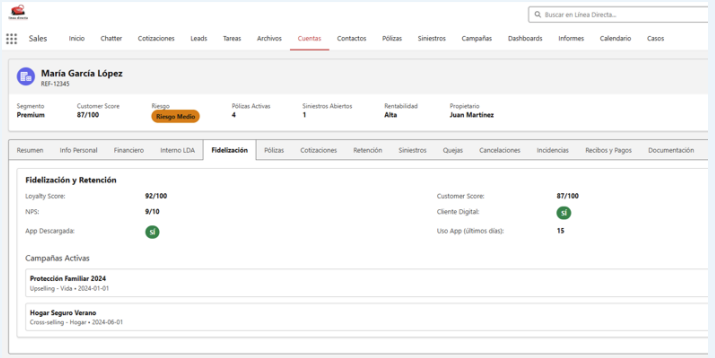

COMPLEJIDAD

Alta

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box


FASE

Hogar	Fase 5	Salud	Fase 5
Coche	Fase 5	Expats	Fase 5
Moto	Fase 5	Empresa	Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Proceso fidelización

A continuación, se detalla el planteamiento del flujo de Fidelización para ilustrar el enfoque contemplado en la propuesta:

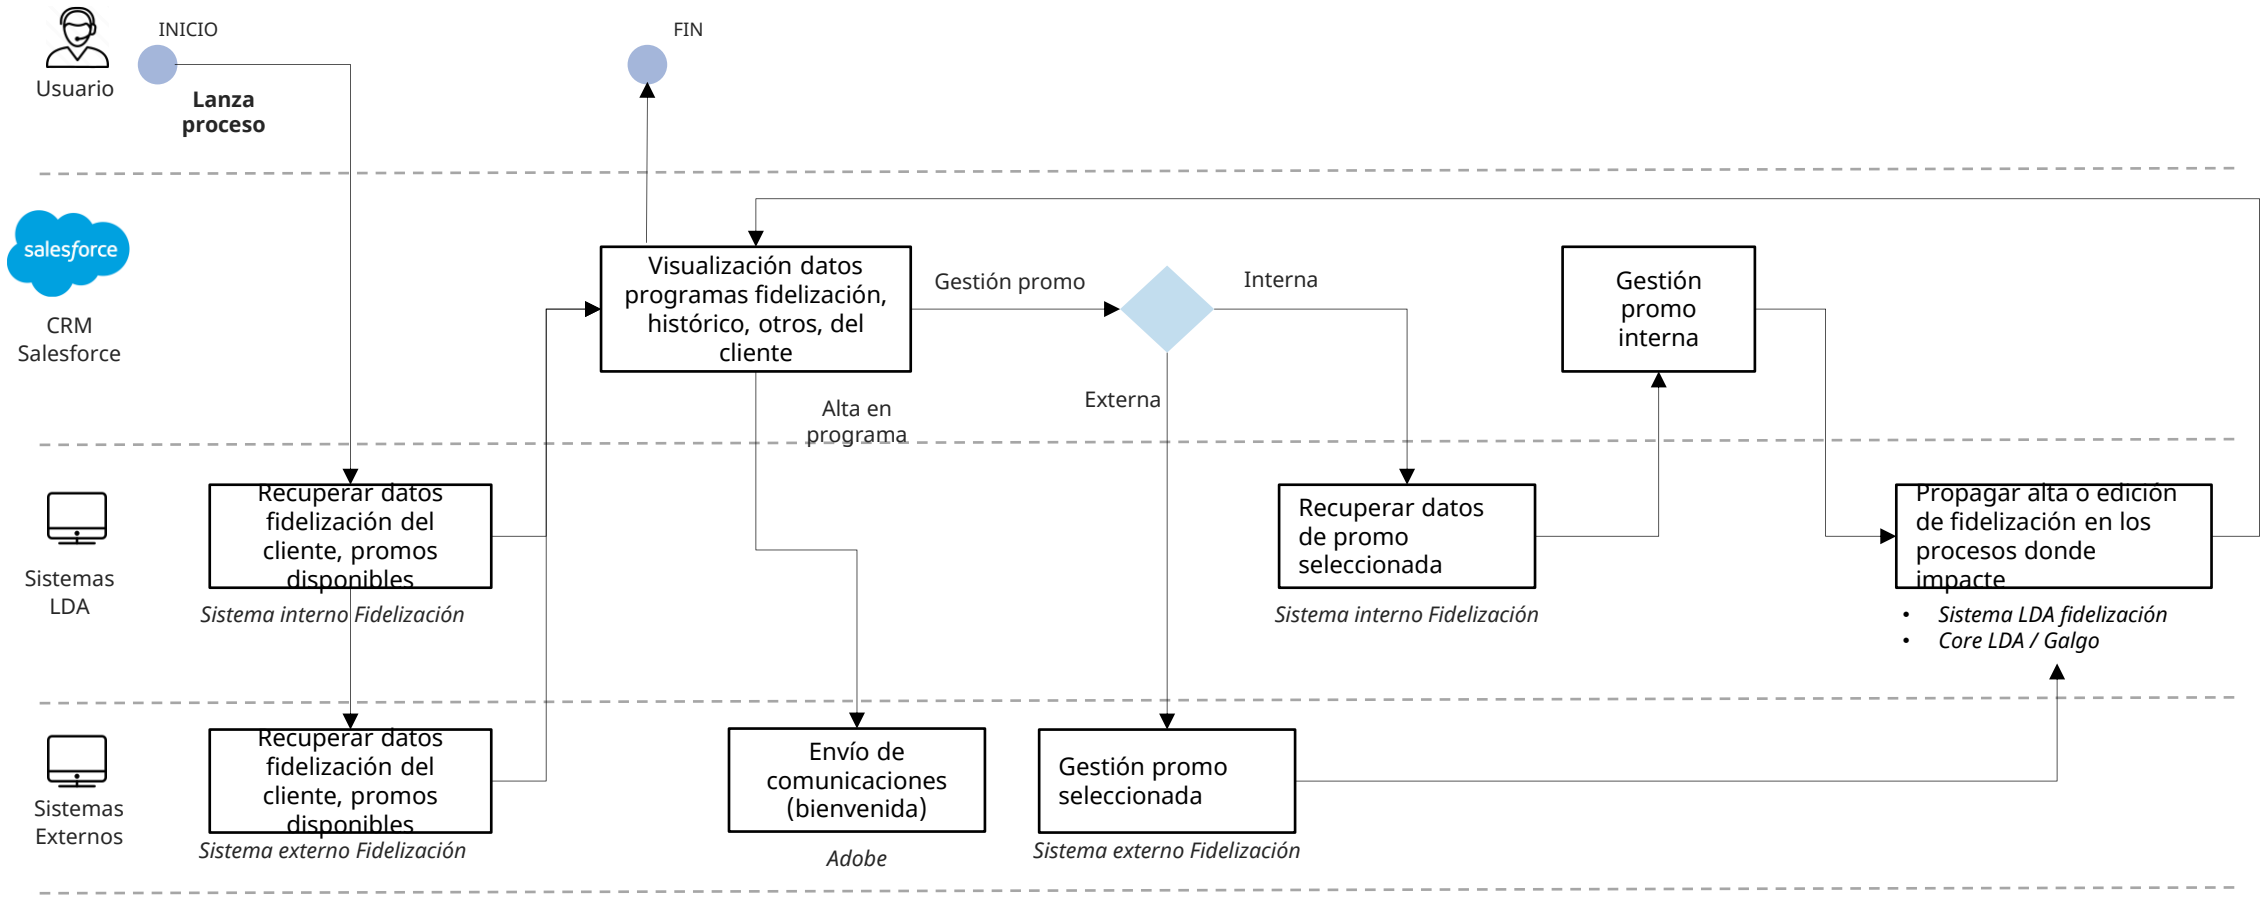

Comentarios:

- Si el cliente tiene algun beneficio por fidelización, en proceso de cotización Galgo será responsable de indicar dicho beneficio
- Las campañas de fidelización nuevas o modificadas impactarán en Cotización, Renovación de pólizas, Suplementos
- Los datos de las campañas de fidelización existentes impactan en Precancelación (deberán cargarse al abrir dicho proceso)
- Las estrategias de fidelización formarán parte de las estrategias a mostrar en precancelación según el motivo de la cancelación u otros
- Desde métodos de pago se controlará la integración con campañas relativas a determinadas tarjetas empleadas

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Portal

Se propone la implantación de un **Portal de Partners y Usuarios Operativos** sobre Salesforce Experience Cloud que permita revisar información del CRM como por ejemplo la gestión controlada de Leads, consulta de Oportunidades o revisión de procesos de aprobación

Descripción de los subprocesos

El portal, tentativamente, permitirá:


- La consulta de pipeline de oportunidades con filtros por estado, ramo, fecha o partner.
- Alta y gestión de Leads/Referrals con formularios simplificados, y conversión de Lead a Oportunidad según permisos.
- Consulta de oportunidad (estado, importe, histórico de interacciones).
- Visualización del estado de cotización y trazabilidad del proceso.
- Gestión de aprobaciones (aprobar / rechazar / comentar) y panel de tareas pendientes y alertas.
- Acceso a documentación asociada (ofertas, anexos, comunicaciones).
- Modelo de permisos granular por rol y visibilidad limitada a cartera propia.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- La solución se construirá sobre Salesforce Experience Cloud, facilitando un desarrollo nativo en Salesforce que permite la integración automática con las entidades y automatismos / integraciones del CRM controlando el acceso a datos por perfiles y permisos según tipo de usuario.
- El modelo de datos se apoyará en objetos estándar en principio (Lead, Opportunity, Quote, Approval) con reglas de compartición (Sharing Rules / Sharing Sets) para garantizar visibilidad restringida.
- Al igual que otros procesos y entidades, la integración con el core LDA se realizará mediante APIs y consumo de eventos para actualizaciones near-real-time.
- Se implementarán mecanismos de autenticación segura compatibles con Salesforce Experience Cloud (SSO/MFA), auditoría, control de acceso a nivel de registro y trazabilidad completa de acciones críticas.

Premisas

- No se incluirán capacidades de configuración avanzada de producto ni lógica en el portal.
- El core LDA mantiene el rol de sistema maestro para cotizaciones y pólizas.
- El portal ofrece operativa acotada y no sustituye funcionalidades del core.
- Se considera el cumplimiento de requisitos de seguridad, auditoría y RGPD.
- Se contempla únicamente el uso de configuraciones, plantillas y visualizaciones estándar para habilitar la visualización y navegación del portal, permitiendo branding y estilos LDA, pero sin contemplar desarrollos a medida.

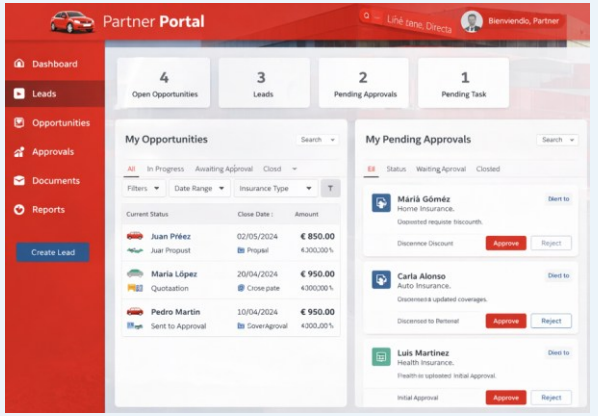

COMPLEJIDAD

Baja

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: Quejas y Reclamaciones

Se añade la propuesta de cobertura del flujo de Quejas y Reclamaciones según los requerimientos recibidos.

Descripción de los subprocesos


- El proceso de gestión de **quejas e insatisfacciones multicanal**, iniciado desde distintos puntos de contacto (email, web, teléfono, organismos externos), permitirá registrar, clasificar y gestionar incidencias tanto de **clientes, no clientes o terceros perjudicados**.
- El proceso contempla la **asociación a pólizas, expedientes o cotizaciones**, la gestión de casos en paralelo, la consolidación o reapertura de incidencias, así como la **trazabilidad completa del ciclo de vida** desde su creación hasta su resolución.
- Incluye capacidades de **clasificación (queja / insatisfacción), asignación automática, gestión por estados, derivaciones entre áreas**, así como la comunicación al cliente y, en su caso, la **gestión de compensaciones económicas**.
- Contemplará enlaces a htas. LDA como gestión de quejas con BPM, gestor documental, Galgo, proveedores externos.

Solución propuesta – Enfoque técnico

- La solución se construirá sobre el objeto estándar **Case como entidad principal**, extendido mediante objetos custom (afectados, pagos, por ejemplo) y configuraciones específicas para soportar la complejidad del proceso.
- Se plantea apoyar la gestión de estados en las configuraciones de etapas de casos y en donde sea necesario extender usando **Screen flows y record-triggered flows para gestión de estados y automatismos**.
- El estándar de Service Cloud cubriría **las reaperturas de caso, asignación de casos a usuarios o grupos** y otras reglas de negocio. Se utilizará APEX para codificar aquellas validaciones que sea necesario gestionar a medida, como por ej reglas de deduplicados más complejas de lo que soporta el estándar.
- Se plantea el uso de las páginas estándar de Salesforce para la **gestión guiada y formularios dinámicos,** añadiendo Lightning web components en determinados puntos para facilitar requisitos visuales que sean imprescindibles para negocio.
- Se contemplan integraciones entrantes para la **recepción y alta de casos (OCU / OMIC / sede electrónica),** y salientes como la **sincronización a demanda con la bbdd de Perjudicados, Gestor documental, pasarela de pagos, y herramienta de comunicaciones CDN** para el envío de notificaciones a cliente, permitiendo además al usuario seleccionar el canal de envío.

Premisas

- Salesforce centralizará la recepción y gestión de quejas y reclamaciones.
- Galgo se mantiene como sistema maestro para pólizas, estados contractuales y lógica de negocio.
- La documentación se almacenará en el gestor documental corporativo, manteniendo Salesforce la referencia y trazabilidad
- La gestión de pagos y compensaciones se ejecutará en sistemas externos, siendo Salesforce responsable de guardar la trazabilidad y completitud de los mismos.

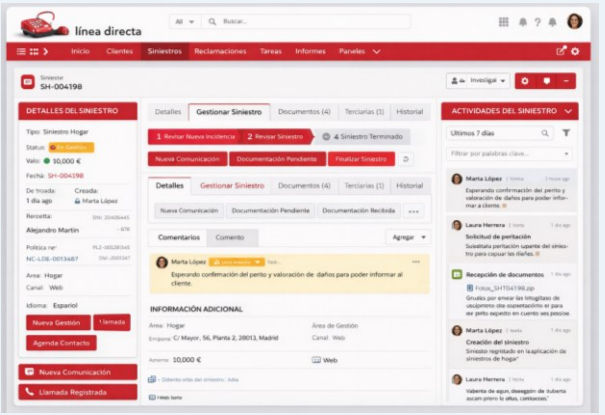

COMPLEJIDAD

Media

COBERTURA DEL ESTÁNDAR

Out of the Box

FASE

Fase 5

© 2026 NTT DATA, Inc.

Detalle fichas requisitos: IA en los procesos

En el ámbito de aumentar la eficiencia del Contact Center a través de la automatización de tareas mediante capacidades IA de Salesforce, se identifican las siguientes aplicaciones según proceso y tipo de IA, incluyendo en el mapa las opciones planteadas en las fichas de cobertura de requisitos:

	PROCESOS INFORMATIVOS		VENTA Y SUSCRIPCIÓN			GESTIÓN DE CLIENTES Y PÓLIZA				
	Identificación Cliente	**Ficha Cliente**	**Cotización**	**Upselling & Crosselling**	**Suplementos**	**Recibos y Pagos**	**Retención**	**Recobro**	**Cancelación y PNC**	**Fidelización**
IA Predictiva	Clasificación automática del caso	*Churn Risk Score* / Customer Risk	Propensión a compra	NBO – Next Best Offer 🟡		Predicción de impago	Modelo de *churn* + recomendación contraoferta	Scoring probabilidad recuperación		NBA – Next Best Action 🟡
IA Generativa	Resumen automático de llamada / motivo 🟢	Resumen inteligente histórico cliente 🟢	Generación automática de email de oferta 🟢	Argumentario personalizado en tiempo real 🟢	Resumen impacto cambio de póliza 🟢		Generación dinámica de discurso de retención	Mensajes personalizados según perfil		
Agentforce	Análisis de sentimiento de llamadas	Propuesta Next Best Action contextual	Asistente comercial en objeciones	NBO – Next Best Offer & Capa Agéntica 🟡		Agente autoservicio para consultas simples	Agente recomendador de estrategia			NBA – Next Best Action & Capa Agéntica 🟡

Se propone un despliegue progresivo de IA, comenzando por capacidades generativas de productividad inmediata, evolucionando hacia modelos predictivos avanzados y culminando en agentes autónomos proactivos en fases posteriores al alcance de esta propuesta.

- 🟢 Capacidades contempladas en el alcance y a abordar en MVP
- 🟡 Capacidades contempladas en el alcance y a abordar en fases posteriores
- ⬚ Resto de opciones: Capacidades no contempladas en el alcance – Propuesta de Roadmap

Nuestro enfoque progresivo en la adopción de capacidades de IA, estará alineado con la madurez de la solución y la evolución de los casos de uso. Dado que el dimensionamiento óptimo depende de volumetrías reales, se recomienda ajustar el consumo de **flexCredits en fase de discovery** y gestionar con Salesforce paquetes de FlexCredits flexibles que permitan su uso a lo largo de la vida del contrato, pudiendo adaptarse las necesidades reales del negocio y evolución de la solución.



Anexos

Metodología, planificación y equipo

© 2026 NTT DATA, Inc.

Equipo del programa

Un **equipo multidisciplinar** que combina las capacidades necesarias para enfrentar cada fase de la transformación.



Modelo de trabajo y presencialidad

- **Inception / Discovery / Gestión del cambio** ***(despliegue de plan de aprendizaje y soporte post golive)*****:** presencialidad de **perfiles clave** (40–50%)
- **Construcción (CRM + Integraciones + Data):** modelo híbrido con presencialidad de **perfiles clave** (20–40%)
- **Hypercare:** soporte remoto con refuerzo presencial de **perfiles clave** en arranque

El modelo combina capacidades onshore y offshore, aplicando offshore únicamente en tareas de desarrollo industrializado, bajo un modelo piramidal y con gobierno técnico que garantiza calidad, eficiencia y continuidad.

Consideraciones

- Presencialidad variable según fase y criticidad, focalizada en **perfiles clave**
- BPS/Formadores en modelo híbrido, con presencia de **perfiles clave** en despliegues
- Participación activa de **perfiles clave en construcción** para asegurar calidad

© 2026 NTT DATA, Inc.

Dedicación equipo LDA

El éxito del proyecto requiere la **participación activa del equipo de LDA** en momentos clave de la transformación.
A continuación, se detalla el formato de colaboración y dedicación media previsto por rol durante el proyecto, especificando sus principales responsabilidades y las fases donde su intervención será más relevante.

			FASES FOCO
Gestión y gobierno	**Sponsor ejecutivo** 5-10%	✓ Aprueba roadmap, presupuesto y prioridades estratégicas del programa CRM. ✓ Participa en Steering Committee y en los gates formales (Kickoff, Inception, Go-Live). ✓ Desbloquea decisiones organizativas, dependencias críticas (Genesys, Core, Data) y cuestiones de convivencia CRM–Galgo. ✓ Garantiza alineación con estrategia corporativa, eficiencia operativa y experiencia cliente.	Cross
	Responsable Programa CRM 40-60%	✓ Interlocutor único con el proveedor conforme al modelo operativo ✓ Responsable de seguimiento de hitos, riesgos, dependencias y cumplimiento contractual. ✓ Coordina áreas internas: Negocio, Arquitectura, Seguridad, Data, Contact Center. ✓ Supervisa cumplimiento de alcance, criterios Go/No-Go y modelo de convivencia progresiva. ✓ Participa activamente en comités operativos y Design Authority.	Cross, con intensidad en Construcción, SIT/UAT y Go-Live.
Sistemas	**Responsable Arquitectura IT** 20-30%	✓ Participa en Design Authority. Valida arquitectura CRM y modelo híbrido CRM–Galgo. ✓ Aprueba patrones de integración (Event Driven / API Manager). ✓ Supervisa estándares técnicos, seguridad, observabilidad (ELK, Dynatrace). ✓ Supervisa cumplimiento RGPD, DORA y Anexo de Ciberseguridad.	Inception, Discovery, Construcción, Go-Live
	Responsable Integración Core (Galgo) 20% -30%	✓ Define servicios expuestos desde mainframe. ✓ Prioriza backlog de APIs y eventos. ✓ Valida sincronización RT / near RT y participa en definición de reconciliaciones y control de idempotencia. ✓ Supervisa impacto de releases en estabilidad operativa del core.	Inception, Discovery e Construcción.
	Responsable Data / Lakehouse 15%-25%	✓ Alinea modelo de datos CRM con arquitectura analítica futura. ✓ Valida integración con entorno Lakehouse y reporting. ✓ Define trazabilidad, linaje y reconciliación CRM–Galgo. ✓ Supervisa calidad de datos y procesos de migración.	Inception, Discovery e Construcción.
Negocio (*)	**Product Owner Negocio** 50%-80%	✓ Prioriza backlog y valida historias de usuario. Define criterios de aceptación funcional. ✓ Lidera validación UAT y aprobación formal de entregables. Responsable del valor entregado en cada release. (*) % estimado sólo durante fases activas	Inception, Discovery y UAT
	Personas y Comunicación + Equipo responsable Gestión del Cambio 30%-40 %	✓ Proporcionan información de colectivos impactados. Validan informes y entregables de Gestión del Cambio. Apoyan en el despliegue del Plan de Comunicación, Aprendizaje y adopción. ✓ Actúan como sponsors y embajadores desde el inicio del proyecto (*) En caso de Escenario 1 de Formación la dedicación de key user como formadores se incrementará al 75 %	Inception, Despliegue, Go-Live.
	Key Users 20%-40%	✓ Validan UX y journeys. Participan en pruebas SIT/UAT. ✓ Detectan impactos operativos reales. Actúan como embajadores en despliegue y adopción. (*) % estimado sólo durante fases activas	Discovery, UAT, Go-Live.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Matriz RACI: Modelo de responsabilidad

MODELO DE RESPONSABILIDAD DE PERFILES GESTIÓN DEL CAMBIO

La siguiente matriz RACI propuesta por NTT DATA aclara las **responsabilidades de los distintos perfiles involucrados en la Gestión del Cambio:**

Actividades Gestión del Cambio	LINEA DIRECTA	CoE CRM	NTT DATA
Definición estrategia de Gestión del cambio	A	C	R
Análisis de stakeholders e impactos del cambio	A	C	R
Diseño y ejecución Plan de Comunicación	A	C	R
Diseño y ejecución Plan de Aprendizaje	A	C	R
Ejecución Plan de Aprendizaje - Formación a usuario final - Escenario 1	R	C	C
Ejecución Plan de Aprendizaje - Formación a usuario final - Escenario 2	A	C	R
Gestión de Red de cambio (Patrocinador, embajadores/champions y comunidad de usuarios) durante el proyecto	A	C	R
Diseño y monitorización Plan de monitorización y refuerzo	A	C	R
Definición modelo CoE CRM	A	A	R
Definición modelo operativo y gobierno	A	A	R
Definición RACI operativo futuro	A	A	R
Definición KPIs de adopción y uso	A	C	R
Soporte post Go-Live (Hypercare)	A	C	R
Seguimiento de adopción y uso	R	A	C
Gestión de feedback de usuarios	R	A	C
Monitorización KPIs de negocio	R	A	C
Priorización backlog evolutivo	R	A	C
Gestión del cambio - Gestión de releases y mejoras	R	A	R
Gestión del cambio - Gestión de conocimiento y documentación durante el proyecto	A	A	R
Gestión del cambio - Transferencia de conocimiento	A	A	R
Gestión del cambio - Gestión de conocimiento y documentación post proyecto	A	R	C
Gestión del cambio - Seguimiento de adopción y uso post proyecto	R	A	C
Gestión del cambio - Gestión de Red de cambio (Patrocinador, embajadores/champions y comunidad de usuarios) post proyecto	R	A	C
Gestión del cambio - Mejora continua del modelo CRM	R	A	C

MODELO DE RESPONSABILIDAD DE PERFILES COE CRM (RACI)

La siguiente matriz RACI propuesta por NTT DATA aclara las **responsabilidades de los distintos perfiles del CoE CRM de Línea directa**:

Actividades CoE CRM	CRM Lead	Arquitecto CRM	Gobierno & Releases	Backlog / Demand	Data CRM	Adopción & Change Lead
Definición estrategia CRM	A	C	I	C	C	C
Gobierno de la plataforma	A	R	R	C	C	I
Definición arquitectura y estándares	I	A	C	I	C	I
Validación de soluciones y diseños	A	R	C	C	I	I
Priorización backlog	A	C	I	R	I	C
Gestión de demanda negocio	A	I	I	R	I	C
Planificación de releases	C	C	A	R	I	I
Despliegue de releases	I	C	R	I	I	I
Gestión de integraciones	I	R	C	I	C	I
Gobierno de datos CRM	I	C	I	I	A	I
Calidad y modelo de datos	I	C	I	I	R	I
Monitorización KPIs y uso	A	I	I	C	C	R
Gestión de adopción	A	I	I	C	I	R
Formación continua	C	I	I	I	I	R
Gestión de incidencias (N2/N3)	A	R	R	I	C	I
Mejora continua del CRM	A	R	C	R	C	C

Consideraciones: **Para el seguimiento de estas actividades se establecerán KPIs de Gobierno y gestión de la demanda, de Entrega (Delivery / Releases), de Incidencias y Soporte, de Adopción , de Valor de negocio y de Mejora continua.*

© 2026 NTT DATA, Inc.

Modelo de gobierno y responsabilidades del programa

El programa se gobierna mediante un **modelo estructurado en niveles estratégico, táctico y operativo**, que asegura **alineación con negocio, coordinación entre los distintos actores implicados y control efectivo de la ejecución del proyecto.**

		OBJETIVOS
Nivel estratégico	**COMITÉ DIRECTIVO**	Seguimiento de la evolución de los resultados del proyecto, asegurando que todas las decisiones se ajustan a la estrategia de Moeve Chemicals. Aprobación cambios contractuales. Revisión planes sobre el servicio.
Nivel táctico	**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**	Transforma las decisiones a nivel estratégico en planes de acción, coordinando y controlando su ejecución. Responsable de la identificación de las necesidades de Moeve Chemicals.
Nivel operativo	**EQUIPOS DE TRABAJO**	Seguimiento, gestión operativa y ejecución de las tareas diarias, garantizando el éxito del proyecto en términos de alcance, costes y calidad.

Actividades del proyecto	LDA	NTT DATA	Terceros	SF
Modelo de gobierno	A	R	-	-
Provisión de licencias (Salesforce/ Mulesoft/ LinkedIn)	R	C	-	R
Coordinación y seguimiento de proyectos	R	R	I	I
Consultoría estratégica	A	R	-	-
Solución técnica y arquitectura informática	R	R	I	C
Desarrollos para la integración de sistemas (SAP/Datalake/ Mulesoft)	A	R	R	I
Construcción de CRM (Salesforce/Mulesoft)	A	R	-	C
Pruebas integradas y E2E	A	R	R	-
Actividades y recursos de Gestión del Cambio	A	R	-	-
Recursos de apoyo a la formación	R	R	C	C
Plan de formación: Formación a Formadores	A	R	I	-
Plan de formación: Formación a usuario final (Escenario 1)	R	C	I	-
Plan de formación: Formación a usuario final (Escenario 2)	A	R	I	-
Plan de pruebas de aceptación del usuario (UAT)	R	C	A	-
Ejecución de pruebas de aceptación del usuario (UAT)	R	C	C	C
Corrección de errores en UAT	A	R	R	R
Plan de implantación y soporte	R	R	C	-
Decisión Go/ No go	R	C	C	I
Go live y soporte	R	R	C	I



Anexos


Aceleradores

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque eficiencia con IA: Aceleradores

Generación Automática de Prototipos Navegables y Traducción a Salesforce

Propósito	Generación automática y gobernada de prototipos navegables con look&feel Salesforce a partir de historias de usuario, asegurando alineación directa con componentes Salesforce (Flows, LWC, objetos).
Qué Acelera	• **Validación** UX temprana • Reducción **retrabajo** funcional • **Traducción** directa a lógica Salesforce • **Aceleración** Inception / Blueprint • **Reducción del riesgo** de redefinición funcional en UAT
Qué Incluye	• **Motor** de generación LWC y Flows • **Librerías** de componentes aseguradores • **Conversión** automática historias → estructura técnica • **Validación** de coherencia funcional.
Nuestro Framework	• **Arquitectura:** Orquestación inteligente de acciones. • **Capa Semántica:** Traducción dinámica de lenguaje funcional a objetos y flows. • **Automatización:** Generación de componentes reutilizables. • **Gobernanza:** Versionado y control de cambios.

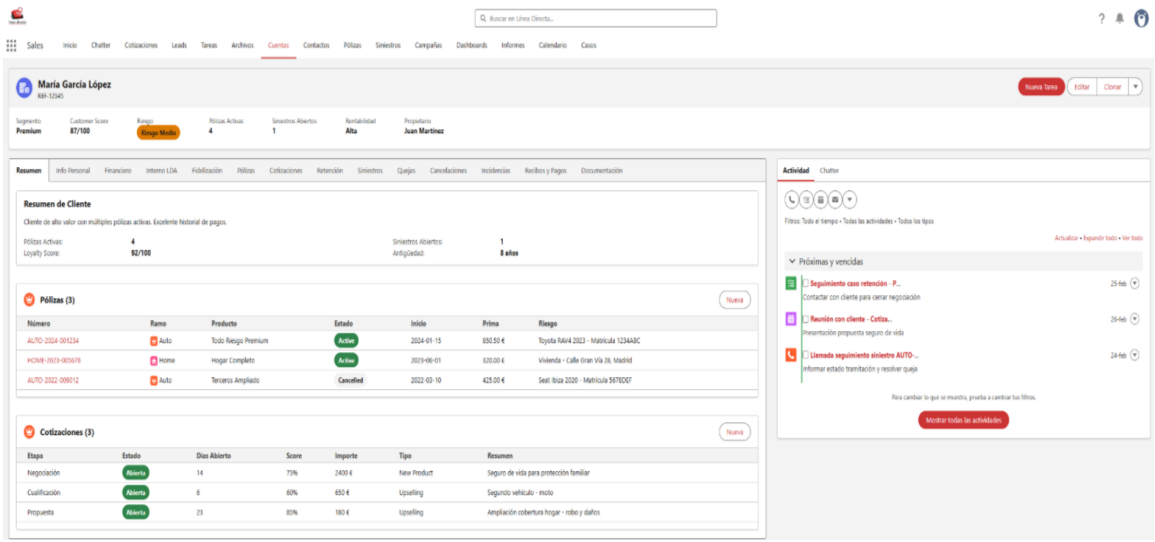

-25% Tiempo de diseño de UX

-50% Bloqueos por desalineación UX–negocio


- Reducción estructural del **retrabajo** en UAT
- Eliminación de **bloqueos** por desalineación funcional
- **Aceleración** de fases fundacionales (Inception / Blueprint)

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque eficiencia con IA: Aceleradores

Generación de Casos de Uso IA Adaptados al Negocio

Propósito	Identificación automática y priorización de casos de uso IA alineados con métricas reales de negocio (conversión, TMO, churn, eficiencia)
Qué Acelera	• **Detección** de oportunidades IA en procesos comerciales y operativos • **Simulación** de impacto económico • **Priorización** por ROI y complejidad • Integración con modelo operativo CRM
Qué Incluye	• **Catálogo** de casos sector asegurador • **Matriz** impacto vs complejidad • **Framework** de scoring dinámico • **Templates** Agentforce integrables
Nuestro Framework	• **Capa Semántica:** Traduce KPIs y métricas en lógica de recomendación. • **Automatización:** Activa casos como carrito asistido, retención contextual o resumen automático. • **Gobernanza:** Trazabilidad del razonamiento y control de consumo.

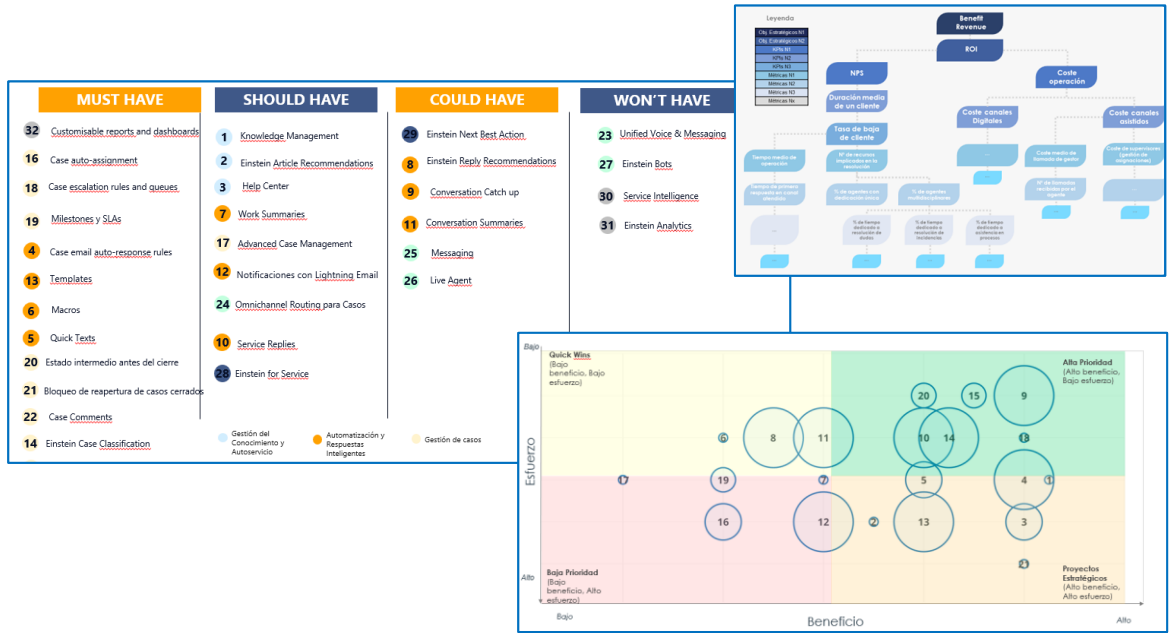

-20% Tiempo de definición de casos de uso IA

5-10% Eficiencia operativa


- Identificación temprana de **quick wins**
- Mayor alineación **negocio–tecnología**
- **Reducción riesgo** de "IA cosmética"

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque eficiencia con IA: Aceleradores

Generación Automática de Modelo Extendido

Propósito	Generación automática y gobernada del modelo de datos extendido a partir del lenguaje de negocio, asegurando coherencia estructural desde el Blueprint.
Qué Acelera	• **Traducción** de procesos TO-BE a modelo de datos • Identificación de **entidades, relaciones y atributos** • Definición de **external IDs** • **Reducción de inconsistencias** estructurales entre CRM, Core y Data Lake
Qué Incluye	• **Motor agéntico** de generación asistida del modelo extendido • **Librerías** sector asegurador • **Patrones** multipóliza y oportunidad multiproducto • **Validaciones** automáticas de inconsistencias
Nuestro Framework	• **Arquitectura**: Modelo escalable optimizado para entornos productivos. • **Capa Semántica**: Traducción dinámica del lenguaje de negocio a estructuras de datos complejas. • **Gobernanza**: Control de versiones del modelo y trazabilidad de decisiones.

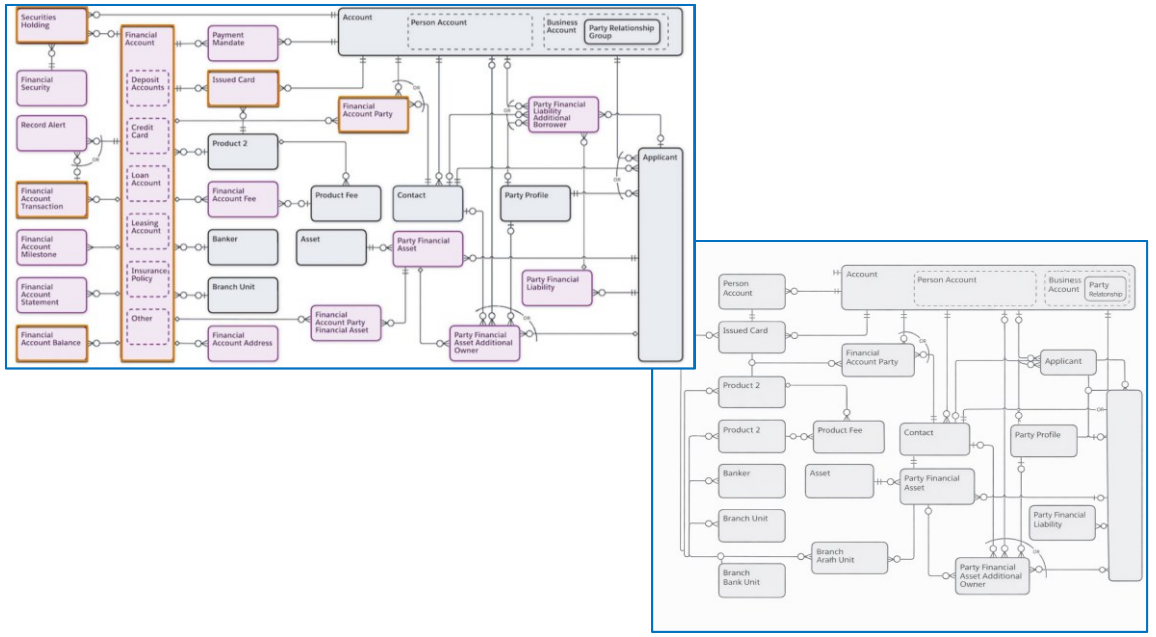

-30% Tiempo de diseño de modelo

-50% Tiempo de construcción de modelo

- Reducción **retrabajo** estructural
- Mejora **coherencia** CRM–Core
- Disminución **riesgo** técnico en fases iniciales

© 2026 NTT DATA, Inc.

Enfoque eficiencia con IA: Aceleradores

Acelerador FÉNIX

Fénix es un acelerador que permite la generación automática de documentación técnica a partir de servicios MuleSoft existentes.

Problema habitual


- Documentación desactualizada o inexistente.
- Dependencia del desarrollador original.
- Alto esfuerzo manual en auditorías y mantenimiento.
- Riesgo en evolutivos y onboarding de nuevos equipos.


Solución Fénix

- Analiza automáticamente el servicio MuleSoft.
- Genera diagrama de flujo, secuencia técnica e Inventario de componentes.
- Genera documentación estructurada y reutilizable en minutos.

Impacto en el proyecto LDA

- Reducción significativa del tiempo de documentación técnica.
- Mejora en la trazabilidad y gobierno de integraciones.
- Aceleración en análisis de impacto ante cambios.
- Menor riesgo operativo y mayor mantenibilidad.

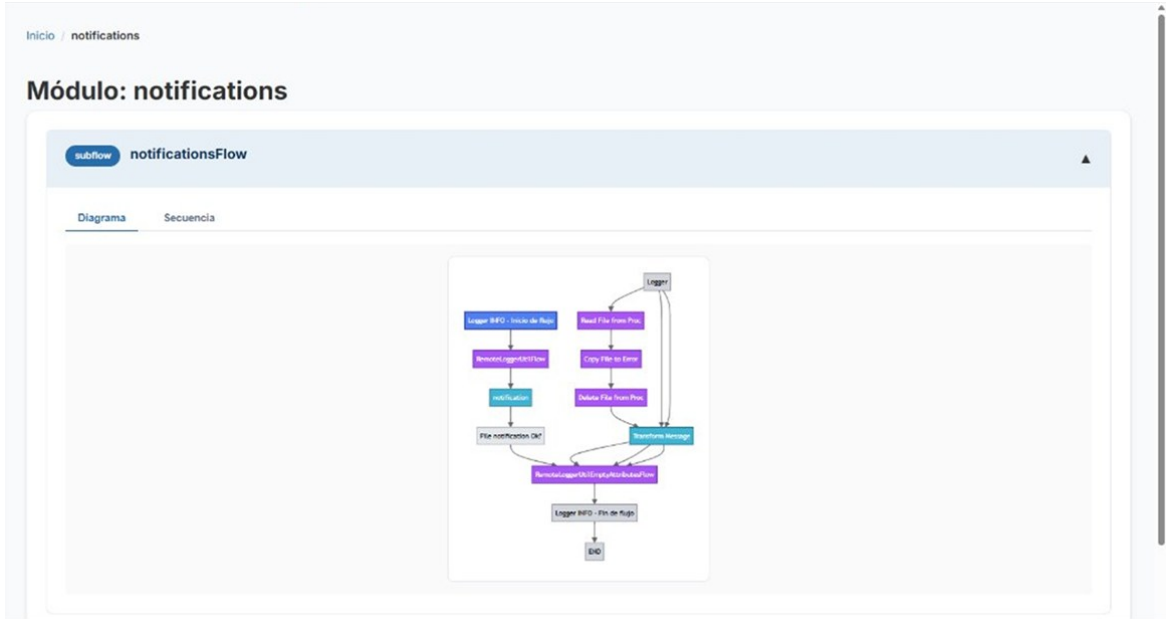

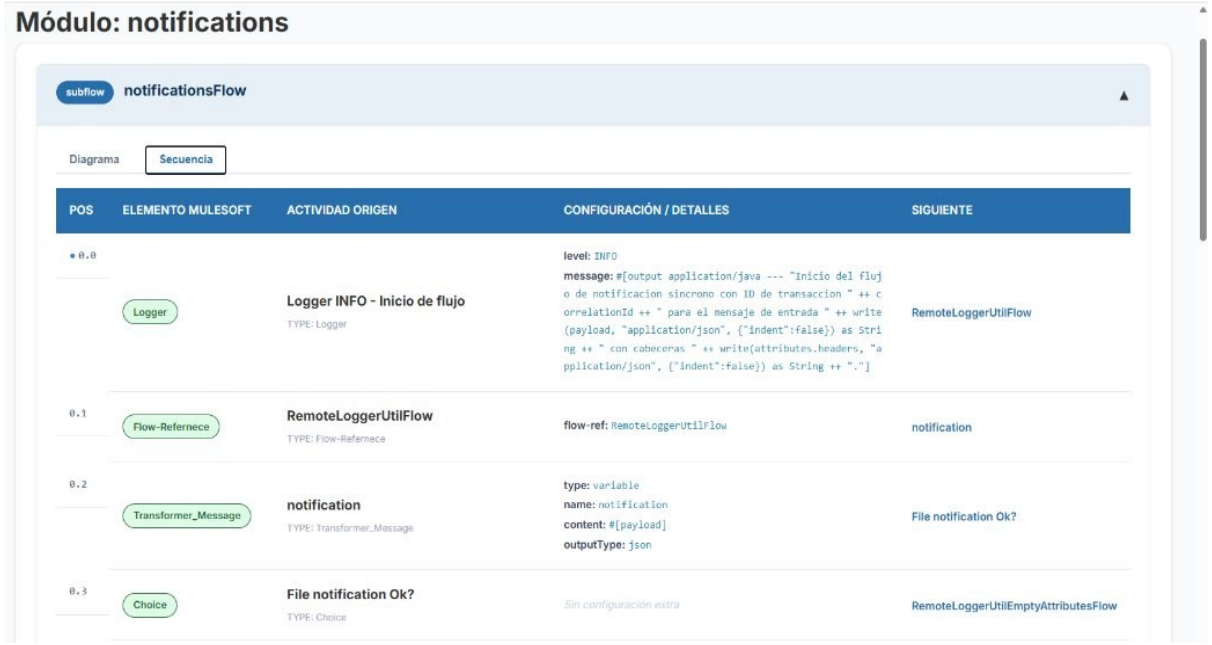



Anexos

KPIs

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito: KPIs de transformación

Medimos la transformación por su **impacto** en **eficiencia**, **crecimiento** y **rentabilidad** aseguradora.

1. Adopción y Modelo Operativo

Sustitución progresiva de Galgo por **CRM**.

% Procesos en CRM

Adopción por colectivo
Agentes · Back · Partners

Interacciones Omnicanal
trazadas en CRM

Uso de **Galgo**

2. Eficiencia Operativa

Reducción de **costes y tiempos.**

TMO (Tiempo medio Op)

Duplicidades

Retrabajo / Incidencias

Productividad por agente

3. Impacto Comercial

Más ventas y mayor **conversión**.

Conversión Cotización Venta

Cross / Up-Selling

Ticket Medio

Abandono cotización

4. Cartera y Rentabilidad

Medimos la transformación por su **impacto** en **eficiencia**, **crecimiento** y **rentabilidad** aseguradora.

Churn Cliente

Impagos

Retención Cliente-Level

Margen técnico

Estos KPIS se acordarán durante el inicio del proyecto, asegurando un foco claro desde el inicio, que nos permita medir el éxito de la transformación.
Se incluirán KPIs para medir el avance de la Gestión del Cambio y la adopción por parte de los usuarios.

© 2026 NTT DATA, Inc.

KPIS de Ejecución

Medimos la ejecución por su **impacto** en **eficiencia**, **crecimiento** y **rentabilidad** aseguradora.

1. Gobierno y planificación

Medimos control, cumplimiento y predictibilidad

% Hitos cumplidos en fecha

Desviación plazo y esfuerzo vs baseline aprobado
(% plazo y esfuerzo)

Cumplimiento roadmap releases

Variación backlog
(% cambio por dependencias)

Riesgos abiertos vs mitigados

Lead time decisión LDA

2. Calidad y estabilidad de la solución

Medimos calidad técnica, estabilidad y cumplimiento

Defectos críticos en UAT
(% sobre total)

Ratio reapertura incidencias

Cobertura de pruebas
(% requisitos testados)

Defect leakage
(errores detectados post Go)

Cumplimiento checklist seguridad / arquitectura

Cumplimiento estándares integración RT

3. Gestión de Dependencias e Integración

Garantizamos sincronización bidireccional estable y trazable

% Integraciones desarrolladas vs plan

Latencia media integración (p95)

Errores integración / reintentos

Eventos CDC procesados correctamente (%)

Reconciliaciones automáticas exitosas

Incidentes de sincronización datos

4. Adopción y Go-Live

En Plan de Trabajo debes medir readiness, no impacto negocio

% usuarios formados por colectivo

% certificación interna superada

Índice readiness Go-Live

Incidencias funcionales primera semana

Uso CRM vs Galgo
(tracking progresivo)

Nivel feedback early adopters

Estos KPIS se acordarán durante el inicio del proyecto, asegurando un foco claro desde el inicio, que nos permita medir el éxito de la ejecución

© 2026 NTT DATA, Inc.

KPIs de eficiencia esperada

Implantación, evolución y operación (Sales & Service)

KPIs basados en nuestra propuesta Sales & Service, seleccionada por su mejor equilibrio entre time-to-market, flexibilidad , utilización del producto y coste frente a otras alternativas de mercado

KPI Implantación	Impacto esperado	KPI Mantenimiento & Evolución	Impacto esperado	KPI Operativo (Negocio)	Impacto esperado
Reducción esfuerzo de desarrollo	-20% a -30% gracias a uso de aceleradores (componentes UI, APIs, plantillas)	Esfuerzo de evolución funcional	-20% a -30% (configuración + reutilización de componentes)	% adopción self-service	25% – 40% de interacciones trasladadas a digital
Time-to-market funcionalidades	-20% a -30% (despliegue incremental + reutilización)	Tiempo de despliegue de mejoras	-30% vs modelo tradicional	Reducción llamadas al Contact Center	-15% a -30%
Complejidad de implementación	Media (reducida por uso de frameworks y patrones reutilizables)	Flexibilidad ante cambios de negocio	Alta (modificaciones vía configuración y APIs)	Reducción TMO (tiempo medio operación)	-10% a -20%
Reutilización de componentes	>60% (aceleradores + arquitectura modular)	Dependencia de IT	Baja–media (modelo low-code en front)	First Contact Resolution (FCR)	+10% a +15%
Dependencia de desarrollos custom	Baja–media (priorización estándar + aceleradores)	Coste de mantenimiento evolutivo	Bajo (arquitectura desacoplada)	Tiempo resolución gestiones simples	-30% a -50%
Riesgo en integración	Reducido (patrones API + middleware estandarizado)	Impacto de cambios en core	Bajo (desacoplamiento vía APIs/middleware)	Satisfacción cliente (NPS)	+5 a +10 puntos
Eficiencia en testing y QA	-20% esfuerzo (uso de automatización y frameworks reutilizables)	Reutilización evolutiva	Alta (componentes y servicios compartidos)	Productividad agente	+10% a +20%

La propuesta basada en **Sales & Service permite maximizar la eficiencia en todo el ciclo de vida**, desde la **implantación** hasta la **operación**, gracias al uso de **aceleradores**, **arquitectura modular y capacidades low-code**. Este enfoque **reduce el esfuerzo de desarrollo y evolución**, mejora el time-to-market y habilita una mayor adopción digital, impactando directamente en la eficiencia operativa y la experiencia de cliente.

S&S ofrece el mejor equilibrio entre rapidez de implantación, flexibilidad y coste; **FSC está construido sobre S&S, aportando una extensión con especialización sectorial** pero con mayor coste y alta probabilidad igualmente de tener que adaptar parcialmente su estándar al negocio específico de LDA. **MS destaca en capacidades de marketing** pero no cubre de forma nativa los procesos core de relación y servicio.



Anexos

Premisas, dependencias y gestión de riesgos de la implantación

© 2026 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance: Generales

Generales

- El proyecto CRM y Contact Center (Genesys) evolucionan en paralelo con planificación coordinada.
- El modelo de trabajo podrá ser híbrido (no 100% presencial continuo) y se permite modelo mixto onshore/nearshore/offshore: nuestro modelo de delivery contempla para el desarrollo ciertas partidas en offshore.
- No se contemplan cambios regulatorios relevantes durante la implantación.
- El alcance funcional descrito en RFQ es completo y no se contemplan macroprocesos adicionales fuera de los identificados, y si los hubiera se recalibrará el alcance
- La definición de KPIs e informes será cerrada antes de desarrollo.
- LDA proporcionará: Acceso a Galgo/Mainframe.
- Sobre las credenciales presentadas, en caso de ser requerido, se contrastará la posibilidad de acceso a persona de contacto mismas (será necesario confirmar autorización).
- No se han considerado esfuerzos de equipos ajenos a los descritos en esta oferta. Por lo tanto, no se han tenido en cuenta esfuerzos de adaptaciones en otros sistemas, tales como el core (COBOL / CICS / DB2), más allá del consumo de servicios expuestos por LDA.
- La automatización de pruebas no está incluida en esta propuesta. Desde NTT DATA tenemos áreas prestando este servicio bajo diferentes herramientas, recomendamos Selenium. En caso de requerirse, sería un servicio que solicitar adicionalmente a esta RFP.
- No se contempla un enfoque Big Bang; el despliegue será incremental por olas funcionales.
- La lógica aseguradora (pricing, reglas técnicas, underwriting, etc.) permanece en Galgo salvo decisión expresa en fase de diseño.
- No se incluyen reingenierías completas de procesos legacy fuera del perímetro definido en cada fase.Cualquier evolución normativa futura (DORA, RGPD, Solvencia II, etc.) posterior a la adjudicación podrá implicar revisión de alcance.

Inception General

- La estimación de la implantación de NTT DATA se ha basado en los requerimientos facilitados en la RFP, que han sido analizados por NTT DATA y su análisis sirve para la estimación de esfuerzos y el precio entregado a LDA
- A la fecha, existe un cierto nivel de incertidumbre (datos, integraciones, ...etc), por lo que el éxito de esta fase requerirá flexibilidad, colaboración y confianza mutua. Como resultado del análisis de Discovery, podrán identificarse ajustes en el alcance funcional, técnico o de integración inicialmente considerado en la presente oferta. Dichos ajustes serán formalmente documentados en un Informe de Alcance Final (Scope Validation Report), que incluirá:
    - Requerimientos y premisas confirmados, priorizados y validados en cuanto a su complejidad.
    - Nuevos desarrollos o integraciones identificadas, con su complejidad técnica confirmada.
    - Estimación revisada de esfuerzo y actualización del plan de releases.
- En caso de que los ajustes identificados impliquen variaciones relevantes de esfuerzo, cronograma o coste, se aplicará un proceso conjunto de revisión de requerimientos, analizando las categorías must, need y nice to have, con el objetivo de mantener el proyecto dentro del presupuesto original. Si, tras dicha revisión, el resultado acordado implicase un incremento presupuestario relevante, ambas partes podrán:
    - Activar el proceso de gestión de cambios previsto en el Modelo de Gobierno, para su evaluación y aprobación en el Comité de Proyecto
    - O bien acordar una salida pactada, en caso de no llegar a un acuerdo en el coste sobre la implantación facilitado tras el Discovery, tanto LDA como NTT DATA podrán optar a la finalización del contrato. En este caso
    - NTT DATA dejaría finalizada la definición funcional y realizaría un traspaso de conocimiento de dicho funcional valorado entre 2 y 4 sesiones
    - Hasta la aprobación del Scope Validation Report, los hitos de planificación y estimaciones de esfuerzo asociados al desarrollo o implantación tendrán carácter provisional y orientativo

Necesidades de entornos y usuarios

- Se considera necesario, para no impactar en el desarrollo del proyecto y comprometer las fechas establecidas, el poder disponer en la fecha planificada de los entornos, herramientas, plataformas de desarrollo, usuarios habilitados, etc. necesarias para la realización del proyecto

Herramientas

- Se contempla la utilización de las herramientas JIRA y Office como herramientas de trabajo para documentar la solución implementada.
- LDA deberá proporcionar accesos, entornos y credenciales en tiempo y forma.
- Se asume disponibilidad de herramientas corporativas de CI/CD. No se incluye la creación de un nuevo modelo DevOps corporativo.

Licencias y Software necesario para el desarrollo

- La adquisición de licencias de uso del producto Salesforce y el resto que se utilicen en la implantación del proyecto se realizará por parte de LDA con dichos vendors sin ejercer NTT DATA como intermediario.
- Las licencias deben estar disponibles al inicio del proyecto.

Idiomas

- Se contempla la configuración de idiomas del aplicativo Salesforce en Español e Inglés.
- Se contempla configuración estándar en Español e Inglés.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance: Implantación

Implantación:

- Por cada oleada, se incorporará una planificación detallada del proyecto que incluirá todos los hitos, tareas y entregables bajo responsabilidad de NTT DATA, así como las actividades dependientes de terceros. Dicho plan identificará las fechas clave de colaboración o entrega requeridas por cada parte (por ejemplo, definición y desarrollo de integraciones, ejecución de pruebas funcionales y UAT, fases de validación y despliegue). En ningún caso se asumirán costes derivados de causas no imputables a NTT DATA (p. ej., demoras por aprobaciones del Cliente, cambios de alcance, dependencias externas no gestionadas por el Proveedor). Existirá un límite de responsabilidad económica por el proyecto a acordar entre las partes
- NTT DATA se compromete a cumplir el calendario de implantación acordado y los Acuerdos de Nivel de Servicio de implantación. Definiciones operativas
    - Retraso Imputable al Proveedor: desviación respecto al Calendario Comprometido causada por hechos bajo control del Proveedor (p. ej., falta de disponibilidad del equipo acordado, demoras en entregables propios, incidencias técnicas no relacionadas con dependencias de LDA o terceros).
    - Desviación: diferencia entre la fecha/alcance planificado y el real (hitos, duración de UAT, fecha de paso a producción).
    - En caso de que se produzcan retrasos en los hitos de implantación imputables a NTT DATA, el proveedor asumirá los costes razonables y directamente atribuibles a dichas desviaciones, siempre que se trate de impactos derivados de causas bajo su control (por ejemplo, falta de disponibilidad de recursos comprometidos, incidencias técnicas propias o demoras en entregables críticos).
    - Cualquier eventual sobrecoste imputable al retraso deberá centrarse exclusivamente en los costes adicionales de implantación o en los recursos necesarios para recuperar el plan de proyecto, y no en los costes de licenciamiento, que estarán amparados por las condiciones del acuerdo Salesforce–LDA
- Impactos por otros proyectos: en caso de replanificación del proyecto por causas ajenas a NTT DATA deberá revisar el posible impacto en planificación y coste asociado.
- Cambio de alcance y causas no imputables: todo cambio de alcance, dependencia externa, o decisión del Cliente que afecte al plan se gestionará mediante Change Request con su traza de impacto en plazo/coste/ANS. Estos casos no generan asunción de costes por parte del Proveedor. Anexos útiles: 1. Plantilla de Registro de Desviaciones (campos: ID, Hito, Fecha detección, Causa, Imputable a, Impacto plazo/coste, Acción, Owner, ETA, Estado; 2. Catálogo de causas tipo (p. ej., staffing, calidad de entregable, dependencia externa, entorno, decisión de negocio); 3. Cuadro de mando ANS con indicadores y umbrales de alerta/penalización
- Procedimiento de Cambios en el alcance: En caso de que, durante la ejecución de las tareas amparadas por esta propuesta, se modifiquen los supuestos, plazos, actividades previstas, etc., ambas partes se reunirán a solicitud de NTT DATA para redefinir el cronograma de ejecución y los esfuerzos previstos, así como para acordar una valoración económica de los impactos que se formalizarán en una Nota de Cambio, si corresponde. A través del Comité de Dirección, LDA y NTT DATA deben firmar la Nota de Cambio del sistema como prueba de la aceptación y compromiso de ambas partes, proporcionando una copia a NTT DATA. LDA y NTT DATA se comprometen a incluir en todas las reuniones de seguimiento de proyectos, como punto del orden del día, la revisión del estado de las Notas de Cambio pendientes. El plan de facturación se regularizará con los ajustes acordados en los comités de dirección
- Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) serán medidos y evaluados conforme a las condiciones establecidas tras el Discovery y de acuerdo con las métricas validadas entre LDA y NTT DATA. No obstante, se establece que los incumplimientos de los ANS ocasionados por causas ajenas a NTT DATA o atribuibles a terceros —incluidos proveedores externos, dependencias de sistemas no gestionados por NTT DATA o incidencias en infraestructuras fuera del ámbito del servicio— no serán considerados en el cálculo de los indicadores de desempeño y, por tanto, no serán objeto de penalización. Se propone un límite de penalización máximo de un 1,5% de la facturación.
- NTT DATA ofrece una garantía de 1 año a partir de la entrada en producción y aceptación formal del sistema por parte de LDA. Esta garantía cubrirá únicamente incidencias justificadas y atribuibles directamente a los servicios prestados por NTT DATA, entendiendo por incidencias aquellas deficiencias o errores respecto a los requisitos técnicos y funcionales acordados. LDA deberá acreditar la imputabilidad de la anomalía a NTT DATA. Si el proyecto evoluciona hacia nuevas fases licitadas de forma independiente, la supervisión del período de garantía se integrará en el Comité de Seguimiento Operativo de dichas fases. En caso contrario, se mantendrá un Comité específico hasta la finalización de la garantía. Cualquier retraso no atribuible a NTT DATA implicará una revisión del alcance, cronograma, esfuerzo y coste del proyecto. NTT DATA se compromete a subsanar sin coste adicional para LDA durante la fase de garantía, aquellas incidencias que efectivamente sean imputables al presente proyecto y generar los componentes de despliegue necesarios para su implantación en entorno de Integración, para lo cual NTT DATA dispondrá de un equipo dedicado en exclusividad a LDA con el fin de gestionar las respuestas necesarias en el periodo que discurre la garantía.
- El horario de trabajo de los equipos será de 9:00 a 18:30 de lunes a jueves y de 8:00 a 15:00 los viernes. Del 15 de Julio al 15 de septiembre se contempla la jornada intensiva (de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes en ese periodo)

© 2026 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance: Integraciones

Integraciones

- Se contempla el uso de APIs y conectores estándar de Salesforce/MuleSoft.
- No se incluyen desarrollos de middleware adicionales fuera de MuleSoft salvo acuerdo específico.
- Se asume que las APIs necesarias estarán disponibles y con SLA adecuados por parte de LDA.
- El rendimiento de sistemas terceros queda fuera del control del integrador.
- No se incluye la construcción de un nuevo Data Lake/Lakehouse, únicamente su integración.

Convivencia con Galgo

- Se asume modelo híbrido de integración: Galgo → CRM mediante patrón Event-Driven (near real time).CRM → Galgo mediante APIs síncronas (real time).
- No se modificará el contrato canónico de eventos publicados por Galgo.
- La transformación y adaptación al modelo CRM será responsabilidad del integrador.
- Se habilitarán mecanismos de idempotencia, reintentos y DLQ en capa CRM.
- Se evaluará la necesidad de procesos de reconciliación periódica por entidad.
- La sincronización bidireccional temporal durante pilotos podrá impactar en esfuerzo de integración.

Pruebas:

- LDA gestionará la disponibilidad de los equipos de QA/Negocio necesarios para la realización y soporte de las pruebas UAT definidas para cada entrega funcional, así como la coordinación necesaria para que todos los sistemas, datos de prueba y configuraciones requeridas por las funcionalidades y sistemas estén desplegados y operativos en los entornos de UAT. LDA asumirá cualquier indisponibilidad de los sistemas requeridos en las pruebas o retrasos por la falta en las entregas del resto de aplicativos que suponga un retraso en las pruebas o la no disponibilidad para hacer los casos de prueba completos. En caso de tener impacto sobre la planificación, se tratará como un cambio de alcance del proyecto. LDA identificará el responsable de adaptar y realizar las pruebas sobre los sistemas que se integren con la nueva solución, definiendo quién será responsable de suministrar los datos de los sistemas conectados

Migración de Datos

- La migración se limita a información activa y operativa.
- Se contempla migración inicial únicamente de datos necesarios para operación CRM.
- Solo se migrarán las tablas que sean necesarias para el CRM
- No se incluye limpieza estructural masiva del histórico.
- El histórico financiero completo permanece en el sistema Core.
- No se contempla consolidación MDM corporativa fuera del alcance CRM.
- Las reglas de negocio son definidas y validadas por Línea Directa.
- Los mapeos origen-destino son definidos y validados por Línea Directa
- La reconciliación se limita a entidades y atributos críticos acordados.
- No se contempla implantación de una solución corporativa de gestión maestra de datos
- Desde el punto de vista técnico la estimación de migración se basa en
    - Premisas técnicas:
        - Disponibilidad, estabilidad y calidad de los datos de origen.
        - Entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción operativos.
        - Ventana de puesta en producción definida y acordada.
        - Volúmenes dentro de los rangos facilitados.
        - Acceso a responsables funcionales para validación.
    - Premisas Organizativas
        - Designación de responsables de datos por parte de Línea Directa.
        - Validación formal de los mapeos antes de su ejecución.
        - Capacidad de toma de decisiones ágil ante discrepancias.
        - Participación activa del negocio en la validación final.

- .

© 2026 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance: Soporte post producción

Soporte Post Producción

- La duración del soporte post producción es de 12 meses desde la salida del MVP, con inicio escalonado siguiendo las siguientes directrices.

- El importe cubrirá el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, así como la gestión integral del servicio, conforme a los horarios y coberturas establecidos por LDA.
- Soporte Correctivo (incidencias críticas) y Soporte de fabricante 24x7
- Servicio de desarrollo: 8x5 (L-J 8:30 – 18:00 y V 8:00 – 15:00)
- Se han incluido dietas y gastos de desplazamiento para visitas puntuales del responsable de servicio a las oficinas de LDA.
- Se ha incluido una bolsa de horas para actuaciones en remoto fuera de horario que no sean provocadas por mal funcionamiento de las plataformas, bugs o similar.
- Cualquier hora fuera horario adicional para fines de semana se facturará a 75€/hora para fines de semana (Sábado, Domingo y Festivos) y 100€/hora para festivos especiales (Navidad, Nochevieja,...).
- La fase de transferencia y estabilización inicial será sin coste para LDA
- Las comunicaciones relacionadas con cortes de servicio por subidas a Producción serán comunicadas por LDA, en el medio y forma que se considere, pero añadiendo a los responsables del equipo de NTT DATA como destinatarios, aparte del resto de personas que LDA considere.
- El equipo propuesto trabajará en remoto, aunque podrá personarse de manera puntual en las oficinas de LDA para cualquier tipo de reunión que sea necesario realizar de manera presencial previo aviso por LDA. El tiempo de preaviso se acordará entre LDA y NTT DATA.
- El precio no incluye el plan de traspaso para que otro proveedor pudiera asumir el servicio (fase devolución de servicio) que estará fuera de los meses de contrato, en caso de extensión ser revisará para aplicar el IPC

Gestión del Cambio

- El plan estará sujeto a ajustes derivados de la fase de Inception y alineado al roadmap del Plan de Transformación. Durante cada fase, se refinará en la etapa inicial de Discovery bajo un enfoque cíclico e iterativo.
- **Volumetría:** Alcance estimado de 2.000 usuarios distribuidos en 4 colectivos. Cualquier modificación del roadmap, releases o ampliación de colectivos tras su aprobación implicará revisión presupuestaria.
- **Gobernanza y Coordinación:** El diseño del Plan de Comunicación y del Plan de Formación requerirá colaboración con el área de Personas y Comunicación de Línea Directa.
- La difusión del proyecto y materiales se realizará junto con el área de Comunicación. Los detalles se concretarán tras la fase de Inception.

Gestión del Cambio

- Línea Directa identificará usuarios clave y referentes internos que actuarán como impulsores durante la formación y adopción.
- El equipo implantador deberá facilitar con antelación la documentación funcional (procesos, roles, funcionalidades y plataforma) antes de cada release para permitir la correcta generación de materiales formativos.
- **Plan de Aprendizaje:** Se contemplan horas orientativas por usuario y fase, distribuidas en: Sesiones teóricas (visión global y procesos), sesiones prácticas basadas en casos reales. sesiones de seguimiento y resolución de dudas, apoyo experto del especialista Salesforce. El enfoque definitivo (contenido, número de sesiones, duración y calendario) se definirá tras la fase de Inception según el alcance por ola.
- **Escenarios de Formación**
    - **Escenario 1:** Formación de Formadores en las 5 fases .La formación a usuarios finales será impartida por equipo interno de Línea Directa y COE CRM Salesforce.
    - **Escenario 2:** NTT impartirá tanto la Formación de Formadores como la formación a usuarios finales en cada fase, con un equipo de 5 formadores y despliegue alineado a cada entrada en producción en una propuesta de 5 olas.
- **Materiales y Soporte:** Todos los materiales habrán de estar disponibles en repositorio digital e incluirán: Manual de usuario completo, Infografías y guías rápidas (Journey Map), Vídeo demo con avatar, videopíldoras grabación de webinars. Los manuales se elaborarán a partir de la documentación técnica Salesforce generada por el equipo implantador. La carga de materiales formativos e itinerarios y la gestión de alumnos en la plataforma digital de formación propia de LDA será responsabilidad de LDA.
- **Idioma** de los materiales y entregables de Gestión del cambio será castellano.
- **Entorno de formación**: para la práctica de la formación se creará un juego de datos de prueba basado en los principales procesos y roles y será necesario disponer de un entorno para pruebas en Salesforce preparado con la configuración correcta y el número suficiente de datos (a ser puesto a disposición por el equipo técnico del proyecto).
- Durante el Go Live se proporcionará acompañamiento y soporte y se realizará un seguimiento de la adopción, medición de resultados y, en caso necesario, se implementarán acciones correctivas.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance: Gestión del cambio

Gestión del Cambio

- **Responsabilidad de Línea Directa: s**erá responsable de cargar, alojar y actualizar en su propia plataforma digital de aprendizaje (IsEazy) el programa formativo y de realizar la administración pertinente de los alumnos. Así mismo tendría que facilitará periódicamente al equipo de gestión del cambio los indicadores de formación que permitan ir conociendo el avance del aprendizaje
- *En caso de ser necesario, para el apoyo en la gestión de la plataforma digital de formación, se podría ofrecer de manera opcional un perfil administrador de plataforma que pueda colaborar en la carga de datos, alta de cursos y gestión de usuarios (fuera del alcance de esta propuesta).*
- Es imprescindible contar con el equipo interno responsable de la Gestión del Cambio de Línea Directa y con el área de Personas y Comunicación para coordinar internamente las actividades del proyecto, validar entregables y metodología, colaborar con el equipo de Gestión del cambio de NTT Data y tomar decisiones sobre el proyecto.

Aprobaciones de entregables

- Como modelo de aprobación de entregables desde NTT DATA proponemos el siguiente, si bien se acordará en tiempo de kick-off:
    - La aprobación de los documentos entregables por parte de LDA deberá de ser en un período máximo de 10 días laborales desde su entrega.
    - El procedimiento de aprobación de los entregables, así como el de las actas de reunión es el siguiente:
    - Presentación del entregable
    - Modificación de entregable con las matizaciones a realizar por las áreas intervinientes (Plazo de modificación 5 días)
    - Revisión de las modificaciones introducidas (Plazo de 3 días)
    - En caso de no respuesta en los plazos previstos se darán por aprobados los entregables
    - Las pruebas de UAT deben ser realizadas y certificadas por el equipo de negocio de LDA, con soporte del equipo NTT DATA.
    - El equipo de NTT DATA generará los planes de pruebas durante la fase de construcción que deben ser aprobadas por LDA tal y como se indica más arriba.

Contact Center - Genesys

- CRM y CCaaS evolucionarán en paralelo con coordinación de releases y salida productiva alineada, aunque con gobiernos independientes.
- Genesys Cloud será el motor exclusivo de los canales (voz, chat, email) y del enrutamiento.
- El CRM será el sistema de gestión operativa y relacional donde se ejecutan procesos, casos, oportunidades y visión 360º.
- El agente operará en una única consola integrada con CTI embebido y screen pop en tiempo real.
- Toda interacción relevante generará automáticamente registros trazables en el CRM (caso, oportunidad o actividad).
- La sincronización de interacciones y eventos será en tiempo real o near-real-time, sin procesos batch.
- Se definirá explícitamente la frontera funcional entre lógica de canal (Genesys) y lógica de proceso (CRM).
- Se respetará el modelo de sistemas maestros evitando duplicidades entre Genesys, CRM y Mainframe.
- El modelo soportará la convivencia progresiva entre Galgo y CRM sin impacto en la operación diaria.
- La IA de Genesys y la IA del CRM serán complementarias y no solapadas en sus capacidades.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de riesgos: Mapa inicial de riesgos

A continuación, se detallan los riesgos identificados y las fases en las que se identifican (1/2):

Riesgo	Categoría	Descripción	Impacto	Prob.	Severidad	Fase crítica	Mitigación preventiva	Plan de contingencia	Foro de gobierno
Convivencia CRM–Galgo	Estructural	Inconsistencias funcionales o de datos durante la transición	Operativa y reputacional	Media	Alta	Inception / SIT	Definir fronteras claras + modelo maestro + reconciliación estructurada	Reversión parcial de flujos Reconciliación intensiva	Design Authority
Impacto en Contact Center	Operativa	Pérdida de productividad de agentes en despliegue	Negocio / coste	Media	Crítica	Go-Live	Despliegue progresivo + piloto + UX validada	Soporte reforzado + extensión Hypercare	Comité Operativo
Dependencia Genesys CCaaS	Externa	Fallos en CTI / identificación cliente	Atención cliente	Media	Alta	SIT	Coordinación con vendor + pruebas conjuntas	Fallback identificación manual	Comité Operativo
Calidad de datos	Datos	Duplicados o inconsistencias en migración	Procesos y reporting	Alta	Alta	Inception / Migración	Estrategia deduplicación + validaciones previas	Plan de limpieza acelerado	Design Authority
Complejidad ecosistema (Lakehouse, core, etc.)	Estratégica	Desalineación con otros proyectos paralelos	Roadmap y coste	Media	Alta	Inception	Mapeo dependencias + coordinación transversal	Replanificación ola	Steering Committee

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de riesgos: Mapa inicial de riesgos

A continuación, se detallan los riesgos identificados y las fases en las que se identifican (2/2):

Riesgo	Categoría	Descripción	Impacto	Prob.	Severidad	Fase crítica	Mitigación preventiva	Plan de contingencia	Foro de gobierno
Seguridad / DORA	Regulatoria	Incumplimiento requisitos seguridad y trazabilidad	Legal y reputación	Baja-Media	Alta	Inception / Go-Live	Validación arquitectura segura Auditoría previa	Corrección urgente antes Go-Live	Steering Committee
Scope creep post-freeze	Alcance	Nuevas necesidades tras cierre Scope Box	Coste y plazo	Alta	Alta	Diseño / UAT	Mecanismo formal de CR Clasificación cambios	Repriorización / CR formal	Comité Operativo
UAT insuficiente	Calidad	Validación de negocio incompleta	Re-trabajo en producción	Media	Alta	UAT	Criterios claros Go/No-Go Usuarios clave definidos	Extensión UAT	Comité Operativo
Falta de adopción modelo cliente	Organizativo	CRM implantado pero no transformador	Beneficio esperado	Media	Alta	Go-Live / Hypercare	Gestión del cambio desde inicio Métricas adopción	Refuerzo formación + ajustes UX	Comité Operativo
Transferencia incompleta al CoE	Operativa	Dependencia prolongada del proveedor	BAU y coste	Media	Media	Cierre	Plan KT estructurado Acta transferencia	Extensión soporte controlada	Steering Committee
Licenciamiento sobredimensionado	Económico	Incremento CAPEX/OPEX no previsto	Presupuesto	Media	Alta	Inception	Licenciamiento racional por perfil	Ajuste modelo licencias	Steering Committee
No readiness en Go-Live	Operativa	Despliegue prematuro sin estabilidad	Reputación y coste	Media	Alta	Gate Go-Live	Checklist formal Validación KPIs	Posponer Go-Live	Steering Committee

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de dependencias

Las dependencias se **clasifican y se gobiernan según su naturaleza y nivel de impacto**, evitando escalados innecesarios y garantizando control progresivo. (1/2):

Dependencia	Tipo	Impacto	Criticidad	Nivel de validación	Riesgo asociado	Mitigación propuesta
Core Galgo (Mainframe)	Estructural	Integración RT bidireccional CRM–Core	Alta	Design Authority Steering	Fallos sincronización, latencia, bloqueo olas	Validación patrón integración por entidad + pruebas SIT end-to-end + no paralelización
Kafka / Broker eventos	Estructural	Flujo Galgo → CRM near real-time	Alta	Design Authority	Pérdida de eventos / falta idempotencia	Validación idempotencia + DLQ + reconciliación periódica
API Manager (CRM → Galgo)	Estructural	Escrituras síncronas al Core	Alta	Design Authority	Sobrecarga o fallo en operaciones críticas	Rate limiting + pruebas rendimiento + validación seguridad
CDC (Change Data Capture)	Técnica	Propagación cambios DB2	Alta	Design Authority	Desfase datos / inconsistencias	Monitorización + proceso reconciliación
Genesys Cloud CCaaS	Operativa transversal	Operación Contact Center	Alta	Comité Operativo Steering (si impacto modelo operativo)	Impacto directo en atención al cliente	Plan coordinación por ola + pruebas integradas CC
Datawarehouse / Lakehouse	Estratégica	Reporting y modelo cliente 360	Media/Alta	Steering Committee	Desalineación modelo datos	Alineamiento temprano modelo datos + revisión arquitectura
LDAP / Gestión usuarios	Técnica	Accesos y perfiles CRM	Media	Comité Operativo	Problemas acceso / seguridad	Validación roles en Inception
(Firma digital)	Técnica	Procesos de contratación	Media	Comité Operativo	Bloqueo procesos digitales	Integración probada en SIT antes de UAT
DB2 Content Manager	Técnica	Documentación y comunicaciones	Media	Comité Operativo	Falta acceso documentación	Validación API documental en Inception
Requisitos DORA / Ciberseguridad	Estratégica	Cumplimiento normativo	Alta	Steering + Design Authority	Riesgo regulatorio	Validación arquitectura segura + observabilidad ELK/Dynatrace
Modelo de maestros CRM/Core	Estructural	Gobierno de datos	Alta	Design Authority	Conflictos de ownership	Definición clara en Inception + validación formal
Convivencia prolongada CRM–Galgo	Estratégica	Transformación progresiva	Alta	Steering Committee	Complejidad operativa	Faseado por olas + no Big Bang
Gestión del Cambio. Sponsorship	Estratégica	Escasa/inadecuada adherencia y adopción del cambio	Alta	Steering Committee	Falta o sponsorship inadecuado	Plan de Red de Cambio activado desde el principio
Gestión del Cambio. Colaboración con áreas internas de LDA	Operativa transversal	Inadecuado o incompleto análisis de situación	Media/Alta	Comité Operativo	Inadecuado o incompleto diseño del Plan de Gestión del Cambio	Plan de Gestión del cambio correctamente validado y revisión periódica en cada fase y reléase.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de dependencias

Las dependencias se **clasifican y se gobiernan según su naturaleza y nivel de impacto**, evitando escalados innecesarios y garantizando control progresivo. (2/2):

Dependencia	Tipo	Impacto	Criticidad	Nivel de validación	Riesgo asociado	Mitigación propuesta
Integraciones por Oleada	Estructural	Disponibilidad progresiva de servicios Core por fase (olas)	Alta	Design Authority + Comité Operativo	Bloqueo de avance por falta de APIs/servicios en una ola	Planificación conjunta por ola + contrato de APIs por fase + validación temprana en Inception + mocks/stubs para desacoplar desarrollo
Datos y entornos	Técnica / Operativa	Disponibilidad de datos de calidad para pruebas, migración y operación	Alta	Comité Operativo + Data Governance	Datos incompletos o no representativos / retrasos en pruebas / migración de datos, retraso en integraciones o pruebas por falta de entornos ,	Estrategia de datos desde Inception + definición datasets de prueba + ciclos de carga controlados + validación calidad previa a UAT. Entornos de Mule disponible desde el principio, y entornos de prueba de sistemas externos
Disponibilidad de key users	Operativa transversal	Validación funcional, UAT y adopción del sistema	Alta	Comité Operativo	Retrasos en definición y validación, baja calidad en UAT, riesgo en adopción	Planificación temprana de dedicación + compromiso formal LDA + cobertura por roles + calendarización por hitos críticos

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de riesgos técnicos

A continuación, se detallan los riesgos identificados y las fases en las que se identifican (1/2):

Riesgo	Descripción	Impacto	Prob.	Severidad	Fase crítica	Mitigación preventiva	Plan de contingencia	Foro de gobierno
Dependencia del core y madurez de APIs	Las APIs expuestas por Galgo pueden no cubrir todas las capacidades necesarias o tener granularidad insuficiente	Impacto en procesos CRM y tiempos de desarrollo	Media	Alta	Inception / Diseño	Inventario temprano de APIs disponibles + validación con equipos core	Implementar orquestación o composición de APIs en MuleSoft	Design Authority
Integración con JSF legacy	Parte de la lógica funcional podría estar embebida en el frontend JSF existente	Riesgo de reimplementación funcional	Media	Alta	Diseño	Spike técnico para analizar componente y decision solo táctica en caso de no existir microservicios	Uso temporal de iframe o patrón Strangler para migración progresiva	Design Authority
Definición del modelo de eventos Kafka	Falta de definición del catálogo de eventos, versionado y contratos	Riesgo de inconsistencias en sincronización	Media	Alta	Diseño / SIT	Definir modelo de eventos, contratos y versionado temprano	Implementar capa de adaptación en MuleSoft	Design Authority
Consumo de eventos (duplicados / orden)	Eventos Kafka pueden llegar duplicados o fuera de orden	Inconsistencias en CRM	Media	Alta	SIT	Implementar idempotencia, control de ordering y DLQ (Middlware)	Reprocesamiento de eventos desde topic	Architecture Board
Sistemas externos aún no especificados	Parte del ecosistema de integraciones no está completamente identificado	Impacto en estimación e integración	Media	Media-Alta	Inception	Definir patrón de integración estándar reutilizable	Ajuste estimación y backlog en fase de diseño	Steering Committee
Disponibilidad de APIs del nuevo TPA	El nuevo sistema TPA aún no tiene APIs definidas	Bloqueo de integración en procesos de valoración	Media	Alta	Diseño / SIT	Confirmar modelo de integración y timeline con proveedor	Implementar integración temporal vía proceso alternativo	Design Authority

© 2026 NTT DATA, Inc.

Gestión de riesgos técnicos

A continuación, se detallan los riesgos identificados y las fases en las que se identifican (2/2):

Riesgo	Descripción	Impacto	Prob.	Severidad	Fase crítica	Mitigación preventiva	Plan de contingencia	Foro de gobierno
Integración con sistemas legacy (Notes / MIR)	Sistemas legacy pueden tener limitaciones técnicas o baja capacidad de integración	Impacto en automatización de procesos	Media	Media	SIT	Validación temprana de interfaces disponibles	Adaptación vía middleware o integración indirecta	Design Authority
Complejidad del ecosistema de integración	Alto número de sistemas conectados (core, marketing, validadores, lakehouse, etc.)	Incremento de complejidad operativa	Media	Alta	Diseño / SIT	Arquitectura API-led con desacoplamiento	Priorización de integraciones por olas	Architecture Board
Rendimiento integraciones tiempo real	Latencia o degradación en integraciones síncronas CRM–core	Impacto en experiencia agente	Media	Alta	SIT / Go-Live	Pruebas de carga y dimensionamiento temprano	Modo degradado con reintentos y colas	Design Authority
Calidad de datos en migración	Datos inconsistentes o duplicados durante migración inicial	Impacto en procesos CRM	Alta	Alta	Migración	Estrategia deduplicación + data cleansing (no contemplado en scope)	Corrección posterior mediante reconciliación	Data Governance Board
Migración de datos y volumen	Volumen de datos superior a lo previsto o problemas en ventanas de carga	Retrasos en Go-Live	Media	Alta	Migración	Ensayos de migración y estrategia incremental	Ajuste ventana de migración	Steering Committee
Dependencia del conector Genesys	Fallos o limitaciones del conector CTI	Impacto en operaciones del contact center	Media	Alta	SIT	Pruebas conjuntas con proveedor	Fallback manual temporal	Comité Operativo
Gobierno del contrato de eventos	Cambios en el modelo de eventos sin control de versionado	Incompatibilidad entre sistemas	Media	Media-Alta	Diseño	Definir gobierno de contratos y versionado	Adaptación de consumidores	Architecture Board
Observabilidad de integraciones	Falta de trazabilidad entre sistemas	Dificultad para diagnosticar incidencias	Media	Media	Operación	Implementar logging centralizado y correlation-id	Herramientas de monitorización	Operación TI
Escalabilidad futura	Incremento de usuarios o volumen de eventos superior a lo estimado	Impacto en rendimiento	Baja-Media	Media	Operación	Dimensionamiento escalable y pruebas de carga	Escalado de infraestructura	Architecture B



Anexos

Listado de entregables

© 2026 NTT DATA, Inc.

Entregables Business: Inception & Discovery

Para la fase de Inception y los Discovery de cada ola, desde el equipo de business, se plantea la entrega de los siguientes entregables:

INCEPTION


#1 Backlog de requerimientos
Resumen de requerimientos del proyecto, integrando el mapa de procesos CRM, las reglas macro de negocio y la definición de las fronteras funcionales entre CRM y Galgo.

#2 Blueprint alto nivel
Ilustración de los procesos del ciclo de vida de gestión de clientes, identificando las actividades principales y las interacciones entre las distintas figuras implicadas (cliente, agente, sistema CRM, etc.).

Ilustrativo: Backlog requerimentos



Ilustrativo: Blueprint



OLAS: DISCOVERY & UX


#3 Backlog HUs (DoR)
Backlog estructurado de historias de usuario elaborado a partir de los requerimientos identificados para cada pantalla y funcionalidad.

#4 Prototipos navegables
Construcción de prototipos navegables para cada una de las pantallas necesarias por proceso a partir de las necesidades de usuario definidas.

Ilustrativo: HUs



Ilustrativo: Prototipos navegables

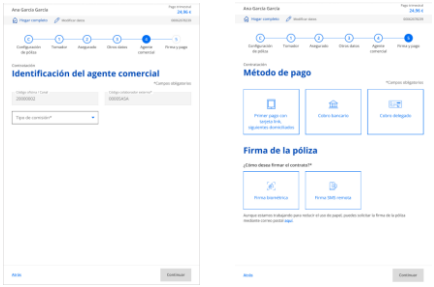

Todos estos entregables son documentos vivos, que se irán adaptando con cada cambio validado y aprobado

© 2026 NTT DATA, Inc.

Entregables Migración: Inception & Olas

Para la fase de Inception y en cada una de las olas, desde el equipo de Migración, se plantea principalmente la entrega de los siguientes entregables:

INCEPTION

#1 Diccionario de Metadatos y linaje
Documentación que describe el significado de los datos y su trazabilidad de punta a punta, alineada con las políticas de Gobierno del Dato. Matriz detallada del mapeo de campos y de los External IDs

#2 Inventario de datos
Informe de los datos de origen a migrar, AS-IS y TO-BE de los modelos de datos origen y destino. Identificación de riesgos y dependencias, Informe de volumetrías y calidad de datos en origen

#3 Arquitectura de Integración
Definición del alcance funcional de la migración. Representación visual del flujo que detalla el uso del Middleware, capas de ingesta-transformación y protocolos de conexión.

#4 Estrategia de migración
Definición del alcance de la migración, identificación de tablas a migrar, estrategia de cargas para el despliegue y fases intermedias. Plan de pruebas de integridad y resultado

OLAS

#1 Documentación técnica de diseño
Documentación técnica de todos los jobs, scripts y pipelines de ingesta realizados
Documentación técnica final de la arquitectura de datos realizada

#1 Documentos de validación UATs
Documento que consolida resultados de pruebas unitarias e integración, evidencias de cumplimiento de criterios técnicos

#1 Diccionario de Metadatos y linaje
Versión del documento final que describe el significado de los datos y su trazabilidad de punta a punta, alineada con las políticas de Gobierno del Dato. Matriz detallada del mapeo de campos y de los External IDs

#1 Runbook
Guía paso a paso de cómo ejecutar, monitorizar y reiniciar los Jobs desarrollados.
Inventario de los posibles errores más comunes y de como solucionarlos

Todos estos entregables son documentos vivos, que se irán adaptando con cada cambio validado y aprobado, incluyendo la fase de hypercare

© 2026 NTT DATA, Inc.

Entregables Integración: Inception & Olas

Para la fase de Inception y en cada una de las olas, desde el equipo de Integración, se plantea principalmente la entrega de los siguientes entregables:

INCEPTION

#1 Arquitectura de integración alto nivel
Definición del modelo híbrido (Sync / Event-Driven), patrones de integración y separación CRM–Galgo.

#2 Catálogo de integraciones priorizado
Identificación y clasificación de integraciones (sync, async, documental), dependencias y roadmap por fases

#3 Contratos y modelo canónico
Borradores OpenAPI / RAML y definición preliminar del modelo canónico de eventos (CDC).

#4 Gobierno técnico y criterios de aceptación
Definición de idempotencia, gestión de errores (DLQ), reconciliación y criterios técnicos mínimos para APIs críticas.

OLAS

#5 Documento de Diseño Técnico Detallado (LLD)
Documento por release que recoge diseño de APIs, contratos definitivos, modelo de eventos y reglas de transformación.

#6 Especificaciones API versionadas
OpenAPI / RAML finales aprobadas y publicadas, incluyendo versionado y cambios respecto a la fase anterior.

#7 Informe de validación técnica
Documento que consolida resultados de pruebas unitarias e integración (SIT), evidencias de cumplimiento de criterios técnicos.

#8 Inventario actualizado de integraciones
Documento consolidado que recoge estado, patrón (sync/async), versión y dependencias de las integraciones implementadas en la fase.

Todos estos entregables son documentos vivos, que se irán adaptando con cada cambio validado y aprobado, incluyendo la fase de hypercare

© 2026 NTT DATA, Inc.

Entregables Salesforce: Inception & Olas

Para la fase de Inception y en cada una de las olas, desde el equipo de Salesforce, se plantea principalmente la entrega de los siguientes entregables:

INCEPTION

#5 Arquitectura Funcional
Modelo de ownership de entidades aprobado, Matriz Maestro CRM / Maestro Galgo, Plan de decomisión funcional progresiva

#2 Modelo de Datos (Logical Design)
Diseño modelo lógico alineado a Blueprint, objetos estándar vs custom, relaciones clave, estrategia de External Ids, modelo de seguridad (roles, perfiles, sharing)

#3 Arquitectura Técnica CRM
Decisiones estándar vs desarrollo custom, estrategia de automatización (Flow vs Apex), modelo de entornos, estrategia de versionado y despliegue (CI/CD), lineamientos de escalabilidad y rendimiento

#4 Framework de Gobierno Salesforce
Modelo de Design Authority, principios de configuración vs código, estándares de naming, criterios técnicos mínimos por componente, DoR / DoD técnicos

OLAS

#5 Documento de Diseño Técnico Detallado (LLD)
Diseño de layouts por perfil, definición de Lightning Pages, Componentización reutilizable, Flujos de navegación optimizados, Validación con key users

#6 Plan técnico de despliegue
Estrategia de promoción entre entornos, gestión de versiones, validación pre-deploy, ventana de despliegue coordinada con Integración y Migración

#7 Informe de validación UATs
Documento que consolida resultados de pruebas de usuario (SAT), evidencias de cumplimiento de criterios de aceptación.

#8 Hardening y Calidad Técnica del Release
Pruebas unitarias Apex (> cobertura mínima definida), validación límites de plataforma (governor limits), control de deuda técnica por ola, informe de calidad técnica de la ola

Todos estos entregables son documentos vivos, que se irán adaptando con cada cambio validado y aprobado, incluyendo la fase de hypercare

© 2026 NTT DATA, Inc.

Entregables de Gestión del Cambio: Inception & Olas

Ilustrativo de materiales y contenidos digitales diseñados para impulsar la toma de conciencia sobre el cambio y sus beneficios, las fases e hitos del proyecto, los contenidos de formación y movilizar a la acción.

Fase de Inception

Informe de diagnóstico de la situación inicial
Análisis del punto de partida organizativo, identificando stakeholders, impactos del cambio, riesgos de adopción y brechas entre el AS-IS y el TO-BE.

Plan de Gestión del Cambio
Acciones necesarias para preparar, acompañar y consolidar la adopción del CRM Salesforce, incluyendo comunicación, formación, motivación y medición de resultados.

Roadmap de Gestión del Cambio
Planificación secuencial de las iniciativas de cambio, alineada al calendario de releases y despliegue funcional en base al plan de despliegue híbrido propuesto en la metodología

Mapa de matriz de partes interesadas
Matriz de impactos del cambio

Olas

Plan de Comunicación & Sensibilización

Presentación del proyecto (Bienvenida)
Información clave del proyecto: Propósito, objetivos, beneficios, alcance, fases e hitos del proyecto.

Video de presentación del proyecto
Información clave del proyecto: Propósito, objetivos, beneficios, alcance, fases e hitos del proyecto en formato atractivo y motivador.

Comunicados estratégicos y tácticos
Comunicado de lanzamiento del proyecto y comunicados de Go Live progresivos para preparar a las audiencias de las dos fases antes del arranque del proyecto y comunicar la fecha de arranque.

Plan de Motivación & Compromiso

Kit de Bienvenida para Red de Cambio
Presentaciones para apoyar a patrocinador y embajadores en la comunicación del propósito, los beneficios y los aspectos clave del proyecto.

Definición de los roles de la Red de Cambio y plan de acciones
Propósito, responsabilidades y nivel de dedicación de los miembros, definiendo su papel como referente funcional y canal bidireccional entre el programa y sus equipos.

Mapa de resistencias
Análisis para identificar posibles focos de resistencia al cambio, segmentados por colectivo, impacto y nivel de criticidad.

Plan de Aprendizaje y nuevas formas de trabajo

Manual de usuario
Guía detallada para el uso de la plataforma, con instrucciones claras y ejemplos prácticos para aprovechar todas las funcionalidades.

Video Demo con avatar (IA)
Demostración atractiva en la que se explican los flujos de manera visual y dinámica.

Guías rápidas para procesos/rol tipo Journey Map
Infografías que muestran el recorrido del usuario en los procesos principales

Training Kit
Guía y tips de formación (playbook) y Encuesta de evaluación del formador

Presentaciones utilizadas durante la formación
Documentos visuales que resumen los puntos más relevantes y facilitan la comprensión de los contenidos.

Casos de uso procesos/rol
Juego de casos de uso por rol. Roles: agentes, coordinadores y supervisores.

Entorno de formación*
Configurado con datos reales y suficientes para la práctica de los principales procesos siguiendo el juego de casos de uso*.

Documento de preguntas frecuentes (FAQs)
Recopilación de las dudas más habituales con sus respuestas, para resolver consultas rápidas y recurrentes.

Acciones gamificadas
Gamificación para potenciar el aprendizaje, destacando el carácter visual y atractivo.

Encuesta de evaluación del conocimiento y del grado de satisfacción
Tras la formación y práctica realizada, para impulsar la mejora continua.

Grabación de las sesiones de formación
Registro completo de las sesiones impartidas, disponible para consulta posterior y repaso de los conceptos clave

Canal de soporte vía Teams
Para consultas funcionales de los usuarios clave y formadores.

Plan de Monitorización & Refuerzo

Sesiones de preguntas y respuestas
Webinar de resolución de dudas, refuerzo del conocimiento y training tips. Presentación y grabación puesta a disposición de los perfiles involucrados.

Canal de soporte via Teams
Para consultas funcionales de los usuarios clave y formadores.

Documento de preguntas frecuentes (FAQs) actualizado
Actualizado en base a las consultas de los usuarios post arranque.

Entorno de formación*
Disponible post arranque para continuar la práctica.

KPIs y Cuadro de mando del cambio
Indicadores reflejados en un cuadro de mando para monitorizar el nivel de preparación, adopción y uso del nuevo CRM en LDA.

Guías rápidas para procesos/rol tipo Journey Map
Actualización en base a modificaciones o feedback de mejora recibido (en caso de ser necesario).

Informe de cierre de proyecto
Documento que consolida resultados alcanzados, objetivos cumplidos y lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto.

Consideraciones:
Los entregables finales a utilizar se definirán en la fase de Inception.
El entorno de formación deberá ser preparado por el equipo técnico responsable de la implantación tecnológica.



Anexos

Cómo garantizamos el éxito

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito: Escenarios

Escenarios de Propuesta Económica: con el objetivo de adaptarnos al modelo de decisión y gobierno que LDA considere más adecuado, planteamos dos escenarios de colaboración. Ambos garantizan la calidad de la implantación, pero difieren en el alcance de responsabilidad y en el modelo de gestión del riesgo

Gestión Integral del Programa (Modelo End-to-End)

- Propuesta recomendada por NTT DATA. Este escenario contempla la gestión completa del programa bajo un modelo end-to-end, donde NTT DATA asume la responsabilidad integral desde la definición hasta la puesta en marcha
- Alcance:
  - Inception General del Programa
  - Implantación CRM
  - Diseño e implantación de la capa Middleware
  - Carga inicial de datos (incluyendo transformación y validación)
  - Gestión del Cambio
  - Soporte y Mantenimiento

Valor diferencial

- Un único responsable integral del programa (one single point of accountability).
- Optimización global de planificación, costes y dependencias.
- Reducción de riesgos en integraciones y calidad del dato.
- Aceleración del time-to-market al evitar fricciones entre proveedores.
- Gobierno unificado de arquitectura, datos y procesos de negocio.

Modelo Acotado con Integración y Datos Liderada por LDA

- Este escenario contempla un perímetro más acotado para NTT DATA, en caso de que LDA decida mantener la responsabilidad directa sobre la capa middleware y los procesos de transformación de datos, apoyándose en integradores especializados en sus entornos legacy y mainframe
- Alcance NTT DATA:
  - Inception General (alcance ajustado)
  - Implantación CRM hasta integración con middleware (MuleSoft)
  - Carga en CRM de datos previamente transformados por LDA
  - Coordinación técnica en integración y datos
  - Soporte y Mantenimiento
- Responsabilidades clave:
  - La responsabilidad de la capa middleware y la transformación de datos recaería en LDA.
  - NTT DATA establecería mecanismos formales de coordinación técnica para minimizar riesgos de dependencia, integración y planificación.
- Consideraciones relevantes:
  - Modelo con mayor necesidad de sincronización entre equipos.
  - Incremento potencial del riesgo en plazos si no se garantiza una gobernanza técnica sólida y dependencia directa de terceros en componentes críticos de integración y datos.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito: Escenarios

Ambos escenarios mantienen el modelo target. La diferencia radica en el nivel de industrialización y en la distribución del riesgo entre NTT DATA y LDA.

Línea	Escenario 1 Cobertura Integral	Escenario 2 Modelo Esencial compartido
Implicaciones	✓ Menor riesgo operativo ✓ Mayor previsibilidad ✓ Mayor inversión inicial ✓ Industrialización completa	✓ Reducción CAPEX inicial ✓ Mayor implicación técnica LDA ✓ Mayor dependencia de madurez técnica en integración y dataDependencia mayor de madurez interna
Gestión del programa	Gobierno transversal del programa de transformación	Gobierno transversal del programa de transformación
Definición	Blueprint detallado por proceso, Prototipado, escritura de historias de usuario, validación intensiva con negocio	Blueprint detallado por proceso, Prototipado, escritura de historias de usuario, validación intensiva con negocio
Implementación	Diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del alcance en las distintas oleadas propuestas	Diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del alcance en las distintas oleadas propuestas
Integración	Diseño, construcción y gobierno completo de las integraciones requeridas para cobertura E2E del proceso.	Diseño de arquitectura y definición de contratos. Construcción adicional y estabilización asumida parcialmente por LDA.
Data	Extracción, transformación, calidad, carga y reconciliaciones gestionadas por NTT DATA.	Carga en CRM de datasets definidos. Extracción, transformación y calidad asumidas por LDA o terceros.
Gestión del cambio	Gestión del cambio para los distintos colectivos siguiendo plan de puesta en producción por oleadas y el alcance correspondiente de cada oleada	Gestión del cambio para los distintos colectivos siguiendo plan de puesta en producción por oleadas y el alcance correspondiente de cada oleada

Escenario sujeto a diferencias

Escenarios iguales

La diferencia económica se concentra en Integración y Data, dominios que concentran el mayor riesgo técnico y estructural del programa



Anexos

Casos de éxito

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito

Transformación integral CRM-CC

- Dentro de la iniciativa de transformación digital, se ha implantado una solución multicanal que cubre los siguientes procesos de negocio de MPA Prosegur Alarmas: **Captación, Venta, Operaciones, Atención y Fide[illegible]ción**

Genesys Cloud · Salesforce for Sales · Salesforce for Service · Salesforce for Marketing · Salesforce Field Service · CPQ · Mulesoft

Implantación Ecosistemas CRM

- Implementar la **atención al cliente** de los diferentes servicios como por ejemplo El Parking, Alarmas/Hogar, alquiler de vehículos o servicios de movilidad.”
- Implementar servicios para negocio Patrimonial para captación de nuevos clientes y gestión multicanal de carteras

Salesforce for Sales · Salesforce for Service

Evolución del Sistema Comercial

Salesforce CRM. Servicio de evolución del **sistema comercial** de ASISA incluye participación en proyectos, mantenimiento evolutivo, mantenimiento correctivo y consulta.

- Mantenimiento del sistema comercial con más de 200 usuarios.
- Productos del segmento de seguros B2C.

Salesforce for Sales · Salesforce Communitty · Salesforce for Marketing

Front Único de Gestión multi producto

Acompañamiento i en la construcción y evolución del **Frontal Único de contratación** y suplementos (Decesos y Hogar), cubriendo proceso comercial end-to-end.
Equipo multidisciplinar
Coordinación bajo modelo Design Authority (Core–API) para garantizar coherencia arquitectónica mediante servicios desacoplados y escalables.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito

Transformación y Gestión del Cambio

endesa

- Transformación tecnológica y funcional del actual sistema hacia una **nueva solución basada en Salesforce,** integración CTI con la solución Genesys.
- Impactando **a más de 3.000 empleados a nivel nacional e internacional y con plan de** aprendizaje extensivo a usuarios finales.

Salesforce for Sales · Salesforce for Service · Lightning Platform
Salesforce for Marketing · Salesforce Communitty · BIT2WIN

Integración con Genesys Cloud

CaixaBank PAYMENTS & CONSUMER

Evolución del modelo de atención en CaixaBank Payments & Consumer (CPC), combinando Dynamics 365 y SF.

- Incluye la gestión operativa y evolutiva (AM) de Dynamics
- El desarrollo del front de atención y captación sobre Dynamics (Proyecto Odisea)
- Implantación progresiva de Salesforce como plataforma objetivo (MVP y Fase 1 en curso, con evolución hacia capacidades de IA y sustitución completa de Dynamics). Reporting y explotación de la información de servicio.

Genesys Cloud · Salesforce for Service · Salesforce Platform

Implantación CRM en Salud

Adeslas SegurCaixa

Implantación de **Health Cloud**

- Información médica de los pacientes vista 360
- Cualificación de pacientes mediante indicadores de salud
- Integración con portal paciente
- Analítica avanzada utilizando Healthcloud y Health Records
- Gestión de [illegible]endas, [illegible]
- Envío de contenido multimedia recomendado

Salesforce for Health · Salesforce for Service · Salesforce Platform

Transformación y Gestión integral del CC

madrid Línea madrid

- **Transformación global y modernización tecnológica, operación front-back y transformación del servicio**
  - + 650 agentes y múltiples canales de atención
  - +94% CSAT
  - < 1% rechazo al final del día

© 2026 NTT DATA, Inc.

Cómo garantizamos el éxito

Implantación CRM en Salud

quirónprevención

- Implementación de Salesforce CRM para la gestión de oportunidades de venta para clientes B2B y gestión de las licitaciones para administraciones publicas (AAPP).

Salesforce for Sales · Salesforce for Marketing (Pardot) · Salesforce Platform

Front Único de Auto servicio y capa de integración

Resolution Life

- **Capa frontal Outsystems**: desarrollo de productos y funcionalidades para **optimizar la gestión de operaciones y el servicio al cliente (gestión de siniestros y autoservicio**
- Diseño y **construcción de arquitectura desacoplada (Mulesoft),** orientada a la incorporación de carteras provenientes de distintas compañías adquiridas para la gestión de carteras en Run Off

Impulso de la Banca Comercial

BBVA

- Transformación digital del canal Oficina de BBVA mediante Financial Services Cloud para 17.000 usuarios, con integración de Marketing Cloud y evolución hacia Service y Telefonía. Enfocado en una visión 360º del cliente, mejora de la visión del gestor y capacidades de reporting, incluyendo gestión comercial, riesgos, sostenibilidad, formalización y postventa.
- Uso potencial de Agentforce aporta un elemento diferencial, optimizando tiempos de gestión y aumentando la conversión en venta y postventa

Financial Services

Transformación digital del modelo comercial

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN

Construimos juntos una **visión 360, una atención omnicanal y un modelo comercial** más ágil y unificado.

- **IA generativa**
- **Recomendación inteligente** de vehículos en stock,
- Visión cliente y vehículo 360º
- **Automatización del CC**
- Preparación de la base para incorporar **de Agentforce.**

Salesforce for Sales · Salesforce for Service · Salesforce for Marketing · Salesforce Communitty · Amazon Connect · Service Voice by Salesforce · Mulesoft



Anexos

Régimen de Penalizaciones

© 2026 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Penalizaciones de Proyecto (Implantación)

Categoría	Indicador	Definición	Objetivo	Penalización
Planificación	Cumplimiento de hitos	Entregas en fecha acordada	≥95%	3% por hito incumplido
Calidad	Defectos UAT por entrega	% defectos bloqueantes (impidan avance ejecución de pruebas)	≤5%	2% si 5% - 10%5% si > 10%
Producción	Defectos post-release	% críticos en 30 días	≤2%	5% + Corrección sin coste
Documentación	Entrega completa	Documentación validada	100%	Retención 5-10%
Gobierno del proyecto	Reporting	Informes de reporting acordados	100% en fecha	1% por incumplimiento
Gobierno del proyecto	Comités	Reuniones de seguimiento acordadas	≥95% realizados	1% por incumplimiento

Condiciones

- Las penalizaciones se aplicarán previa validación conjunta en comité de seguimiento.
- Serán aplicables únicamente ante incumplimientos directamente imputables al proveedor, excluyendo impactos derivados de terceros o dependencias fuera de su ámbito de control.
- El modelo de penalizaciones se aplicará de forma proporcional, alineado con los entregables comprometidos y el alcance real del proyecto.
- Proyecto de implantación por fases (olas), con un régimen de penalizaciones acumuladas de hasta un máximo del 15% por fase, en línea con el RFQ. Cada hito del proyecto se corresponderá con una ola de implantación con sus entregables asociados.
- La definición final de hitos, alcance de cada ola y criterios de medición de SLAs será revisada y acordada conjuntamente durante la fase de Inception.
- Durante el periodo de estabilización post Go-Live (primer mes), las desviaciones de SLA serán monitorizadas sin aplicación automática de penalizaciones.
- El cómputo de SLA considerará únicamente tiempos dentro del horario de servicio y estados imputables al proveedor.
- Los SLA y KPIs específicos del proyecto se definirán y acordarán conjuntamente en la fase de planificación detallada, en función del alcance y entregables aprobados.

© 2026 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Medición del SLA (mensual)

- Medición mensual sobre KPIs acordados, basada en métricas objetivas (ServiceNow)
- Validación conjunta en comité de seguimiento
- El cálculo se realizará sobre el % global de cumplimiento mensual, no por incidente individual
- El cómputo considerará únicamente tiempos dentro del horario de servicio y estados imputables al proveedor

Periodo de estabilización

Durante el primer mes tras cada release:

- Monitorización de SLA sin aplicación automática de penalizaciones
- Ajuste conjunto de umbrales si procede

Esquema de Penalización por Cumplimiento SLA

Prioridad	Definición	Respuesta	Resolución	Penalización
P1	Servicio LDA caído independiente de la Plataforma	≤15 min	≤4 h	5%
P2	Funcionalidad crítica afectada (proceso crítico o 75% usuarios finales)	≤1 h	≤8 h	3%
P3	Impacto medio (superior al 50% de los procesos y usuarios finales de LDA)	≤4 h	≤2 días	2%
P4	Consulta	≤4 h	≤4 días	1%

- Penalización proporcional al nivel de desviación
- Penalización máxima mensual: 15% del fee de soporte AM
- Aplicable únicamente a incumplimientos directamente imputables al proveedor

Condiciones

No aplicarán penalizaciones en caso de:

- Dependencias externas (Core, Genesys, terceros)
- Acción u omisión del cliente
- Cambios de alcance no formalizados
- Fuerza mayor
- Incidencias fuera del horario de servicio

- El modelo se revisará si la volumetría supera el 10–15% durante 2 meses consecutivos
- La priorización deberá ser correctamente asignada por el cliente

Los SLAs y umbrales se revisarán y ajustarán de mutuo acuerdo al inicio del proyecto (fase de Inception)



Anexos

Equipo - CVs

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Gestión

Manager

Educación

- **Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones – Universidad Politécnica de Madrid**
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (B2), Portugués (B1)

Áreas de especialización

- Ejecución end-to-end de iniciativas de transformación digital impulsadas por Salesforce
- Liderazgo de equipos multidisciplinares y gestión de stakeholders
- Definición y gobierno del alcance funcional y técnico
- Excelencia en la entrega, aseguramiento de la calidad y alineación entre negocio y TI

Experiencia profesional relevante

- **Telefónica Tech – Transformación Digital B2B (Communications Cloud)**
  Manager – Evolución de CPQ y Procesos Comerciales
  2025
  Lideró la implementación de Salesforce Industries CPQ y apoyó la evolución de las capacidades de OM/SOM dentro del programa de transformación B2B de Telefónica Tech.
  Coordinó equipos multidisciplinares para rediseñar procesos comerciales incluyendo venta guiada, pricing y provisión (fulfilment).
  Apoyó la definición del roadmap y aseguró la calidad en la entrega de los principales flujos de trabajo de transformación.

- **Vodafone – Salesforce AMS & Marketing Automation Squad**
  Manager – Marketing Automation & Operaciones y Evolución de Salesforce
  2025
  Lideró la línea tecnológica del equipo de Marketing Automation, colaborando con Vodafone y su agencia para optimizar campañas y customer journeys en Salesforce.
  Supervisó las operaciones AMS de Sales & Service Cloud, garantizando la resolución de incidencias, el mantenimiento de la plataforma y la mejora continua.
  Impulsó la optimización de procesos, la priorización del backlog y la coordinación con otros equipos técnicos de Vodafone para apoyar la evolución del sistema.

- **ENGIERO – Transformación con Salesforce & Salesforce Industries**
  Manager – Transformación de Ventas y Servicio B2B & B2C
  2022 – 2024
  Gestionó un programa de transformación digital para modernizar los procesos de ventas y postventa B2B y B2C utilizando Salesforce Industries.
  Coordinó el diseño funcional, la ejecución técnica y la alineación transversal entre múltiples unidades de negocio.
  Supervisó el alcance, la planificación, los riesgos y el aseguramiento de la calidad, integrando sistemas legacy en una plataforma unificada de Salesforce.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Gestión

Project Manager

Educación

- **Grado en Ingeniería Informática – Universidad Politecnica de Madrid**
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (intermedio)

Certificaciones

- Salesforce Certified Sales Cloud
- Salesforce Certified Service Cloud
- Salesforce Certified CPQ
- Salesforce Certified Marketing Cloud
- Salesforce Certified Field Service

Experiencia profesional relevante

Technical Manager – Bip&Drive, Madrid: Programa de transformación digital del CRM de Bip&Drive.
- **05/2025 – Actualidad**
  Project Manager, definiendo las fases del proyecto desde discovery hasta producción.
- Seguimiento del proyecto y comités ejecutivos.
- Gestión del alcance.
- Planificación detallada del proyecto.

Technical Manager – Engie Rumanía, Madrid: Proyecto de transformación digital de Engie, consistente en la migración del CRM actual (B2C y B2B) a Salesforce en 3 fases.
03/2024 – 01/2025
Responsabilidades:
- Gestión del proyecto hasta el GoLive de la Fase 1 (B2B).
- Seguimiento del proyecto con el cliente.
- Gestión económica.
  Salesforce Clouds: Sales Cloud, Service Cloud, Vlocity (Industries) y Marketing Cloud.

Technical Manager – Prosegur, Madrid: Proyecto de transformación digital para la migración del CRM actual de Prosegur (B2C) a Salesforce.
06/2021 – 02/2024
Responsabilidades:
- Gestión integral del proyecto en todas sus fases, desde Discovery hasta GoLive y estabilización.
- Seguimiento del proyecto con el cliente.
- Gestión económica.
  Salesforce Clouds: Sales Cloud, Service Cloud, CPQ, Field Service (FSL) y Marketing Cloud.

Technical Manager – Endesa RM, Madrid: Responsable del servicio de Release Management de Endesa.
02/2020 – 05/2021
Responsabilidades: Gestión del servicio; Planes de entornos; Planes de releases; Control de despliegues; Seguimiento con cliente.
Herramienta: Copado.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Salesforce

Salesforce Chief Architect

Educación

- **Grado en Ingeniería Informática – Universidad de Granada**
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (B2 – Intermedio alto)

Certificaciones

- Salesforce Certified Administrator
- Salesforce Certified System Architect
- Salesforce Certified Application Architect
- Salesforce Certified Experience Cloud Consultant
- Salesforce Certified AI Associate
- Salesforce Certified AI Specialist

Experiencia profesional relevante

Salesforce Chief Architect – NTT DATA, Madrid
07/2023 – Actualidad
- Miembro del Salesforce Center of Excellence de NTT DATA.
- Arquitectura de soluciones en proyectos Salesforce.
- Diseño de arquitecturas de solución para proyectos en distintos sectores (Seguros, Seguridad Privada, Transporte).

Salesforce Expert Architect – NTT DATA, Madrid
08/2020 – 07/2023
- Diseño de arquitectura global (Seguridad, Identidad, Estrategia de despliegue, Integraciones, etc.) para un proyecto de Transformación Digital en el sector de Seguridad Privada.
- Desarrollo e implantación sobre Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Field Service y Salesforce CPQ.

Salesforce Architect – everis Spain, S.L.U., Madrid
03/2017 – 08/2022
- Gestión de releases en un proyecto multi-proveedor y multi-fase.
- Definición de la estrategia de integración con sistemas legacy.
- Definición de metodología y buenas prácticas.
- Arquitecto cloud para Sales Cloud y Vlocity (Salesforce Industries).
- Soporte técnico con tecnología Vlocity (DataRaptor, OmniScript, Integration Procedure).
- Implementación de Contract Management mediante el módulo CLM de Vlocity.
- Definición e implementación de herramienta de Integración Continua.

Senior Analyst – everis Spain, S.L.U., Madrid
08/2013 – 03/2017
- Analista senior para aplicaciones legacy de Telefónica en distintos dominios: Fijo, Móvil y Empresas.
- Gestión de cliente y toma de requisitos para evolutivos.
- Participación en el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas.
- Supervisión y soporte técnico a miembros del equipo.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Salesforce

Salesforce Leader

Educación

Grado en Ingeniería Informática

Certificaciones

- Salesforce Omnistudio Developer
- Salesforce Data Cloud Consultant
- Salesforce AI Associate

Conocimiento en:

- Apex, LWC, Aura, Omnistudio, CPQ, CLM, Field Service
- Javascript
- GIT, Copado
- FullStack Java – React

Experiencia profesional relevante

- **Desarrollador Salesforce | Proyectos sector Seguros & Energy | 2025 – actual**
- Implementación de una solución basada en LWC, para la generación e integración de un proceso guiado para el usuario. Gestión de permisos y perfiles para poder hacer uso del proceso guiado.
- Gestión, análisis y desarrollo de la Migración de una aplicación de gestión de esperas desarrollada en componentes Aura a LWC.
- Análisis y desarrollo de la solución basado en LWC, Apex
- Testing y release management con Copado
- UATs con cliente y elaboración de documentación técnica y funcional
- **Desarrollador Salesforce | Proyectos sector Enery & Telco| 2020 – 2025**
- Implementación Salesforce Industries for Energy&Utilities con procesos de ventas B2B y B2C de productos de telefonía, y de Electricidad y gas, aplicando Industries CPQ para catálogo y carrito.
- Flujos guiados para la obtención de datos (manual o WEB mediante integraciones) y automatización de los estados de los objetos, mediante análisis y desarrollo de OS, FlexCard, Integration Procedure, Data Mapper, CLM, LWC
- Desarrollo de productos CPQ y actualización de precios. Generación de productos con reglas personalizadas, precios contenidos en matrices de Omnistudio y cálculo final de precios con Calulation Procedure
- Análisis y desarrollo custom para el control de descuentos entre distintas jerarquías de productos
- Administración de Salesforce; desarrollo y mantenimiento de perfiles y grupos de permisos
- Análisis y desarrollo completo del flujo automático de creación de documentos de Oferta y Contrato y de flujo del carrito
- UATs con cliente; revisiones y demostraciones con negocio para comprobar cumplimiento de requisitos del cliente. Corrección de incidencias.
- Desarrollo de flujos guiados para la obtención de datos (manual o integración WEB o Mulesoft) y automatización de los estados de los objetos, mediante el análisis y desarrollo de OS, FlexCard, Integration Procedure, Data Mapper, CLM, LWC.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Salesforce

Salesforce Senior Developer

Educación

FP Superior - Desarrollo de Aplicaciones Web

Certificaciones

- Salesforce Certified Associate
- Salesforce Certified AI Associate
- Salesforce Platform Developer 1

Conocimientos

- LWC, Apex, Flows, Unit testing, CTI, SOQL, SOSL, gestión de objetos, usuarios, perfiles, administración en Salesforce
- Agile, Jira, ServiceNow
- Git, Github, Bitbucket, Jenkins

Experiencia profesional relevante

- **Salesforce developer | Proyecto sector Telco (Enero 2024 – actualidad)**
  - Análisis detallado de la funcionalidad existente, identificando pain points y áreas de mejora en la operativa diaria del equipo de atención al cliente.
  - Desarrollo de soluciones personalizadas para abordar los desafíos identificados, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio.
  - Sesiones de formación en Salesforce sobre Reports y Dashboards, Einstein Bots, Ciclo de Vida de un Caso, Productividad, permitiendo al equipo aprovechar al máximo las capacidades de análisis de la plataforma.
  - Colaboración en la configuración de Experiencia de Cliente (Lightning Pages) para proporcionar a los agentes una interfaz intuitiva y personalizada, mejorando su eficacia en la resolución de problemas.
  - Colaboración con los equipos internos y los stakeholders de cliente para garantizar la alineación de las soluciones propuestas con los objetivos del negocio y las necesidades del cliente.
- **Análisis de funcionalidades de Einstein AI | NTT DATA (Septiembre 2023 – Enero 2024)**
  - Analizar nuevas funcionalidades de IA en Service Cloud, Sales Cloud y CRM Analytics.
  - Desarrollo de POCs.
  - Aplicación a casos de uso y participación en sesiones de co-creación.
- **Salesforce developer | Proyecto sector Banca (Abril 2021 – Septiembre 2023)**
  - Gestión de equipos para el desarrollo de funcionalidades del proyecto.
  - Recopilación requisitos de cliente, asegurando una comprensión completa de sus necesidades.
  - Análisis de tareas, identificando áreas de mejora y eficiencia.
  - Integraciones con APIs internas del cliente.
  - Coordinación de despliegues a entornos de pruebas y producción mediante Jenkins.
  - Uso de tecnologías Salesforce como Service Cloud, Communities, Lightning Web Components y Apex.
  - Implementación de la integración CTI con Genesys Cloud para mejorar la comunicación con los clientes.
  - Aplicación de tecnologías adicionales, como JavaScript y Git.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Salesforce

Salesforce Analyst

Educación

- **Licenciatura en Publicidad**
- **Master en Gestión Comercial y Marketing**
- Idiomas: **Inglés B2+**

Certificaciones

Certificaciones Salesforce:

- Admin
- Email Specialist
- Admin MKT Cloud
- AI Specialist
- Service Consultant

Conocimientos:

- Salesforce CRM
- MKT Cloud

Experiencia profesional relevante

Analyst – Sector Seguros
Implementación evolutiva de un nuevo método de pago en **Salesforce Sales Cloud**, integrándolo con soluciones existentes. Coordinación funcional con cliente, liderazgo de sesiones de refinamiento y elaboración de documentación TDA. Validación funcional de la solución previa a despliegue.

Analyst – Sector Retail
Responsable funcional de **Service Cloud** en cliente internacional, liderando la migración del sistema de atención al cliente desde SAP a Salesforce. Diseño e implementación de funcionalidades (Email-to-Case, Entitlements, Milestones) para optimizar la gestión de casos. Coordinación entre equipos técnicos y de negocio
.

Junior Analyst – Marketing
Diseño y ejecución de **journeys en Salesforce Marketing Cloud (SFMC)** para comunicaciones nacionales e internacionales. Seguimiento, análisis y optimización de campañas. Gestión y depuración de bases de datos. Impartición de formaciones a usuarios en buenas prácticas de campañas y segmentación.

Junior Analyst – Sector Utilities
Ejecución de campañas multicanal (Email y SMS) en SFMC mediante Journey Builder. Segmentación avanzada con SQL, gestión de Data Extensions, automatizaciones y envíos programados. Carga y gestión de datos mediante Automation Studio.

Junior Analyst – Sector Seguros
Participación en la puesta en marcha de SFMC: Configuración de Business Units, usuarios, estructuras de datos y Send Classifications. Diseño de plantillas y journeys automatizados multicanal. Pruebas de envío, calentamiento de IP y seguimiento de entregabilidad. Configuración de campos y objetos en Salesforce CRM y apoyo en despliegues con Copado.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Salesforce

QA Tester

Educación

- **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**

Certificaciones

Salesforce
- AI Associate

Conocimientos
- BI
- Salesforce CRM – Sales, Service
- Salesforce Service Cloud Voice
- Experiencia con AWS

Experiencia profesional relevante

QA Salesforce | Proyectos cliente Pharma | 2025 – actual

- Revisión de User Stories y requerimientos funcionales (Sales Cloud / Service Cloud), diseño de casos de prueba, definición de criterios de aceptación y cobertura de pruebas (funcionales, regresión, integración).
- Validación de flujos en Salesforce, pruebas de integraciones vía APIs y validación de datos entre sistemas.
- Pruebas UAT y soporte a negocio: Coordinación y soporte en pruebas con usuarios, preparación de datos de prueba en sandboxes, validación post-deploy en producción y aseguramiento de la calidad en releases y despliegues.

Desarrollador Salesforce | Proyectos diversos clientes| 2023 – 2025

- Análisis, resolución de incidencias técnicas, gestión de Incidencias de casos (service cloud) y uso de omnichannel
- Revisión de automatizaciones con Flows y Apex (code y actions)
- Uso de herramientas de debug para identificar inconsistencias en validaciones y procesos
- Realización de integraciones API Rest y soporte a integraciones con sistemas externos
- Elaboración documentación técnica para estandarizar y facilitar la gestión de la plataforma

Desarrollador Salesforce | Proyecto cliente Automoción| 2022 – 2023

- Creación de automatización de dashboards en Power BI
- Administrador y desarrollador de evolutivos. Encargado de gestionar tickets de incidencias del proyecto

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Business

Business Consulting Manager

Educación

- Licenciatura en Derecho (Universidad de Salamanca)
- Master en Gestión Financiera y Fiscal (ISDE Business School)
- Master in Management (IE Business School)
- Certificado en Transformación Digital (MIT)
- Certificado en Design Thinking: Innovación, Estrategia y Cambio (ESADE)
- Idiomas: Español (nativo) | Inglés (avanzado)

Áreas de especialización

- Transformación Digital y Tecnológica
- Análisis y reingeniería de procesos
- Definición de modelos operativos y funcionales
- Gestión de equipos y proveedores

Experiencia profesional relevante

- **Diseño y desarrollo de portal del cliente, portal del agente y gestor de tareas en agile (100% remoto)**
  - Análisis del modelo AS-IS: identificación de dependencias, necesidades e ineficiencias del modelo.
  - Definición del modelo TO-BE considerando las necesidades de negocio y cliente, y las limitaciones técnicas de los sistemas. Construcción de frameworks visuales en inVisio y Balsamiq.
  - Redefinición de procesos, mejora de usabilidad, diseño de distintos journeys con un fuerte componente de UX aplicando las mejores prácticas de los principales players del mercado y sector.
  - Coordinación de squads de distintas y perfiles durante el desarrollo de portales en paralelo.

- **Eficiencia en procesos de facturación apalancada en la creación de un nomenclátor común para el sector de salud privada: hospitales y aseguradoras (100% remoto)**
  - Análisis de catálogos individuales, de reglas y de procesos de facturación entre compañías.
  - Generación de catálogo común para aumentar eficiencia: ahorro tiempo/coste y reducción de incidencias.

- **PMO/PO en aplicación móvil para la gestión de pólizas de salud (100% remoto)**
  - Coordinación de los desarrollos de la app y nuevas funcionalidades como servicios de salud con IA y dotación de palancas comerciales avanzadas a través de la inclusión de elementos cross-selling.
  - Redefinición de journeys, fomentando la autogestión y mejora de la experiencia de usuario.

- **Definición estratégica de nuevo modelo operativo e implantación de nueva solución tecnológica (híbrido)**
  - Análisis del catálogo de servicios tradicional y propuesta de evolución de procesos para su inclusión en web y app.
  - Definición de los journeys de usuario para procesos de consulta y contratación, y recogida de feedback.

- **Gestión de identidades y segregación de funciones (híbrido)**
  - Definición de nuevo modelo de gestión de permisos e identidades, y del futuro modelo de mantenimiento.
  - Alineamiento de áreas involucradas y soporte en la gestión del cambio.

- **Eficiencia de procesos y optimización ágil (híbrido)**
  - Análisis de procesos: identificación de gaps y de potenciales mejoras, así como plan de evolución.
  - Inventariado y priorización de implantación de mejoras teniendo en cuenta impacto en la eficiencia, áreas involucradas y presupuesto.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Business

Senior Consultant

Educación

- Ingeniero Industrial, Universidad Iberoamericana
- Kanban System Design (KMP-I)
- Team Kanban Practitioner
- Idiomas:
  - Español nativo
  - Inglés profesional

Áreas de especialización

- Banca - Seguros
- Crédito y Caución
- Transformación de sistemas
- CeX
- Palantir

Experiencia profesional relevante

- **Generación de historias de usuario**, incluyendo los gaps, para dar soporte y asegurar la operativa en los sistemas To-Be, teniendo en cuenta las implicaciones de desarrollo y el impacto en sistemas
- **Ejecución de pruebas de implantación bajo metodología QA**
- **Gestión integral, diseño y ejecución de proyectos de Seguros** para asegurar el éxito y cumplimiento de objetivos. En proyectos de Core Asegurador para afores, experiencia del cliente para programas de lealtad, migración de sistemas para seguro de crédito, creación de nuevos canales de adquisición de clientes para Crédito Automotriz, entre otros
- Análisis y **levantamiento de procesos y sistemas de la operativa e2e** (Seguros de crédito, desde el área comercial, hasta el área financiera, CeX desde activaciones para captar nuevos clientes hasta la implementación de la solución para mejorar la experiencia)
- **Manejo avanzado de Palantir Foundry, con experiencia impartiendo formación a usuarios y equipos técnico**
- **Definición, planeación y seguimiento** de cada etapa del proyecto, así como la implementación de modelos de gobierno, bajo metodologías Agile y Waterfall. Bajo la creación de cronogramas priorizados estimando plazos y tiempos de los entregables.
- **Identificación de gaps** entre los sistemas As-Is y To-Be, entendiendo las necesidades de negocio y las implicaciones que esto tiene para su desarrollo, asegurando su correcta implantación
- Coordinación y colaboración de **equipos multidisciplinarios y stakeholders clave**, bajo metodologías Agile, para asegurar la comunicación y sinergia hacía un mismo objetivo, incluyendo tecnología, recursos humanos, finanzas
- Definición y **desarrollo de cuadros de mando para el reporting (DataStudio),** visuales dinámicos y KPIs
- Definición, seguimiento y ejecución del **modelo de reestructuración de migración de roles** de un Banco en las diversas regiones, asegurando una transición fluida

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo - Business

Junior Consultant

Educación

- Grado en Economics (Universidad Rey Juan Carlos)
- Certificate in Advanced English (Cambridge)
- Español (Nativo) | Inglés (C1) | Italiano (A1)

Áreas de especialización

- Ofimática: Word, Excel, PowerPoint
- Consultoría de Negocios
- Análisis de Datos y Métricas de Impacto
- Transformación Cultural y Digital

Experiencia profesional relevante

- **Proyecto de Excelencia Operativa – Aseguradora líder nacional**
  - Elaboración de informes y recomendaciones estratégicas basadas en datos objetivos, orientadas a la mejora de la experiencia del usuario y la excelencia operativa.
  - Diseño y ejecución de encuestas para medir la percepción de calidad de los servicios centralizados.
  - Identificación de oportunidades de optimización en procesos y modelos centralizados, proponiendo ajustes para incrementar eficiencia y estandarización.
  - Análisis de catas del proceso de soporte al mediador para identificar puntos críticos y oportunidades de mejora.

- **Proyecto de Adopción Plataforma de Análisis de Datos – Aseguradora líder nacional**
  - Identificación y análisis de KPIs relevantes a partir de los datos de participación en formaciones de distintos tipos de herramientas de la plataforma.
  - Seguimiento y análisis de respuestas a formularios de inscripción para sesiones formativas.
  - Preparación y envío de convocatorias para formaciones, e emails de feedback y seguimiento post-formación.
  - Control y mantenimiento actualizado de los registros de asistencia a las formaciones.

- **Proyecto Data Culture - NWoW**
  - Diseño y facilitación de workshops enfocados en la adopción de nuevas formas de trabajo y cultura de datos.
  - Obtención, análisis e interpretación de métricas de participación en formaciones y sesiones colaborativas, generando recomendaciones basadas en datos para la toma de decisiones del cliente.
  - Preparación y diseño de presentaciones ejecutivas con enfoque visual y estratégico para el cliente.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Gestión del cambio

Manager Gestión del Cambio

Educación

- Certificación Prosci Change Manager Practitioner
- Certificación HCMBOK, HCMBOK 3G y profesional experto en HCMP.
- Gen AI White & Yellow Belt L1 (NTT Data).
- Certificación Lean Change Management.
- Certificanión Scrum Master y Scaled Agile SAFe 5.0.
- Certificación en Project Management Professional (PMI).
- Executive Coach ACC ICF y Coach Systemic (ORSC).
- Transpersonal Coach & Facilitator, IHE John Whitmore.
- Herramientas de Transformación Cultural(I&II) Barret Values Centre.
- Neuroership i4 Practitioner.
- Licenciatura en Ciencias Empresariales. Master en Comercio Exterior.

Áreas de especialización

- Gestión del Cambio y Transformación Digital.
- Transformación cultural.
- Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles: Scrum, Kanban, Design Thinking, Lean Change Management y Lean Start Up, SAFe, Management 3.0, Visual Thinking.
- Coaching ejecutivo y sistémico.
- Formación y desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo. Innovación y creatividad. Programas de aprendizaje en línea.

Experiencia profesional relevante

Amplia experiencia en Gestión del Cambio en programas de transformación y estandarización a gran escala, así como en proyectos relacionados con la transformación digital, la transformación cultural, metodologías ágiles y el diseño de procesos y modelos organizativos.
Experiencia en proyectos nacionales e internacionales en los sectores de energía, comercio minorista, automoción, industrial, tecnología, audiovisual, educación, infraestructuras, consultoría, seguros, farmacéutico, banca, alimentación, logística y administración pública, así como en organizaciones internacionales y ONG. Capacitado en el diseño y facilitación de procesos de aprendizaje centrados en competencias. Fuerte sentido empresarial.

- **Sector Seguros:**
Apoyo especializado para evolucionar la metodología actual de Gestión del Cambio, la Oficina de Gestión del Cambio y el conocimiento y rendimiento de los gestores de cambio, para establecer un modelo más robusto, adaptable y fácil de aplicar que encaje en el contexto real de la organización.

- **Sector Automovilístico:**
Diseño, despliegue y dinamización de talleres de Gestión del Cambio y Compromiso para todo el personal de la planta de fabricación (4.000 empos, trabajadores de oficina y trabajadores) para garantizar el éxito de un programa de desarrollo de conocimientos y habilidades a largo plazo.

- **Sector de Tecnología y Consultoría:**
Programa de mejora de habilidades en IA generativa para organizaciones internacionales, multiempresariales y multilingües con 140.000 empos.

- **Sector Energía y sector de Telecomunicaciones/Servicios digitales:**
Implementación de proyectos CRM (solución Salesforce), ERP y HRIS con nuevas formas de trabajo correspondientes.

- **Sector Energía:**
Transformación digital, incluyendo la implementación de Everilion CRM (soluciones de punto de venta y backoffice a nivel global) en +40 países, 4 continentes y 4 idiomas. Diseño y ejecución del plan estratégico de gestión del cambio a nivel corporativo y nacional: Plan de gestión de patrocinio y partes interesadas, plan de comunicación, plan de aprendizaje, plan de compromiso y plan de seguimiento, análisis de KPI y sostener y reforzar el cambio. Duración del proyecto: 3 años.

- **Sector Público / Organizaciones Internacionales:**
Diseño del plan de Gestión del Cambio asociado con la definición del nuevo modelo operativo de gestión de subvenciones para 20 países.

- **Sector de Telecomunicaciones:**
Global Change Manager en la implementación internacional de la solución de recursos humanos SAP Success Factors.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Gestión del cambio

Consultor Gestión del Cambio

Educación

- Grado en Administración y Dirección de Empresas

Áreas de especialización

- Especialización en programas de Transformación y Gestión del Cambio
- Transformación modelo operativo en el ámbito de los Recursos Humanos
- Experiencia de empo (compensación y beneficios)
- Gestión de proyectos. PMOs
- Comunicación digital

Experiencia profesional relevante

- **Sector Bancario:**
  - Gestión del Cambio Cultural en una multinacional del sector bancario, impulsando la concienciación en Ciberseguridad mediante la definición e implementación de planes estratégicos de sensibilización, comunicación y acompañamiento. Coordinación de iniciativas clave para integrar la cultura de seguridad en los proyectos estratégicos de la compañía.
- **Sector Utilities:**
  - Implantación de Salesforce: Gestión del cambio en la implantación de Salesforce en una compañía multinacional del sector energético y petroquímico con presencia global, mediante el diseño y ejecución de planes de comunicación y awareness adaptados para garantizar una adopción fluida en el equipo.
  - Implantación de M365: Gestión del cambio en multinacional del sector de energías renovables especializada en proyectos fotovoltaicos, centrada en los planes de comunicación y formación para fomentar la adopción de aplicaciones como Teams, OneDrive y SharePoint principalmente.
- **Sector Público:**
  - Gestión del cambio en la Transformación Digital de los Proyectos Estratégicos de IT de la Comunidad de Madrid
- **NTT DATA (Proyectos de PMO):**
  - En el ámbito de Rebranding en el workstream de Real Estate & Worplace en 16 países
  - En el ámbito de adopción de nuevas formas de trabajo:
    1. Transformación cultural y adopción de nuevas formas de trabajar
    2. Definición de hábitos y comportamientos que permitan adoptar la nueva cultura organizativa
- **Sector Industria:**
  - Gestión del cambio, planes de comunicación y sensibilización, y acompañamiento en la implantación de herramientas en el ámbito de Recursos Humanos.
  - Formaciones a empleados.
- **Sector Seguros:**
  - Transformación en distintas empresas en el ámbito de Compensación y Beneficios. Rediseño de políticas retributivas
- **Sector Educativo:**
  - Assessment de madurez digital e implantación de distintas herramientas tecnológicas a nivel organizativo (docente y no docente)
  - Formación en distintas competencias digitales
  - Acompañamiento a lo largo del proceso de transformación
- **Sector de Franquicias:**
  - Digitalización del área de negocio de la compañía
  - Diseño e implantación de campañas de comunicación y estrategias de posicionamiento online

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Gestión del cambio

Consultor Gestión del Cambio

Educación

- Grado en Empresa y Tecnología

Áreas de especialización

- Gestión del Cambio
- Comunicación - Transformación cultural
- Conocimiento en el uso de Herramientas Office 365 Y Power Platform
- Uso de herramientas de creación de contenido
- Uso de herramientas de dinamización de contenidos

Experiencia profesional relevante

- **Gestión del Cambio:**

Colaboración en el Desarrollo de ofertas comerciales.

- **Utilities:**
  - Elaboración de informes de actualización sobre el avance del proyecto, garantizando una comunicación efectiva y oportuna de los hitos alcanzados.
  - Creación de informes de progreso que enumeran los objetivos cumplidos y los próximos pasos, facilitando la transparencia en la gestión del proyecto.
  - Redacción de comunicados para el lanzamiento de nuevas funcionalidades y ayuda en la planificación de reuniones mediante herramientas digitales para optimizar la gestión de reuniones corporativas.
  - Desarrollo de manuales multilingües utilizando la nueva herramienta implementada “Everilion”, promoviendo la accesibilidad de la información.
  - Apoyo en la creación de formaciones para el cliente, orientadas a facilitar la comprensión y el uso efectivo de la herramienta.
  - Implementación de herramientas de engagement para incrementar la interactividad y el interés en las sesiones formativas.
  - Coordinación y gestión de la documentación del proyecto para garantizar un traspaso de conocimiento eficiente tanto al cliente como al equipo sucesor.

- **Sector Público:**
  - Apoyo en la generación de contenido, mediante la creación de presentaciones gamificadas, promoviendo el aprendizaje interactivo.

- **Sector Industrial:**
  - Apoyo en la generación de contenido visual, creación de guías formativas visuales.
  - Apoyo en un Proyecto de Ciberseguridad en el sector farmacéutico, ayudando en la creación de contenidos multimedia, incluyendo vídeos y presentaciones interactivas, junto con evaluaciones gamificadas, con el uso de la IA. Con el objetivo de potenciar la concienciación sobre la relevancia de la ciberseguridad.

- **Sector de Comunicaciones:**
  - Elaboración de guiones, plantillas para propuestas de entrevistas y preguntas estratégicas, optimizando la presentación y estructuración de la información. Estableciendo contacto continuo con el cliente y proveedor.
  - Encargada de organizar, coordinar y dar seguimiento a la comunicación con clientes y proveedores para identificar necesidades y alinear expectativas en el marco de un proyecto regulatorio. Impulsé acciones de gestión del cambio para facilitar la adopción de nuevos procesos internos, asegurando una transición fluida y efectiva.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Gestión del cambio

Diseñador de Contenidos Multimedia y E-learning

Educación

- Grado en Diseño Gráfico / Comunicación Audiovisual
- Máster en Diseño / Multimedia / Producción Audiovisual
- Formación especializada en Motion Graphics y Animación
- Formación en Marketing Digital y RRSS
- Certificaciones en Desarrollo de Productos Multimedia y Editoriales

Áreas de especialización

- Diseño y producción de contenidos e-learning bajo estándar SCORM
- Edición de vídeo, imagen y audio
- Motion graphics y animación
- Diseño de infografías y materiales interactivos
- Creación de simuladores formativos
- Configuración y gestión de contenidos en LMS (Moodle)
- Maquetación HTML + CSS
- Diseño UI/UX aplicado a entornos formativos
- Producción audiovisual y creación de videotutoriales

Experiencia profesional relevante

- **Sector Energía:**
  - Diseño y producción de contenidos formativos interactivos para programas de transformación y digitalización.
  - Creación de videotutoriales y recursos audiovisuales para adopción de nuevas herramientas corporativas.
  - Desarrollo de infografías y materiales visuales para campañas internas.Gestión y parametrización de contenidos en LMS.
- **Sector Público:**
  - Diseño de materiales formativos digitales para iniciativas de capacitación interna.
  - Creación de presentaciones gamificadas y recursos interactivos para fomentar el aprendizaje activo.
  - Elaboración de guías visuales y documentación formativa accesible.
- **Sector Industrial:**
  - Desarrollo de contenidos multimedia para programas de concienciación y seguridad.
  - Producción de vídeos formativos y materiales interactivos.
  - Diseño de evaluaciones gamificadas y simulaciones formativas.
- **Sector Comunicaciones:**
  - Creación de guías visuales, materiales corporativos y contenidos multimedia para programas internos.
  - Desarrollo de branding gráfico para iniciativas formativas.
  - Producción de contenidos audiovisuales orientados a transformación organizativa.
- **Sector Servicios y Retail:**
  - Diseño de materiales promocionales y formativos.
  - Producción audiovisual y edición de vídeos corporativos.
  - Desarrollo de presentaciones formativas interactivas.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Integraciones

MuleSoft Lead Architect

Educación

- Licenciatura en Ingeniería Informática.
- Inglés avanzado

Áreas de especialización

MuleSot, Integration, Java, SpringBoot,Tibco, SQL, SOA

Experiencia profesional relevante

Sector Industria (Sep 2023 – May 2025)

Project Manager, liderando simultáneamente 3 proyectos de integración sobre MuleSoft (diseño, implementación y evolución de la plataforma de integración y su gobierno).

• Gestión end-to-end de los 3 proyectos: definición de alcance y objetivos, planificación, seguimiento de hitos, control
de riesgos y dependencias, gestión de cambios, y aseguramiento de calidad y entregables.

• Coordinación y liderazgo transversal del equipo para ejecutar en paralelo dos proyectos con el mismo equipo, gestionando capacidad, prioridades y asignación de tareas para cumplir plazos y compromisos.

• Gestión de equipo técnico en dos proyectos: coordinación de 1 Arquitecto de Integración y 4 desarrolladores, asegurando alineación técnica, estándares, buenas prácticas y consistencia de la solución.

• Rol mixto en un tercer proyecto: Project Manager y, además, Arquitecto de Integración y desarrollador, participando
en el diseño de la arquitectura, definición de patrones de integración, implementación de APIs/integraciones y creación de pruebas de concepto (POCs) para validar enfoques técnicos.

• Diseño y estandarización de la arquitectura de integración en MuleSoft: definición de patrones, gobernanza de APIs,
versionado, manejo de errores, trazabilidad, seguridad y criterios de calidad para asegurar soluciones escalables y mantenibles.

• Interlocución con stakeholders (cliente e internos): sesiones de alineación, toma de requisitos, priorización, gestión
de expectativas y reporting periódico del estado del portfolio (avance, riesgos, decisiones y próximos pasos).• Impulso de la productividad del equipo mediante el uso y mejora de herramientas de gestión, plantillas y procesos de
trabajo (seguimiento, documentación y comunicación) para asegurar trazabilidad y eficiencia.

Sector Banca (Abr 2020 – Sept 2023)

• Diseño de la arquitectura de la plataforma de Integración de Santander Consumer Finance
• Diseño de modelos de gobierno y arquitectura de integración
• Diseño de los Business Capabilities
• Diseño y desarrollo de Mule Apps con enfoque API-Led
• Integración de estándar BIAN (Banking industry architecture network)

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Integraciones

MuleSoft Expert Architect

Educación

- Ingeniero informático en la Universidad Rey Juan Carlos
- Español (lengua materna)
- MuleSoft Certified Developer
- MuleSoft Certified Integration Architect

Áreas de especialización

MuleSoft,TIBCO, Azure Data Factory, WebMethods, JBPM, Integration pattern, Oracle

Experiencia profesional relevante

Overview

Arquitecto con 19 años de experiencia en integración, especializado en el diseño e implementación de soluciones que facilitan la comunicación efectiva entre sistemas y aplicaciones dentro de una organización. He trabajado con diversas plataformas de integración líderes en la industria, como MuleSoft, Tibco y WebMethods. Estas plataformas son esenciales para facilitar la conexión entre diferentes sistemas, aplicaciones y servicios, garantizando la interoperabilidad en entornos empresariales complejos.

Sector Industria (Jun 2016 – Present)

- Gobernanza de la arquitectura: ayudar a los equipos de desarrollo a definir estándares, facilitar la reutilización y garantizar la seguridad.
- Gestión de la plataforma Azure Data Factory para equipos que desarrollan ETL para casos de transferencia de datos entre sistemas con transformaciones de datos simples.
- Tecnologías: Anypoint Platform, Azure Data Factory
- Rol: Arquitecto expert

- Definición y desarrollo de proyectos de gestión de RR.HH. con Mulesoft 4.
- Desarrollo de servicios con Tibco BusinessWorks para la gestión de hipotecas.
- Tecnologías: MuleSoft, Tibco
- Rol: Consultor/Arquitecto

Sector Telco (Jul 2008 – Jun 2016)

- Utilizar Tibco BusinessWorks 5.8 para el mantenimiento y desarrollo de los procesos necesarios para la comunicación y la gestión de la empresa.
- Definición y programación de procesos de negocio con JBPM, colaborando en el desarrollo de servicios y flujos de trabajo con J2SE.
- Tecnologías: Tibco, JBPM.
- Rol: Consultor.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Integraciones

MuleSoft Developer

Educación

- Formación Profesional Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- Dominio del español y el inglés

Áreas de especialización

MuleSoft, Python, Bitbucket, Git, Rust, JIRA

Experiencia profesional relevante

Overview

experiencia en consultoría de TI. Forma parte del equipo de Plataforma.

Sector Seguros (Sept 2022 – Ago 2024)

- Diseño y desarrollo de políticas personalizadas para las API de MuleSoft y Flex Gateway.
- Creación de scripts de Python para optimizar la gestión y automatización de la plataforma MuleSoft.
- Gestión y mantenimiento de la plataforma MuleSoft.
- Tecnologías: MuleSoft, API REST y SOAP, Jira, Python y Rust.
- Rol: Ingeniero.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Data

Data Tech Lead

Educación

- Máster en Business Intelligence and Big data
- Postgrado, Inteligencia de negocio y Análisis de datos
- Ingeniería Técnica Informática de Sistemas

Certificaciones

- Certificado de Especialización en Big Data y Sistemas NoSql
- Certificado de Especialización en análisis y minería de datos
- Certificado de Especialización en Fundamentos de Inteligencia de Negocio y Big Data
- Talend - Byte me
- Talend - Digging deep into database
- Talend - Back it up with data

Áreas de especialización

- Dirección y coordinación de equipos.
- Creación de ETLs con Talend y Pentaho.
- Análisis y diseño de Data Warehouses, Data Marts y Data Lakes
- Migración de ETLs a Talend
- Procesos de mejora de calidad del dato en integración
- Bases de datos: Snowflake, Big Query, MS SQL Server, Oracle, MySQL, RedShift, BigQuery, Ficheros planos o semi estructurados (CSV, XML, JSON). Programación PL/SQL,
- Metodologías: ITIL, Agile, Kanban, Scrum, Jira, Confluence.
- Amazon AWS S3, Google Cloud

Experiencia profesional relevante

SENIOR TECHNICAL LEAD – SISTEMAS CLOUD
NTT DATA Noviembre 2022 – Actualmente (Madrid)

- Coordinación de proyectos ágiles y equipos de desarrollo
- Análisis de los requisitos y de las necesidades de integración de datos entre fuentes y destinos propios de los clientes o de terceros.
- Diseño y optimización de arquitecturas buscando mejoras en la escalabilidad y rendimiento.
- Responsable de proyectos de migración a sistemas Cloud

ARQUITECT DE INTEGRACION DE DATOS - TALEND
Sector bancario Marzo 2018 – Noviembre 2022 (Zaragoza)

- Responsable de la gestión de proyectos ágiles y equipos de desarrollo en diferentes clientes
- Diseño y coordinación de ETLs con Talend con diferentes orígenes y destino de datos (Salesforce, Oracle, AWS, Redshift,Sftp, json, S3, Azure)
- Migraciones desde DataStage, Sql Server y Oracle a sistemas Cloud como Azure y Google Cloud usando la herramienta Talend
- Diseño de arquitecturas de datos
- Análisis de los requisitos

DATA ENGINEER - PENTAHO
Sector Asegurador Mayo 2015 – Abril 2016 (Barcelona)

- Diseño e implementación de Jobs y transformaciones con Kettle de Pentaho, para el departamento de Gestión y Calidad de datos
- Mantenimiento y evolutivos de procesos de carga
- Transformación y extracción de datos del DWH.

DATA ENGINEER - PENTAHO
Sector Asegurador Enero 2015 – Mayo 2015 (Barcelona)

- Desarrollo de procesos con Pentaho, creación de Reports y resolución de incidencias Transformación y extracción de datos del DWH.
- Validación de datos, manejo de queries en PL/SQL Oracle y SQL Server

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Data

Senior Data Engineer

Educación

- Máster en Big Data y Business Intelligence
- Título de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Áreas de especialización

- Lenguajes: Python, Scala 2.12, Bash.
- Bases de Datos: SQL (PostgreSQL,Snowflake) y NoSQL (MongoDB)
- Procesamiento y Transformación de datos: Apache Spark, dbt, Polars.
- Modelado de Datos: modelo dimensional Kimball, OBT, Slowly Change Dimension.
- AWS: S3, EMR, EC2, Data Pipeline, SNS, ECS, Athena.
- GCP: Google Storage, BigQuery, Composer, IAM.
- Visualización y Reportes de Datos:
- Control de Versiones: Git, Github, Gitlab
- Orquestación y CI/CD: Apache Airflow, dbt Cloud, Github Actions.
- Manejo de APIs: Postman.
- Infraestructura y DevOps: Terraform, Docker

Experiencia profesional relevante

Senior Platform Solutions Engineer en NTT Data.

Sector Público

- Colaborar en la construcción de un Data Warehouse corporativo en Snowflake, aplicando modelado dimensional y estándares de calidad.
- Migrar objetos y flujos desde Teradata a Snowflake, convirtiendo procedimientos complejos en modelos dbt
- Implementar conceptos avanzados de dbt (tests, materializaciones incrementales, modularidad y principios de Data Mesh)
- Mentoría y formación interna en dbt Cloud/Core y adopción inicial de dbt Fusion
- Generar documentación técnica y funcional detallada, facilitando el traspaso al equipo de mantenimiento y mejorando la coordinación entre áreas.
- Mantener y optimizar el Data Warehouse en Bigquery, migrado desde SQL Server, resolviendo discrepancias y validando grandes volúmenes de datos en un entorno con documentación limitada.
- Reducir los costes de procesamiento entre 20–30% mediante un correcto particionamiento, clusterización y optimización de consultas utilizadas por Looker Studio y Google Sheets.
- Operar y supervisar los pipelines en Airflow (Composer), incluyendo alertas en Teams para mejorar el control y la respuesta ante fallos.
- Extraer datos de APIs y múltiples fuentes, para almacenarlos en AWS S3 en formato Parquet.
- Procesar y transformar grandes volúmenes de datos con Spark/Scala en AWS EMR y BigQuery en GCP.
- Preparar los datos finales en Athena y BigQuery habilitando su consumo por equipos de marketing, visualización e inteligencia artificial, garantizando su consistencia, calidad y disponibilidad.
- Mejorar la fiabilidad del sistema mediante documentación funcional/técnica, mapeos de datos y alertas automáticas en Slack para fallos en EMR, reduciendo tiempos de respuesta del equipo.

© 2026 NTT DATA, Inc.

CVs equipo – Data

Data Engineer

Educación

- Ingeniería en Informática
- Ingeniería Técnica en Informática de sistemas

Certificaciones

- Powercenter: Developer Cloud Application Integration Services for Developers
- Cloud Data Integration for Powercenter Developer, Foundation Certification
- Tableu: Developer

Áreas de especialización

- Analista BI, con amplia experiencia en herramientas ETL
- Conocimientos avanzados con diferentes entornos de bases de datos.
- Formación y experiencia en herramientas de integración Cloud (ICS)
- Análisis e implementación de varios proyectos con tecnología DBT y Snowflake

Experiencia profesional relevante

Data Engineer - NTT DATA Spain

Sector Público

- Análisis e implementación de modelos DWH en Snowflake usando DBT Technology DBT, Snowflake

Sector Bancario

- Análisis y desarrollo de ETL usando IBM DataStage Technology SQL, DataStage
- Análisis funcional del modelo centralizado de información
- Generación de documentaciones técnicas para equipos de desarrollo de ETL's Technology SQL
- Implementación del entorno Datalake de ICO
- Análisis y desarrollo ETL en entorno Cloud (IICS)
- Análisis y desarrollo de soluciones BI dentro de entornos DWH.
- Desarrollo procedimientos almacenados Teradata
- Mantenimiento procesos estructurales dentro del DWH.
- Integración datos mediante tecnología Big Data (Cloudera y BDM), Powercenter, Teradata, Cloudera, BDM, DWH
- Desarrollo procesos ETL basados en Informatica Powercenter
- Proceso aseguramiento de la calidad y trazabilidad del dato Technology Powercenter, Teradata,

Sector Automóvil

- Mantenimiento de entorno informacional
- Análisis y aplicación de correctivos en Powercenter y BBDD's
- Integración datos en Cloud (IICS)
- Formación tecnología a integrantes del proyecto. Technology Powercenter, SQL, IDQ, IICS


NTT DATA

© 2026 NTT DATA, Inc.


Metodología: Estrategia UX

INCEPTION

Definición de la estructura y pautas de experiencia sobre la base funcional definida, asegurando coherencia en la navegación y consistencia global.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Alineamiento con negocio en la definición funcional, integrando criterios de experiencia y navegación.
2. Definición de la arquitectura de información, estructura y pautas de UX para la construcción de las pantallas.
3. Diseño de 2-3 pantallas clave en Figma que permitan validar y entender la propuesta de estructura y navegación planteadas.

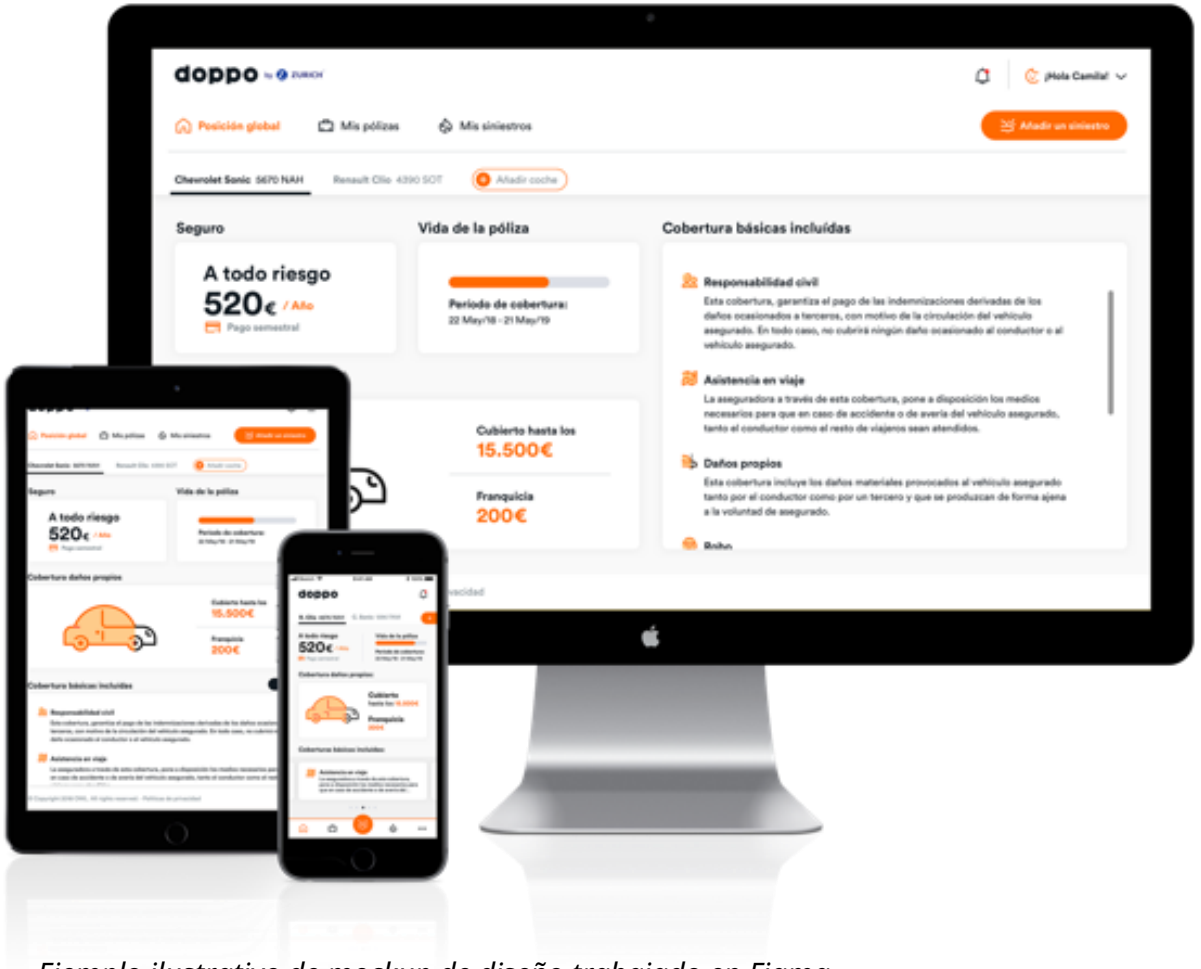

Ejemplo ilustrativo de mockup de diseño trabajado en Figma
