MINSAIT | linea directa



Implantación CRM

REQ0028484

Propuesta Económica

Marzo 2026

MINSAIT

Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partner, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el "Propósito").

La información aquí presentada es propiedad de la sociedad del grupo controlado por Indra Holding TI, S.L.U. que suscribe el presente documento (en lo sucesivo, "Minsait"), y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito de Minsait.

Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de aquellos terceros a los que Minsait haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación. Una vez finalizado o concluido el Propósito, el cliente debe restituir a Minsait toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo utilizar de ninguna manera, ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait salvo que haya sido autorizado para ello previa y expresamente por escrito por Minsait.

El destinatario de la información confidencial, después de finalizado el Propósito, no podrá utilizar de ninguna manera ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait.

Copyright © 2026 Minsait. Todos los derechos reservados. España

01

INTRODUCCIÓN

02

PROPUESTA ECONÓMICA

03

PENALIZACIONES

04

PLAZO DE VALIDEZ

MINSAIT

Introducción

01



MINSAIT

MINSAIT

El presente documento contiene la Propuesta Económica de colaboración realizada por **Minsait** , con objeto de presentar a Línea Directa su oferta en respuesta a la RFQ: **Implantación CRM REQ0028484**

Este documento constituye de forma indisoluble la oferta económico-comercial junto con el documento de Propuesta Técnica.

Adicionalmente, **Minsait** quiere remarcar que el alcance del proyecto será exclusivamente el descrito en el presente documento, y que una vez aceptado por Línea Directa tendrá validez a todos los efectos sobre la información remitida. De la misma manera, **se incluye documento anexo con las consideraciones particulares para la propuesta.**

Por la presente propuesta, **Minsait** ofrece a Línea Directa todas sus capacidades como aliado Tecnológico y de Negocio para afrontar la ejecución del proyecto ofertado de acuerdo con lo detallado en las siguientes páginas.

Sea cual sea el resultado final de la adjudicación, **Minsait quiere agradecer a Línea Directa la confianza depositada** para elaborar y presentar esta Propuesta de Colaboración.



¿Cómo se ha planteado la Oferta Económica?


Para elaborar esta propuesta económica hemos trabajado de forma completamente coordinada entre los equipos de Minsait y Nespon, combinando la experiencia sectorial y técnica de ambos, así como el conocimiento adquirido durante el assessment previo realizado para Línea Directa. Este enfoque conjunto nos ha permitido partir de un entendimiento profundo y compartido del entorno, los procesos y las necesidades reales del proyecto.

A partir de este punto de partida común, realizamos un ejercicio estructurado de análisis del RFQ y de sus requisitos funcionales y técnicos, desglosando el alcance en unidades estimables y clasificándolo por tipo de esfuerzo. Cada requisito fue valorado por especialistas de las distintas disciplinas, estableciendo estimaciones realistas, contrastadas y alineadas con la complejidad de cada fase.

El dimensionamiento del equipo y el modelo económico se han construido conforme al modelo de entrega propuesto: un equipo por fases, equilibrado según carga real, reforzado por capacidades especializadas donde aportan mayor valor (FSC, arquitectura, integraciones, UX y gobierno). Este diseño garantiza un consumo predecible por sprint/fase y maximiza la eficiencia mediante estándares, reutilización y minimización de desarrollos custom.

Finalmente, la oferta incorpora mecanismos de control y revisión, asegurando que el esfuerzo se mantiene alineado con el alcance aprobado y que cualquier desviación se trata con total transparencia.

El resultado es una propuesta económica sólida, trazable y fácilmente auditable, basada en esfuerzo real, en metodología robusta y en un uso eficiente de los recursos, garantizando viabilidad, cumplimiento de plazos y sostenibilidad del modelo.

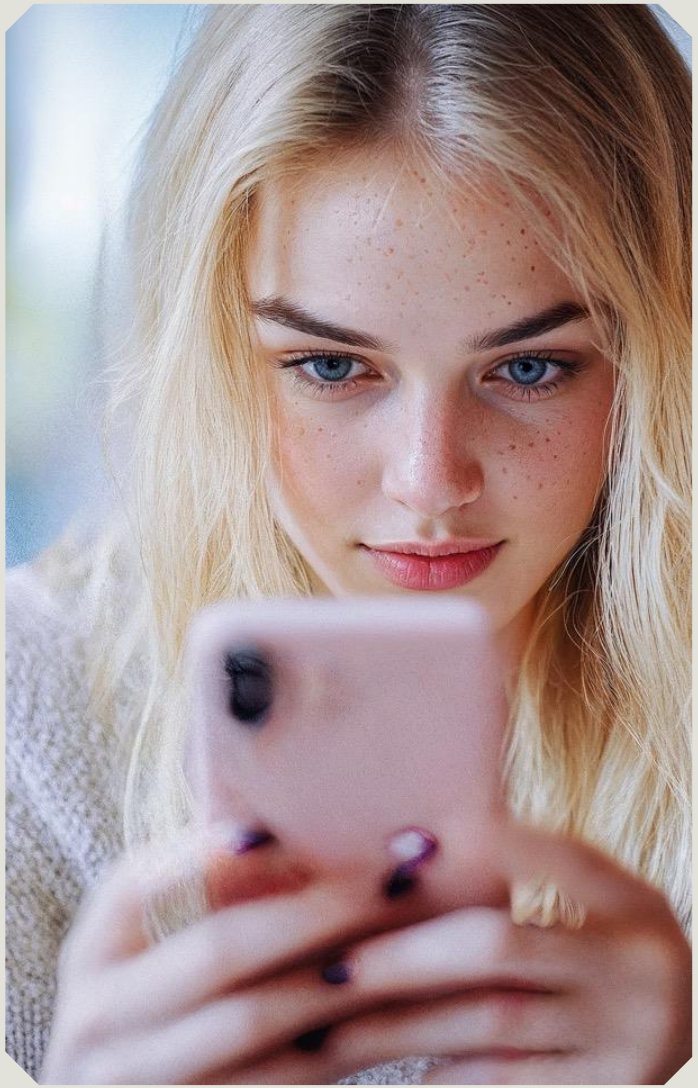

MINSAIT

linea directa

Entendemos que la información y consideraciones incluidas en el presente documento responden adecuadamente a la solicitud de LDA. No obstante, **estamos a vuestra disposición para ampliar o aclarar aquellos aspectos que ustedes consideren convenientes** a través de la persona de contacto indicadas a continuación:



José Luis Martínez García de Lara
Móvil: **649 370 261**
Email: **jlmartinez@minsait.com**

Salvador Méndez Cortés
Móvil: **636425967**
Email: **smendez@minsait.com**

Avda. de Bruselas, 33-35
28108 – Alcobendas (MADRID)

Propuesta económica

02



MINSAIT

Propuesta económica

Discovery + Definición + UX	255.484,66€
Implementación Financial Services Cloud	2.841.335,64 €
Gestión del Cambio	378.804,56 €
Soporte y Mantenimiento (1 año)	394.461,00 €
Total	**3.870.083,86€**



Estimación económica

A continuación, se detalla la estimación económica por línea de trabajo, perfil y esfuerzo asociado:



MINSAIT	Horas	Tarifa (€/hora)	Importe (€)
Discovery + Implementación FSC	**48.956,73**		**3.096.818,30 €**
Jefatura global proyecto	3.580,21	83,50 €	298.956,14 €
Líder Equipo Desarrollo FSC	3.068,76	69,68 €	213.822,94 €
Desarrollador Senior FSC	10.527,53	57,07 €	600.405,36 €
Experto funcional FSC	3.639,83	75,27 €	296.476,74 €
Arquitecto Técnico FSC	1.790,11	92,90 €	166.306,73 €
Ingeniero DevOps FSC	1.628,89	52,90 €	86.173,52 €
Arquitecto Integraciones	1.832,73	89,26 €	157.914,69 €
Desarrollador Integraciones Senior	10.698,02	61,02 €	647.576,65 €
Desarrollador Integraciones Junior	4.688,38	45,56 €	213.568,58 €
Líder Equipo QA	1.620,49	58,06 €	94.092,89 €
Analista QA	2.813,03	51,61 €	145.188,41 €
Consultor Integración Canales	955,73	54,48 €	54.054,24 €
Consultor Migración	2.113,03	54,48 €	122.281,40 €
Gestión del Cambio	**6.453,34**		**378.804,56 €**
Desarrollador Senior FSC	339,56	58,33 €	19.807,81 €
Experto funcional Seguros	6.113,78	58,75 €	358.996,75 €
Soporte y Mantenimiento	**7.433,49**		**394.461,00 €**
Service Manager	1.484,09	60,99 €	90.516,40 €
Desarrollador Senior FSC	2.239,16	57,14 €	127.952,03 €
Desarrollador FSC	2.239,16	37,83 €	84.716,78 €
Desarrollador Integraciones Senior	1.471,08	63,20 €	91.275,79 €

Planificación hitos de facturación

Con el objetivo de maximizar la eficiencia, capturar sinergias entre procesos y funcionalidades, acelerar el time-to-market y garantizar una implementación segura, hemos realizado una agrupación de las 9 fases inicialmente propuestas por LDA, definiendo **6 Go Lives** que permiten cubrir el 100% del alcance planteado:



Los Go Lives se producirán a la finalización del mes indicado:

Go Live 1 (mes 5) – Fase 1

Go Live 2 (mes 9) – Fase 2 + Fase 3 + Fase 4

Go Live 3 (mes 14) – Fase 5 + Fase 6

Go Live 4 (mes 15) – Fase 7

Go Live 5 (mes 17) – Fase 8

Go Live 6 (mes 18) – Fase 9



PROPUESTA ECONÓMICA

Facturación y forma de pago

Desde Minsait proponemos el siguiente plan de facturación para este proceso de **60 días** de f.f.

Fase	SSPP Proyecto	Importe	% Hito Go Live
Go Live 1	Hito 1: Mes 1 Lanzamiento del Proyecto – Aceptación Oferta	**396.763,19 €**	50%
Go Live 1	Hito 2: Mes 4 Inicio Pruebas UAT	**198.381,59 €**	25%
Go Live 1	Hito 3: Mes 6 Puesta en producción	**198.381,59 €**	25%
Go Live 2	Hito 4 : Mes 5 Inicio	**427.145,80 €**	50%
Go Live 2	Hito 5: Mes 8 Inicio Pruebas UAT	**213.572,90 €**	25%
Go Live 2	Hito 6: Mes 10 Puesta en producción	**213.572,90 €**	25%
Go Live 3	Hito 7: Mes 9 Inicio	**549.422,85 €**	50%
Go Live 3	Hito 8: Mes 13 Inicio Pruebas UAT	**274.711,43 €**	25%
Go Live 3	Hito 9: Mes 15 Puesta en producción	**274.711,43 €**	25%
Go Live 4	Hito 10: Mes 13 Inicio	**102.852,26 €**	50%
Go Live 4	Hito 11: Mes 14 Inicio Pruebas UAT	**51.426,13 €**	25%
Go Live 4	Hito 12: Mes 16 Puesta en producción	**51.426,13 €**	25%
Go Live 5	Hito 13: Mes 15 Inicio	**182.022,47 €**	50%
Go Live 5	Hito 14: Mes 16 Inicio Pruebas UAT	**91.011,24 €**	25%
Go Live 5	Hito 15: Mes 18 Puesta en producción	**91.011,24 €**	25%
Go Live 6	Hito 16: Mes 17 Inicio	**79.604,75 €**	50%
Go Live 6	Hito 17: Mes 18 Inicio Pruebas UAT	**39.802,37 €**	25%
Go Live 6	Hito 18: Mes 19 Puesta en producción	**39.802,37 €**	25%

Fase	Gestión del servicio Soporte y Mantenimiento	Importe	% Hito
Soporte	Gestión del servicio Mes 19: mes 7 año 2 - mes 6 año 3 (anual prepaid)	**394.461,04 €**	100%

Penalizaciones

03



MINSAIT

Detalle de penalizaciones:

A continuación, se presenta una propuesta de penalizaciones equilibrada y alineado con las mejores prácticas del sector:

Entregables que no cumplan los requisitos o presenten errores graves

En caso de entregables que no cumplan los criterios de aceptación acordados, Minsait procederá a su corrección sin coste adicional dentro de un plazo de 15 días laborables.

Retrasos en Hitos Principales del Calendario

En caso de retrasos imputables única y exclusivamente a Minsait en hitos principales del calendario (Go Live de cada fase), se aplicará una penalización del 0,5 % del valor del hito afectado por cada semana de retraso, con un máximo del 5 %.

Incumplimiento de SLA acordados

En fase de soporte y mantenimiento, los posibles incumplimientos de los niveles de servicio acordados (SLA) podrán ocasionar una penalización del 2% en el caso de incumplimiento puntual y de hasta el 5 % si existiese un incumplimiento reiterado de la factura del servicio.

Las penalizaciones anteriormente indicadas podrán ser acumulables entre sí, respetando los límites indicados.

Detalle de Nivel de Servicio: Tiempo de Respuesta y Resolución

Severidad	Tiempo de Respuesta (TR)	Tiempo de resolución (TS)	Disponibilidad (D)
P1 Crítica	1 hora	N/A	99,9%
P2 Resto	4 horas	2 días	


La atención de incidencias se realizará en horario habitual de oficina 8x5

Para el cómputo de SLAs no se tendrá en cuenta el tiempo en el que la incidencia se encuentra escalada en el fabricante (N3)
Para que se cumplan los tiempos de respuesta, la comunicación de incidencias, principalmente las críticas, debe ser por teléfono.

Los niveles de servicio relacionados con la resolución de incidencias se regirán de manera exclusiva por la Disponibilidad (D) para incidencias críticas y por el Tiempo de Resolución (TS) para las incidencias no críticas.

Plazo de validez

04

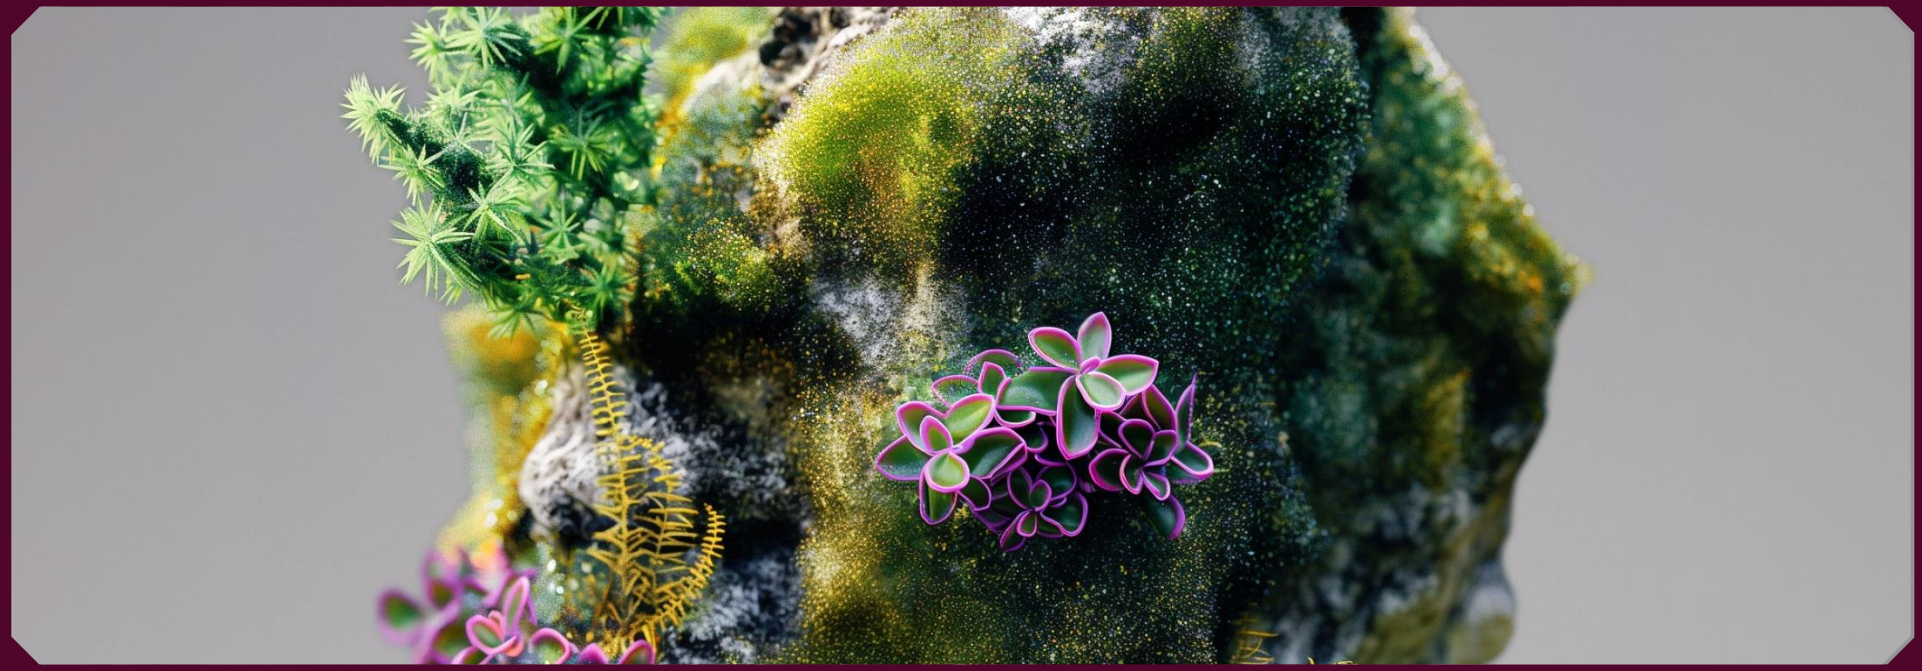

MINSAIT

De acuerdo con lo establecido en la RFQ REQ0028484 y completamente alineados con las necesidades de Línea Directa, **la oferta de Minsait tiene una validez de 120 días.**



MINSAIT

Tech for impact
