
MINSAIT | linea directa

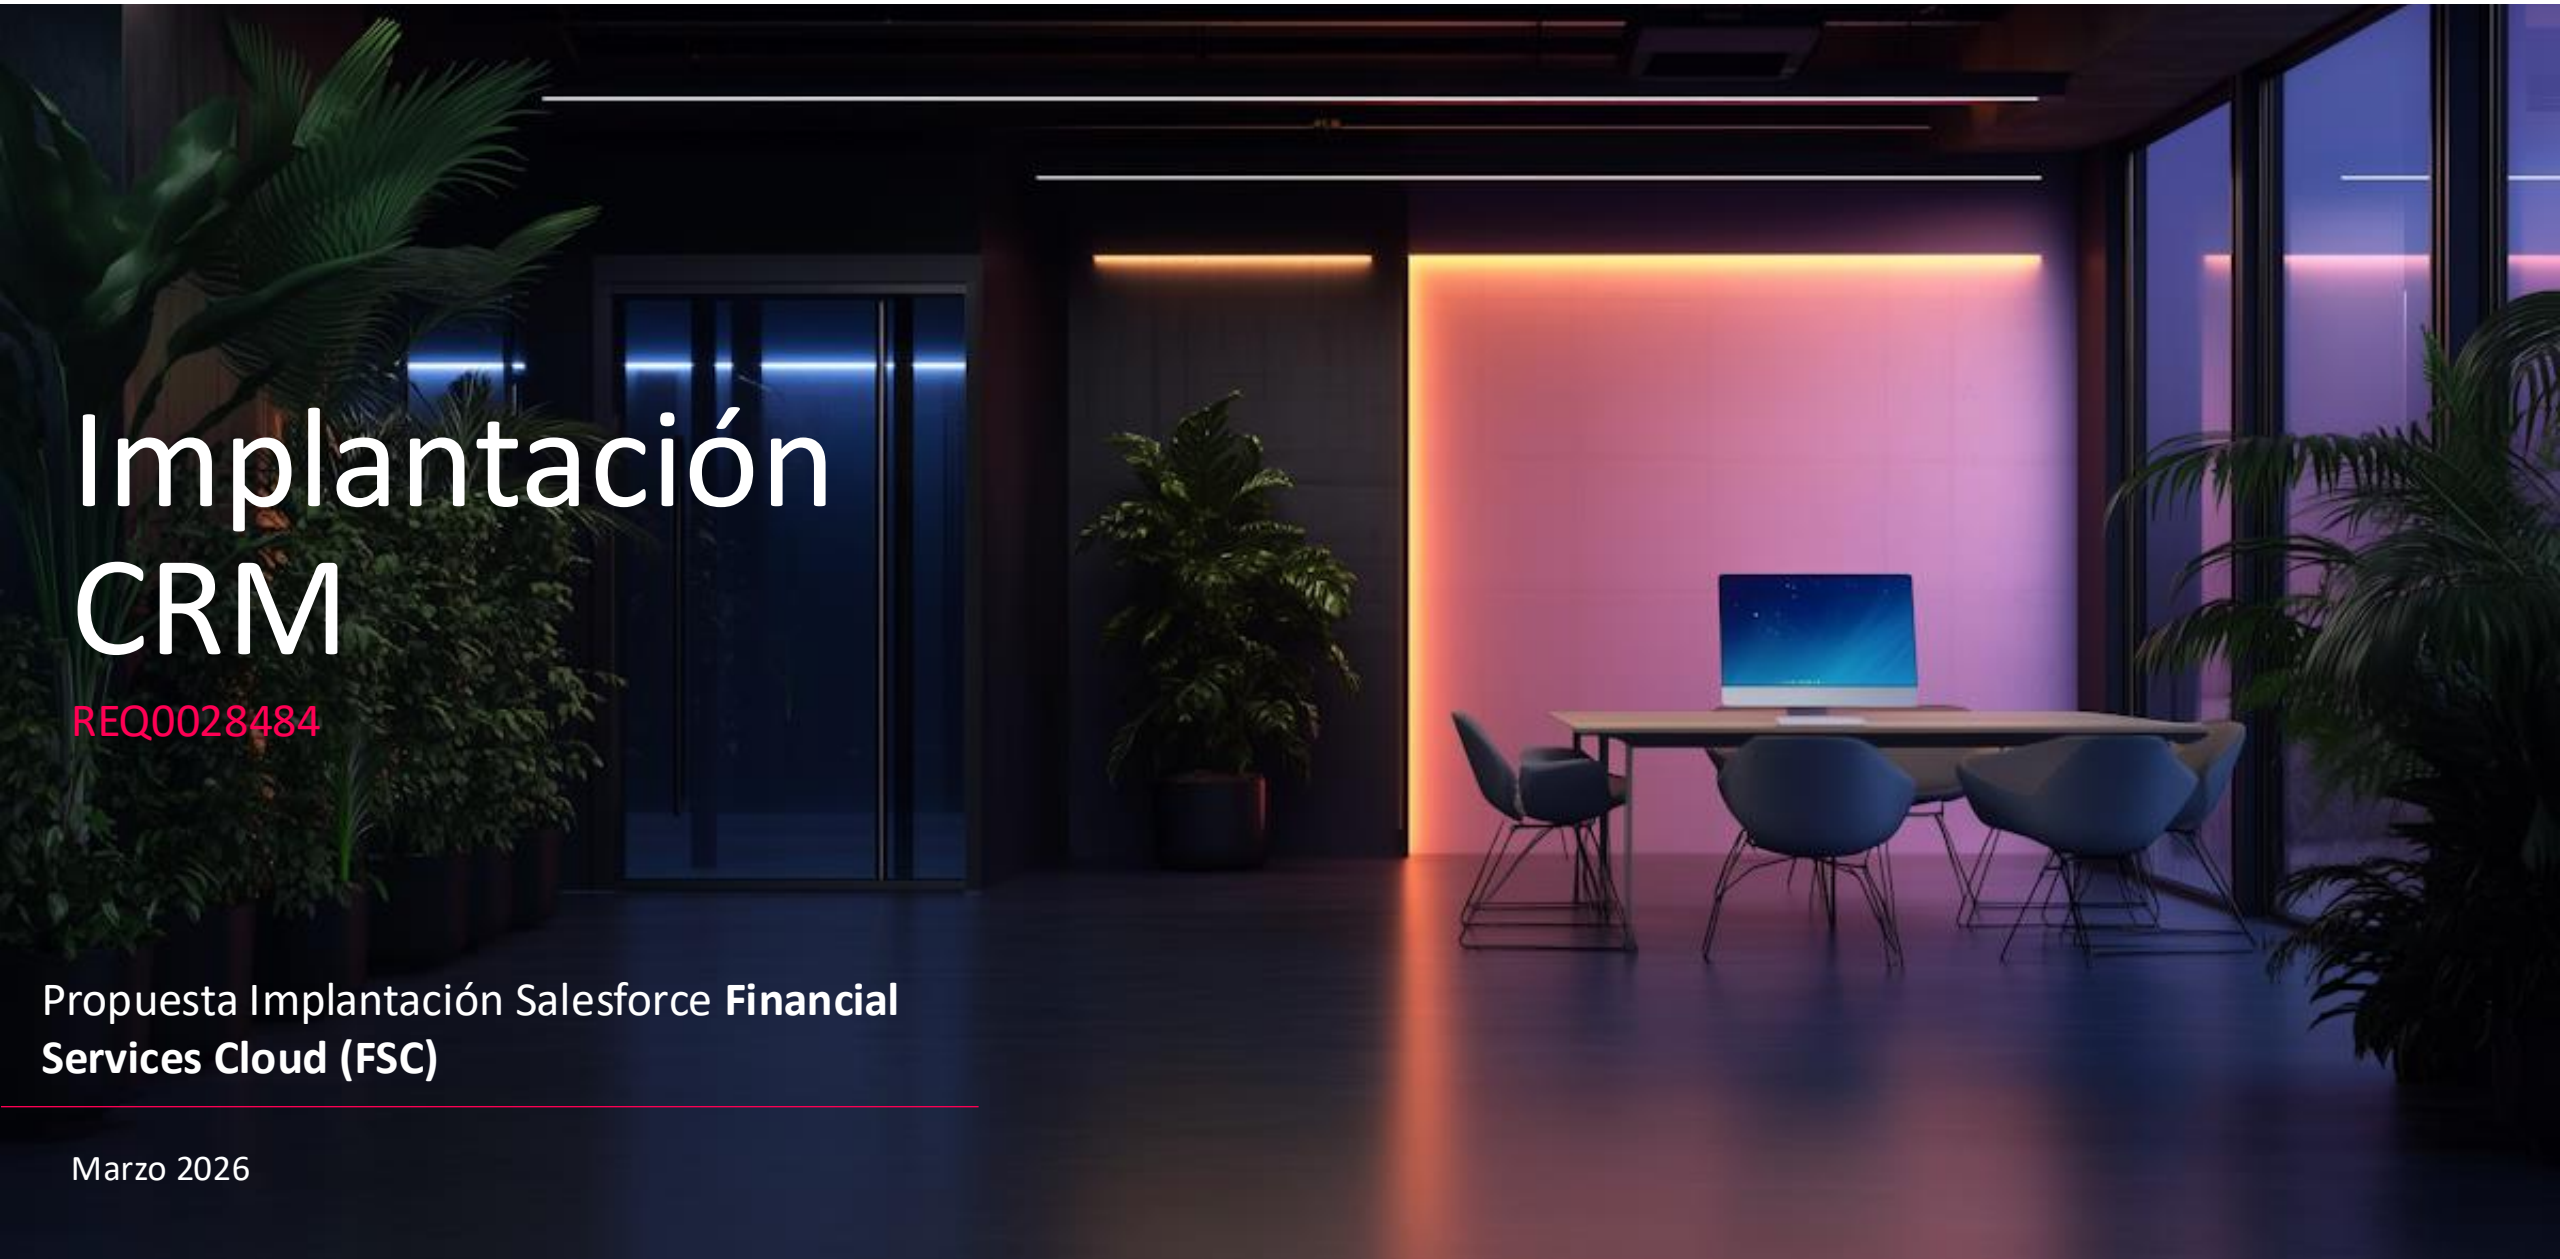

Implantación CRM

REQ0028484

Propuesta Implantación Salesforce **Financial Services Cloud (FSC)**

Marzo 2026

MINSAIT

Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partner, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el "Propósito").

La información aquí presentada es propiedad de la sociedad del grupo controlado por Indra Holding TI, S.L.U. que suscribe el presente documento (en lo sucesivo, "Minsait"), y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito de Minsait.

Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de aquellos terceros a los que Minsait haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación. Una vez finalizado o concluido el Propósito, el cliente debe restituir a Minsait toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo utilizar de ninguna manera, ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait salvo que haya sido autorizado para ello previa y expresamente por escrito por Minsait.

El destinatario de la información confidencial, después de finalizado el Propósito, no podrá utilizar de ninguna manera ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Minsait.

Copyright © 2026 Minsait. Todos los derechos reservados. España

01 Carta de presentación y compromiso

02 Resumen ejecutivo

03 Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

04 Plan de transformación

05 Propuesta técnica
- 5.1. ¿Por qué Salesforce?
- 5.2. Solución funcional
- 5.3. Solución técnica
- 5.4. Cobertura de requisitos

06 Plan de trabajo
- 6.1. Planteamiento de proyecto
- 6.2. Equipo y carga de trabajo

07 Gestión del cambio y adopción

08 Modelo operativo y de relación
- 8.1. Modelo de relación
- 8.2. Modelo de gobierno

09 Gestión de calidad, seguridad y gobierno del dato

10 Optimización de costes

11 Modelo de soporte técnico

12 Listado de entregables

13 Anexos

MINSAIT

Carta de Presentación y Compromiso

01



MINSAIT

El presente documento recoge la **Propuesta de Implantación de la solución Salesforce Financial Services Cloud (FSC)** elaborada por **Minsait**, en colaboración con **nuestro partner Nespon Solutions**, con el objetivo de dar respuesta a Línea Directa Aseguradora (en adelante, LDA) en el marco de la RFP **CRM_Implantación REQ0028484.**

La propuesta ha sido elaborada a partir de la información compartida por LDA en los diferentes documentos de la RFP, así como del conocimiento adquirido por Minsait durante el **Assessment CRM realizado a comienzos de 2025** y en el conjunto de iniciativas en las que actualmente **acompañamos a LDA como partner tecnológico de referencia.**

En este contexto, Minsait quiere poner de manifiesto su **firme compromiso con los requisitos y objetivos definidos por LDA en el proceso de licitación**, presentando una propuesta orientada a garantizar el éxito de la implantación y a maximizar el valor de la solución Salesforce FSC para el negocio.

A través de esta propuesta, Minsait pone a disposición de LDA no solo sus **capacidades tecnológicas, funcionales y de transformación**, sino también la **fortaleza de su ecosistema de partnerships estratégicos**, que nos permite complementar nuestro conocimiento con especialistas de referencia del mercado. Este modelo nos permite combinar **conocimiento sectorial, experiencia en implantaciones similares y capacidades especializadas** para ofrecer a LDA la mejor solución posible para abordar con éxito esta iniciativa.

Sea cual sea el resultado final del proceso de adjudicación, queremos **agradecer de antemano a LDA la confianza depositada en Minsait, al invitarnos a participar en esta iniciativa**, así como la oportunidad de seguir colaborando conjuntamente en la transformación tecnológica de vuestra compañía.





VALOR AÑADIDO

Customer Experience: CRM + Contact Center, el combo que dispara la experiencia de cliente

En Minsait integramos nuestras capacidades de CRM y Contact Center en un único equipo para impulsar relaciones de cliente realmente excepcionales. Esta combinación nos permite **capitalizar nuestro conocimiento de la evolución del Contact Center de LDA** en este proyecto, actuar como **interlocutor único** para asegurar la coordinación entre iniciativas y generar **sinergias naturales** en el diseño e implantación del nuevo CRM.

Nuestro equipo de Salesforce dentro de la práctica de Customer Experience reúne a **expertos que dominan la plataforma, entienden el negocio y trabajan de forma coordinada para acelerar resultados**, impulsar adopción y garantizar el éxito de cada proyecto.

+380	+650	+100
Profesionales expertos Salesforce	Certificaciones y acreditaciones	Casos de éxito/ referencias

registered ISV partner · global services agreement · SUMMIT PARTNER · PARTNER · authorized cloud reseller

SPAIN CONSULTING PARTNER RECOGNITION
New Logo Partner of the Year FY24

nespon SOLUTIONS

Perfil Corporativo

Firma global de servicios tecnológicos con presencia en **América, EMEA y Asia** . Como **Summit Partner de Salesforce** —el máximo nivel de partnership— formamos parte del grupo reducido de compañías con mayor certificación, capacidad de entrega y experiencia sectorial.

Credenciales Relevantes

+600 Certificaciones Salesforce	+100 Credenciales FSC
+10 Clientes Sector Asegurador	+50 Proyectos Internacionales
+20 países	Desde 2016
+120 sistemas legacy integrados	



Experiencia Sectorial en Seguros

Trayectoria probada en modernización de core asegurador, implementación de Insurance Cloud y lanzamiento acelerado de productos digitales:

Sura Seguros
Transformación digital y desarrollo de nuevos productos sobre arquitectura **Salesforce Insurance**

APS Bank
Implementación de **Financial Services Cloud (FSC)** para el proceso de Digital Onboarding

Banorte Seguros (México)
Prototipo productivo basado en **Financial Services Cloud (FSC)** con múltiples coberturas y APIs en 12 semanas

Global Seguros / Seguros del Estado / Andina ART
Modernización de procesos de cotización, portales y administración de pólizas

sura · BancoEstado · Andina ART · BANORTE · APS bank values you can bank on · MAS SEGUROS

Capacidades Diferenciales

- **Implementación estructural** de FSC (no adaptación genérica de CRM)
- **Arquitectura sectorial** sostenible a largo plazo
- **Integraciones complejas** (Contact Centers, motores de pricing, data platforms)
- **Eficiencia operativa** , escalabilidad y preparación para IA (Agentforce)
- **Modelo de entrega global** con gobierno robusto y metodologías ágiles

Enfoque Estratégico

Nespon no implementa únicamente una solución tecnológica

Diseña e implementa la arquitectura aseguradora

Soporta el negocio en el largo plazo

Reduce deuda técnica y acelera valor

Nespon Solutions es pionera en la implementación de IA y Agentforce y experta en la **implantación de Financial Services Cloud (FSC)**

1+1=3

… porque no siempre 1+1 suman 2

Minsait aportará su experiencia en **consultoría tecnológica**, **integración** de sistemas, **gestión de proyectos complejos** y **profundo conocimiento del entorno de LDA**, con el objetivo de garantizar una ejecución sólida del proyecto y su plena alineación con las necesidades del negocio.

Sobre esta base, complementamos nuestras capacidades con el conocimiento y la experiencia de **Nespon Solutions, una de las compañías líderes en la implantación de Salesforce Financial Services Cloud** con experiencias reales en aseguradoras.

Dos equipos con una misma visión, trabajando juntos por un objetivo común

salesforce

MINSAIT + nespon SOLUTIONS



Entendemos que la información y consideraciones incluidas en el presente documento responden adecuadamente a la solicitud de LDA. No obstante, **estamos a vuestra disposición para ampliar o aclarar aquellos aspectos que ustedes consideren convenientes** a través de la persona de contacto indicadas a continuación:



José Luis Martínez García de Lara
Móvil: **649 370 261**
Email: **jlmartinez@minsait.com**

Salvador Méndez Cortés
Móvil: **636425967**
Email: **smendez@minsait.com**

Avda. de Bruselas, 33-35
28108 – Alcobendas (MADRID)

Resumen ejecutivo

02



MINSAIT

LDA tiene como objetivo centralizar y unificar toda la información del cliente para disponer de una visión 360º, mejorar la gestión comercial y optimizar la atención al cliente…

Assessment CRM realizado por Minsait en 2025 → *Implantación nueva solución CRM que integre procesos, datos y canales* → Evolución Continua

Escenario de partida
"As-IS"

- **Dependencia de Galgo como herramienta principal**:
  - Los procesos comerciales, de gestión de cartera y de siniestros se realizan mediante operativas heterogéneas, sin contar con un modelo unificado para la relación con el cliente.
- **Falta de una plataforma que ofrezca una visión única del cliente**
- **Gestión comercial y de cartera poco optimizada** que dificulta la trazabilidad, el reporting y la coordinación entre los distintos canales.
- **Carencia de un modelo CRM formal:** la relación con el cliente se gestiona a través de múltiples sistemas, sin una visión 360º ni una gestión omnicanal integrada.



Escenario objetivo
"To-Be"

- **Visión integral del cliente como núcleo del modelo:** Implementación de un CRM que unifique toda la información del cliente, proporcionando a los agentes una perspectiva amplia y actualizada desde una única plataforma.
- **Modelo operativo basado en funcionalidades estándar del CRM** que aseguren la sostenibilidad y disminuyan la deuda técnica.
- **Integración omnicanal total**, donde el CRM actúa como el centro neurálgico para gestionar las interacciones de todos los canales, coordinando Contact Center y CRM en un esquema integrado.

…para ello, hemos construido una alianza entre Minsait y Nespon, como garantía de éxito para afrontar el reto de implantar Salesforce Financial Services Cloud (FSC)

- **Conocimiento del cliente**, gracias a nuestra participación en la evolución del **Contact Center y el Assessment** realizado en 2025
- Expertos en implantaciones de **Salesforce SFC en el sector asegurador**
- Una **alianza complementaria** que mezcla el conocimiento de LDA con la excelencia tecnológica
- Garantía de una **ejecución sana y alineada a los requisitos de LDA**

Para llevar a cabo el proyecto, sugerimos los siguientes flujos de trabajo (Workstreams)



Discovery

Nuestros equipos comenzarán por asegurar un entendimiento profundo del proyecto y sus necesidades



Implantación

Durante los siguientes meses se lleva a cabo la implantación de la solución asegurando la máxima calidad en cada fase



Post-arranque

Desde la primera puesta en producción, Minsait ofrece un periodo de post-arranque como acompañamiento a Línea Directa



Gestión del cambio

Nuestro equipo experto asegura una transmisión de conocimiento fluida diseñada para Línea Directa



Soporte

Especialistas de la solución se encargan de dar soporte a los usuarios y responder a las necesidades de LDA

Ponemos a disposición de LDA un equipo completo que nos permitirá combinar la excelencia en el ecosistema Salesforce con una sólida experiencia en el sector asegurador

Gestión

Director de proyecto

Lidera la coordinación y el gobierno del proyecto durante toda la implantación, asegurando la correcta ejecución del plan, la alineación con los objetivos de Línea Directa y la coherencia entre los distintos workstreams. Supervisa la planificación, el roadmap funcional y técnico y la gestión de dependencias entre los diferentes equipos (Salesforce, Genesys, Integraciones, Datos, QA, Canales y Change), actuando además como punto de contacto principal con el cliente. Asimismo, impulsa la gobernanza, consolida el reporting ejecutivo, prioriza el backlog y coordina a los equipos multidisciplinares bajo un modelo híbrido de trabajo, garantizando una implantación controlada, alineada y orientada a valor

Equipos por Work stream


Discovery + Definición + UX

Experto funcional Seguros + (1) Implementación + (2) Pruebas y Calidad

Asegura que los requisitos y procesos del negocio se traduzcan al modelo y capacidades de la vertical de SF.


Colaborar con el experto funcional para definir una solución que refleje fielmente la operativa y garantice consistencia con requisitos

(1) Implementación y migración de datos

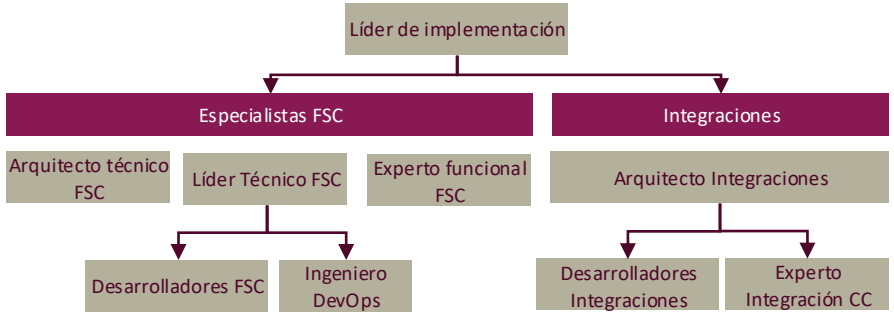


Lidera la configuración y parametrización de la solución, así como la definición y construcción de las integraciones con los sistemas externos. El equipo se organiza en dos líneas de trabajo — especialistas en FSC e integraciones — coordinadas por un jefe de proyecto y respaldadas por arquitectos técnicos y líderes especializados, garantizando coherencia técnica, alineación con el negocio y una implantación robusta adaptada al sector asegurador

(2) Pruebas y Calidad



El equipo de QA se centra en pruebas transversales, E2E y de negocio, necesarias para un proyecto con múltiples integraciones y para asegurar un UAT eficiente y sin regresiones.


Soporte post-implantación



Garantizar la continuidad operativa del servicio tras la implantación, coordinando las actividades de soporte, supervisando niveles de servicio, priorizando incidencias y asegurando una comunicación entre negocio y equipo técnico

Equipos gestión del cambio


Change management team



Lidera la gestión del cambio asociada a la implantación del CRM, coordinando las iniciativas de comunicación, formación y adopción para facilitar la transición de los usuarios al nuevo sistema. El responsable coordina y asegura la ejecución del plan, El consultor de negociodefine la estrategia de adopción alineada con los procesos y necesidades de los usuarios, mientras que el consultor de diseño transforma estos contenidos en materiales claros, visuales y estructurados que facilitan la comprensión y el aprendizaje

Con el objetivo de priorizar la adopción por parte de los usuarios, proponemos el siguiente plan de implementación gradual a lo largo de 18 meses, seguido de un periodo adicional de 12 meses de Soporte y Mantenimiento

- Planificamos **18 meses de proyecto** para completar una implementación gradual por grupos de usuarios.
- La Fase 0 para el Discovery durará 3 meses, y nos permitirá cerrar el alcance total del proyecto y sus dependencias dentro del marco temporal establecido con un acuerdo formal por parte de LDA, y al que se dará continuidad para profundizar en todo el detalle necesario en sesiones de Refinamiento durante las semanas previas al arranque de cada una de las 9 fases.

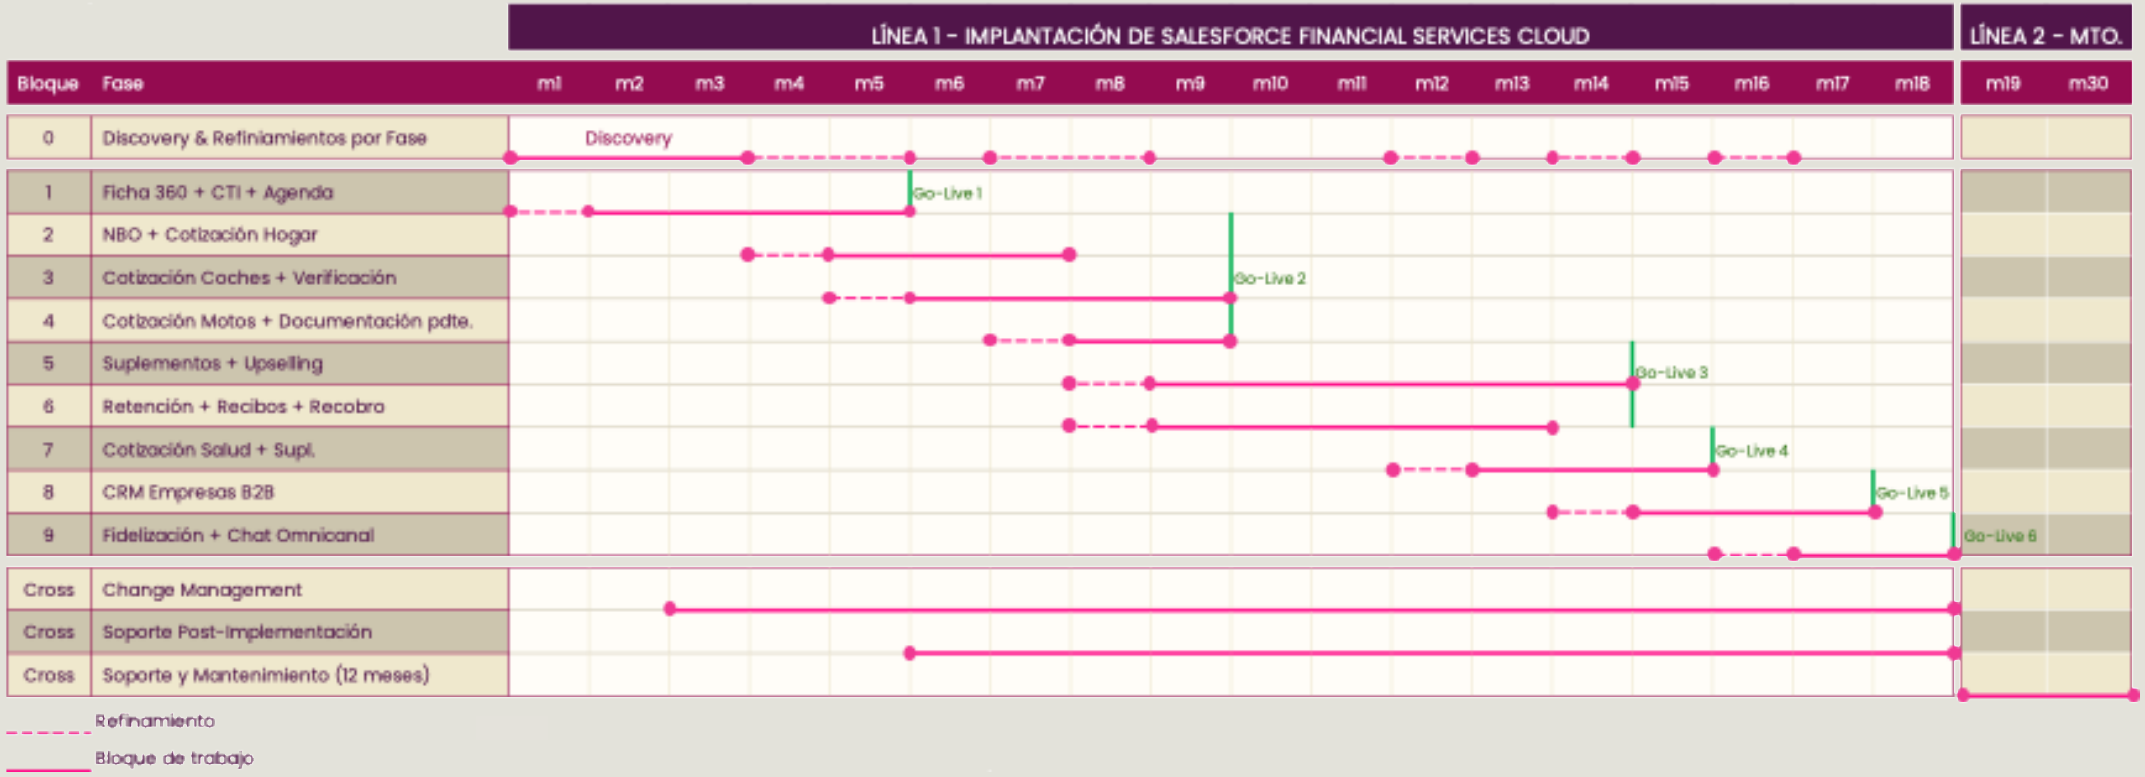

Con el alcance definido y las expectativas de LDA claramente establecidas, presentamos los factores esenciales de la propuesta de valor de Minsait que nos sitúan como el socio ideal



Factores clave Minsait

Conocimiento



Contamos con **más de 18 años de colaboración con LDA** y actualmente somos responsables de la implementación del nuevo Contact Center. Nuestra amplia experiencia, junto con el **assessment realizado en 2025**, nos brinda un **conocimiento exhaustivo del ecosistema de gestión de clientes, abarcando funcionalidades, obsolescencias y oportunidades para la evolución tecnológica**.

Equipo experto en Seguros y Salesforce

Hemos formado un **equipo mixto de consultoría empresarial especializado en el sector asegurador** y **equipo técnico con amplia experiencia en Salesforce**, apoyado por el **conocimiento en la vertical SFC del equipo de Nespon**, además de nuestra trayectoria en **proyectos destacados** a **nivel nacional** e **internacional**.

Implantación Contact Center

La **adjudicación del Contact Center** nos sitúa en una posición única para **maximizar el valor de ambos proyectos**. Esta convergencia nos permite ofrecer una **implantación más eficiente, robusta y alineada con la visión integral de transformación que Línea Directa necesita**.

Enfoque de proyecto

El enfoque de proyecto busca **minimizar riesgos, asegurar una implantación exitosa y garantizar una transición ordenada a la gestión del servicio.**
La elección de Salesforce Financial Services Cloud, nos permitirá acelerar la implementación asegurando una cobertura 100% de las necesidades de LDA.
Nuestra capacidad para diseñar soluciones escalables nos permite asegurar una transición fluida, una adopción sólida y una clara **generación de valor desde el primer día**.

Compromiso absoluto, para ofrecer a LDA resultados visibles desde el primer día



Aceleración del proyecto

- Contamos como punto de partida con una **visión amplia y completa de los procesos operativos** y los **interlocutores clave** gracias al assessment realizado en 2025
- Disponemos de un **mapa de conocimiento completo** de la gestión operativa actual

Estrategia de implantación progresiva


Nuestra propuesta se apoya en un **análisis profundo de procesos y colectivos de usuarios** para diseñar una **implantación que minimice el impacto y facilite la adopción**. Tras mapear procesos, usuarios e impactos, **estructuramos go-lives funcionales que evitan cambios simultáneos y reducen riesgos**. Sobre las fases definidas por LDA y nuestro conocimiento del negocio, **proponemos una implantación progresiva que optimiza costes, genera sinergias y garantiza una transición ordenada, eficiente y centrada en las personas**.

Transición a la gestión del servicio

El servicio tendrá una duración de 12 meses y comenzará tras el último go-live, precedido por un periodo de Post-Arranque (**hypercare**) en el que **un equipo especializado acompañará de forma intensiva a los usuarios, monitorizará la plataforma y resolverá incidencias para asegurar un arranque estable**.

Diagnóstico y entendimiento del entorno actual

03

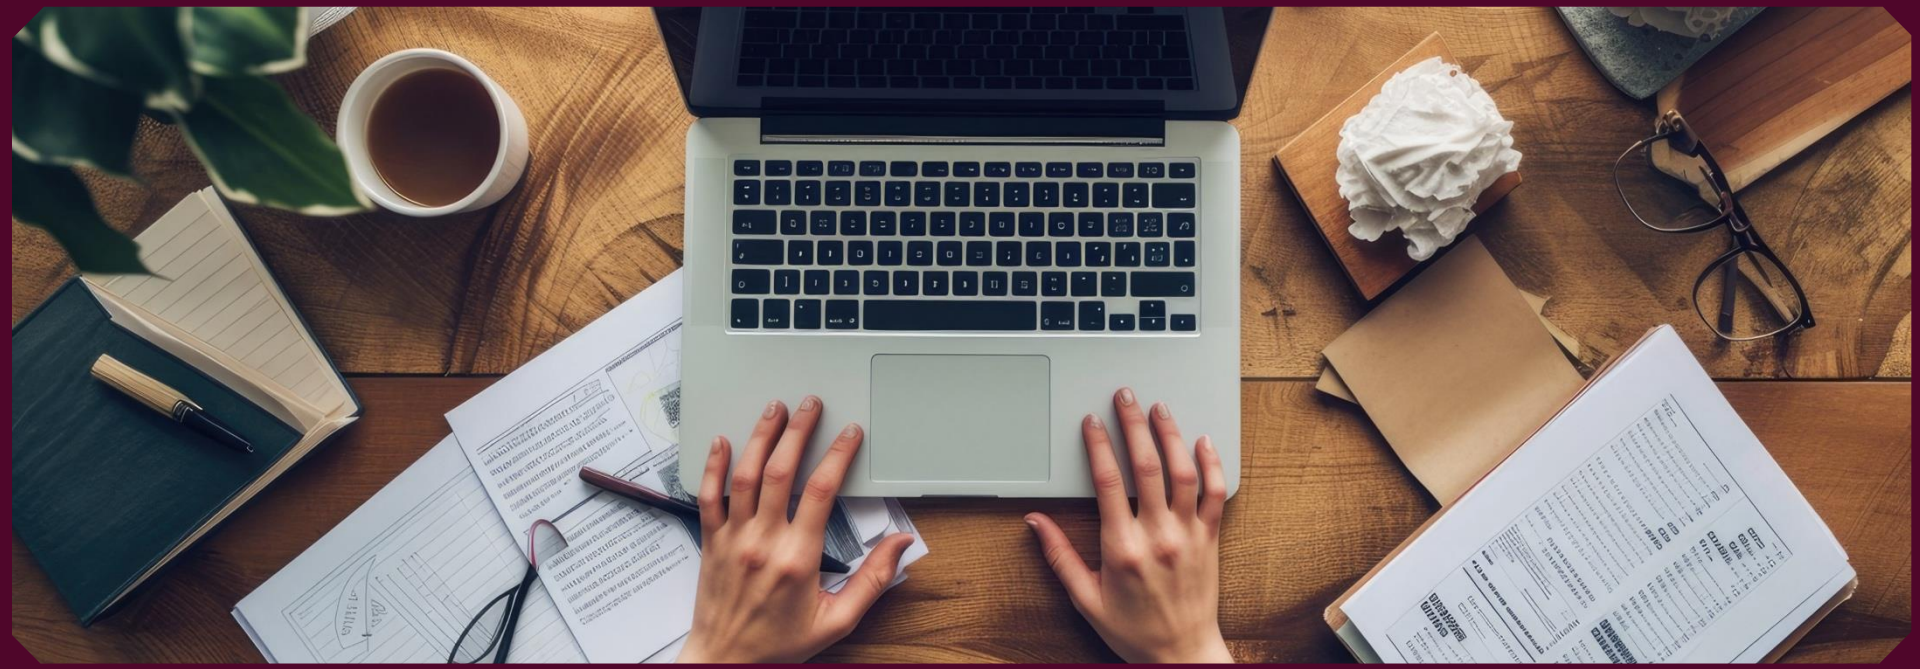

* La fuente de todo el contenido de este apartado es el assessment realizado por Minsait durante el 2025

MINSAIT

En 2025, realizamos un assessment para entender el punto de situación de LDA en cuanto a canales, modelo organizativo, operativo y tecnológico, para abordar un proyecto de implantación de CRM

VALOR AÑADIDO

Framework del levantamiento AS IS de LDA

Levantamiento de la situación actual

1. Canales y modelo organizativo

- Visión de los **canales de atención** actuales
- Entendimiento del **modelo organizativo del Contact Center** (ventas, cartera y siniestros), incluyendo el grado de participación por proveedores externos
- Identificación de **equipos que dan soporte a comercial y cartera** con la actividad de promociones

2. Modelo operativo

- Análisis de las **funcionalidades ofrecidas para la operativa** desde el Contact Center y el operacional Galgo
- Diagnóstico y visión de los diferentes **modelos de reporting**

3. Mapa de arquitectura

- Levantamiento de la **arquitectura actual**, **componentes y mapa de integraciones**
- Identificación de **proyectos en curso que pueden impactar en el CRM** y su alcance

Insights

4. Recorridos de mejora

- Identificación de los principales **aspectos a considerar y recorridos de mejora sobre** funciones clave que tiene un CRM mediante los módulos de:
  - Visión integral de cliente
  - Ventas
  - Servicio
  - Marketing

Fuente: análisis Minsait

Conocemos los canales de LDA, así como la organización del Contact Center, su modelo de proveedores y las funciones de promociones y campañas

VALOR AÑADIDO


Levantamiento de la situación actual: Canales y modelo organizativo

A Canales de venta y atención al cliente




Actualmente Línea Directa dispone de **6 canales habilitados para la venta y/o atención al cliente**: canal telefónico, web, chat, área privada, redes sociales y B2B

B Organización del Contact Center

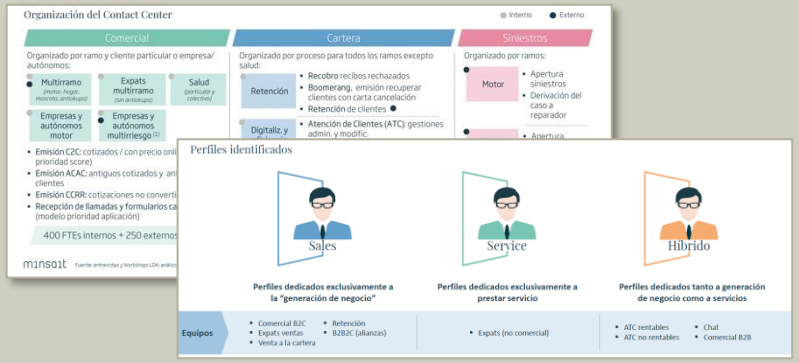


El Contact Center en LDA está **organizado en equipos de comercial, cartera y siniestros con distintos perfiles (exclusivos a comercial, exclusivos servicio e híbridos)**

C Modelo de proveedores externos

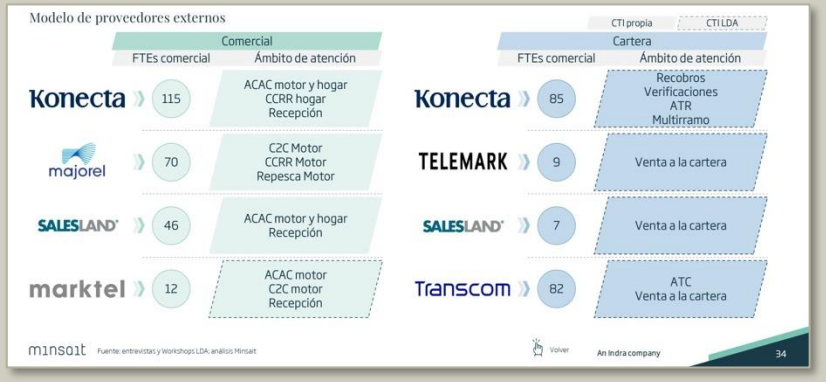

Línea Directa tiene un **modelo mixto de atención, apoyándose en varios proveedores de servicio** (1), que incluso en algún caso utilizan su propia CTI.

D Promociones y campañas

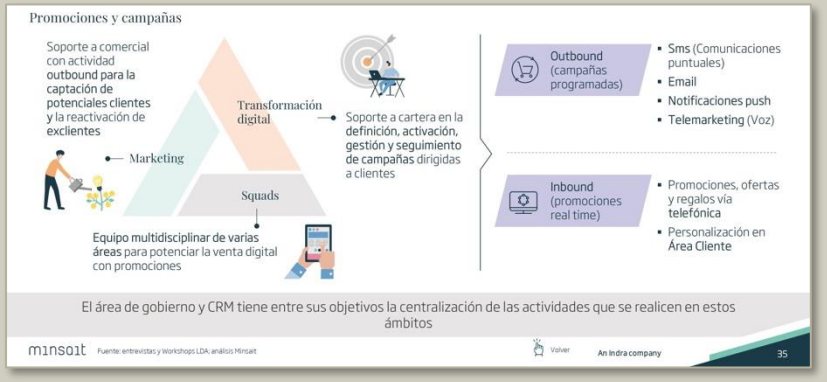

Adicionalmente, **a través de distintos equipos se da soporte a comercial y cartera con la gestión de actividades de promociones** (inbound) y campañas (outbound)

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

(1) Centrado en comercial y cartera, pero por desde otras áreas existen otros proveedores de servicio (p.e. pas, Proveedores de Mantenimientos y Asistencias de S&P, etc.)

También hemos obtenido una visión del funcionamiento del Contact Center y de las operativas que actualmente realizan los agentes a través de Galgo


Levantamiento de la situación actual: Modelo operativo

VALOR AÑADIDO

1. Visión Contact Center

GENESYS AVAYA

- A nivel operador, la **actividad se inicia con la CTI**, que muestra información de la cola y **datos del cliente si logra identificarlo en los árboles de identificación**

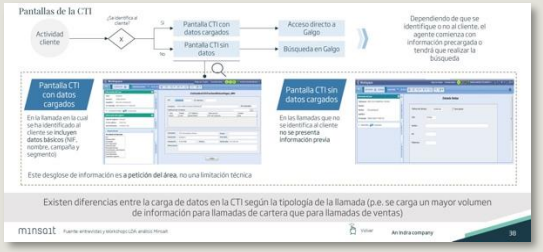

En curso evolución de su actual Contact Center multifabricante en onprem a la solución CCaaS all in one de Genesys Cloud

Operativas del agente de Contact Center

- Galgo es el principal **componente operacional e informacional** para la gestión del ciclo de vida del cliente y es **operado tanto por agentes internos y proveedores externos al ser su Back End**




2. Visión de GALGO

Además, contamos con una visión a alto nivel de la arquitectura global actual (2025) y de los principales componentes que la conforman

VALOR AÑADIDO

Levantamiento de la situación actual: Mapa de arquitectura (1/3). Arquitectura actual

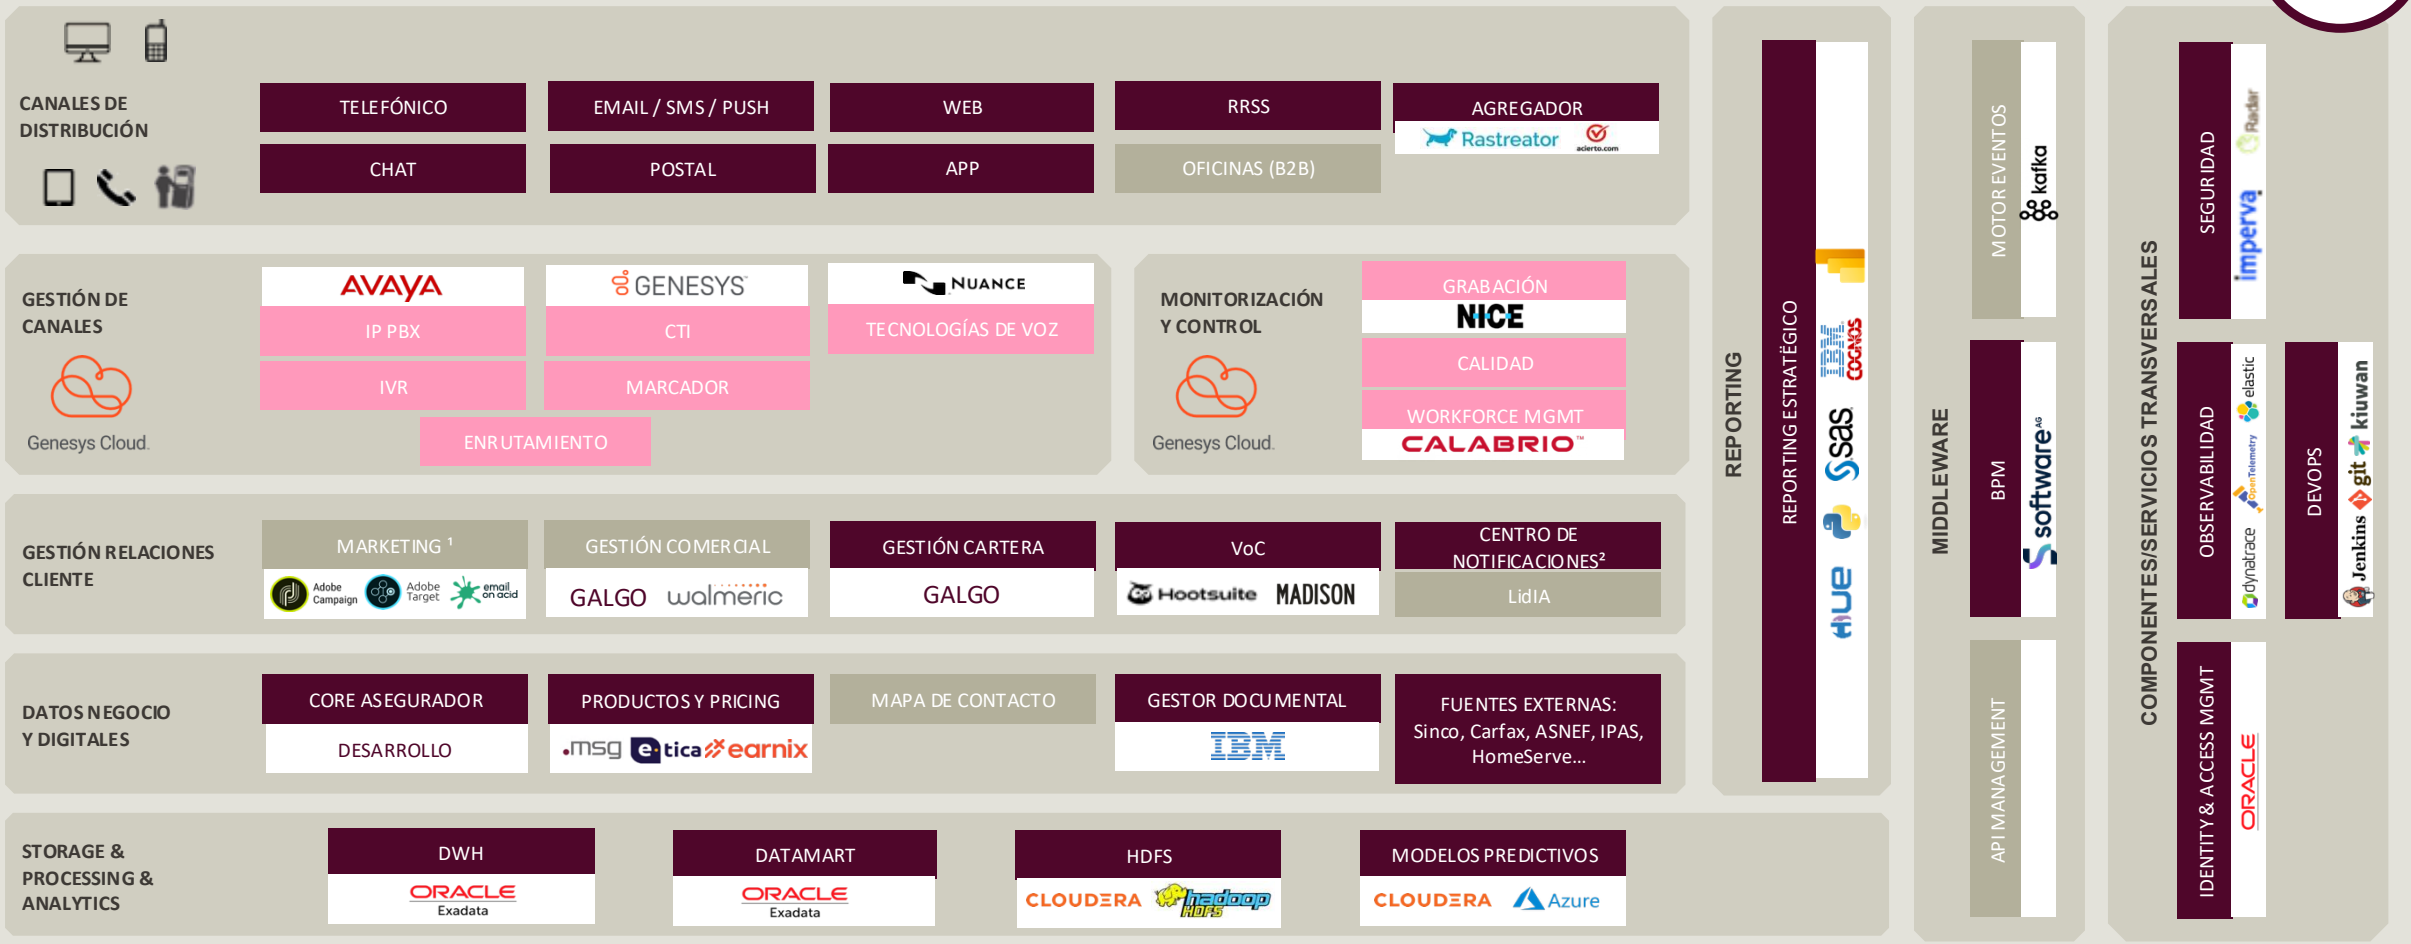

MINSAIT

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

[1] Funcionalidades de Epiphany en migración a Adobe Campaign


[2] Existen ciertas comunicaciones de Lotus Notes pendientes de migrar

Cubierto | Iniciativa en curso | Evolución a Genesys Cloud con el proyecto de CC

Hemos profundizado en el levantamiento detallado de los elementos de la arquitectura (2025), de sus relaciones e integraciones dentro del ecosistema

Levantamiento de la situación actual: Mapa de arquitectura (2/3). Mapa de integraciones

VALOR AÑADIDO

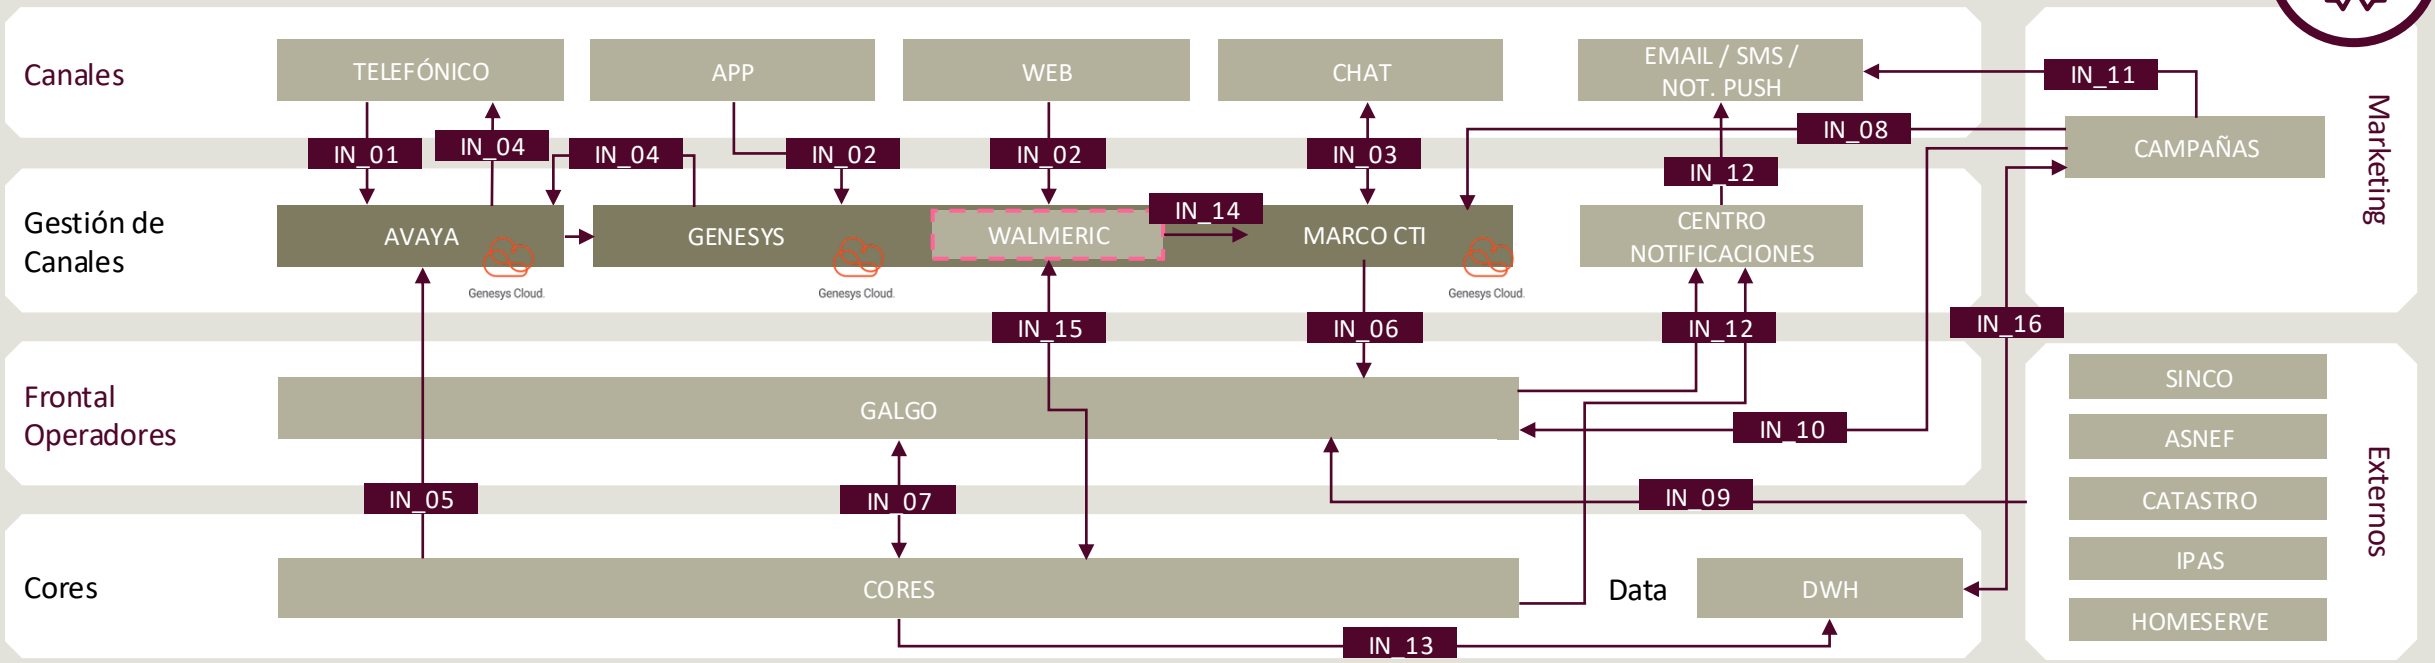

IN_01	Llamadas inbound a gestionar a través de Avaya
IN_02	Click2call/call me back
IN_03	Interacción por chat a través de Genesys
IN_04	Llamadas outbound/call me back
IN_05	Captura de datos core para mostrar en Marco CTI
IN_06	Apertura de Galgo desde Marco CTI
IN_07	Lectura/Escritura datos de cliente
IN_08	Cargas campañas outbound
IN_09	Información externa relevante
IN_10	Promociones Real Time
IN_11	Campañas outbound canales digitales
IN_12	Notificaciones email, sms y push
IN_13	Datawarehouse
IN_14	Huella Digital
IN_15	Nurturing y datos lead
IN_16	Segmentación y explotación datos

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

Nota: solo se consideran las integraciones con impacto directo en CRM

Y en este contexto también se identificaron varios proyectos en curso (2025) que podrían tener impacto en el CRM y en la definición de su alcance

VALOR AÑADIDO

Levantamiento de la situación actual: Mapa de arquitectura (3/3). Otros proyectos relacionados

Proyecto	*Alcance*	*Posible impacto*
Walmeric: Gestión de Leads	Implantación de **Walmeric para Gestión de Leads en busca de una mejora de la conversión de leads digitales**. Incluye trazabilidad E2E de leads, subida resultados a plataformas de cálculo inversión para mejor conversión, captura de huella digital y modelo de priorización de leads para llamadas de inbound y call me back en base a score	• Definir funciones claras entre Walmeric y el CRM, evitando **solapamiento funcional** con módulos de lead management del CRM • El término *lead* pasará a denominar cualquier persona que interactúe con LDA, independientemente de los datos de contacto. Decidir dónde se hace mapeo ID Lead con ID Persona.
Mapa de contactos (Proyecto Cartera 2025)	El proyecto Cartera 2025 incluye un **proyecto de comunicaciones** dedicado a unificar todas las necesidades de comunicaciones, incluyendo la creación de un Mapa de Contactos	• Impacto directo al definir la **estructura de contactos**. Se debe asegurar la integración y la definición del **maestro del dato** • Decisión de qué contactos han de **mostrarse como parte de la visión 360º** • Decisión de si las comunicaciones **CRM salen de Centro Notificac.**
Migración de Epiphany a Adobe Campaign	Proyecto de **transición y migración de las funcionalidades de Epiphany a Adobe Campaign**	• Necesario evaluar la **integración** CRM - Adobe Campaign (analizar si es necesario integración temporal con Epiphany) • Se deben evitar **solapamientos y redundancias funcionales** • Se debe definir el sistema **Maestro de los datos** (campañas)
Implantación de CDP	Proyecto de selección e implantación de un repositorio centralizado de información de cliente para **una visión 360º tanto de clientes existentes como para clientes existentes como para leads**	• Se debe definir el rol de cada uno de los sistemas evitando el **solapamiento funcional**. • Se debe evaluar la **integración** entre ambos sistemas (perfil 360º, segmentación, scorings, cross-sellings, personalizaciones) y el **maestro de los datos** comunes
Evolución de la plataforma Contact Center	Proyecto de **evolución y modernización de la arquitectura Contact Center on premise actual** (Avaya/Genesys/Nuance/Nice/Calabrio) **a la solución All In One de Genesys Cloud, donde Minsait es el partner que acompaña a LDA desde enero 2026**	• Se debe asegurar la **Integración** CC Cloud – CRM y habilitación de Conector CC-CRM. • Se ha de revisar **los flujos de trabajo en la solución migrada** y cómo impactan al CRM
Evolución de la tecnología de frontales	Proyecto en curso de migración de los frontales a una tecnología más moderna (React)	• Para funcionalidad modelada en CRM el impacto debería ser nulo siempre y cuando no se modifiquen las APIs • Para funcionalidad webview/iframes, se debe valorar la compatibilidad

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

Nota: solo se consideran las integraciones con impacto directo en CRM

Y finalmente, con todo ello se identificaron potenciales recorridos de mejora que deberían evolucionarse…

VALOR AÑADIDO

No exhaustivo

Insights: Recorridos de mejora (1/2)

Visión integral de cliente

- **El operador no tiene visibilidad de las interacciones que ha tenido con el cliente previamente** ni del resultado que le ha dado el operador anterior
- **Ausencia** de **visión 360 de cliente**
- Necesidad de alineamiento con el proyecto de **mapa de contactos**

Galgo + plat. terceros

walmeric

- **Convivencia entre CRM y** la plataforma de **Walmeric** en gestión de leads
- **Agenda básica y "simple"** (operador gestiona tareas autogeneradas, asegurando ejecución según horario manualmente definido)
- Utilización de **informes manuales** en sala

Ventas

- Necesidad de alineamiento con la evolución de CC a **solución Cloud**
- No **recogida de información extra** (p.e. datos de pólizas en la competencia)
- **Poner en valor** a la compañía **en renovación** y falta inteligencia de **históricos de retención**

Servicio

- Ausencia de **hitos** que guíen la actividad del operador

Marketing

Adobe Campaign

- Ausencia de **solución específica para la gestión E2E del flujo de campañas** (aprobación, calendario, seguimiento, repositorio, etc.)
- Falta de uniformidad entre equipos en la gestión de campañas con **necesidad de Gobierno unificado**: metodologías, priorización, herramientas, procesos, métricas, etc.
- **Modelo de datos no unificado** y grandes desarrollos para incluir nuevas variables

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

Nota: solo se consideran las integraciones con impacto directo en CRM

… mediante la implantación de un CRM que aporta una serie de funcionalidades diferenciales para el desarrollo de las actividades del negocio

Insights: Recorridos de mejora (2/2)

No exhaustivo

VALOR AÑADIDO

Se identifican las siguientes áreas en las cuales se produce el mayor aporte de valor por parte del CRM a LDA

- Visión 360
- Agenda comercial
- Gestión de leads
- Gestión de oportunidades y pipeline
- Planificación de ventas
- Optimización de la venta
- Reporting
- Argumentarios
- Transcripciones

Impacto directo en ventas

Impacto transversal (ventas y servicio)

Fuente: entrevistas y Workshops LDA; análisis Minsait

Nota: solo se consideran las integraciones con impacto directo en CRM

Plan de transformación

04



* La fuente de todo el contenido de este apartado es el pliego de petición de oferta (RFQ): PMO Programa Transformación Tecnológica 2026-2028 de Enero 2026

MINSAIT

Para articular la evolución de las capacidades tecnológicas, LDA ha lanzado su Plan de Transformación TI 2026-2028, basado en tres pilares…

Contexto en LDA

- Línea Directa Aseguradora dispone de aplicaciones con amplia cobertura funcional, aunque también de un entorno con limitaciones estructurales y operativas (deuda técnica, formas de trabajar tradicionales, etc.)
- Estas limitaciones frenan la agilidad y su capacidad de respuesta ante la transformación acelerada del negocio

Plan de transformación tecnológica 2026-2028 de LDA

Pilares

1	La modernización de las plataformas
2	La reorganización del talento y de las formas de trabajar
3	La adopción masiva de Inteligencia Artificial

Impactos esperados

Agilidad	Reducción drástica del Time-to-Value para necesidades de negocio
Eficiencia	Permitir escalar el negocio mediante la simplificación tecnológica, la automatización y la IA
Experiencia	Hiper-personalización y omnicanalidad para el cliente
Inteligencia	Toma de decisiones basada en datos en tiempo real


… y se despliega con proyectos transformadores, habilitadores y de resiliencia, siendo la implantación del CRM una de las iniciativas transformadoras clave

Tipología de proyectos del Plan de transformación

Proyectos transformadores	• Nuevo centro de interacción y experiencia de cliente (CXaaS) • Gobierno de datos y analítica • CRM	**Alta involucración de equipos transversales (negocio, TI, etc.)**
Proyectos habilitadores	• Gobierno Cloud e IA • Automatización del ciclo de vida de software • Renovación Tecnológica • Nueva arquitectura de aplicaciones distribuida • Inteligencia y minería de procesos	**Proyectos eminentemente tecnológicos, con involucración principalmente de equipos de TI**
Proyectos de resiliencia	• Plan de ciberseguridad (En fase de consolidación)	

Propuesta técnica

05

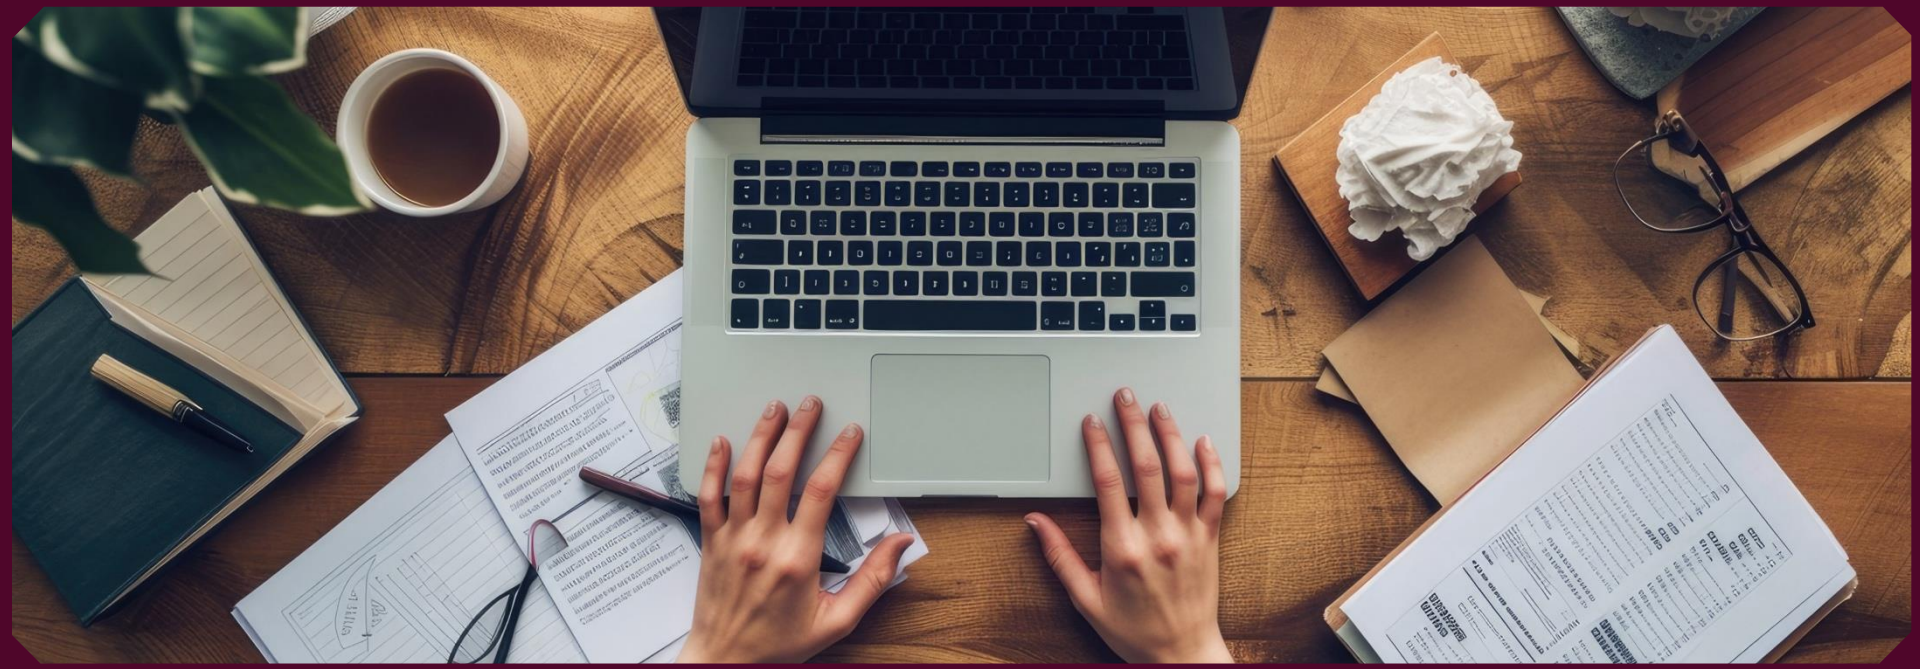

MINSAIT

¿Por qué Salesforce?

5.1

MINSAIT

La apuesta por incorporar soluciones CRM en el sector asegurador está impulsando una visión cliente más completa y generando impactos positivos en múltiplos ámbitos…

Automatiza acciones y procedimientos

- **Mejora de la eficiencia y fiabilidad** de envío de comunicaciones
- **Elimina tareas manuales** de poco valor añadido
- **Estandariza métodos y formas de comunicación**, mejorando la calidad del proceso

Incrementa la rentabilidad

- **Reduce el coste de envío de comunicaciones** (reduce medios físicos)
- **Aplica el conocimiento disponible del cliente** en generar nuevas ventas
- **Contribuye a la captación** de leads y prospects

Mejora la satisfacción de cliente

- Permite una **mayor personalización** de la comunicación
- **Incrementa el impacto** de las comunicaciones
- **Favorece la vinculación** del cliente con la compañía
- **Involucra al cliente** en diferentes etapas de su ciclo de vida

Apoya la estrategia de negocio

- Actúa como **palanca clave** para aplicar la **estrategia de negocio** con clientes
- Sitúa a los clientes dentro de su **ciclo de vida** y permite **ejecutar acciones** afines a su estado y situación

Maximiza las ventas

- Dota de **herramientas de utilidad para las fuerzas de venta**
- Simplifica el trabajo y **ayuda en la labor comercial**

Aumenta la eficiencia

- **Optimiza el proceso**
- **Reduce costes** y **minimiza los tiempos desde la contratación hasta el alta**, reduciendo errores

…impactos que se potencian gracias al apoyo de una Plataforma específicamente desarrollada pa sector asegurador

Solución Vertical Especializada

Financial Services Cloud **no es un CRM generalista** configurado para seguros. Es una solución vertical diseñada específicamente para la industria financiera y aseguradora, construida sobre décadas de mejores prácticas globales y evolución sectorial.

Beneficios para Línea Directa

- Adoptar una **arquitectura probada** en aseguradoras líderes globalmente
- **Reducir drásticamente** desarrollos personalizados estructurales
- **Acelerar la transformación digital** con implementación ágil
- **Evitar deuda técnica futura** con arquitectura escalable
- **Incorporar innovación continua** sin re-implementaciones costosas

Evolución de la Arquitectura

Arquitectura Fragmentada

Múltiples sistemas desconectados, datos aislados, procesos manuales, alta complejidad de integración

Plataforma Unificada FSC

Sistema único integrado, Customer 360 real, procesos automatizados, arquitectura escalable

FSC permite a Línea Directa evolucionar de una arquitectura fragmentada hacia una plataforma unificada, inteligente y escalable.

Que proporciona una Visión Integral que Transforma la Relación con el Cliente

Vista Unificada y Contextual

Financial Services Cloud proporciona una **vista unificada y contextual del asegurado**, consolidando en una sola pantalla toda la información relevante:


- Pólizas activas y vencidas
- Coberturas contratadas
- Historial de siniestros
- Pagos realizados y pendientes
- Interacciones multicanal
- Relaciones familiares y empresariales
- Indicadores de rentabilidad y riesgo

Impacto Directo en el Negocio

- ↓ Reducción de tiempos de atención
- ↑ Incremento de satisfacción del cliente
- ↑ Mejora en retención
- ↑ Mayor cross-sell y up-sell

Modelo de Relaciones Avanzado

FSC permite **modelar la realidad relacional del cliente asegurado**, no solo una póliza aislada:

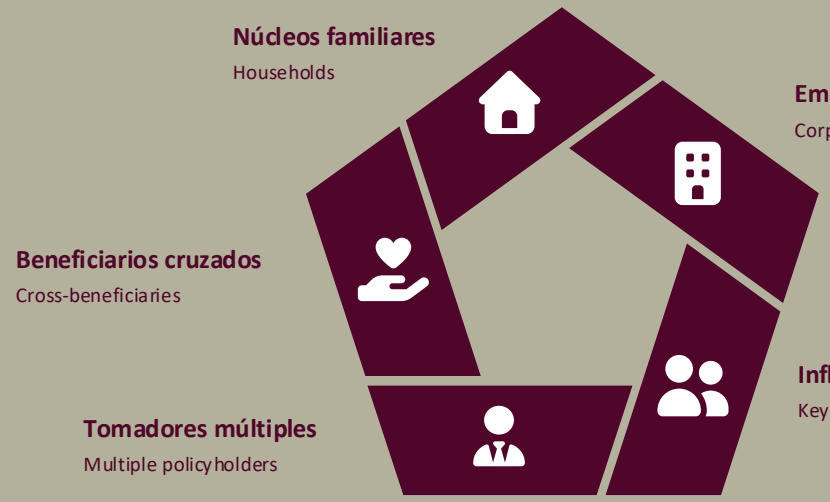

Visión estratégica de cartera, exposición y oportunidades comerciales.

En Minsait, confiamos en FSC como motor de crecimiento, logrando una mayor conversión, reducción de cancelaciones y una eficiencia operativa superior, lo que se traduce en un retorno de inversión superior a 3,5× en el tercer año.

Tasa de conversión

+12%

+756.000€/año*

Porcentaje de cotizaciones que se convierten en póliza

NBA, argumentario inteligente y proceso de cotización guiado eliminan fricciones y orientan al agente en cada paso.

2.160 pólizas nuevas/año

Cancelaciones voluntarias

-15%

+456.000€/año*

Pólizas que el cliente decide no renovar o dar de baja

Ficha de retención con índice de fuga, argumentario y proceso guiado de negociación con condiciones especiales

1.200 pólizas retenidas/año

AHT (Average Handle Time)

-25%

+640.000€/año*

Tiempo medio de gestión por llamada: conversación + registro post-llamado

Screen-pop automático elimina la búsqueda manual; registro post-llamada automático al colgar elimina el wrap-up manual

1.600h liberadas/día → 40 FTE redirigidos

Cobro en primer intento

+20%

+4,3M€/año*

% de recibos impagados recuperados en el primer contacto de recobro

Gestión unificada de impagados con datos actualizados, comunicaciones por CDN y priorización automática por valor y antigüedad

+360.000€/mes recuperados

*Cálculos aproximados realizado para LDA teniendo en cuenta experiencias pasadas en proyectos de implantación de Salesforce FSC en el sector Asegurador.

Por todas estas razones, en Minsait consideramos que Salesforce Financial Cloud representa la opción más adecuada para Línea Directa.

- Responde eficazmente a los requisitos funcionales clave del negocio, alcanzando un **90% de cumplimiento funcional**.
- Es la única plataforma que integra un **modelo asegurador nativo** completamente alineado con las necesidades de LDA.
- Brinda la mayor compatibilidad técnica y **reduce significativamente los riesgos de integración**, además de contar con conectores nativos para Genesys y Adobe.
- Proporciona una capacidad destacada para la **innovación continua**, respaldada por tres actualizaciones anuales que incorporan cientos de mejoras, superando a otras soluciones del mercado y avanzando constantemente dentro del sector asegurador.
- Permite el **modelado de procesos guiados** mediante el motor OmniStudio integrado en FSC, facilitando la configuración a través de componentes declarativos.
- Incluye **funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial** y habilita una verdadera omnicanalidad.
- Presenta una **experiencia de usuario optimizada desde el inicio**, con interfaces funcionales ya existentes y probadas en producción, diseñadas específicamente para los flujos de trabajo de agentes en seguros y servicios financieros, eliminando la necesidad de wireframes o prototipos en Figma.
- Facilita el **cumplimiento de normativas relevantes** como ISO 27001, GDPR y DORA.

MINSAIT

El corazón del ecosistema digital

- MuleSoft actúa como el **motor de todas las conexiones**: orquesta datos, automatiza procesos y permite construir experiencias digitales conectadas
- **Centraliza** la gobernanza y observabilidad de todas las integraciones en un solo lugar, evitando silos, integraciones frágiles y duplicidad de esfuerzos

MuleSoft

salesforce PARTNER

MuleSoft Partner

Integration Platform as a Service (iPaaS)



API Management




9

Años líder Gartner & Forrester

MuleSoft es el **único producto que aparece como Líder en Gartner para dos áreas bajo la misma solución**

- Líder en Integración iPaaS
- Líder en Gestión de API

Mulesoft reduce los riesgos de ciberataques y mejora la seguridad del dato



Gestión centralizada del dato

La integración centraliza datos de múltiples fuentes, mejorando la monitorización, gestión y seguridad al eliminar silos y reducir riesgos de violaciones



Mejora los Protocolos de Seguridad

Los sistemas integrados aplican de forma uniforme funciones avanzadas de seguridad y control de acceso, como cifrado y autenticación, reduciendo así las vulnerabilidades



Cumplimiento constante

La integración asegura que todo el sistema siga los mismos estándares de seguridad y cumplimiento, reduciendo el riesgo de incumplimientos accidentales e infracciones



Sistema de Alertado y Monitoreo a Tiempo Real

Los sistemas integrados ofrecen monitoreo en tiempo real y alertas automáticas, facilitando la detección y respuesta rápida ante amenazas



Reduce errores humanos

Los sistemas integrados ofrecen monitoreo en tiempo real y alertas automáticas, facilitando la detección y respuesta rápida ante amenazas

Por todas estas razones, en Minsait consideramos que Mulesoft representa la mejor alternativa de integración para Línea Directa.


- **Satisface plenamente los requisitos funcionales del modelo de Integración definido para LDA**, incluyendo observabilidad, gobierno, seguridad, capacidades event-driven y procesos de reconciliación.
- **Centraliza y unifica la conectividad entre el Core, el CRM y los sistemas satélite**, eliminando integraciones ad-hoc y garantizando un ecosistema coherente y sostenible.
- **Acelera la entrega, reduce la deuda técnica y habilita la construcción de una plataforma de integración corporativa estándar** y escalable.
- **Refuerza la seguridad, el cumplimiento normativo y la resiliencia**, elementos críticos en el sector asegurador.
- **Prepara a la organización para el futuro**, integrando IA, agentes inteligentes, automatización avanzada y experiencias omnicanal.
- **Se apoya en una tecnología ampliamente contrastada** en organizaciones con arquitecturas complejas y reguladas similares a LDA.
- Proporciona **conectividad nativa** a través de un conector estándar con Salesforce facilitando la integración.
- Facilita el **gobierno de las APIs** mediante la gestión del ciclo de vida unificado

MINSAIT

PLATAFORMA CONFLUENT

La plataforma de event streaming permite desacoplar productores y consumidores de información, facilitando la integración entre aplicaciones, sistemas core y servicios externos.

- **Los datos se publican como eventos en tiempo real**, lo que permite que múltiples aplicaciones los consuman simultáneamente sin dependencias directas entre sistemas.
- **Este enfoque habilita un ecosistema de aplicaciones más flexible y escalable**, donde nuevas capacidades pueden añadirse reutilizando los eventos existentes.
- **El resultado es un efecto de red**: a medida que se incorporan nuevas fuentes de datos y nuevos consumidores, el valor de la plataforma aumenta y se acelera la innovación.
- La plataforma de event streaming facilitará la integración en tiempo real y desacoplada del core asegurador Galgo con el CRM y otros sistemas corporativos.

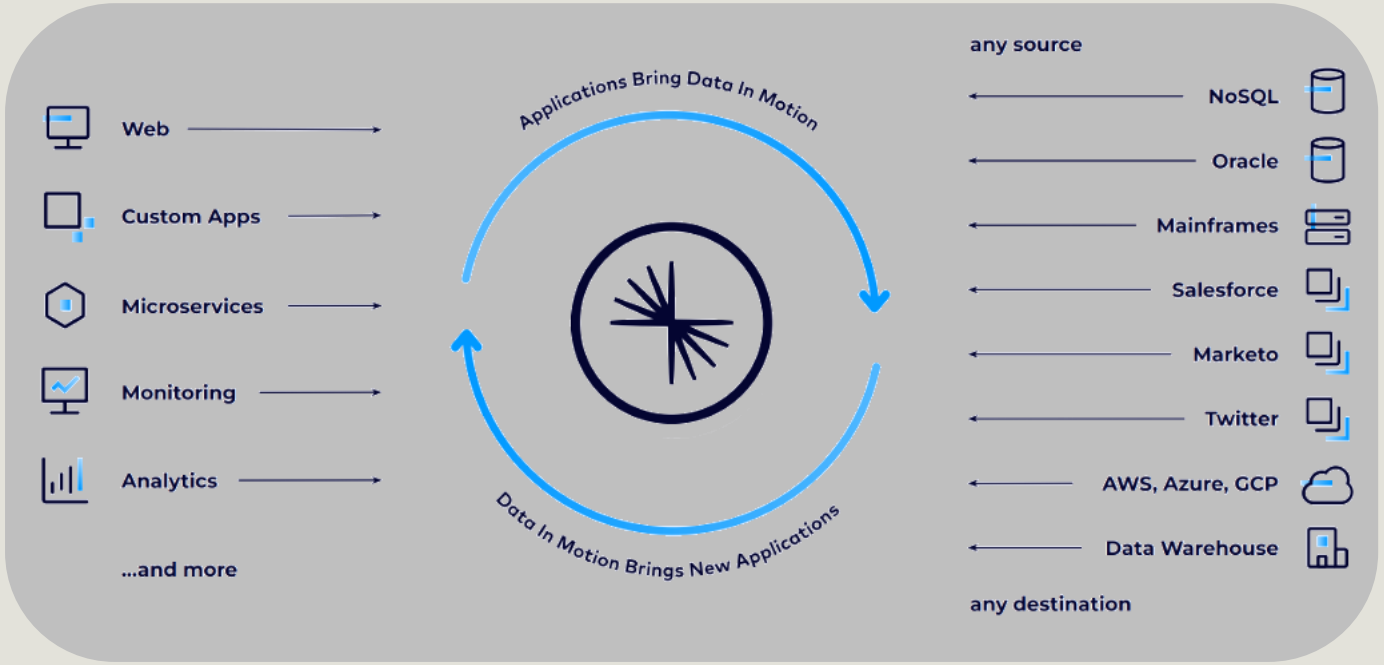


Dado que el proyecto contempla la implantación de una plataforma de event streaming basada en Apache Kafka, ***Minsait recomienda la adopción de Confluent***

Solución funcional

5.2

MINSAIT

Flujo End-To-End de Gestión del Cliente



Procesos CRM que soportan cada etapa del ciclo de vida

Identificación y gestión del cliente	Permite **identificar al cliente** y acceder a su **ficha cliente 360**, donde se centraliza la información básica, las **interacciones** y los **medios de contacto**. Desde este punto se gestionan las comunicaciones con el cliente, incluyendo **chat**, llamadas y actividades comerciales.
Proceso de cotización	Gestiona la **creación de oportunidades y cotizaciones**, recogiendo la información necesaria para elaborar la propuesta comercial. Incluye procesos de **verificación** del riesgo y gestión de **documentación pendiente** hasta completar la contratación.
Gestión del contrato	Permite gestionar el ciclo de vida de la póliza una vez emitida, incluyendo modificaciones mediante **suplementos** y procesos de **cancelación o precancelación (PNC)**, manteniendo trazabilidad de los cambios realizados sobre el contrato.
Gestión financiera	Proporciona visibilidad sobre la situación económica de la póliza mediante la consulta de **recibos y pagos**. En caso de incidencias de cobro, se gestionan procesos de **recobro** para el seguimiento y regularización de los importes pendientes.
Crecimiento y fidelización	Permite desarrollar la relación con el cliente a lo largo del tiempo mediante **recomendaciones de upselling y cross-selling**, así como acciones de **retención** y **fidelización** orientadas a aumentar el valor y la permanencia del cliente.

Fases y procesos funcionales propuestos

VALOR AÑADIDO

- Fase 1: Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)
- Fase 2: NBO + Cotización Hogar
- Fase 3: Cotización Coches + Verificación
- Fase 4: Cotización Motos – Documentación pdte.
- Fase 5: Suplementos + Upselling
- Fase 6: Retención + Recibos + Recobros
- Fase 7: Cotización Salud + Supl.
- Fase 8: CRM Empresas B2B
- Fase 9: Fidelización + Chat Omnicanal

Fases de implantación:

Se mantienen las **9 fases propuestas por LDA**, respetando las mismas líneas de trabajo y agrupación funcional definidas en el planteamiento inicial.

No obstante, con el objetivo de **minimizar el impacto en los usuarios, facilitar la adopción progresiva de la solución y optimizar el esfuerzo operativo y los costes de despliegue**, la implantación se organizará en **6 Go-Lives progresivos**, agrupando determinadas fases funcionales.

De este modo, cada Go-Live incorporará un conjunto coherente de capacidades que permitirá **poner en producción funcionalidades completas y operativas**, manteniendo la continuidad del servicio y asegurando una transición controlada para los equipos de negocio.

A grandes rasgos, las fases cubren la evolución progresiva del CRM desde las capacidades básicas de **identificación de cliente, atención telefónica y gestión comercial**, hasta funcionalidades más avanzadas como **cotización multirramo, gestión de cartera, operaciones post-venta, fidelización, omnicanalidad y gestión del segmento B2B**.

El detalle de la **planificación y agrupación de estas fases** se describe en la sección de planificación del proyecto.

Fases y procesos funcionales propuestos

- Fase 1: Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)
- Fase 2: NBO + Cotización Hogar
- Fase 3: Cotización Coches + Verificación
- Fase 4: Cotización Motos – Documentación pdte.
- Fase 5: Suplementos + Upselling
- Fase 6: Retención + Recibos + Recobros
- Fase 7: Cotización Salud + Supl.
- Fase 8: CRM Empresas B2B
- Fase 9: Fidelización + Chat Omnicanal

Integración telefónica, Ficha Cliente 360 y Agenda

La Fase 1 constituye el primer hito operativo del CRM y el primer entorno de trabajo para los agentes. En esta fase se habilita la **identificación automática del cliente durante la llamada**, el acceso a una **ficha cliente 360 con visión consolidada** y la **gestión de agenda y actividades comerciales** desde una única plataforma. El objetivo es mejorar la eficiencia en la atención telefónica y proporcionar al agente toda la información necesaria durante la interacción con el cliente.

Identificación y alta de cliente

- Búsqueda de clientes desde múltiples campos (DNI/NIE/NIF/CIF, nombre, teléfono, email o código postal) consultando fuentes internas y externas.
- Alta de cliente potencial cuando no existe registro previo, diferenciando tipo de cliente y rol (tomador, empresa, figura relacionada).
- Generación automática de un identificador único de cliente en el momento del alta.
- Validación de campos obligatorios y control de calidad de datos con detección de posibles duplicados.
- Historial de clientes consultados recientemente para facilitar la gestión de llamadas de seguimiento.

Ficha Cliente 360

- Ficha estructurada que centraliza la información del cliente en una visión única.
- Organización de la información en tres ámbitos principales: datos personales y financieros, área de trabajo (pólizas, oportunidades, etc) y recomendaciones comerciales.
- Información sincronizada con los sistemas corporativos para ofrecer una visión actualizada del cliente.
- Gestión y actualización de datos de contacto manteniendo la consistencia de la información.
- Historial completo de interacciones y actividades realizadas con el cliente accesible para los equipos comerciales.

Telefonía y agenda

- Identificación automática del cliente al recibir una llamada y visualización inmediata de su ficha.
- Registro automático de actividades asociadas a las llamadas, reduciendo tareas manuales posteriores.
- Gestión de agenda y tareas comerciales para seguimiento de clientes e interacciones.
- Incorporación de leads procedentes de canales digitales con asignación automática a agentes o equipos.
- Paneles de supervisión con indicadores operativos como actividad de llamadas, conversión comercial o estado de la cola de atención.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Cotización Hogar y recomendaciones comerciales

En esta fase se habilita la capacidad de **realizar cotizaciones del producto Hogar directamente desde el CRM**, permitiendo que el agente gestione el proceso comercial completo sin cambiar de entorno de trabajo. El proceso de cotización se acompaña de capacidades de recomendación comercial que ayudan al agente a identificar las mejores ofertas o coberturas para cada cliente, así como priorizar oportunidades con mayor probabilidad de conversión.

Framework de cotización reutilizable

- Construcción de un **framework único de cotización** común para todos los ramos de producto.
- Implementación inicial con **Hogar como primer caso de uso**, estableciendo el modelo base para futuras extensiones.
- Diseño modular que permite incorporar nuevos ramos reutilizando la misma estructura de cotización.
- Separación entre la capa común de cotización y las particularidades específicas de cada producto.
- Reducción del esfuerzo de implantación de nuevos ramos y simplificación del mantenimiento evolutivo.

Next Best Offer (NBO)

- Incorporación de una **capa de recomendación comercial** integrada en la ficha cliente y en el proceso de cotización.
- Sugerencias en tiempo real sobre **la cobertura o producto más adecuado** según el perfil del cliente.
- Orientación al agente sobre la **siguiente mejor acción comercial** durante la interacción con el cliente.
- Priorización de oportunidades comerciales con mayor probabilidad de conversión mediante **lead scoring**.
- Mejora de la eficiencia comercial y aumento de la **tasa de conversión** en los procesos de venta.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Cotización Coches, Verificación y Multicierre

En esta fase se amplía la capacidad de cotización incorporando el ramo de **Coches**, reutilizando la base de cotización construida en la fase anterior. Además, se incorpora el proceso de **verificación del riesgo** asociado a productos de motor y se habilita la capacidad de **multicierre**, que permite contratar varios productos en una única operación comercial durante la misma interacción con el cliente.

Cotización Coches

- Extensión del framework de cotización incorporando el ramo de **Coches** como segundo producto del modelo.
- Reutilización de la estructura común de cotización construida en la fase anterior.
- Incorporación de los elementos específicos del producto de motor, como datos de riesgo, etc.
- Mantenimiento de un flujo de cotización homogéneo que incluye identificación de cliente, cálculo de precio, documentación y cierre.
- Reducción del esfuerzo de implantación de nuevos productos gracias a la reutilización de la arquitectura común de cotización.

Verificación

- Incorporación de un **proceso de verificación del riesgo** asociado a productos de motor.
- Activación automática del proceso de verificación tras la contratación o modificación de la póliza cuando sea requerido.
- Gestión de distintos tipos de verificación, como inspección presencial, envío de fotografías o verificación remota.
- Seguimiento completo del ciclo de vida de la verificación desde su asignación hasta la resolución.
- Actualización del estado de la verificación y su relación con el estado de la póliza.

Multicierre

- Capacidad para **contratar varios productos en una única interacción comercial** con el cliente.
- Posibilidad de añadir distintos productos al proceso de cotización durante la misma conversación.
- Consolidación del proceso de pago y formalización en una única operación.
- Generación conjunta de la documentación y emisión simultánea de las pólizas asociadas.
- Mejora de la experiencia comercial y aumento de las oportunidades de venta combinada.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Cotización Motos, Verificación y Documentación Pendiente

En esta fase se habilita la capacidad de **realizar cotizaciones del producto Hogar directamente desde el CRM**, permitiendo que el agente gestione el proceso comercial completo sin cambiar de entorno de trabajo. El proceso de cotización se acompaña de capacidades de recomendación comercial que ayudan al agente a identificar las mejores ofertas o coberturas para cada cliente, así como priorizar oportunidades con mayor probabilidad de conversión.

Cotización Motos con Verificación

- Extensión del modelo de cotización incorporando el ramo de **Motos** reutilizando la estructura común ya implantada.
- Captura de información específica del producto como **datos del vehículo, uso, conductor y antecedentes**.
- Integración del proceso de cálculo de precio, documentación y cierre dentro del flujo de cotización estándar.
- Reutilización del **proceso de verificación** incorporado en fases anteriores para validar el riesgo cuando sea necesario.
- Incorporación de reglas específicas del ramo manteniendo un proceso de cotización homogéneo para el agente.

Documentación Pendiente

- Activación automática del proceso cuando la póliza requiere **documentación adicional del cliente** para su validación definitiva.
- Creación de una **orden de documentación pendiente** vinculada a la póliza o proceso de contratación.
- Notificación al cliente solicitando la documentación requerida.
- Registro de los documentos recibidos y seguimiento del estado hasta su validación.
- Actualización del estado de la póliza una vez completada la documentación o escalado del proceso si no se recibe dentro del plazo establecido.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Suplementos, Expats y Upselling

Esta fase completa las capacidades de **gestión post-venta de las pólizas**, permitiendo modificar contratos existentes y gestionar cambios sobre pólizas activas de los ramos de motor y hogar. Además, se incorporan funcionalidades de **recomendación comercial y venta adicional**, así como soporte operativo para la gestión de clientes internacionales.

Suplementos Motor y Hogar

- Gestión de **modificaciones sobre pólizas activas**, como cambios de datos, coberturas o asegurados.
- Reutilización del modelo de cotización para recalcular condiciones y prima tras cada modificación.
- Visualización del impacto de los cambios antes de su confirmación.
- Aplicación del mismo modelo de suplementos para distintos ramos, adaptando únicamente las reglas específicas de cada producto.
- Registro de los cambios realizados manteniendo la trazabilidad de la evolución de la póliza.

Upselling y Crosselling

- Presentación de **productos o coberturas adicionales** durante procesos de cotización, modificación o atención al cliente.
- Recomendaciones comerciales basadas en el perfil del cliente, su historial y sus productos contratados.
- Identificación de oportunidades de **venta adicional o ampliación de cobertura** durante la interacción con el cliente.
- Registro de las recomendaciones mostradas y su resultado para mejorar el contexto comercial en futuras interacciones.

Gestión de clientes internacionales (Expats)

- Adaptación del proceso de identificación y gestión de clientes para **perfiles internacionales**.
- Soporte para diferentes documentos de identificación y datos específicos de residencia.
- Aplicación de reglas de elegibilidad y condiciones adaptadas al perfil del cliente extranjero.
- Integración de estas capacidades en los procesos existentes de **identificación, cotización y gestión de pólizas**.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Gestión de Cartera: Retención, Recibos y Recobro

En esta fase se incorporan los procesos de **gestión de cartera**, permitiendo a los equipos responsables gestionar la relación con clientes existentes, prevenir cancelaciones y administrar la situación financiera de las pólizas. El sistema centraliza la información relevante del cliente y proporciona herramientas para gestionar **retención, pagos e impagos**, facilitando la toma de decisiones y la ejecución de acciones operativas desde un mismo entorno.

Retención de clientes

- Adaptación de la **ficha cliente** para el equipo de retención con información relevante para la negociación.
- Visualización de indicadores como **riesgo de abandono, historial de incidencias y motivos de baja anteriores**.
- Proceso guiado de negociación que permite registrar el motivo de cancelación y aplicar **argumentarios o condiciones especiales dentro de los márgenes definidos**.
- Registro del resultado de la gestión de retención y ejecución de las acciones correspondientes (mantenimiento del contrato o baja ordenada).

Recibos y pagos

- Visualización desde la ficha del cliente de **todos los recibos asociados a sus pólizas**.
- Consulta de información relevante como **estado del recibo, importe, fecha de cargo y método de pago**.
- Ejecución de acciones operativas sobre los recibos, como **cobro manual, aplazamientos, devoluciones o cambios de método de pago**.
- Actualización del estado de los recibos y sincronización con los sistemas financieros correspondientes.

Recobro

- Gestión de **impagos** mediante la creación y seguimiento de órdenes de recobro.
- Actualización de datos de contacto y envío de comunicaciones al cliente para regularizar la situación.
- Registro del resultado de cada gestión de recobro realizada por los agentes.
- Priorización automática de los casos de recobro según criterios como **antigüedad del impago o valor del cliente**.
- Escalado de los casos a equipos especializados cuando se superan determinados umbrales definidos por la organización.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

Salud: Cotización, Valoración y Suplementos

En esta fase se incorpora el ramo de **Salud**, ampliando el modelo de cotización existente para soportar **cotizaciones con múltiples asegurados dentro de un mismo grupo familiar**. Además, se integra el proceso de **valoración médica del riesgo**, que puede condicionar la emisión de la póliza, y se habilitan capacidades de **gestión de suplementos y oportunidades de venta adicional** asociadas a este tipo de producto.

Cotización Salud

- Extensión del modelo de cotización para soportar **grupos familiares con múltiples asegurados** dentro de una misma póliza.
- Captura de información específica de cada asegurado, incluyendo datos de salud relevantes para la evaluación del riesgo.
- Visualización del **precio total y su desglose por asegurado**, incluyendo coberturas seleccionadas.
- Reutilización del proceso de cotización construido en fases anteriores, adaptándolo a las particularidades del producto de salud.
- Presentación clara de coberturas y condiciones durante el proceso de contratación

Valoración médica

- Activación del proceso de **valoración médica** cuando el perfil de riesgo de uno o varios asegurados lo requiere.
- Acceso del equipo especializado a la información necesaria para evaluar el riesgo bajo criterios de confidencialidad.
- Emisión de un resultado de valoración que puede confirmar la contratación, condicionarla o rechazarla.
- Gestión de los posibles resultados permitiendo al agente **adaptar la propuesta o modificar las condiciones** sin reiniciar el proceso.
- Seguimiento del estado de la valoración y su impacto en la contratación de la póliza

Suplementos y Upselling Salud

- Gestión de **suplementos sobre pólizas existentes**, como modificación de asegurados o cambios de coberturas.
- Recalculo de las condiciones del contrato cuando se realizan modificaciones.
- Presentación de **productos o coberturas adicionales** relevantes durante la gestión del cliente.
- Identificación de oportunidades de **venta adicional o ampliación de cobertura** en función del perfil del cliente.
- Derivación o seguimiento de oportunidades comerciales relacionadas con otros productos.

Fases y procesos funcionales propuestos

Fase 1:
Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)

Fase 2:
NBO + Cotización Hogar

Fase 3:
Cotización Coches + Verificación

Fase 4:
Cotización Motos – Documentación pdte.

Fase 5:
Suplementos + Upselling

Fase 6:
Retención + Recibos + Recobros

Fase 7:
Cotización Salud + Supl.

Fase 8:
CRM Empresas B2B

Fase 9:
Fidelización + Chat Omnicanal

B2B: CRM y Cotización Empresas

En esta fase se incorporan las capacidades necesarias para gestionar el **segmento de empresas**, permitiendo a los equipos comerciales administrar cuentas corporativas, gestionar el ciclo de ventas B2B y realizar cotizaciones de productos colectivos. El modelo reutiliza las capacidades construidas previamente, adaptándolas a la gestión de **cuentas empresa, jerarquías de contactos y pólizas colectivas**.

Gestión de Cuentas Empresa

- Adaptación de la **ficha cliente** para el modelo B2B, incorporando información propia de empresas como razón social, sector o tamaño de plantilla.
- Gestión de **jerarquías de contactos e interlocutores** dentro de cada organización.
- Visualización unificada de pólizas colectivas, suplementos e historial de interacciones con la empresa.
- Acceso a la información comercial relevante desde una única vista del cliente corporativo.

Gestión Comercial B2B

- Gestión del **pipeline de oportunidades B2B** con seguimiento de las distintas fases del proceso comercial.
- Planificación de actividades comerciales, tareas y agenda asociadas a cada cuenta empresa.
- Seguimiento de oportunidades por agente, producto o segmento de empresa.
- Supervisión del estado del pipeline comercial mediante indicadores y paneles de seguimiento.

Cotización y Gestión de pólizas colectivas

- Cotización de **productos colectivos** vinculados a empresas.
- Captura de información del colectivo asegurado, como número de empleados u otras características relevantes.
- Presentación del precio y coberturas aplicables al conjunto del colectivo.
- Emisión y gestión de pólizas colectivas con todos los asegurados vinculados a la cuenta empresa.
- Gestión de modificaciones o suplementos sobre pólizas colectivas cuando cambian las condiciones del colectivo.

Fases y procesos funcionales propuestos

- Fase 1: Ficha 360 + CTI + Agenda (MVP)
- Fase 2: NBO + Cotización Hogar
- Fase 3: Cotización Coches + Verificación
- Fase 4: Cotización Motos – Documentación pdte.
- Fase 5: Suplementos + Upselling
- Fase 6: Retención + Recibos + Recobros
- Fase 7: Cotización Salud + Supl.
- Fase 8: CRM Empresas B2B
- Fase 9: Fidelización + Chat Omnicanal

Fidelización, Omnicanalidad y Automatización

En esta fase se completa la evolución del CRM incorporando capacidades avanzadas de **fidelización del cliente, atención omnicanal y automatización de interacciones**. El objetivo es ofrecer una experiencia coherente para el cliente independientemente del canal de contacto, mejorar la eficiencia operativa de los agentes y reforzar la relación con el cliente a largo plazo.

Fidelización

- Implementación de un **programa de fidelización basado en puntos** asociados a la contratación, renovación o vinculación de productos.
- Consulta del saldo de puntos y beneficios disponibles desde la ficha del cliente.
- Aplicación de reglas de acumulación y canje definidas por el negocio.
- Registro del historial de beneficios y recompensas asociado a cada cliente.
- Visibilidad del programa de fidelización para los agentes durante la interacción con el cliente.

Atención omnicanal

- Gestión unificada de interacciones procedentes de **múltiples canales** como llamadas, chat o email.
- Enrutamiento inteligente de las interacciones al agente más adecuado según disponibilidad o especialización.
- Acceso al **historial completo de interacciones** del cliente independientemente del canal utilizado.
- Continuidad en la conversación con el cliente sin necesidad de repetir información entre canales.
- Centralización de la gestión de interacciones dentro del entorno de trabajo del agente.

Automatización y asistencia al agente

- Automatización de la gestión de **consultas simples y repetitivas** mediante asistentes virtuales o herramientas de IA.
- Resolución automática de solicitudes de bajo valor como consultas sobre estado de póliza, pagos o datos de contacto.
- Escalado automático de casos complejos a agentes humanos cuando es necesario.
- Transferencia del contexto completo de la conversación para facilitar la continuidad de la atención.
- Mejora de la eficiencia operativa y reducción de tiempos de gestión.

Solución Técnica

5.3

MINSAIT

Salesforce Financial Servicen: arquitectura en tres capas y un enfoque técnico imbatible para Línea Directa

Proponemos una solución basada en una **arquitectura de tres capas, diseñada específicamente para el sector asegurador**. Esta estructura se apoya en un modelo orientado a maximizar la agilidad, la eficiencia operativa y la gobernanza técnica del ecosistema. Su diseño desacoplado permite que cada capa evolucione de forma independiente, reduciendo los riesgos asociados a las dependencias entre sistemas y facilitando un ciclo continuo de innovación sin comprometer la estabilidad del entorno. Este enfoque garantiza una escalabilidad robusta, una transición ordenada y una integración eficiente con los sistemas existentes a lo largo de toda la implementación. Las tres capas son:

Capa de Engagement

(Finantial Service Cloud (FSC)
con OmniStudio + Business Rules Engine)

Financial Services Cloud incluye un motor de reglas de negocio específico para el sector asegurador, que gestiona criterios de elegibilidad, riesgos, escalación y regulaciones. En Línea Directa, cada llamada y cliente tiene un flujo y experiencia personalizados.

Capa de Integración

(CDC/Kafka + MuleSoft Anypoint(

Línea Directa integra varios sistemas como voz, pagos y CRM, pero sin una capa de integración, el asesor debe usar múltiples pantallas. FSC actúa como hub central, unificando estos sistemas en un solo flujo para facilitar el trabajo del asesor sin cambiar de plataforma.

Capa de Intelligence

(Data Cloud +Agentforce + Einstein AI +
Next Best Action + Analytics)


Data Cloud integra el perfil del cliente en tiempo real, mientras que Einstein AI calcula propensión y riesgo de fuga. Agentforce actúa como copiloto en la llamada. Todo es nativo en la misma plataforma, permitiendo que la inteligencia intervenga durante la llamada, no solo después, ofreciendo una experiencia integrada desde su origen.

Capa de Engagement

Financial Services Cloud + OmniStudio + Business Rules Engine
Lo que ve el operador de Línea Directa

Hoy el operador de Línea Directa no pierde tiempo por falta de información. La pierde buscándola, interpretándola y decidiendo qué hacer con ella. FSC con OmniStudio y el Business Rules Engine elimina exactamente eso: la fricción entre el dato y la acción.


- **Perfil completo del cliente:** Antes de la llamada en Genesys, FSC ya tiene toda la información del cliente, permitiendo al agente enfocarse en resolver el problema sin buscar datos.
- **Flujo guiado y adaptado:** OmniScript dirige al agente según el tipo de gestión, ajustándose automáticamente a cambios como intentos de cancelación, garantizando un proceso sin errores.
- **Decisiones rápidas y uniformes:** El BRE decide en milisegundos sobre escaladas, ofertas o excepciones, asegurando que todos los agentes actúen de forma consistente.
- **Registro automático:** DataRaptor guarda toda la actividad al finalizar, eliminando tareas manuales y errores que afecten la trazabilidad.

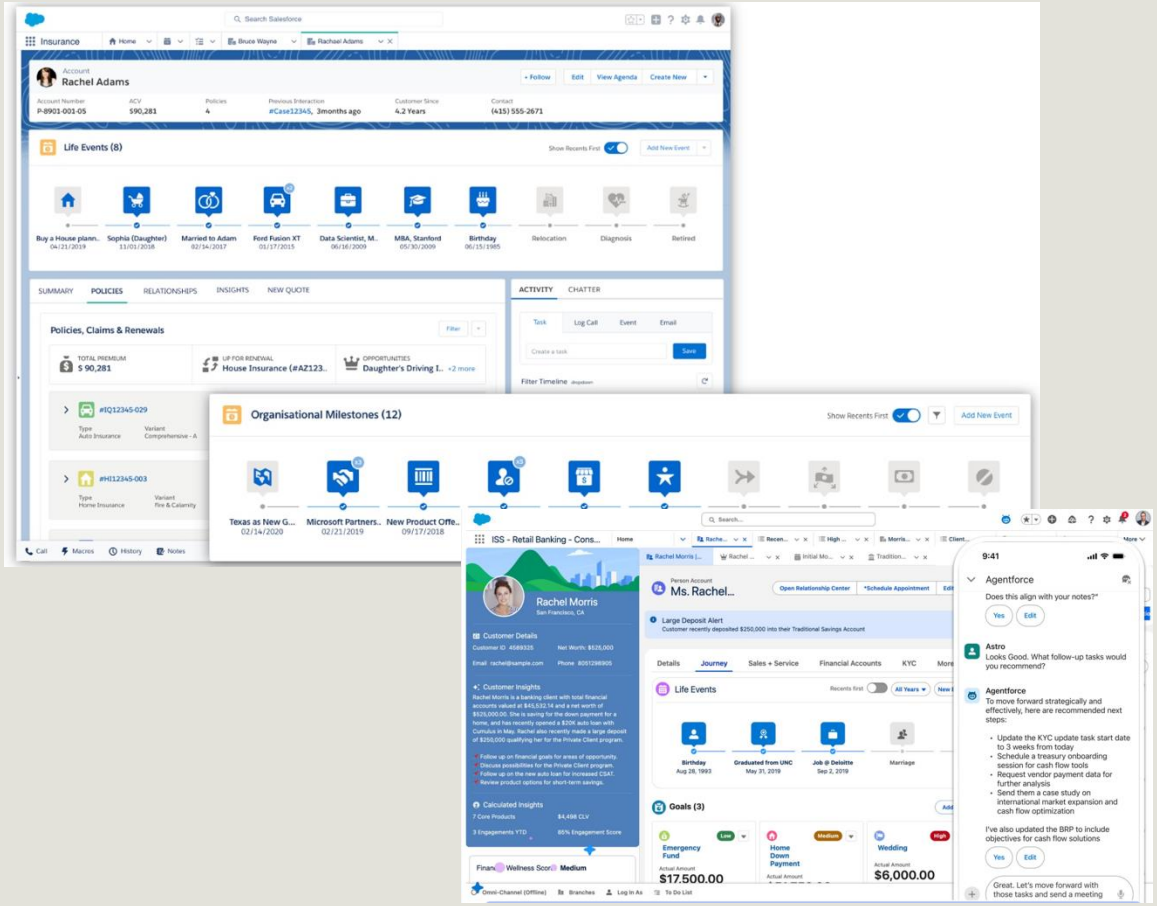

Capa de Integración

MuleSoft Anypoint + Confluent Kafka + CDC + APIs REST

Para que la experiencia del operador sea excelente (Engagement), los datos deben ser precisos y estar disponibles en tiempo real (Integración).
Una vez definida la experiencia de usuario en la capa de Engagement —donde habilitamos la agilidad y la omnicanalidad— es fundamental asegurar que el flujo de información sea bidireccional, seguro y, sobre todo, en tiempo real. No podemos ofrecer una visión 360° si los datos del core (Galgo) no fluyen. Por ello, la Capa de Integración que presentamos a continuación es el motor que garantiza que cada decisión tomada en el front-end esté respaldada por la realidad técnica de nuestros sistemas legacy y periféricos.

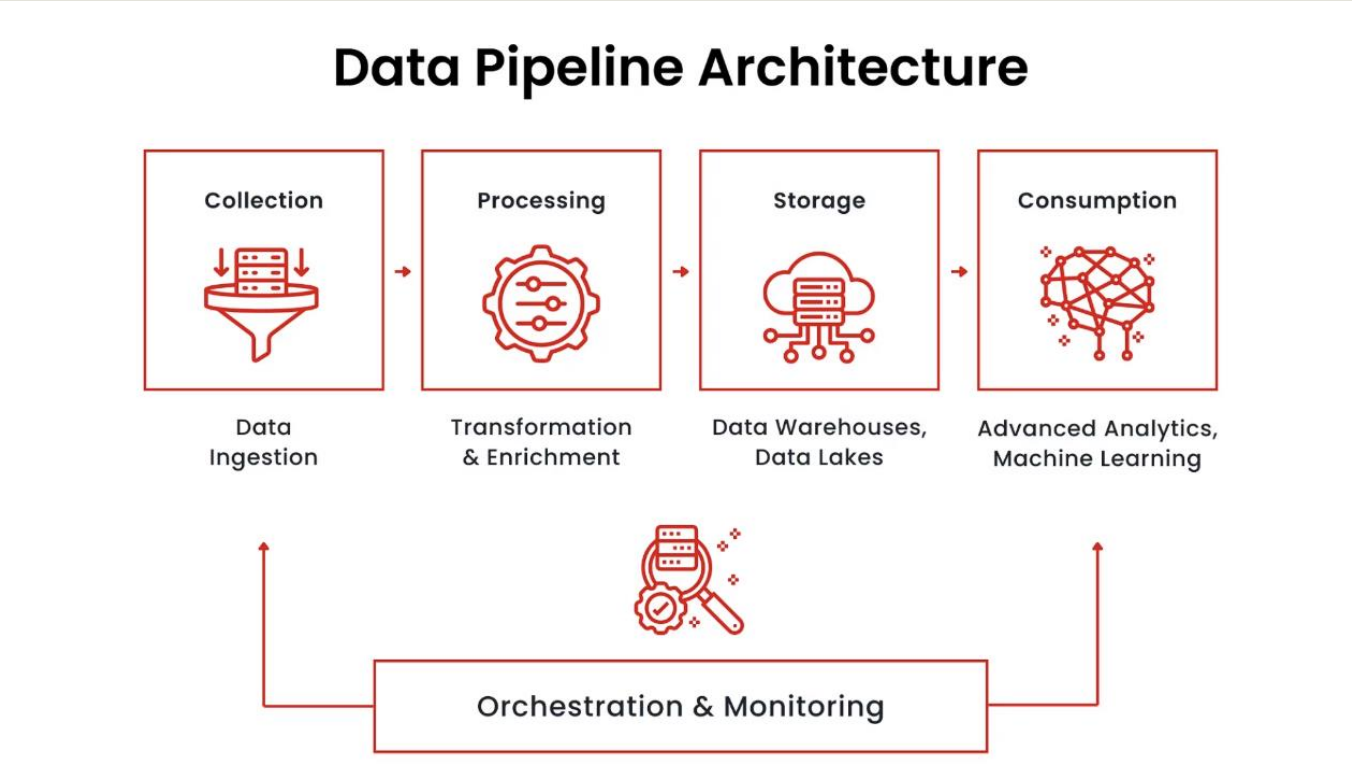

Para habilitar las funcionalidades de Financial Services Cloud, hemos desarrollado una infraestructura de datos bidireccional que sirve como columna vertebral para la gestión de la información.

Anteriormente contábamos con una capa de interacción ágil, y ahora presentamos la 'infraestructura' que la sostiene: una combinación de APIs REST y una orquestación avanzada que traduce la complejidad Galgo al modelo nativo de Salesforce.

Sin embargo, esta capa representa solo el punto de partida; su diseño contempla la escalabilidad necesaria para integrar y manejar la complejidad de todos los sistemas periféricos de Línea Directa.

Como se detallará en la **sección 5.3.2**, estamos construyendo un ecosistema interconectado donde los datos fluyen sin compartimentos estancos, asegurando una conciliación perfecta gracias al uso de External IDs.

Capa Intelligence

Data Cloud +Agentforce + Einstein AI + Next Best Action + Analytics

Componentes Clave y Valor Agregado

Capacidades "Out of the Box" (Incluidas en Financial Services Cloud - FSC): Estas funciones vienen preconfiguradas para el sector asegurador, enfocadas en la productividad del usuario

- Einstein Relationship Insights: Explora la web y noticias para identificar conexiones entre clientes y empresas.
- Actionable Segmentation: Permite crear listas de clientes para campañas basadas en datos demográficos y de comportamiento.
- Generación de Resúmenes: Resúmenes automáticos de interacciones con clientes o del estado de una póliza para que el agente humano ahorre tiempo.
- Next Best Action: Sugerencias automáticas sobre qué ofrecer a un cliente (ej. un seguro de vida tras un cambio de estado civil).


Agentforce: IA Autónoma, no simples Chatbots

A diferencia de los bots tradicionales basados en menús rígidos y respuestas preprogramadas, Agentforce representa una nueva era de IA Autónoma. Gracias a su capacidad de razonamiento, no solo responde preguntas, sino que ejecuta procesos de negocio completos (como la apertura de un siniestro o la cualificación de un lead) de forma independiente, conectándose a datos en tiempo real y actuando bajo estrictos marcos de seguridad y cumplimiento.

El Pilar de la Confianza: Einstein Trust Layer

Para cumplir con el RGPD y las exigencias de seguridad de una aseguradora, toda la IA de Salesforce opera bajo la Trust Layer. Este es el componente que garantiza que los datos sensibles de los asegurados estén protegidos:

- Zero Data Retention (Retención Cero de Datos): Ningún dato enviado a los modelos de lenguaje (LLMs) externos para procesar una solicitud es almacenado por el proveedor del modelo. Una vez generada la respuesta, los datos se olvidan.
- Enmascaramiento de Datos: Antes de enviar información al modelo, la Trust Layer detecta y oculta automáticamente datos sensibles (PII - Información de Identificación Personal).
- Auditoría de IA: Salesforce mantiene un registro completo de todas las interacciones de la IA para auditorías de cumplimiento normativo.

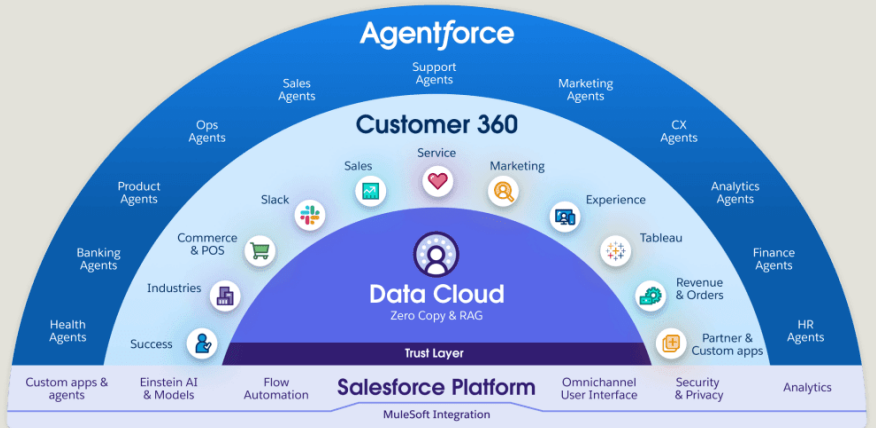

IA en acción: mostramos casos reales implantados con éxito

VALOR AÑADIDO

Caso de uso	Dominio	Motor IA	Prior.	Descripción	KPI target
Resumen automático de llamada	Atención	Einstein Generative AI	MUST	Genera resumen de llamada y próximos pasos automáticamente.	-25% AHT post-llamada
NBA Cotización Multiproducto	Ventas	Einstein NBA + Rules Engine	MUST	Recomienda la mejor oferta multiproducto para maximizar conversión.	+12% conversión
Lead Scoring — Propensión compra	Ventas	Einstein Lead Scoring	MUST	Prioriza leads con mayor probabilidad de compra.	+18% leads Walmeric
Enrutamiento inteligente llamadas	Atención CC	Einstein Classification	SHOULD	Enruta llamadas al mejor agente según intención.	-15% AHT total CC
Clasificación automática siniestros	Siniestros	Einstein Classification (NLP)	MUST	Clasifica siniestros por tipo y severidad automáticamente.	-60% tiempo clasificación
Predictive Case — Riesgo litigio	Siniestros	Einstein Prediction Builder	MUST	Estima probabilidad de litigio y dispara mitigaciones.	-20% derivación litigio
Churn Scoring — Riesgo abandono	Retención	Einstein Prediction Builder	MUST	Predice riesgo de abandono para activar acciones preventivas.	-15% cancelaciones
NBA Retención — Argumentario dinámico	Retención	Einstein NBA (retención)	MUST	Sugiere argumentario de retención adaptado al perfil.	+25% retención Riesgo Alto
Scoring propensión al pago	Recobro	Einstein Scoring	MUST	Predice propensión de pago para optimizar recobro.	+20% cobro 1er intento
Agentforce — Recobro digital HitL	Recobro	Agentforce Agent	SHOULD	Gestiona recobro digital con humano en bucle.	-35% llamadas recobro manual
Agentforce — Notif. estado siniestro	Siniestros	Agentforce Agent	SHOULD	Notifica cambios del siniestro y reduce llamadas.	-40% llamadas consulta estado
Agentforce — Retention Agent digital	Retención	Agentforce Agent	COULD	Ejecuta retención digital autónoma para riesgo medio.	Retención autónoma Riesgo Medio

IA en acción: casos reales que ya están transformando a nuestros clientes del sector seguros

VALOR AÑADIDO

El sector asegurador enfrenta un cambio donde la eficiencia y la experiencia del cliente ya no dependen solo de procesos manuales o bots rígidos. Casos de éxito muestran cómo aseguradoras han mejorado con agentes inteligentes que razonan, acceden a datos en tiempo real y actúan con precisión, ofreciendo a linea directa una ventaja competitiva como integradores.

Empresa	Desafío	Solución
Aseguradora Genérica	Declaración de siniestros, envío de fotos y solicitud de grúa de forma manual y lenta.	Reducción del 30% en el tiempo de declaración de siniestros mediante IA autónoma.
Aseguradora Genérica	Alta carga en consultas de coberturas, descarga de certificados y estado de pagos.	Automatización del 70% de las consultas frecuentes sin intervención de agentes.
Andina ART	4 personas coordinando 12,000 traslados al mes. Tiempo de asignación: 29 horas.	Tiempo de asignación bajó a 40 min. Agentforce gestiona el 69% de los casos por WhatsApp.
Más Seguros	Localizar información en carteras de +1,000 pólizas era lento y frustrante para el usuario.	Respuesta en < 5 minutos (antes 1-2 días). Libera 1/3 del tiempo de los asesores.
Hipotecario Seguros	Bot de WhatsApp (Einstein) rígido, limitado para escalar y con diálogos poco naturales.	Migración a Agentforce para conversaciones fluidas y escalabilidad total del roadmap digital.



Arquitectura de la Solución

5.3.1

MINSAIT

Una arquitectura preparada para ganar: el diseño tecnológico que impulsa la evolución de Línea Directa

Tras analizar cómo FSC estructura la experiencia del agente, la lógica de negocio y la inteligencia de datos en tres capas, mostramos su **aplicación práctica en Línea Directa**, con sistemas y flujos específicos en producción. La página siguiente presenta un diagrama único de la arquitectura técnica que integra todos los sistemas operativos en una plataforma unificada **basada en Salesforce Financial Services Cloud**.



No se trata de una arquitectura genérica, sino de una solución **basada en los sistemas reales de Línea Directa**, diseñada para asegurar una operación fluida sin deuda técnica ni dependencia de decisiones individuales.

Una arquitectura preparada para ganar: el diseño tecnológico que impulsa la evolución de Línea Directa


El diagrama ilustra el recorrido de los datos desde el canal de contacto del cliente, pasando por el agente, hasta llegar a los sistemas de registro empresariales.

A la izquierda se encuentran los **canales de entrada**: Genesys con CTI Connector, canales digitales, chat y mensajería.

En el centro se ubica el **núcleo**: Salesforce FSC con Insurance, OmniStudio, Flows, Automatización y Data Cloud.

La **Capa de Integración y Gobernanza** emplea MuleSoft Anypoint y Kafka para gestionar conexiones y eventos.

A la derecha están los **sistemas maestros**: Galgo, LDAP, Logalty, IBM Content Manager y DWH Oracle, que suministran datos en tiempo real a Salesforce.

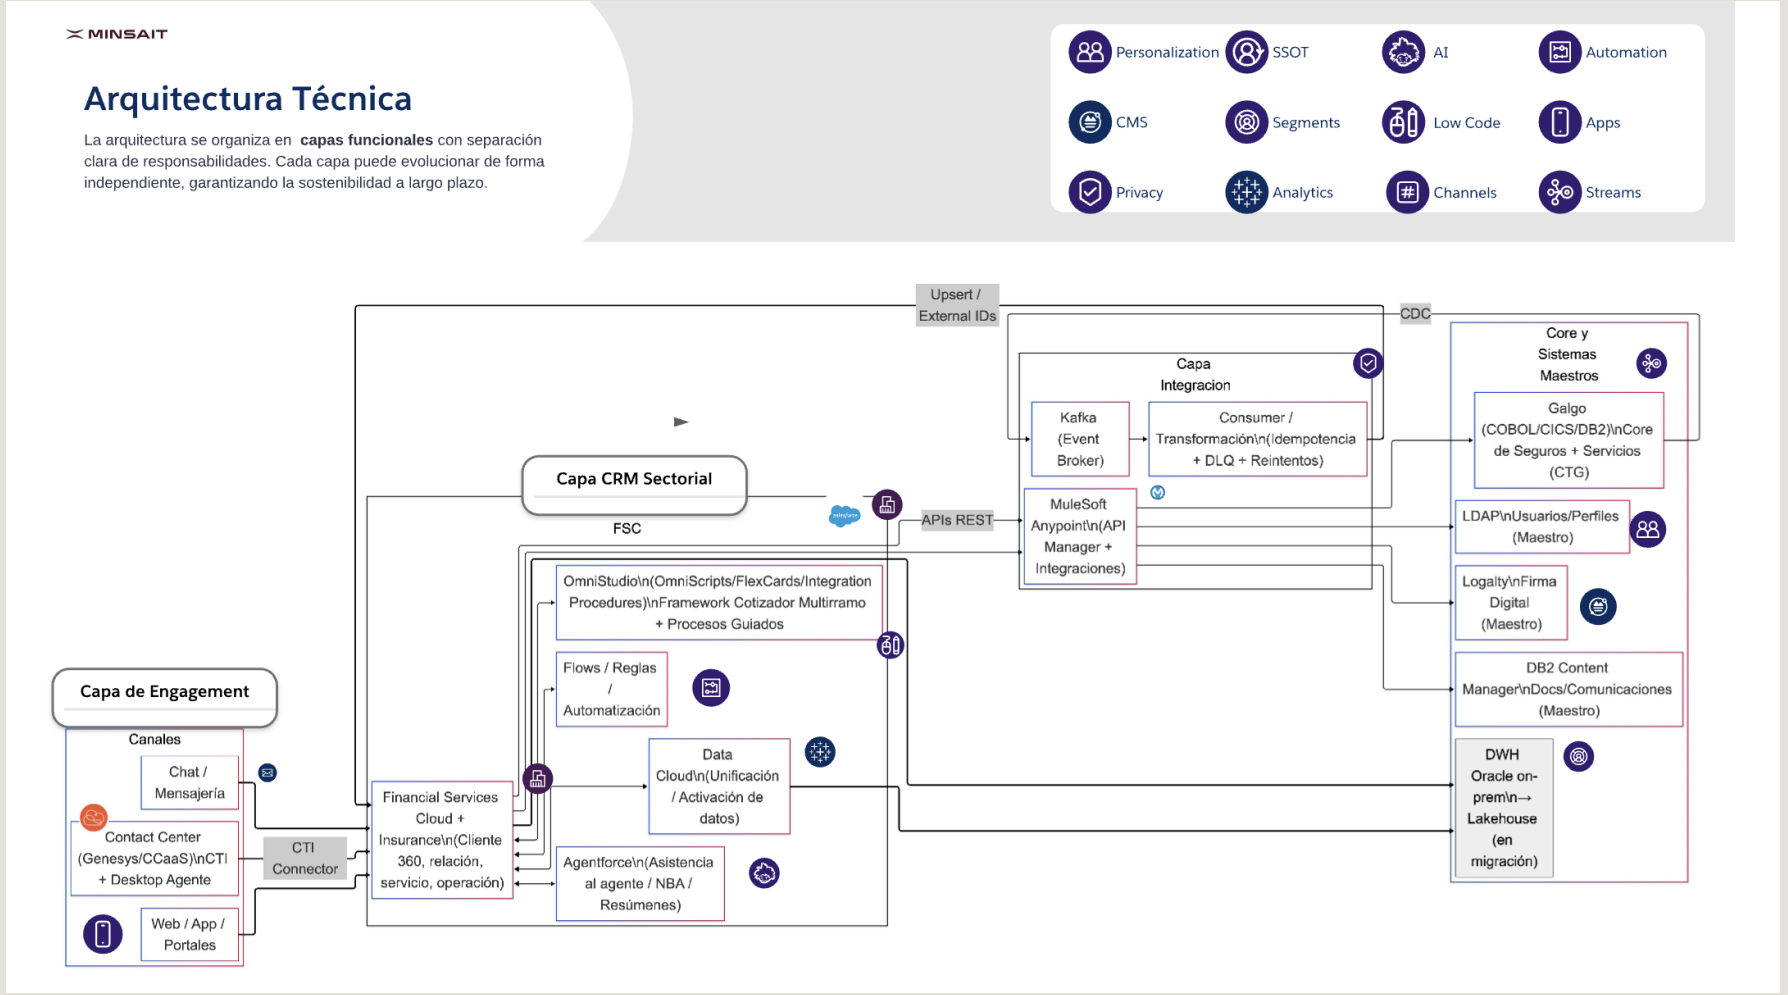

Modelo de integración


5.3.2

MINSAIT

Arquitectura de Integración Corporativa para el Nuevo Ecosistema Salesforce


La arquitectura de integración diseñada para Línea Directa establece un marco corporativo unificado, orientado a conectar el **nuevo ecosistema de Salesforce - Financial Services Cloud** con el resto de las plataformas y sistemas críticos de la compañía de forma segura, trazable y escalable. Este modelo se basa en una capa de integración desacoplada y robusta, que centraliza la exposición y el consumo de capacidades de negocio mediante APIs, eventos y procesos batch, integrándose con el *core asegurador*, la gestión documental, los canales comerciales, la analítica corporativa y los servicios de identidad.

El diseño arquitectónico se fundamenta en Salesforce como plataforma núcleo, apoyándose en patrones de integración estándar: APIs expuestas y gobernadas desde un API Manager corporativo, eventos para sincronización near-real-time mediante plataformas de mensajería desacopladas, y mecanismos de observabilidad que permiten trazabilidad end-to-end. **El modelo garantiza resiliencia, seguridad y gobierno**, asegurando que la evolución funcional del CRM y de las integraciones pueda producirse sin fricciones, sin dependencias rígidas y con una operación estable en el tiempo.

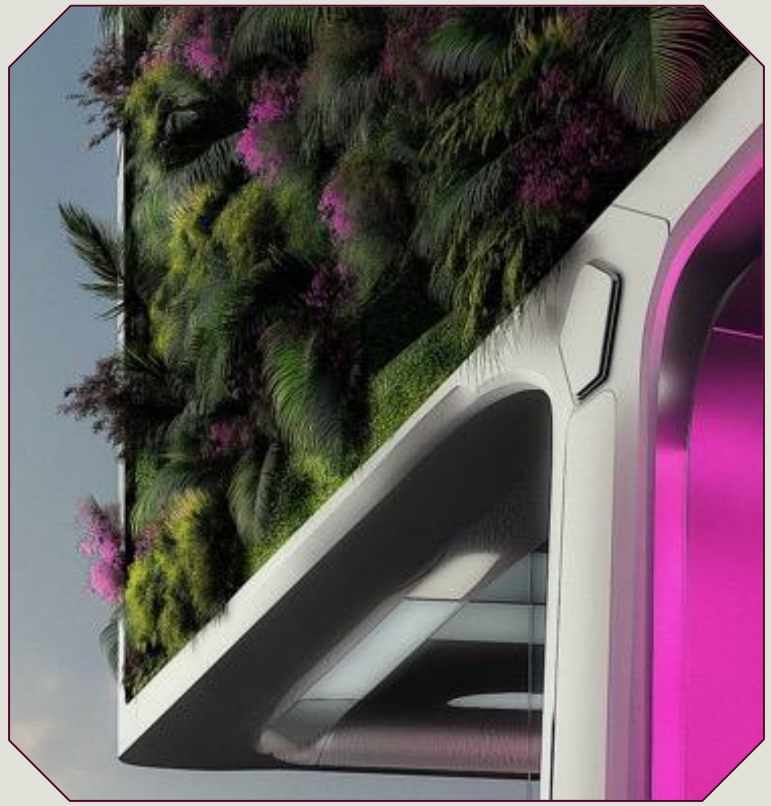

63

Arquitectura de integración propuesta – Diagrama conceptual de integración

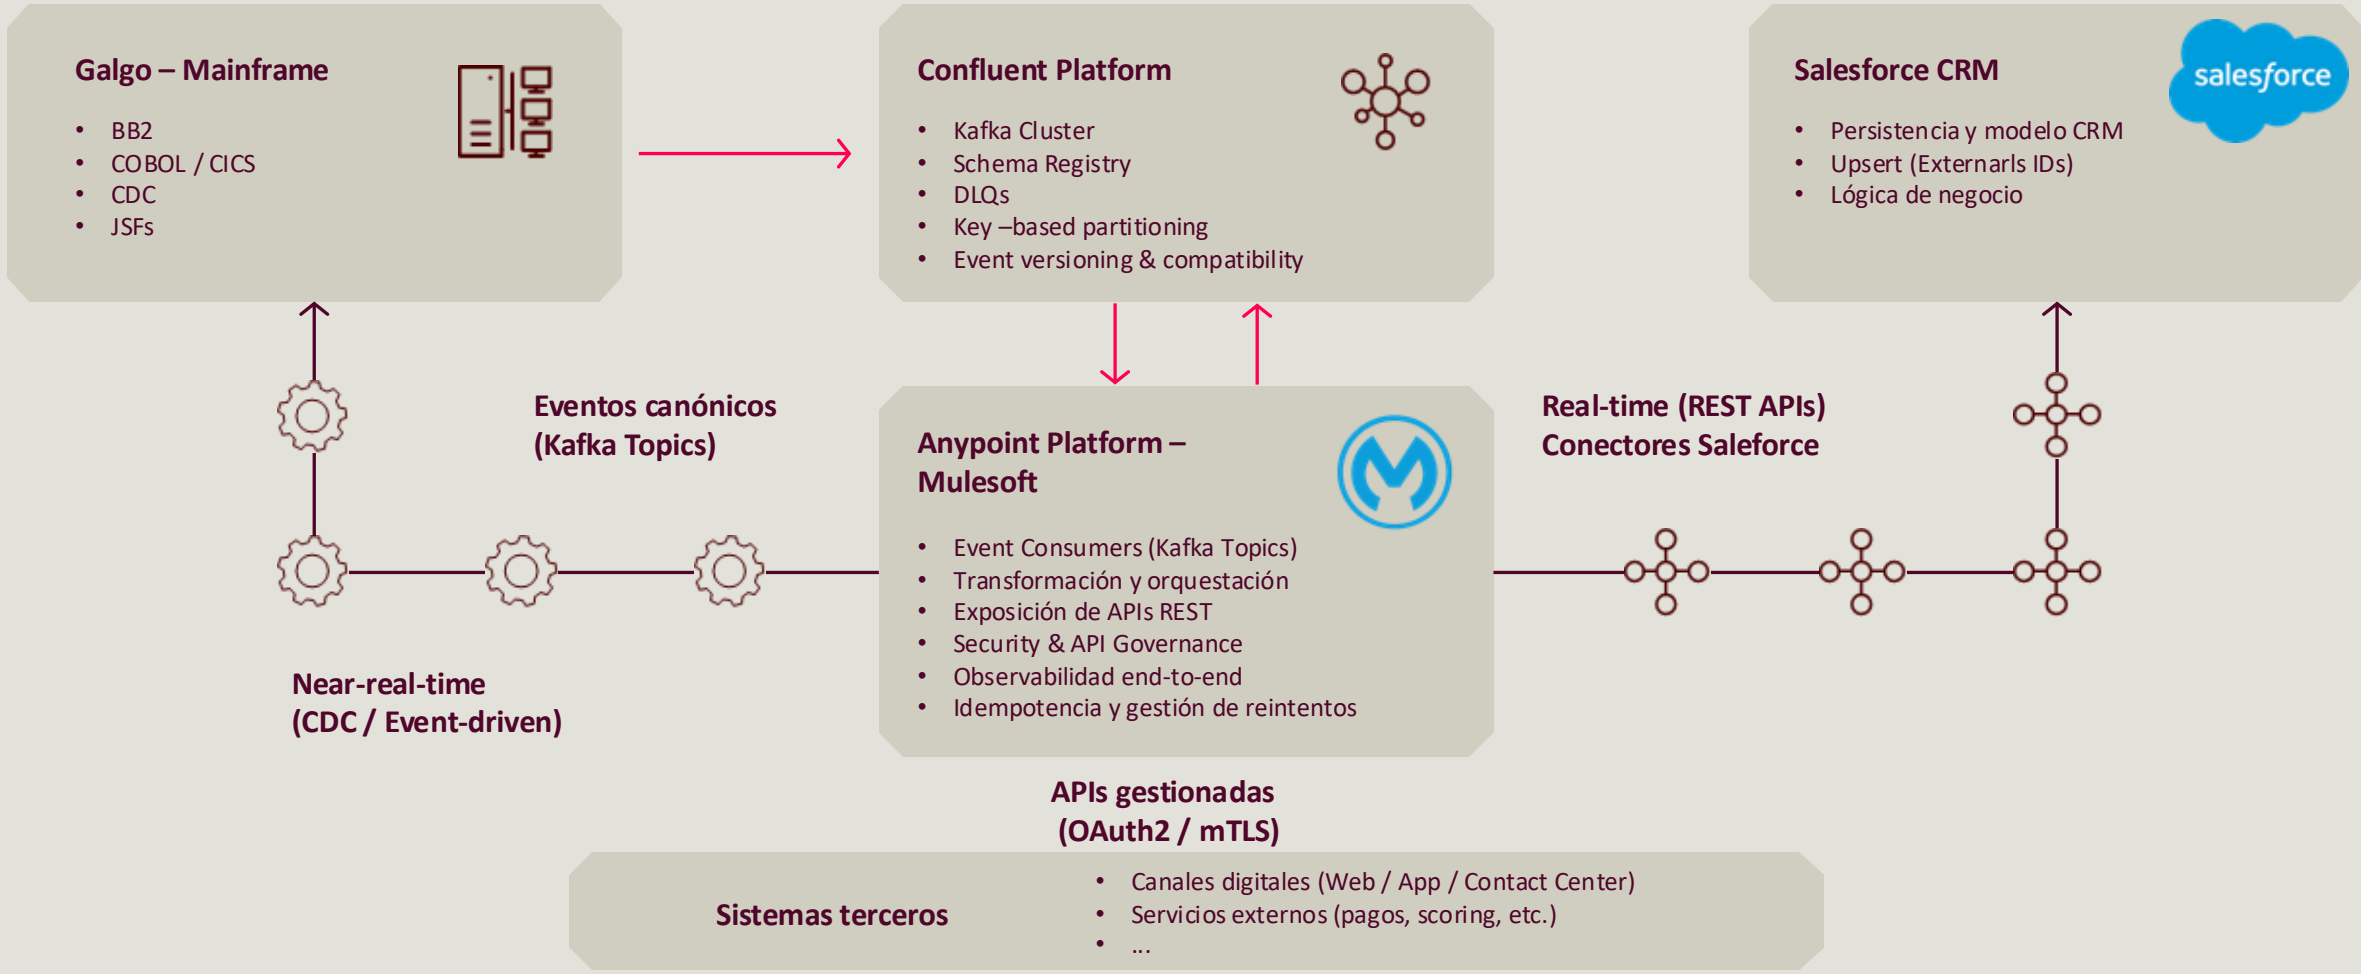

Justificación de la arquitectura propuesta

Arquitectura orientada a consistencia, resiliencia y escalabilidad

Qué problema resolvemos

- Necesidad de sincronización bidireccional Galgo ↔ CRM
- Riesgo de inconsistencias entre sistemas
- Impacto directo en estabilidad operativa
- Dificultad de evolución sin desacoplamiento

Qué patrón aplicamos

- Flujo asíncrono Galgo → CRM mediante CDC + eventos canónicos
- Flujo síncrono CRM → Galgo mediante API-led connectivity (MuleSoft)
- Desacoplamiento mediante backbone de eventos
- Gobierno del dato por diseño

Qué garantías damos

- Orden garantizado por entidad (key-based partitioning)
- Idempotencia funcional en el consumo
- Gestión controlada de errores (DLQ + reproceso)
- Upsert seguro mediante External IDs
- Trazabilidad end-to-end (correlation ID)

Qué riesgos mitigamos

- Desorden de eventos
- Duplicidades en CRM
- Fallos silenciosos sin trazabilidad
- Sobrecarga directa del core
- Dependencia rígida entre sistemas

Arquitectura híbrida que protege el core, desacopla la evolución funcional y reduce el riesgo operativo

- Preparada para crecimiento futuro sin rehacer integraciones
- Base sólida para industrializar nuevas integraciones

Modelo de integración

Patrones por flujos y principios transversales

Galgo --> CRM (Event-driven / CDC)

- **Objetivo**: near-real-time (<5s P95), Desacoplamiento
- **Patrón**: CDC + Publicación de eventos canónicos
  1. CDC captura cambios en DB2 (insert/update/delete)
  2. Publica eventos en Kafka Topics (Confluent)
  3. MuleSoft Event Consumption: consume, transforma, enriquece
  4. Upsert en Salesforce (External IDs + mapping de identificadores legacy)
- **Garantías técnicas**
  - **Orden por entidad**: key-based partitioning (p.ej. policyId/customerId)
  - **Idempotencia funcional** (eventId + externalId + control de versión)
  - **Errores**: retries + DLQ + reproceso controlado
  - **Evolución**: Schema Registry + compatibilidad

CRM → Galgo (Request/Reply / APIs)

- **Objetivo**: real-time (sincronía) para operaciones críticas
- **Patrón**: API-led connectivity (System/Process/Experience APIs)
  1. Salesforce invoca APIs vía conectores
  2. MuleSoft aplica Security & API Governance (OAuth2/mTLS, policies)
  3. Orquesta y adapta hacia servicios Galgo (REST/CTG/capa servicios)
  4. Respuesta síncrona al CRM + trazabilidad end-to-end
- **Garantías técnicas**
  - Rate limiting / protección core
  - Timeouts y circuit breakers
  - Error model: RFC7807 (Problem Details) si aplica
  - Auditoría y correlación (trace-id)

Principios Transversales

- **Trazabilidad end-to-end** (Dynatrace + ELK)
- Contrato de datos: canónico + versionado
- Reconciliación periódica para asegurar consistencia
- Observabilidad operativa (métricas, logs, alertas)
- Seguridad y cumplimiento (cifrado, mínimos privilegios)

Modelo de integración

Modelo de integración basado en API-Led Connectivity


La arquitectura de integración propuesta se fundamenta en el paradigma API-Led Connectivity, que organiza las capacidades de integración en tres capas lógicas de APIs reutilizables. Este enfoque permite desacoplar los sistemas, facilitar la reutilización de servicios y acelerar la evolución del ecosistema tecnológico.

El modelo distingue tres niveles de APIs:

System APIs
- Encapsulan el acceso a los sistemas backend.
- Abstraen la complejidad técnica de los sistemas legacy.
- En este contexto encapsulan las capacidades del core asegurador Galgo y de otros sistemas corporativos del ecosistema


Process APIs
- Orquestan y componen información procedente de varios sistemas.
- Implementan lógica de negocio transversal.
- Permiten desacoplar el CRM de los sistemas backend.

Experience APIs
- Adaptan la información a las necesidades de las aplicaciones consumidoras.
- Permiten optimizar el acceso a los datos según el canal.

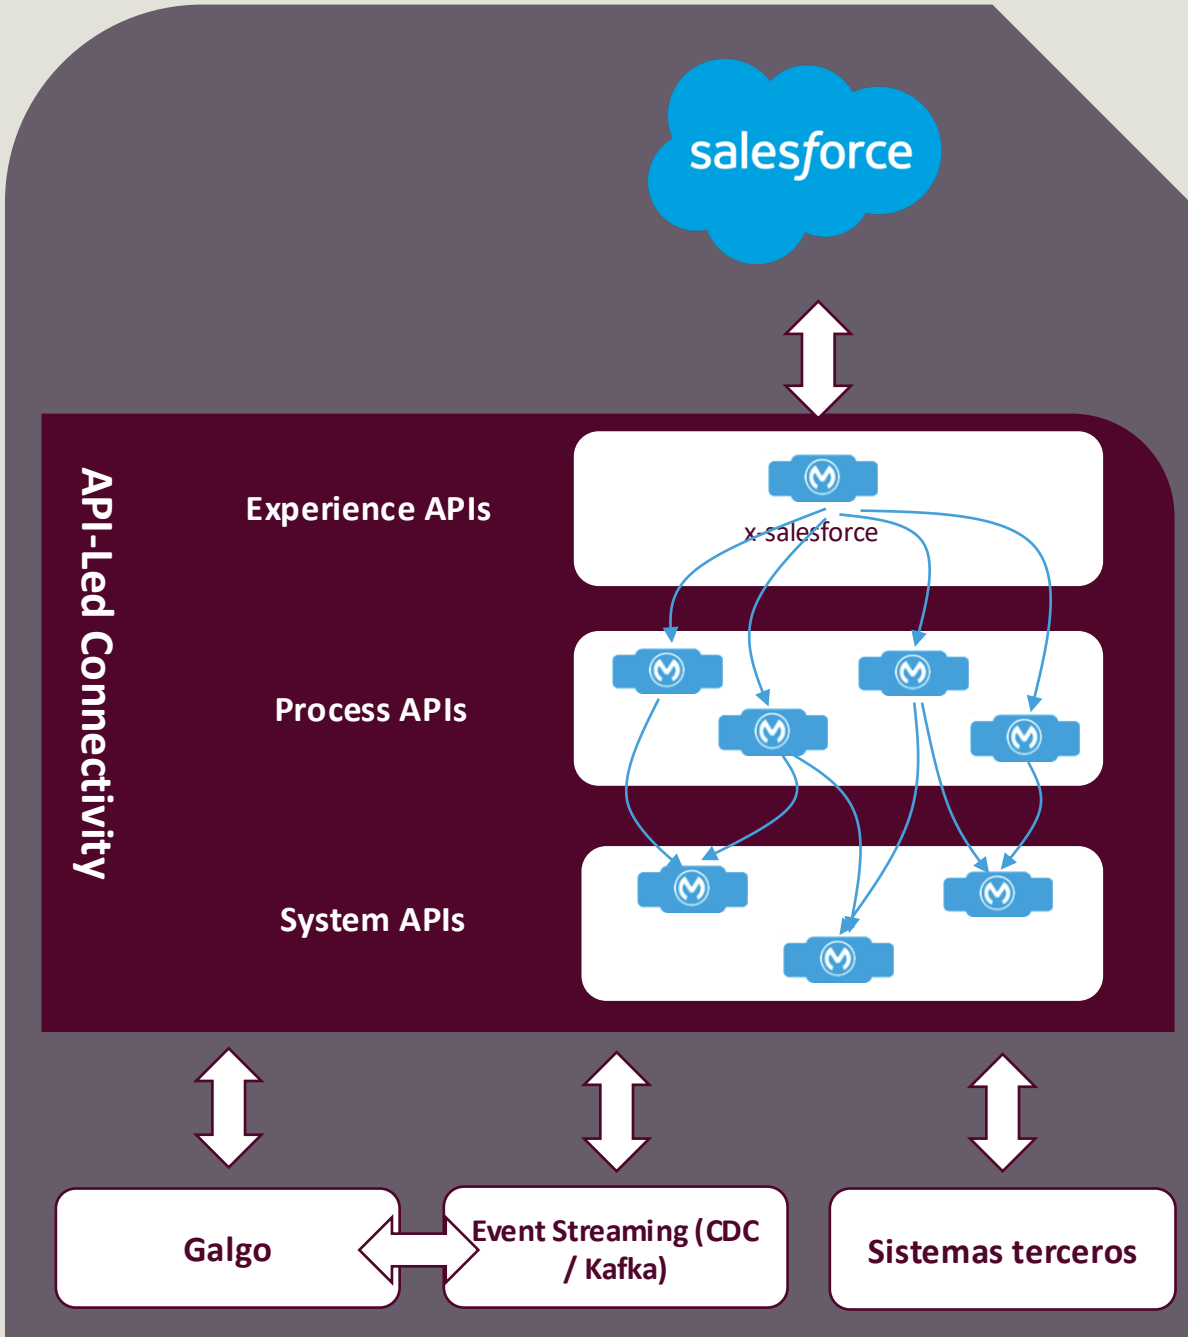

Modelo de integración

Siguiendo la metodología de **API-Led Connectivity**, que facilitará la reutilización de los activos desarrollados durante el proyecto y mejorará el time-to-market de los flujos de integración, y **basándonos en la información recabada en la fase de assessment**, se ha identificado un conjunto de integraciones que se representan de forma ilustrativa en el diagrama adjunto. Durante la fase de Discovery se llevará a cabo un análisis exhaustivo de estas integraciones junto con LDA, con el objetivo de perfeccionar el diagrama API-LED.

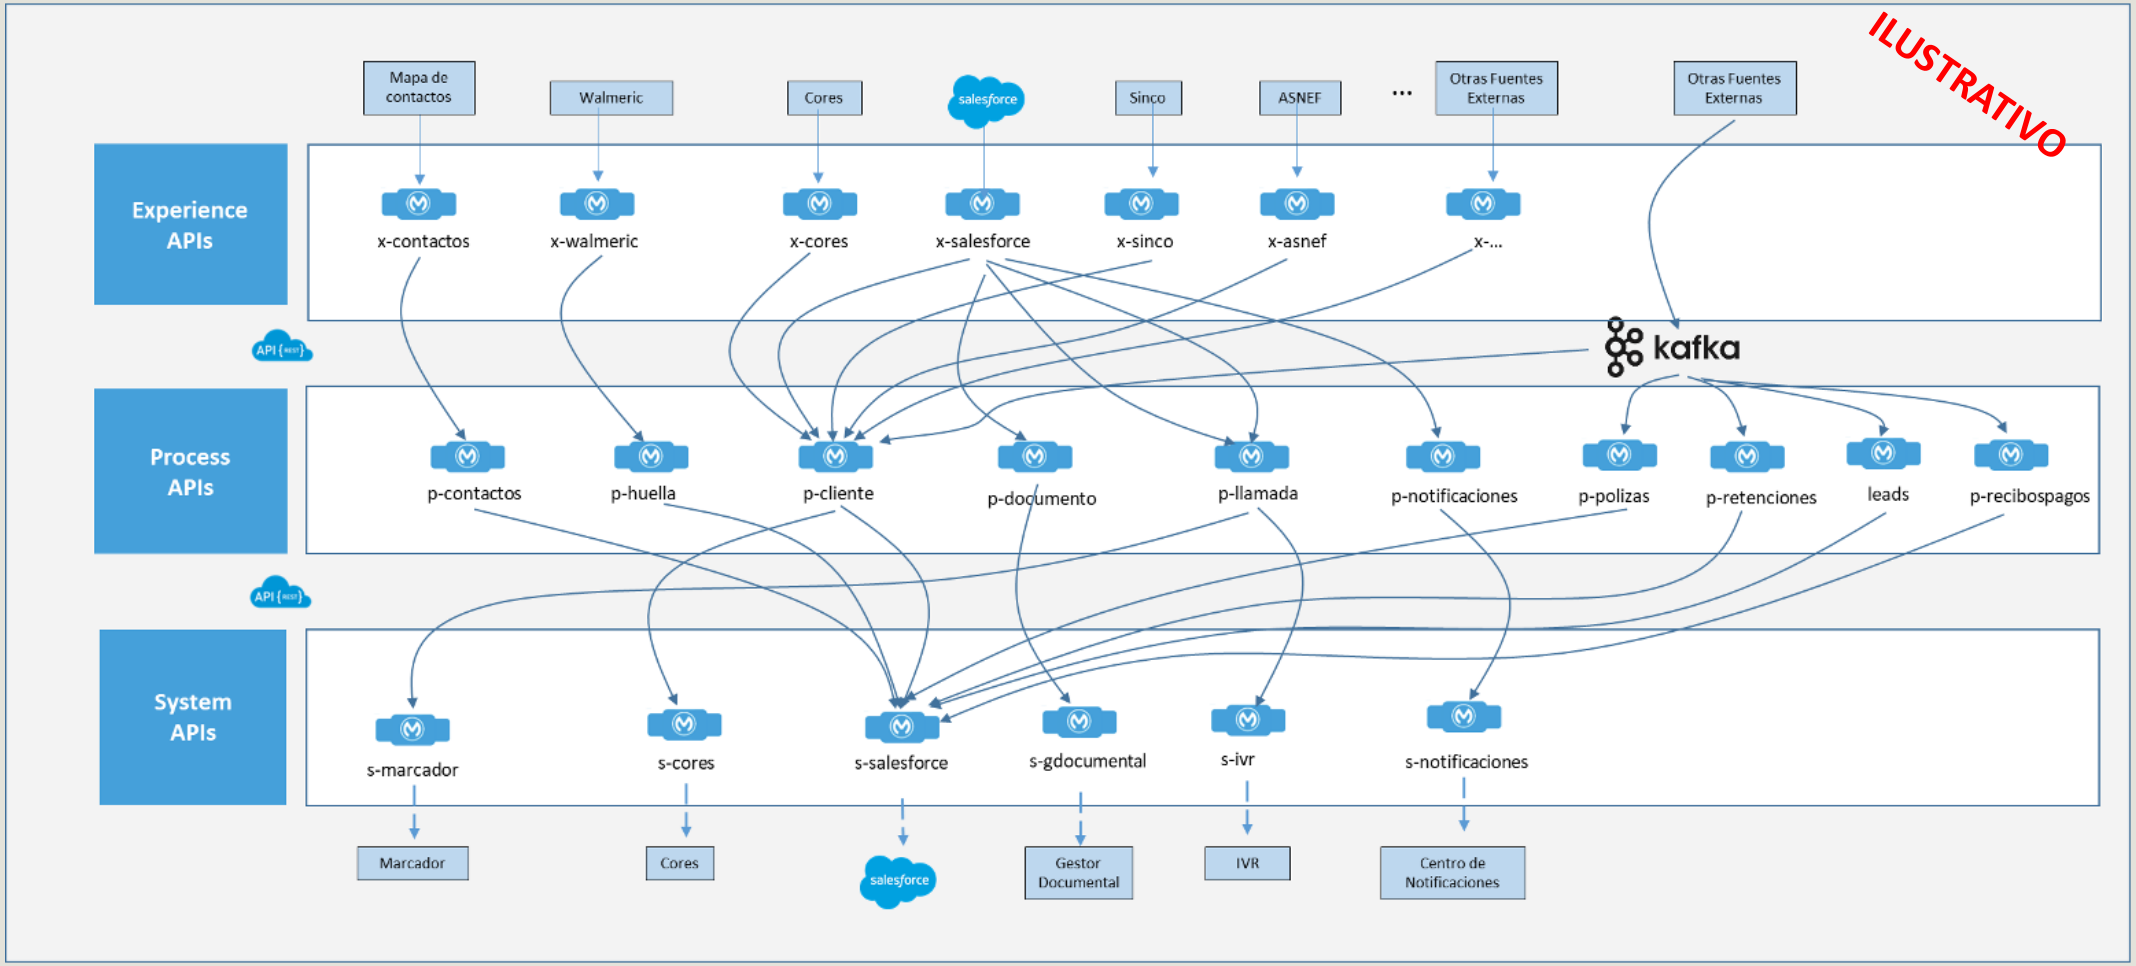

Justificación del modelo de integración

Modelo híbrido que combina asincronía para escalabilidad y sincronía controlada para operaciones críticas

Qué problema resolvemos

- Necesidad de sincronización bidireccional controlada
- Riesgo de inconsistencias por asincronía
- Operaciones críticas que requieren respuesta inmediata
- Necesidad de gobernar eventos y APIs de forma homogénea

Qué patrón aplicamos

- Event-driven para sincronización masiva y near-real-time
- Request/Reply para operaciones críticas
- CDC + Kafka como mecanismo de propagación
- API-led para encapsular acceso al core

Qué garantías damos

- At-least-once delivery controlado (dedupe + idempotencia)
- Reintentos controlados + DLQ monitorizada
- Versionado de eventos y APIs (compatibilidad)
- Estándar común de errores (RFC7807)
- Observabilidad transversal

Qué riesgos mitigamos

- Inconsistencia temporal no controlada
- Saturación del core por llamadas síncronas directas
- Reprocesos manuales por falta de idempotencia
- Caídas en cascada por ausencia de circuit breakers

Integración gobernada para industrializar eventos y APIs con consistencia y resiliencia

- Permite evolucionar procesos sin tocar el core en cada cambio
- Reduce tiempos de integración con patrones reutilizables (event/API templates)
- Minimiza incidencias con observabilidad y control de fallos


Integración de canales con Genesys Cloud CX

La solución propuesta integra el **centro de contacto en la nube Genesys Cloud CX** — actualmente en implantación en Línea Directa— con **Salesforce Financial Services Cloud**, unificando la experiencia del agente mediante un modelo de **arquitectura desacoplada pero profundamente integrada**.

En este enfoque, **Genesys Cloud CX** actúa como la plataforma omnicanal para la gestión completa de las interacciones (voz y chat), mientras que **Salesforce FSC** se consolida como el **sistema central de cliente y operación de servicio** (Policy 360, siniestros, agrupación de hogares, etc.).

La integración se habilita mediante el paquete gestionado **Genesys Cloud for Salesforce**, disponible en AppExchange, que incrusta el softphone de Genesys dentro de la consola de Salesforce y permite funcionalidades clave como **screen-pop automático**, consulta en tiempo real del cliente, y sincronización de estados del agente en ambas plataformas. El modelo asegura una **omnicanalidad unificada**, integrando presencia, enrutamiento y políticas de contacto mediante Genesys Architect, junto con **mapeo bidireccional de datos** e intercambio de inteligencia artificial entre ambas plataformas.

La integración predefinida reduce los cambios de aplicación, simplifica la operación y consolida CRM + CCaaS en un entorno único, optimizando la productividad del agente y elevando la personalización en cada interacción.

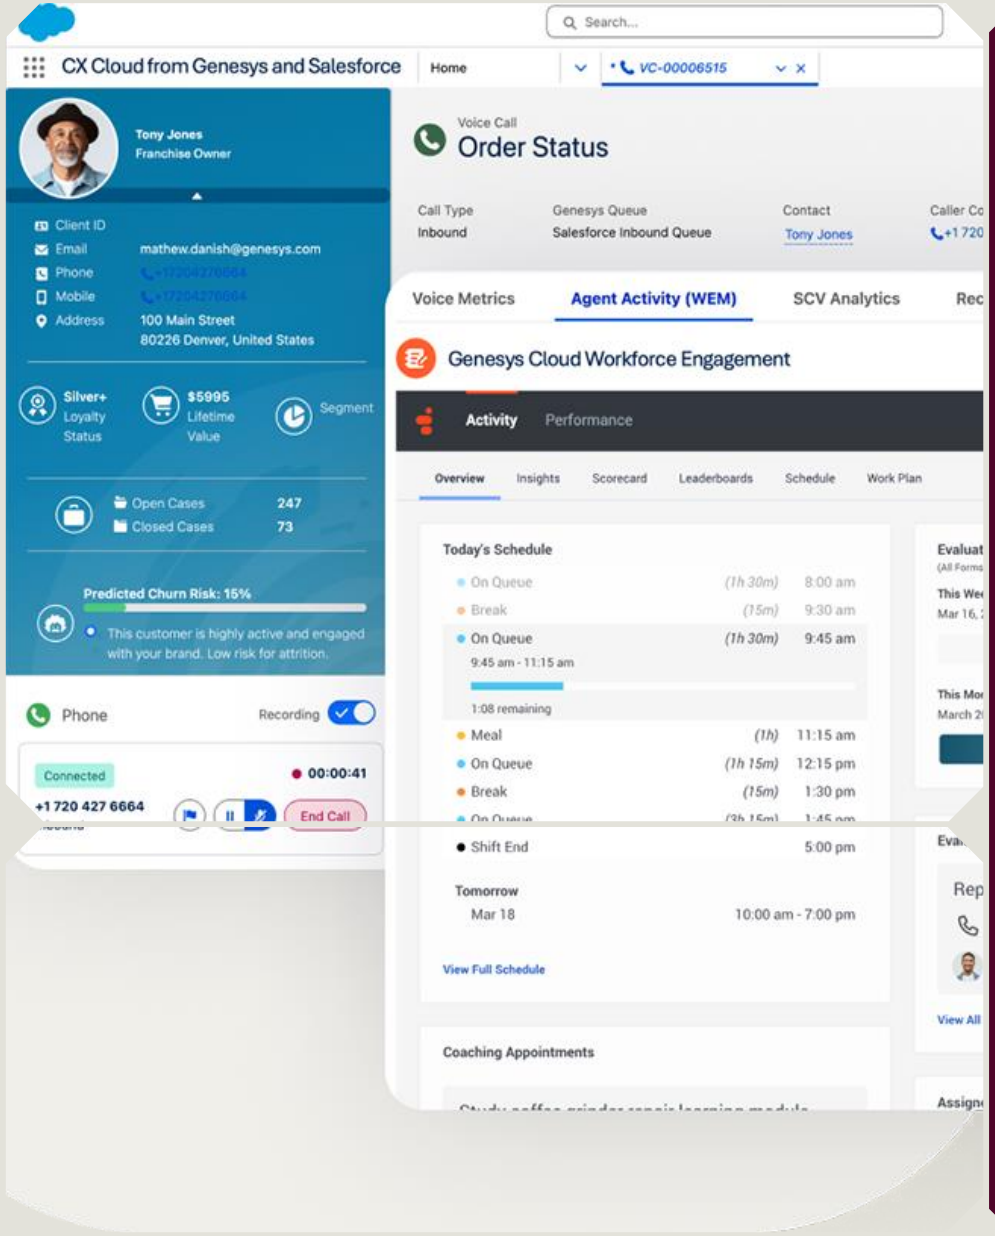

La integración de Salesforce y Genesys Cloud CX convierte el escritorio del agente en una máquina de eficiencia y personalización, unificando canales, datos y decisiones para ofrecer una atención más rápida, más inteligente y verdaderamente diferencial

Seguridad, cumplimiento y gobierno del dato

Seguridad de acceso e integración

Autenticacion y autorización:
- OAuth2 / JWT
- mTLS entre capas
- RBAC por entorno y rol

Protección de APIs:
- Rate limiting
- Throttling
- IP allow-list si aplica
- Protección del core (circuit breakers)

Seguridad en eventos (Kafka):
- TLS encryption in transit
- ACLs por topic
- Segregación por entorno (DEV/PRE/PRO)

Gobierno del dato y contratos

Modelo canónico versionado:
- Schema Registry
- Compatibilidad backward/forward
- Evolución controlada de eventos

Gestión de identificadores:
- External IDs en Salesforce
- Mapping legacy–CRM
- Trazabilidad de origen del dato

Calidad y consistencia:
- Idempotencia funcional
- Reconciliación periódica
- Control de duplicados

Cumplimiento y trazabilidad

Auditoría end-to-end:
- Trace-id correlado (API + evento)
- Logs estructurados

Observabilidad operativa:
- Métricas (latencia P95, error rate, throughput)
- Alertas proactivas

Cumplimiento normativo:
- Cifrado en tránsito y en reposo
- Principio de mínimos privilegios
- Segregación de entornos
- Cumplimiento RGPD (minimización y trazabilidad de datos personales)

Controles Transversales

- Gestión de secretos (vault / secure properties)
- Hardening de entornos
- Backups y retención de eventos
- Política de acceso por entorno

Justificación del modelo de seguridad y gobierno

Modelo de seguridad y gobierno integrado desde el diseño para proteger datos, contratos y accesos en entornos distribuidos

Qué problema resolvemos

- Integración de sistemas críticos que procesan datos sensibles (incluyendo datos personales).
- Necesidad de cumplir normativa (RGPD y auditoría interna).
- Riesgo de exposición del core mediante APIs y eventos.
- Necesidad de garantizar trazabilidad completa en entornos distribuidos.

Qué patrón aplicamos

- Seguridad multicapa (defensa en profundidad)
- Autenticación y autorización: OAuth2/JWT + mTLS
- Control de acceso granular (RBAC por entorno y rol)
- Protección de APIs (rate limiting, circuit breakers)
- Seguridad en eventos (TLS + ACLs por topic)
- Segregación estricta de entornos (DEV/PRE/PRO)

Qué garantías damos

- At-least-once delivery controlado (dedupe + idempotencia)
- Reintentos controlados + DLQ monitorizada
- Versionado de eventos y APIs (compatibilidad)
- Estándar común de errores (RFC7807)
- Observabilidad transversal

Qué riesgos mitigamos

- Accesos no autorizados o escalado de privilegios
- Exposición indebida de datos sensibles
- Incumplimiento normativo (RGPD, auditoría)
- Pérdida de trazabilidad en entornos distribuidos
- Evolución descontrolada de contratos de datos
- Deriva arquitectónica sin gobierno centralizado

Seguridad y gobierno integrados por diseño

- Seguridad transversal en APIs y eventos
- Gobierno del dato como activo estratégico

Observabilidad y monitorización

Visibilidad end-to-end del ecosistema Galgo–CRM

Trazabilidad técnica

- Trace-id correlado (API + evento)
- Logs estructurados
- Correlación entre sistemas
- Auditoría de cambios
- Tracking de eventos procesados

Métricas operativas

- Latencia (P95 / P99)
- Throughput de eventos
- Error rate
- Retries y DLQ
- SLA y SLO definidos

Monitorización proactiva

- Alertas automáticas
- Dashboards ejecutivos y técnicos
- Detección temprana de anomalías
- Monitorización de reconciliaciones
- Health checks continuos

Factores críticos de éxito

- Dynatrace / APM
- ELK / observabilidad logs
- Métricas Kafka (lag, offsets)
- Salesforce monitoring
- Integración con sistema corporativo de alertas

Justificación del modelo de observabilidad y monitorización

Visibilidad end-to-end para garantizar estabilidad operativa, detección temprana y control continuo del ecosistema Galgo–CRM

Qué problema resolvemos

- Falta de visibilidad transversal en arquitecturas distribuidas
- Dificultad para correlacionar incidencias entre APIs y eventos
- Detección tardía de degradaciones de rendimiento
- Falta de métricas objetivas para medir SLA/SLO
- Reprocesos manuales por ausencia de trazabilidad

Qué patrón aplicamos

- Observabilidad integrada desde el diseño (no reactiva)
- Correlación mediante trace-id común en APIs y eventos
- Logging estructurado y centralizado
- Métricas técnicas y de negocio monitorizadas
- Monitorización específica de Kafka (lag, offsets, DLQ)
- Dashboards diferenciados (técnicos y ejecutivos)

Qué garantías damos

- Trazabilidad completa end-to-end
- Detección temprana de anomalías
- Medición objetiva de latencia, throughput y error rate
- Monitorización activa de SLAs y SLOs
- Seguimiento de reconciliaciones y divergencias
- Auditoría continua de actividad y cambios

Qué riesgos mitigamos

- Fallos silenciosos no detectados
- Incidencias prolongadas por falta de diagnóstico
- Pérdida de eventos o desbordamiento de colas
- Incumplimiento de SLA sin visibilidad previa
- Escalada innecesaria por falta de contexto técnico
- Dependencia exclusiva de monitorización reactiva

Observabilidad como pilar operativo para garantizar resiliencia y mejora continua

- Permite anticipar problemas antes de impacto en negocio
- Facilita análisis forense y reducción de MTTR
- Proporciona métricas reales para gobierno del servicio

Modelo técnico integral – visión consolidada

Arquitectura industrializada que integra diseño, gobierno, operación y calidad bajo un modelo único de control

Qué problema resolvemos (visión global)

- Fallos en cascada por cambios no validados
- Rotura de contratos y pérdida de eventos
- Incumplimiento de SLA por falta de pruebas de carga
- Vulnerabilidades o degradación de rendimiento no detectadas
- Deriva arquitectónica entre entornos
- Falta de trazabilidad en ecosistemas distribuidos

Qué modelos consolidamos

Un modelo integral que combina:

- Arquitectura híbrida (event-driven + APIs)
- Gobierno del dato y contratos versionados
- Seguridad multicapa por diseño
- DevOps industrializado y promoción controlada
- Observabilidad end-to-end
- Calidad contínua integrada en el pipeline

Qué garantías aporta el modelo

- Consistencia bidireccional Galgo–CRM
- Protección del core y desacoplamiento evolutivo
- Trazabilidad completa (datos, APIs y eventos)
- Control de versiones y compatibilidad
- Validación técnica antes de cada release
- Operación medible con SLA/SLO definidos

Qué riesgos eliminamos estructuralmente

- Incidencias críticas en producción
- Pérdida de integridad del dato
- Dependencias ocultas entre componentes
- Degradaciones no detectadas
- Incumplimientos normativos o contractuales

Modelo técnico integral que convierte la integración en una capacidad industrial y gobernada

- Escalable sin rehacer arquitectura
- Operable con métricas objetivas
- Evolutivo sin impacto estructural
- Alineado con seguridad, gobierno y negocio

Cobertura de requisitos

5.4

MINSAIT

Cobertura de Requisitos

A continuación, se ofrece una respuesta clara y verificable a los requisitos funcionales y técnicos proporcionados por LDA en los documentos "Requisitos Funcionales CRM v2" y "Requisitos Técnicos CRM v1.1", priorizados mediante la metodología MoSCoW. Para cada requisito se especifica el grado de cumplimiento según la escala establecida.

OOTB	Funcionalidad nativa out-of-the-box en Salesforce FSC Insurance
Config	Configuración o parametrización declarativa sin código
Dev	Desarrollo o extensión sobre plataforma (Salesforce / MuleSoft)
AppEx	Componente o paquete de AppExchange certificado

Funcionalidades Generales del CRM

El núcleo funcional del CRM cubre los requisitos generales con un **90% de cobertura OOTB/Config**, minimizando desarrollos custom y asegurando mantenibilidad a largo plazo.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
FG-01	Interfaz única para el operador	OOTB	FSC Service Console con componentes Lightning embebidos
FG-02	Acceso multicanal	OOTB	Omni-Channel + Genesys CTI + chat + email-to-case + web-to-lead
FG-03	Búsqueda global multicriterio	Config	Global Search FSC + SOSL + FlexCard con lookup multicriterio
FG-04	Roles y perfiles granulares	OOTB	RBAC nativo: Profiles + Permission Sets + Permission Set Groups
FG-05	Dashboard personalizable por rol	OOTB	Lightning Home + Tableau CRM embebidos, diferenciados por perfil
FG-06	Gestión de tareas y actividades	OOTB	Task/Events nativos + Activity Timeline + automatizaciones Flow
FG-07	Insights para transcripciones	Config	Einstein Conversation Insights + Genesys transcripción + GPT
FG-08	Acceso a documentación	Config	Salesforce Files + DB2 Content Manager vía MuleSoft System API
FG-09	Generación de documentos	Config	Document Generation + plantillas Flow/Apex + almacenamiento Files
FG-10	Auditoría de acciones	OOTB	Event Monitoring + Field History Tracking + exportación a SIEM

Identificación y Ficha de Cliente 360º

La identificación y ficha 360º alcanza un **75% de cobertura OOTB/Config**. Los desarrollos se concentran en la replicación near-real-time y las consultas históricas a Galgo.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
IC-01	Identificación automática (screen-pop)	Config	Genesys screen-pop por ANI + OmniScript guiado si no coincidencia
IC-02	Vista 360º completa	OOTB	FlexCards + DataRaptors: datos FSC + réplica Galgo + Einstein NBA
IC-03	Pólizas y recibos en tiempo real	Dev	CDC/Kafka near-real-time + normalización ACORD + reconciliación
IC-04	Datos históricos del cliente	Dev	DataRaptor Extended → MuleSoft APIM. Históricos >3 años on-demand
IC-05	Creación/actualización de ficha	OOTB	Account/Person Account + Duplicate Management + sync bidireccional
IC-06	Cliente empresa con múltiples figuras	OOTB	Account + Contact Roles/Relationships + OmniScript alta guiada
IC-07	Gestión de consentimientos RGPD	OOTB	Privacy Center + Consent Management por canal
IC-08	Scoring de fidelización/cancelación	Config	Einstein NBA + modelos Lakehouse/CDP vía Salesforce Connect/MuleSoft

Gestión de Leads y Oportunidades

El dominio de leads y oportunidades presenta un **80% de cobertura OOTB/Config**, aprovechando al máximo las capacidades nativas de Salesforce para la gestión comercial.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
LO-01	Ingesta multicanal de leads	Config	Web-to-Lead + API Lead FSC + Walmeric vía MuleSoft System API
LO-02	Priorización automática por scoring	Config	Assignment Rules + Flow + Einstein. Score en Lead para colas
LO-03	Conversión lead → oportunidad	OOTB	Lead Convert estándar + mapeo Account/Contact/Opportunity + auditoría
LO-04	Pipeline y seguimiento	OOTB	Opportunity Management + dashboards CRM Analytics/Tableau
LO-05	Reportes avanzados comerciales	OOTB	Reports & Dashboards + CRM Analytics para KPIs, cohortes y embudos

Proceso de Cotización (OmniStudio + BRE)

La cotización es el dominio más extenso con 12 requisitos Must. El **50% de cobertura OOTB/Config** se explica porque la lógica de tarificación reside en Galgo; el desarrollo se concentra en Integration Procedures y conectores MuleSoft.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
COT-01	Inicio con precarga de datos	OOTB	OmniScript desde FlexCard + DataRaptor precarga Account
COT-02	Datos de riesgo dinámicos por ramo	OOTB	OmniScript con Conditional Views + Integration Proc. DGT/catastro
COT-03	Datos personales y figuras	OOTB	OmniScript + DataRaptor + validación NIF/NIE vía Integration Proc.
COT-04	Tarificación real-time Galgo	Dev	Integration Proc. → MuleSoft APIM → CTG → COBOL Galgo (<3s)
COT-05	Precios, coberturas y comparador	OOTB	OmniScript configurable + BRE recomendador + tabla comparativa
COT-06	Motor de descuentos/campañas	Config	BRE por campaña, canal y margen. Registro versionado
COT-07	Multicierre / cross-sell	Config	Einstein NBA + BRE + OmniScript con branching
COT-08	Guardado de borrador	OOTB	InsuranceQuote (draft) + reanudación desde FlexCard
COT-09	Cierre/emisión en Galgo	Dev	OmniScript → DataRaptor → MuleSoft → Galgo. Confirmación Kafka
COT-10	Firma digital embebida	Config	Logalty desde Flow/OmniScript. Documentos en Files + gestor doc.
COT-11	Seguimiento estado emisión	Config	Estados InsurancePolicy/Quote + eventos confirmación Kafka
COT-12	Reportes de cotización	OOTB	Dashboards conversión, tiempos, abandono, éxito por ramo/canal

Retención, Recobro y Gestión de Cartera

La retención y gestión de cartera alcanza un **67% de cobertura OOTB/Config**, con desarrollos orientados a la integración con pasarelas de pago y la sincronización de estados de recibos con Galgo.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
RET-01	Identificación proactiva riesgo cancelación	Config	Einstein NBA con modelos de propensión. Alertas por segmento en ficha 360º
RET-02	Flujo guiado de retención	Config	OmniScript + Knowledge Articles + BRE para contra-ofertas elegibles
RET-03	Recobro de recibos impagados	Dev	OmniScript + datos recibos vía Kafka + pasarela pagos + MuleSoft APIM
RET-04	Gestión Boomerang	Config	Campaign FSC + OmniScript + NBA para priorización y seguimiento
RET-05	Registro motivos cancelación/PNC	OOTB	Case tipo Cancelación + picklist normalizada + Flow → Galgo + reporting
RET-06	KPIs retención y supervisión	OOTB	Dashboards CRM Analytics/Tableau: retención, boomerang, TMO, NBO

Suplementos, Modificaciones y Fidelización

Los suplementos y la fidelización presentan un **50% de cobertura OOTB/Config**. Los desarrollos se centran en la escritura de modificaciones de póliza en Galgo y reglas de elegibilidad médica para Salud.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
SUP-01	Suplementos de póliza	Dev	OmniScript suplemento + BRE validaciones + escritura Galgo vía MuleSoft
SUP-02	Suplementos de salud	Dev	OmniScript Salud extendido + BRE reglas médicas + Galgo vía MuleSoft
SUP-03	Fidelización segmentada	Config	Campaigns + Einstein NBA + segmentación CDP/Lakehouse + MuleSoft APIs
SUP-04	Reportes suplementos/fidelización	OOTB	Dashboards: suplementos, motivos, impacto prima, conversión campañas

Reclamaciones, Encuestas y ATC

La atención al cliente y reclamaciones obtiene un **85% de cobertura OOTB/Config**, siendo el área con mayor madurez nativa en Salesforce FSC.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
ATC-01	Reclamaciones con plazos legales	OOTB	Case + SLA Management (Entitlement + Milestones). Alertas automáticas
ATC-02	Encuestas post-interacción	Config	Salesforce Surveys + envío multicanal (email/SMS/WhatsApp)
ATC-03	Incidencias y solicitudes	OOTB	Case Management + Omni-Channel + clasificación + macros + knowledge
ATC-04	Reporting reclamaciones	OOTB	Dashboards: volumen, tipologías, SLA, reincidencias, evolución

Arquitectura e Infraestructura

Los requisitos de arquitectura e infraestructura se cubren con un **71% de cobertura OOTB/Config**, con desarrollos focalizados en la integración bidireccional con Galgo y la conectividad analítica.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
IT-01	SaaS con alta disponibilidad ≥ 99,9%	OOTB	Salesforce Cloud — SLA 99,99% con failover automático
IT-02	Multi-tenant escalable 1.600+ usuarios	OOTB	Salesforce Hyperforce (AWS/GCP). Escalado automático
IT-03	Integración bidireccional con Galgo	Dev	CDC/Kafka + MuleSoft APIM REST. Diseño técnico + runbook + métricas
IT-04	API RESTful para terceros	OOTB	REST/SOAP/Bulk/Streaming API + OpenAPI + versionado MuleSoft
IT-05	Integración Genesys Cloud	Config	Genesys Cloud for Salesforce (AppExchange) + Open CTI
IT-06	Integración Lakehouse/CDP	Dev	Salesforce Connect + MuleSoft APIM + ingesta Tableau CRM
IT-07	Entornos DEV/QA/PRE/PROD	OOTB	Sandbox Standard + Salesforce DX + GitHub Actions CI/CD

Seguridad y Control de Acceso

La seguridad alcanza una cobertura del **100% OOTB**, demostrando la robustez nativa de la plataforma Salesforce para cumplir con los requisitos más exigentes del sector asegurador.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
SEC-01	MFA obligatorio	OOTB	Salesforce MFA a nivel org. TOTP, FIDO2, Salesforce Authenticator
SEC-02	SSO con directorio corporativo	OOTB	SAML 2.0 / OAuth 2.0 + provisionamiento automático desde LDAP
SEC-03	RBAC granular a nivel de campo	OOTB	Profiles + Permission Sets + FLS + Sharing Rules + OWD
SEC-04	Cifrado en reposo y tránsito	OOTB	TLS 1.2/1.3 + Shield Platform Encryption (BYOK) para NIF, IBAN, salud
SEC-05	Audit trail inmutable	OOTB	Shield Event Monitoring + Field Audit Trail (hasta 10 años) + SIEM
SEC-06	Timeout y bloqueo por inactividad	OOTB	Session Settings por perfil + revocación remota de sesiones
SEC-07	IP Allowlisting	OOTB	Login IP Ranges por perfil + MFA reforzado para excepciones

100% OOTB — La totalidad de los requisitos de seguridad y control de acceso se cubren con funcionalidad nativa de Salesforce, sin necesidad de desarrollo o componentes adicionales.

Integración y Conectores Especializados

La capa de integración es inherentemente "Dev" por la naturaleza del mainframe COBOL/CICS/DB2. La arquitectura CDC/Kafka + MuleSoft es el **patrón de mercado más robusto** para coexistencia y desacoplamiento. El resto de conectores reutiliza los mismos patrones base.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
INT-01	Event-driven Galgo → CRM (ACORD XML)	Dev	CDC → Kafka → MuleSoft Consumer → Platform Events. Payload ACORD TXLife
INT-02	Request/Reply CRM → Galgo (BIAN)	Dev	External Callout → MuleSoft APIM → CTG → COBOL/DB2. Ops BIAN
INT-03	Gestión errores con DLQ y alertas	Dev	DLQ Kafka + exponential backoff + ELK/Dynatrace + Anypoint Monitoring
INT-04	Reconciliación periódica FSC-Galgo	Dev	Batch nocturno checksums + informe discrepancias + resolución semiautomática
INT-05	Integración Logalty (firma digital)	Config	Named Credentials + Flow → API Logalty. Firma embebida en OmniScript
INT-06	Integración Walmeric (leads)	Dev	MuleSoft System API → Salesforce Lead API. Mapping ID Lead = ID Persona
INT-07	Integración Adobe Campaign/CDP	Dev	MuleSoft connector Adobe → FSC. Sync segmentos/campañas. Scope en Discovery
INT-08	Alineación ACORD Data Model	OOTB	FSC Insurance alineado con ACORD ADM. Artefacto: mapeo ACORD
INT-09	Alineación marco BIAN	Config	Service domains BIAN mapeados. Artefacto: documentación alineación

Rendimiento, Disponibilidad y Gestión de Errores

Los requisitos no funcionales se cubren con un **60% de cobertura OOTB/Config**, complementados con optimizaciones de integración y pruebas de carga exhaustivas previas al go-live.

ID	Requisito	Cobertura	Mecanismo
NFR-01	Respuesta pantalla < 3s	OOTB	Lightning Performance + caché datos referencia. Target: <2s sin call externo
NFR-02	Tarificación < 5s con Galgo	Dev	MuleSoft: caché selectiva, compresión, circuit breaker. Target: <3s normal
NFR-03	Disponibilidad ≥ 99,9%	OOTB	FSC SLA 99,99% + monitorización 24/7 + runbook de incidencias
NFR-04	1.600 usuarios concurrentes	OOTB	Stress testing pre-go-live (JMeter/Gatling). Validación límites API
NFR-05	Observabilidad completa	Config	ELK + Dynatrace + Salesforce Event Monitoring. Dashboard unificado

Notas Clave sobre la Cobertura

Aclaraciones importantes sobre los dominios con menor porcentaje OOTB/Config, que no implican riesgo sino la naturaleza inherente de la integración con sistemas legacy.

Cotización (50% OOTB/Config)

La lógica de tarificación reside en Galgo y requiere integración síncrona. El framework OmniStudio + BRE es OOTB/Config; el **desarrollo se concentra exclusivamente en Integration Procedures y conectores MuleSoft** hacia Galgo.

Integración (14% OOTB/Config)

La capa de integración es inherentemente "Dev" por la naturaleza del mainframe COBOL/CICS/DB2. La arquitectura CDC/Kafka + MuleSoft es el **patrón de mercado más robusto** para coexistencia. Todos los conectores reutilizan los mismos patrones base (API-led, reintentos, DLQ, observabilidad).

Estándares ACORD + BIAN (75%)

ACORD es mayoritariamente OOTB en FSC Insurance (modelo de datos alineado). BIAN requiere configuración y **documentación de mapeo entregada como artefacto del proyecto**. Ambos favorecen interoperabilidad futura y cumplimiento regulatorio.

Recomendación de Licencias

Product Name	Unidades	Observaciones
Financials Service Cloud (Incluido OmniStudio)	1900	Plataforma Vertical de Salesforce diseñada específicamente para entidades financieras y aseguradoras (Incluye OmniStudio es un conjunto de herramientas low-code diseñado para crear procesos guiados complejos y experiencias digitales dinámicas)
Experience Cloud	100	Experience Cloud permite crear portales y comunidades digitales para clientes, partners o mediadores.
Agentforce AI		Plataforma de inteligencia artificial de Salesforce que permite incorporar **agentes inteligentes y automatización basada en IA** en los procesos de negocio
Salesforce Shield	NA	Conjunto de herramientas de seguridad avanzada que garantiza el cumplimiento normativo y la protección de los datos dentro de Salesforce.
Salesforce Backup & Restore	NA	Servicio nativo de Salesforce que permite realizar **copias de seguridad automáticas y recuperación de datos de la plataforma**, garantizando la continuidad operativa y la protección frente a pérdida accidental o corrupción de datos.
Data Cloud (Provisioning)	NA	Data Cloud es la plataforma de gestión de datos de cliente en tiempo real de Salesforce. Necesiario la provisión de Data Cloud para la utilización de Agentforce.
Flex Credits	En función de los casos de Uso	Modelo de consumo flexible de Salesforce para utilizar capacidades avanzadas de la plataforma, especialmente relacionadas con **inteligencia artificial, automatización y procesamiento de datos**.
Service Cloud Voice – Partner Telephony **CX Cloud from Genesys and Salesforce** **Digitla Engagement**		Paquetes para realizar la integración entre Genesys & Salesforce.
Data & File Storage		Almacenamiento

Plan de trabajo

06



MINSAIT

Análisis funcional y de impacto para definir los bloques de implantación

La propuesta de implantación que presentamos no parte únicamente de una secuencia técnica de construcción, sino de un análisis profundo de los procesos que se desean trasladar a la nueva plataforma y de los colectivos de usuarios impactados por cada uno de ellos. **Desde el inicio, nuestra perspectiva ha sido entender no solo qué procesos deben transformarse, sino quiénes los ejecutan, cómo interactúan entre sí y qué grado de cambio operativo implica cada bloque funcional.**

A partir de este análisis hemos realizado un **mapeo de procesos frente a grupos de usuarios, identificando el nivel de impacto organizativo en cada caso**. Este ejercicio nos ha permitido agrupar las fases propuestas por go-lives desde el punto de vista funcional como desde la adopción, agrupando procesos que comparten perfiles afectados y lógica operativa, y evitando introducir cambios simultáneos excesivos en distintos colectivos. A continuación, se muestra una imagen que sintetiza estas conclusiones:

Mapeo de procesos identificados con grupos de usuarios

	COMERCIAL					CARTERA				SINIESTROS	
	Multiramo (Hogar + Motor + mascota + antiokupa)	Expats multiramo	Salud	Empresas motor	Empresas multiriesgo	Retención	Digitalización y eficiencia	Venta Cartera	Salud	Motor	Hogar y multirriesgo
Integración de la telefonía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agenda comercial	X	X	X	X	X						
Cotización Hogar	X										
Cotización Coche	X										
Cotización Moto	X										
Proceso de verificación	X										
Documentación pendiente	X										
Expats		X									
Suplementos								X			
Upselling & Cross-selling								X			
Recibos y pagos, recobro						X	X				
Retención						X					
Salud			X						X		
Empresas				X	X	X	X	X			
Fidelización							X				
Atención al cliente							X			X	X
Chat							X				

Propuesta de estrategia de implantación

VALOR AÑADIDO

A partir de las fases indicadas por LDA, los requisitos identificados, los perfiles implicados en cada etapa y nuestro conocimiento de los procesos de línea directa, proponemos una estrategia de implantación progresiva orientada a optimizar costes, generar sinergias y minimizar el impacto en los usuarios. Esta aproximación nos permite estructurar **seis go-lives** coherentes desde el punto de vista funcional, donde cada una incorpora las diferentes fases identificadas por LDA.

El enfoque adoptado no responde únicamente a un criterio técnico, sino a una visión integral de transformación organizativa. Hemos agrupado los distintos despliegues con el objetivo de reducir al mínimo los cambios simultáneos en operativa y herramientas, garantizando que los usuarios experimenten el menor número posible de transiciones. De esta forma, se optimizan tiempos, recursos y costes, al tiempo que se facilita la adopción y se reduce el riesgo operativo.

Go-live 1 MVP Operativo	Ficha de cliente Agenda comercial Llamadas de teléfono Genesys Generación de leads por Walmeric
Go-live 2 Transformación del ciclo comercial multiramo	Framework de cotización multiramo • Hogar • Moto • Coche • Antiokupa • Mascota • Patines/ • Bicicletas Next Best Offer
Go-live 3 Gestión postventa	Suplementos (Hogar + Motor) Expats Upselling & Cross-selling Proceso de retención (Hogar + Motor) Recibos, pagos y recobros Cancelación & PNC
Go-live 4 Transformación integral de Salud	Framework de cotización (Salud) Suplementos(Salud) Upselling (Salud) Valoración médica Recibos, pagos y recobros (Salud)
Go-live 5 Modelo comercial Empresas	Empresas
Go-live 6 Fidelización y Omnicanalidad conversacional	Chat Atención al cliente y fidelización

Propuesta de estrategia de implantación

- Go-live 1: MVP Operativo
- Go-live 2: Transformación del ciclo comercial multiramo
- Go-live 3: Gestión postventa y fidelización
- Go-live 4: Transformación integral de Salud
- Go-live 5: Modelo comercial Empresas
- Go-live 6: Fidelización y Omnicanalidad conversacional

MVP alineado con Genesys

El primer Go-live se plantea como un punto de **arranque controlado y estratégico**. El objetivo principal es garantizar que la organización disponga de una solución operativa **alineada con el go-live de Genesys**, sin generar rupturas en la operativa diaria de los equipos comerciales. En esta Go-live se construye una base sólida: una ficha mínima de cliente que consolida información personal e interacciones, la integración completa con la CTI de Genesys para permitir la gestión de llamadas desde CRM y la incorporación de un espacio de trabajo comercial estructurado que facilite el seguimiento y la proactividad.

Con el fin de reducir riesgos, el proceso de cotización de Galgo no se reconstruye inicialmente, sino que se embebe dentro del CRM. Esta decisión permite mantener intacto un proceso crítico mientras los usuarios se familiarizan con la nueva herramienta, garantizando una única pantalla de trabajo sin comprometer la estabilidad del negocio. Este Go-live representa el mínimo viable necesario para iniciar la transformación sin afectar a la continuidad operativa.

Propuesta de estrategia de implantación

- Go-live 1: MVP Operativo
- Go-live 2: Transformación del ciclo comercial multiramo
- Go-live 3: Gestión postventa y fidelización
- Go-live 4: Transformación integral de Salud
- Go-live 5: Modelo comercial Empresas
- Go-live 6: Fidelización y Omnicanalidad conversacional

Implantación de la cotización de ramos principales (excepto Salud)

El go-live 2 **unifica en un único go-live la fase 2, 3 y 4 propuesta por LDA.** Este go-live implica la implantación de los ramos de cotización: Hogar, Moto, Coche, incorporando además ramos que no estaban contemplados inicialmente en la RFP, como Mascota y Antiokupa, porque forman parte real de la operativa diaria de LDA y resultan críticos para evitar disrupciones en los equipos.

Agrupar todos los ramos en una única liberación evita que el mismo colectivo —responsable de cotizar cualquier producto— tenga que operar temporalmente en dos sistemas distintos, reduciendo fricción, complejidad y riesgo operativo, y simplificando tanto la adopción como la arquitectura técnica. Además, integrar desde esta fase la gestión documental y la verificación garantiza un proceso end-to-end completo, sin dejar bloques críticos para fases posteriores. **Agruparlos permite una transición más limpia, simple y eficiente**, **manteniendo una experiencia homogénea para el usuario y reduciendo al mínimo el impacto organizativo**.

Opcionalmente, para reforzar la estabilidad, se contempla opcionalmente realizar un piloto inicial con un grupo reducido de usuarios, validando rendimiento y usabilidad en entorno real antes de extender la solución al resto del colectivo, disminuyendo riesgos y acelerando la adopción.*

* Fuera del alcance de la propuesta actual

Propuesta de estrategia de implantación

- Go-live 1: MVP Operativo
- Go-live 2: Transformación del ciclo comercial multiramo
- Go-live 3: Gestión postventa y fidelización
- Go-live 4: Transformación integral de Salud
- Go-live 5: Modelo comercial Empresas
- Go-live 6: Fidelización y Omnicanalidad conversacional

Gestión postventa

El go-live 3 de nuevo agrupa en un único go-live todas las capacidades complementarias al proceso de cotización —correspondientes a las fases 5 y 6 de LDA — porque consideramos que deben desplegarse de forma conjunta para maximizar eficiencia y acelerar la entrega de valor. Aunque los equipos afectados son distintos en cada fase, **este enfoque permite optimizar el rendimiento del equipo técnico**, evitando fragmentar desarrollos que están estrechamente vinculados desde un punto de vista funcional y operativo. Al integrar en una misma liberación procesos como suplementos, expats, retención, cancelaciones, PNC, recibos, pagos, recobros y mecanismos de upselling y cross-selling, **se completa de manera coherente el ciclo de vida posterior a la cotización, evitando dependencias innecesarias entre fases y reduciendo significativamente los tiempos hasta la obtención de beneficios tangibles**. Esta agrupación garantiza que la plataforma evolucione de forma sólida y alineada, ofreciendo a los usuarios un conjunto de funcionalidades completo y bien orquestado, sin dilatar en el tiempo la disponibilidad de capacidades críticas para la operación diaria.

Propuesta de estrategia de implantación

Go-live 1:
MVP Operativo

Go-live 2:
Transformación del ciclo comercial multiramo

Go-live 3:
Gestión postventa y fidelización

Go-live 4:
Transformación integral de Salud

Go-live 5:
Modelo comercial Empresas

Go-live 6:
Fidelización y Omnicanalidad conversacional

Los go-lives 4, 5 y 6 se gestionan como despliegues totalmente independientes porque cada uno aborda ámbitos funcionales altamente especializados, sin dependencias relevantes entre sí ni con las fases previas. Esta separación permite tratar cada bloque con la profundidad técnica necesaria, reducir riesgos y evitar condicionantes de secuenciación, dado que se trata de funcionalidades completamente distintas en naturaleza, usuarios impactados y lógica operativa. Al no existir solapamientos ni puntos críticos de integración, cada go-live puede planificarse, construirse y desplegarse de forma autónoma, optimizando el trabajo de los equipos y garantizando una implantación más limpia, estable y controlada.

Transformación integral del ramo Salud

Despliega de forma independiente toda la funcionalidad específica del ramo Salud (cotización, valoración médica, suplementos y cobros específicos), la fase 7 propuesta, tratándose como un dominio autónomo por su complejidad.

Modelo comercial Empresas

Incluye el proceso comercial y de cotización de Empresas incluido en la fase 8, gestionado como un bloque separado debido a la lógica de negocio completamente distinta y la independencia funcional respecto al negocio particular.


Omnicanalidad conversacional, Atención al cliente y Fidelización

En esta fase se implementa de forma íntegra el nuevo módulo de atención al cliente, incluyendo chat conversacional, gestión de consultas, fidelización y flujos de servicio, fase 9 propuesta. Se libera en una única fase porque toda la operativa de atención es funcionalmente autónoma y no interfiere con la parte comercial.

Plan de implementación a alto nivel

El proyecto se plantea en 18 meses con 9 fases secuenciales solapadas, un Discovery inicial de 3 meses con refinamientos continuos por fase, y bloques de trabajo transversales de Gobierno y Change Management activos desde el inicio.

Cada fase entrega valor incremental al negocio con un Go-Live parcial, que podemos decidir agrupar para facilitar la adopción por parte de los usuarios, arrancando por la Ficha Cliente y la gestión de la Agenda y cerrando con la Omnicanalidad completa.

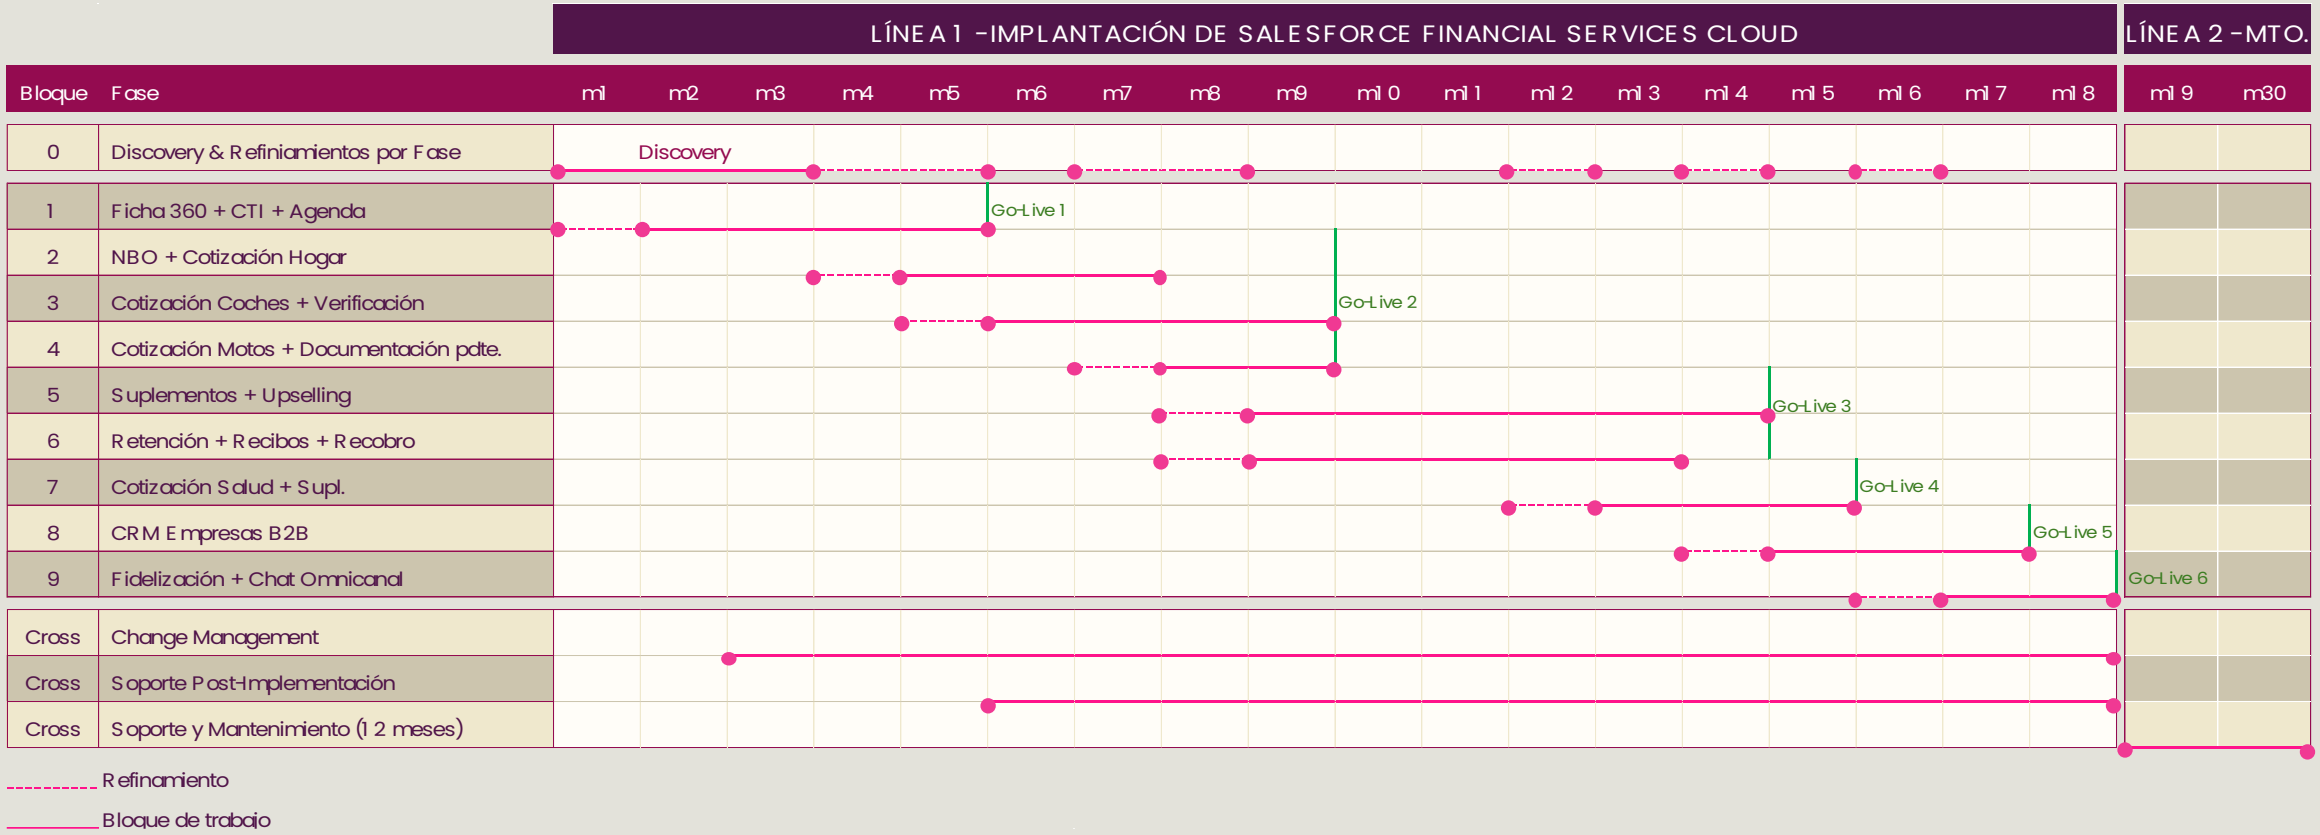

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
D1	Backlog de Historias de Usuario	Jira / Confluence	Alimentado sprint a sprint. Disponible desde el inicio de P&D.	DISCOVERY & UX
D2	Informe de Planning & Design por proceso	Word + PDF + Diagramas	Previo al inicio de desarrollo de cada proceso.	
D3	Acta de Entrega P&D firmada por proceso	Word firmado / PDF	Al cierre de cada proceso de P&D.	
I1	Documento de Arquitectura de Solución	Word / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	IMPLEMENTACIÓN CRM
I2	Solución Salesforce FSC configurada y desplegada	Org Salesforce (producción)	Go-live de cada fase.	
I3	Documentación técnica de configuración	Confluence / Word	Previo al go-live de cada release	
I4	Catálogo de objetos y campos	Excel	Previo al go-live de cada release	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
I5	Ficha técnica por Historia de Usuario compleja	Word / Confluence	Al completar cada HU de alto impacto en el sprint.	IMPLEMENTACIÓN CRM
I6	Diccionario de Datos	Excel	Primera entrega en P&D. Actualizado en cada fase que incorpore nuevas entidades.	
I7	Pasos Manuales de Despliegue por release	PDF	Previo al go-live de cada release.	
I8	Pipeline DevOps y modelo de ramas	PDF + Diagrama	Sprint 0 / Inicio del proyecto.	
Q1	Plan de Pruebas por fase	Word / PDF	Inicio de cada ciclo de QA.	QA Pruebas Internas
Q2	Casos de Prueba	Excel / Zephyr	Previo a la ejecución de QA de cada fase.	
Q3	Reporte de Bugs — ambiente QA	Excel	Al finalizar cada ciclo de QA interno.	
Q3	Informe de Resultados QA	Word / PDF	Cierre de QA interno, previo al inicio de UAT.	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
U1	Plan de UAT	Word / PDF	Previo al inicio de UAT de cada fase.	UAT
U2	Acta de Aceptación UAT	Word firmado / PDF	Al cierre de UAT, previo al go-live de cada fase.	UAT
S1	Manual de Administrador Salesforce	Word / PDF	Primera entrega al go-live de F1. Actualizado al cierre de cada fase.	Soporte Post Go-Live Transferencia CoE
S2	Guía de Usuario por Perfil	Word / PDF	Primera entrega al go-live de F1. Actualizado al cierre de cada fase.	Soporte Post Go-Live Transferencia CoE
S1	Exportación completa del Backlog	CSV / Excel / PDF	Cierre del proyecto.	Cierre Proyecto
S2	Presentación de Cierre del Proyecto	PPT / PDF	Cierre del proyecto.	Cierre Proyecto

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
C1	Mapa de stakeholders / audiencias impactadas por release	PPT / PDF	Assessment inicial de Gestión del Cambio (en mes 3)	Asesssment inicial de Gestión del cambio
C2	Diseño del plan de comunicación, plan de formaciones, y, plan de adopción para cada grupo de usuario por release *(preliminar)*	PPT / PDF	Assessment inicial de Gestión del Cambio (en mes 3)	
C3	Propuesta de KPIs y métricas de seguimiento del cambio y metodología para el refuerzo *(preliminar)*	PPT / PDF	Assessment inicial de Gestión del Cambio (en mes 3)	
C4	Refinamiento y aterrizaje del plan concreto de “C2“ (comunicaciones, formaciones y adopción)	PPT / PDF	Preparación de Gestión del cambio de cada una de las releases (mín. 1 mes previo a GO Live)	Gestión del cambio ligada a cada release
C5	Materiales para la realización de comunicaciones y formaciones	Word / PPT / PDF / Videos / etc.	Preparación de Gestión del cambio de cada una de las releases (mín. 1 mes previo a GO Live)	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
C6	Ejecución del plan de comunicación y de formación	Correo / presencial / videos / píldoras, etc. (según acordado)	Ejecución de Gestión del cambio de cada una de las releases (de forma previa a GO Live)	Gestión del cambio ligada a cada release
C7	Desarrollo de encuestas de feedback y lanzamiento	Correo / Forms	Ejecución de Gestión del cambio de cada una de las releases (de forma previa a GO Live)	
C8	Ejecución de acciones de refuerzo	Correo / presencial / videos / píldoras, etc. (según acordado)	Ejecución de Gestión del cambio de cada una de las releases (de forma previa a GO Live)	
C9	Indicadores de seguimiento y cuadros de mando de la adopción, alineado con “C3”	Excel / PPT / PDF	Ejecución de Gestión del cambio de cada una de las releases (de forma previa a GO Live)	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
M1	Modelo de Despliegue: Diagrama de arquitectura identificando las comunicaciones con los diferentes sistemas involucrados en el proyecto	PPT / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	Integration Mulesoft
M2	Arquitectura de Seguridad de las APIs: Conjunto de políticas de seguridad aplicables.	Word / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	
M3	Guía de diseño API: Documento recogiendo las mejores prácticas en el diseño de APIs incluyendo: Versionado de aplicaciones Convención de nomenclatura de aplicaciones Servicios comunes - Gestión de errores, Gestión de datos de referencia, Gestión de configuración.	Word / PDF	Assessment inicial de Gestión del Cambio (en mes 3)	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
M4	Ciclo de vida APIs: Definición de los estados por los que puede transitar una API durante su ciclo de vida en el proyecto	Word / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	Integration Mulesoft
M5	Diagrama API-Led Connectivity definitivo	PPT / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	
M6	Diseño técnico de los flujos de integración a implementa incluyendo subconjunto de API-Led involucrado	Word / PDF	Previo al inicio del desarrollo de cada fase	Gestión del cambio ligada a cada release
M7	Documentación técnica de las APIs	API Exchange	Go-live de cada fase.	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Resumen de los entregables previstos por parte de Minsait

ENTREGABLE MINSAIT

	ENTREGABLE	FORMATO	MOMENTO ENTREGA	
D1	Análisis Migración y Data Mapping	word / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	Migración
D2	Estrategia de Migración	PPT / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	
D3	Plan de pruebas	Excel	Previo a la ejecución de QA de cada fase.	
D4	Runbook o plan de ejecución	PPT / PDF	Primera entrega en fase P&D. Actualizado al cierre de cada fase.	
D5	Informe del resultado de la migración	Excel	Informe después de cada migración	

La lista de entregables se ha elaborado de conformidad con los términos y condiciones de la solicitud de propuestas y la metodología propuesta, garantizando su alineación con los objetivos y necesidades identificados del proyecto

Planteamiento de proyecto

6.1

MINSAIT

Workstreams de trabajo

El planteamiento del proyecto se basa en una estructura modular organizada en distintos workstreams que permiten abordar de forma ordenada y multidisciplinar todas las actividades necesarias para la implantación del CRM. Cada workstream agrupa un conjunto coherente de tareas y se integra dentro de una metodología iterativa que facilita avances continuos y entregables parciales. Algunas de estas áreas, como Gestión del Cambio, Soporte o los trabajos de Discovery inicial, se desarrollan en detalle en secciones específicas del documento, pero se representan aquí porque forman parte del planteamiento global del proyecto y su coordinación. **Esta visión conjunta permite entender cómo se articulan todas las actividades a lo largo de la ejecución del proyecto y cómo se garantiza su alineación con los objetivos del cliente**.

1 Diseño del nuevo CRM

- Revisar con LDA los procesos comerciales y de atención y los criterios de aplicación para cada uno de ellos
- Evaluar un posible rediseño de ciertos procesos comerciales
- Definir las pantallas de UX necesarias para cada uno de los procesos
- Definir una estrategia de migración de datos que se adapte mejor a las necesidades y objetivos de LDA

Discovery + Definición + UX

2 Despliegue de la Solución tecnológica

- Realizar actividades de migración de datos, alineadas con la estrategia de migración de datos
- Ofrecer una solución Salesforce FSC mediante un enfoque de implementación estructurado e iterativo, alineado con el principio “Adaptado al estándar“.
- Diseñar, desarrollar e implementar informes, asegurando KPIs estandarizados, datos de alta calidad y conocimientos accionables que apoyen la toma de decisiones efectiva en todo el proyecto

Implementación de la solución

Pruebas y Calidad

Migración de datos

Soporte post-implantación

3 Asegurar la adopción del cambio

- Asegurar la correcta adopción y despliegue de la solución mediante la Gestión del Cambio
- Proporcionar formación en cada grupo de usuarios para garantizar el conocimiento completo de la nueva herramienta
- Garantizar la transferencia de conocimientos a los equipos LDA que utilizarán y mantendrán la nueva plataforma de CRM

Gestión del Cambio y Formación

Se encuentra detallada en la sección *07. Gestión del Cambio y Adopción*

Se encuentra detallado en la sección *11. Modelo de soporte técnico*

VALOR AÑADIDO

Para ejecutar estos workstreams, disponemos de un marco de trabajo basado en la visió de procesos y funciones dentro de un Plan de Transformación, con el fin de garantizar la gestión efectiva de la Transformación IT.



Nuestro framework es escalable y adaptable a las necesidades específicas de cada momento y según el grado de madurez o ambición de LDA (en cuanto a funciones de gobierno de la transformación)

De cara al abordaje del proyecto de CRM, y basado en el análisis del assessment, desde Minsait recomendamos varios factores a tener en cuenta para garantizar su éxito global

VALOR AÑADIDO

1.

Instaurar gobierno y asegurar dedicaciones

- Disponer de un **gobierno integral** que involucre con **altos niveles de dedicación a los equipos de CRM, negocio, procesos, tecnología, usuarios y soporte**. El CRM conlleva una transformación operativa y cultural que requiere alineamiento de todos los actores clave

2.

Acotar los requisitos

- Realizar una **revisión de la priorización de los requisitos "must"**, evitando que sea una "lista de deseos" y **aterrizando su definición en historias de usuarios**. Evitar definiciones genéricas de los requisitos facilitará el entendimiento correcto del alcance y **facilitará una licitación** eficaz y realista

3.

Alinear y coordinar la transformación global

- Velar porque las **iniciativas que tienen impacto directo sobre la implantación del CRM se ejecuten en tiempo y forma, asegurando la disponibilidad para evitar replanificaciones o retrabajos** (como el mapa de contactos actualizado, la evolución del Contact Center a una solución Cloud, implantación CDP, entre otros)

4.

Despliegue gradual de funciones y usuarios

- **Desplegar las funcionalidades CRM de forma progresiva con fases controladas**, y un plan de **ramp-up de usuarios,** comenzando **con pilotos funcionales** y validando resultados antes de escalar. **Evitar implantaciones masivas** sin estabilización previa que puedan comprometer la operación o la adopción

5.

Evitar la hiper-personalización

- **Adaptar la organización / procesos a la solución y no al revés**, para aprovechar al máximo la **adherencia al estándar** y evitar tener una herramienta hiperpersonalizada que conllevaría mayores costes de mantenimiento y mayor time to market de las actualizaciones en funcionalidades

6.

No subestimar el cambio y formar "champions"

- Diseñar un **plan de formación y acompañamiento con "champions" internos**, que facilite la adopción, el handover **y minimice resistencias. Monitorizar la transición** para detectar bloqueos o ajustes necesarios, asegurando una adopción fluida y sostenible del nuevo modelo de trabajo

Fuente: análisis Minsait

Implementación de la solución

6.1.1

DISCOVERY + DEFINICIÓN +UX | IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN | MIGRACIÓN DE DATOS | PRUEBAS Y CALIDAD

Esta línea de trabajo se estructura en 3 fases secuenciales e iterativas a fin de transformar los requisitos funcionales en artefactos accionables para implantar

Enfoque metodológico

Se plantean **3 fases secuenciales** que garantizan la **trazabilidad completa desde el requisito funcional hasta la experiencia de usuario validada**

Cada fase genera entregables que alimentan la siguiente, asegurando que no se pierde información crítica en la transición y que cada decisión es aprobada por los interlocutores de LDA.

El objetivo es **maximizar el aprovechamiento de las capacidades estándar de la solución CRM**, evitando personalizaciones innecesarias y proponiendo, cuando proceda, reenfoque de procesos que simplifiquen la implementación sin perder valor funcional

Fases	1. Discovery de requisitos	2. Definición de historias de usuario	3. Diseño UX y prototipados
Actividades	• **Análisis documental inicial**: Revisión de requisitos antes de su validación con negocio *(en RFQ, propuesta previa)* • **Sesiones de inmersión por dominio**: Validación guiada de requisitos y confirmación de flujos E2E, reglas, etc. • **Gap analysis y reglas de negocio**: Evaluación frente al estándar CRM para maximizar configuración OOTB • **Consolidación y validación**: Formalización de clasificación funcional y validación como base para historias de usuario	• **Descomposición inicial**: Traducción de requisitos en historias de usuario manteniendo traza con el origen • **Definición de reglas de negocio y criterios de aceptación:** formalización de validaciones y escenarios Given-When-Then • **Refinamiento colaborativo y Definition of Ready**: Sesiones iterativas con Product Owners de alineamiento • **Análisis de dependencias y priorización :** Identificación de impactos cruzados, y ordenación del backlog	• **Definición de flujos de interacción**: Traducción de historias en flujos E2E y arquitectura de información • **Diseño HI FI en CRM (o Figma)**: Creación de pantallas alineadas con historias y criterios de aceptación (campos, validaciones, estados, mensajes) • **Prototipado navegable:** Simulación interactiva de flujos principales. • **Validación de stakeholders y usuarios**: visión funcional y de usabilidad / experiencia
Entregables	• Matriz de requisitos final • Catálogo de reglas de negocio • Procesos validados E2E • Backlog preliminar cualificado	• Historias de usuario completas, y priorizadas (alineado a fases de implantación) • Matriz dependencias e impactos	• Diseño HI FI / prototipos navegables • Diseño visual aprobado (blueprint UX)

← 4 semanas por *release* (previas al inicio del desarrollo) →

VALOR AÑADIDO MINSAIT

El assessment realizado en 2025 sirve como acelerador. Se ejecutará esta línea de trabajo de forma previa a cada release de desarrollo (no como ejercicio one-shot)

Durante el Discovery aseguraremos que los requisitos son una base sólida validada por interlocutores de LDA previamente a definir las historias de usuario

Discovery de requisitos (1/2) – Actividades

Más detalle a continuación

1. Análisis documental inicial

- **Revisión** completa de los **requisitos** existentes
- **Clasificación por proceso** / módulo / tipología funcional
- **Identificación de inconsistencias** y ambigüedades
- Identificación preliminar de **dependencias inter-proceso**

2. Sesiones de Inmersión por Dominio

- **Validación guiada** requisito a requisito
- Confirmación de **flujo E2E y reglas de negocio**
- Identificación / confirmación de **excepciones y dependencias**
- Registro estructurado de **decisiones y puntos abiertos**

Técnicas estructurales aplicadas:

- Example Mapping (formalización de reglas implícitas)
- Kanban (trazabilidad por requisito)
- Process Mapping AS-IS vs TO-BE

3. Gap Analysis y Reglas de Negocio

- **Gap análisis vs. estándar CRM**: Cubierto por estándar (configuración); requiere parametrización avanzada o requiere desarrollo específico *(confirmación tras primer análisis realizado en RFQ)*
- **Evaluación sistemática frente a estándar CRM** para maximizar configuración sobre desarrollo
- **Identificación estructurada de gaps funcionales** (log de gaps), conflictos entre requisitos (reglas contradictorias entre procesos), **matriz de dependencias, reglas de negocio** implícitas no documentadas y asignación de responsables

4. Consolidación y Validación

- **Clasificación por complejidad y cobertura estándar**
- **Consolidación de reglas de negocio** por dominio
- **Validación formal** del entendimiento común (sign-off)
- **Base estructurada para construcción de historias de usuario**

Output esperado

- Matriz de requisitos final
- Catálogo consolidado de reglas de negocio
- Procesos validados E2E (principales y alternativos)
- Backlog preliminar cualificado

Durante el proceso de RFQ se ha realizado un análisis profundo de requisitos que acelera el discovery, sin embargo, que es necesario asegurar su entendimiento completo y realizar un análisis de dependencias para que las historias de usuario puedan ser correctamente definidas

Las sesiones de inmersión nos facilitarán el entendimiento de requisitos y a asegurar los flujos de los procesos

Discovery de requisitos (2/2) – Dinámica de sesiones de inmersión

Objetivo

- Recorrer cada bloque de requisitos, resolver dudas de interpretación y confirmar prioridades, donde Minsait presenta interpretación y negocio valida, corrige o amplía
- Validación de alcance

Organización de sesiones

- Workshops de 2–3 horas máx
- Máximo 8 participantes (áreas de negocio, tecnología y transformación / procesos)
- Agrupación por dominio funcional
- Participación de Product Owners y expertos de proceso

Ejemplo de dinámica estructurada de cada sesión

0. Previo a la sesión

- El equipo de **Minsait envía con 48 horas de antelación un documento de preguntas específicas sobre los requisitos** a tratar para que Línea Directa puedan preparar las respuestas y convocar a los expertos adecuados

1. Contexto

- Presentación del dominio
- **Walkthrough de la interpretación del requisito**, donde Minsait presenta interpretación y LDA valida, corrige o amplía
- **Validación de alcance**

2. Profundización

- Revisión **requisito a requisito**
- Identificación de: reglas de negocio, casos estándar, excepciones y casos límite, dependencias, roles implicados, volumetrías estimadas, flujos alternativos, integraciones, etc.

3. Deep dive funcional

- **Revisión integral del proceso**
- Planteamiento de **escenarios alternativos en caso de identificaci potencial optimización**
- Validación de flujo E2E

4. Cierre

- Resumen de **decisiones**
- Registro de **puntos abiertos**
- Asignación de **responsables y fechas**
- Confirmación de **próximos pasos**

Técnicas estructurales utilizadas

Se recorre cada requisito aplicando ***example mapping*** para transformar requisitos abstractos en escenarios concretos con: se identifican las reglas de negocio (en tarjetas azules), los ejemplos concretos que las ilustran (tarjetas verdes), las excepciones o casos límite (tarjetas rojas) y las preguntas abiertas (tarjetas amarillas). Este método garantiza que no se queden reglas implícitas sin documentar.

Se emplea **Kanban como tablero de seguimiento**, moviendo cada requisito por los estados: *Por revisar → En discusión → Validado → Requiere ampliación*

Process Mapping

- AS-IS vs TO-BE
- Visualización de flujos simplificados

En esta fase traducimos requisitos a historias de usuario completas, atómicas y priorizadas para que los equipos técnicos puedan implantar sin ambigüedades

Definición de historias de usuario (1/3) – Actividades

1.

Descomposición inicial

- Cada **requisito del Discovery se descompone en una o varias historias de usuario** siguiendo el formato (manteniendo siempre la trazabilidad al requisito origen): ***«Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]»*.**
- La descomposición se guía por el principio **INVEST:** Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Small, Testable
- Los **requisitos complejos se fragmentan en historias más pequeñas vinculadas por épicas**, manteniendo siempre la trazabilidad al requisito origen.



2.

Definición de criterios de aceptación

- Para cada historia se definen **criterios de aceptación detallados en formato Given-When-Then**, que incorporarán las **reglas de negocio específicas** del sector (condiciones de póliza, excepciones regulatorias, validaciones de datos, etc.)
- Cada **criterio será verificable de forma objetiva**, elimina interpretaciones en desarrollo y permite su uso directo en pruebas de aceptación
- Se incluirán tanto los **escenarios de éxito (happy path) como los escenarios alternativos y de error**

3.

Refinamiento colaborativo y DoR

- **Validación iterativa** de historias **en sesiones de refinamiento (grooming) con Product Owners de LDA**
- Cada historia se considera lista para desarrollo cuando cumple **criterios de Definition of Ready (DoR)**: descripción clara, criterios verificables, dependencias identificadas y prioridad confirmada

4.

Análisis de dependencias y priorización

- Las historias **se priorizarán en base a valor de negocio, complejidad técnica y dependencias** y se establecerá un backlog ordenado por releases
- El Product Owner aprueba formalmente la historia de usuario, lo que habilita su paso a diseño UX o directamente a desarrollo según su naturaleza

Este planteamiento garantiza la trazabilidad entre requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación, eliminando también de esta forma cada interpretación abierta en fase de desarrollo

Cada historia de usuario sigue una estructura estándar que garantiza trazabilidad, verificabilidad y preparación para desarrollo

Definición de historias de usuario (2/3) – Estructura estándar

Identidad y trazabilidad

("¿Qué es y de dónde viene?")



- **Título descriptivo** orientado a valor
- **ID de Historia:** Código único de la historia
- **Trazabilidad al requisito**: referencia del requisito original
- **Narrativa**: Como [rol] (agente, cliente, suscriptor, etc.), Quiero [acción], Para [beneficio / objetivo de negocio]
- **Contexto funcional:** proceso al que pertenece, producto / dominio (p.e. motor)
- **Fase de implantación**: identificación a la fase de implantación (reléase) correspondiente

Comportamiento funcional

("¿Cómo debe comportarse?)



- **Reglas de negocio asociadas:** Validaciones y condiciones / casuísticas específicas del dominio asegurador (límites, franquicias, exclusiones, validaciones regulatorias)
- **Criterios de aceptación**: (Given-When-Then): Escenarios verificables para happy path y caminos alternativos

Impacto técnico y preparación

("¿Qué necesito para construirla?")



- **Dependencias e impactos identificados**: relación explícita con otras historias, procesos o decisiones que deben estar resueltas previamente para poder desarrollar esta historia sin bloqueos.
- **Integraciones**: Sistemas, servicios o APIs externas con las que la historia debe interactuar
- **Consideraciones de estándar CRM**: nivel de capacidades OOTB
- **Prioridad confirmada**: Nivel de prioridad validado por el Product Owner

Esta estructura asegura consistencia entre dominios y elimina interpretaciones abiertas en fase de desarrollo

A modo de ejemplo, los requisitos definidos para datos personales cotización Motor, los descompondríamos en 4 historias de usuario independientes

Definición de historias de usuario (3/3) – Ejemplo

Preliminar, ilustrativo

Título	Estructuración de la sección de datos personales en cotización Motor			
Historia	HU-01 – Estructura de la sección de datos personales (Motor)	HU-02 – Identificación visual de campos obligatorios	HU-03 – Autocompletado de datos del tomador	HU-04 – Autorrelleno por coincidencia de roles
ID	HU-MOT-R2-040	HU-MOT-R2-041	HU-MOT-R2-042	HU-MOT-R2-043
Trazabilidad	Cotización datos personales 1.1.40, 1.1.43, 1.1.45	Cotización datos personales 1.1.42	Cotización datos personales 1.1.41, 1.1.47	Cotización datos personales 1.1.44, 1.1.48
Narrativa	Como agente comercial; Quiero que la sección de datos personales esté estructurada por roles; Para introducir correctamente la cotización de Motor	Como agente comercial: Quiero identificar visualmente los campos obligatorios; Para completar la cotización sin errores ni bloqueos	Como agente comercial; Quiero que los datos del tomador se autocompleten si el cliente ya existe; Para reducir tiempo de introducción manual	Como agente comercial; Quiero poder indicar que el tomador es también conductor principal o propietario; Para evitar duplicar la introducción de datos
Contexto y fase	Cotización – Producto Motor + Realease 2. Cada historia puede priorizarse y desplegarse de forma independiente en la Release 2			
Reglas de negocio	Se divide en: Tomador, Cond. principal, Propietario, Cond. declarados. Cada rol debe visualizarse como independiente y editable, y se debe permitir añadir múltiples conductores declarados dinámicamente	Los campos obligatorios deben marcarse con indicador visual estándar corporativo de diseño (UX guidelines) No se podrá avanzar a cálculo de prima si no están completos.	El autocompletado se ejecuta únicamente si el cliente tiene datos personales completos en CRM. El usuario puede editar la información precargada.	Debe existir opción “Tomador = Conductor principal”. Al activarla: Se copian automá-ticamente los datos del tomador. Si el usuario desmarca la opción: Los campos se vuelven editables.
Criterios de aceptación	**Given** que accedo a cotización Motor **When** entro en datos personales **Then** visualizo bloques diferenciados **Given** que añado conductor declarado **When** selecciono “Añadir conductor” **Then** se habilita bloque editable	**Given** que un campo es obligatorio **Then** se muestra con indicador visual distintivo **Given** que intento avanzar sin completarlo **Then** el sistema bloquea la acción y muestra mensaje de error	**Given** que el cliente existe en CRM **When** selecciono el producto Motor **Then** los datos del tomador se completan automáticamente **Given** que modifico un dato **Then** se permite edición antes de guardar	**Given** que “Tomador = Cond. principal” **Then** los datos del conductor se replican automáticamente **Given** que desmarco la opción **Then** los campos quedan habilitados para edición independiente
Dependencias y notas técnicas	Configuración estándar de formularios dinámicos CRM Impacta en historias de autocompletado y validaciones			
Prioridad	Muy alta			

La fase de Diseño UX convierte las historias de usuario y criterios de aceptación definidos en pantallas y prototipos visuales validados antes de su desarrollo

Diseño UX y prototipados

1. Definición de flujos de interacción

- Definición de **flujos E2E por historia / épica** (user flows)
- Diseño de **arquitectura de información**: qué se muestra, en qué orden y cómo se navega

2. Diseño HI FI en pantallas sobre CRM (o en Figma)


- Diseño de **pantallas en HI FI sobre CRM o en Figma**, utilizando el sistema de diseño corporativo de Linea Directa
- Reflejo de las **historias de usuario y sus criterios de aceptación**: campos, validaciones, estados, mensajes de error, flujos condicionales.
- Cobertura de **vistas principales e intermedias** (loading, vacío, error,etc.)

3. Prototipado navegable (si aplica)

- **Pantallas en prototipos interactivos y navegables** sobre CRM (o Figma)
- **Simulación completa** de flujos principales y alternativos
- Inclusión de **microinteracciones y transiciones** que reflejan comportamiento esperado de la solución

4. Validaciones y entrega de blueprint

- Validación funcional y de negocio con **responsables de producto**
- Validación **de usabilidad y experiencia** con **usuarios finales representativos**
- Con el feedback obtenido se tienen **iteraciones de diseños hasta la aprobación formal** *(blueprint visual de la implementación)*



- Se vuelve a identificar **oportunidades de reenfoque de procesos**:
  - **Simplificaciones y automatizaciones** (pasos que pueden eliminarse)
  - **Maximización del estándar CRM** (aprovechar funcionalidades OOTB del CRM)
  - **Aplicación de criterios de accesibilidad y consistencia**
  - Etc.

Esta fase reduce retrabajo y asegura que desarrollo implemente sobre un diseño previamente validado

Implementación de la solución


6.1.2

DISCOVERY + DEFINICIÓN + UX | **IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN** | MIGRACIÓN DE DATOS | PRUEBAS Y CALIDAD

MINSAIT

Proponemos un modelo híbrido de proyecto: de waterfall a ágil, que impulse el crecimiento y la creación de valor

Ejes de decisión

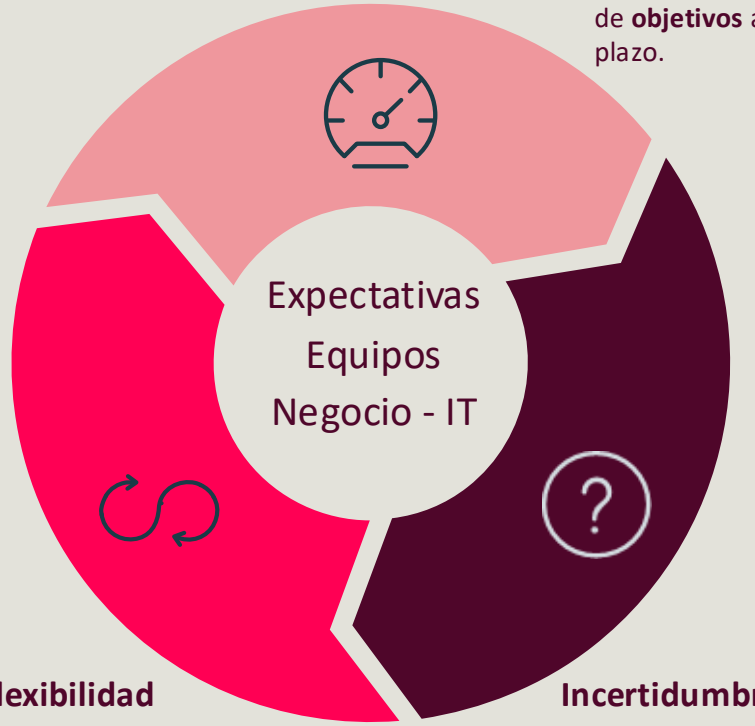

Agilidad

Rapidez en la definición de **objetivos** a corto plazo.

Flexibilidad

Comprensión de las diferentes necesidades del **momento.**

Incertidumbre

No descartar posibles cambios que contribuyen al objetivo común del proyecto, **crear valor**.

Entregas “parciales”

- Modelo flexible que proporcione valor desde las primeras etapas del proyecto.
- Productos finales en cada Fase del proyecto.

Filosofía de trabajo y método para **aportar valor** de forma temprana.


Entrega de **mayor valor añadido** y **antes.**

Validaciones y revisiones continuas por IT y Negocio

Mantenimiento de opciones “abiertas” el mayor tiempo posible.

Evitamos GAPs entre la definición y la implantación final, asegurando que lo que se define es implementable.

…con estas fases de proyecto en el modo agile

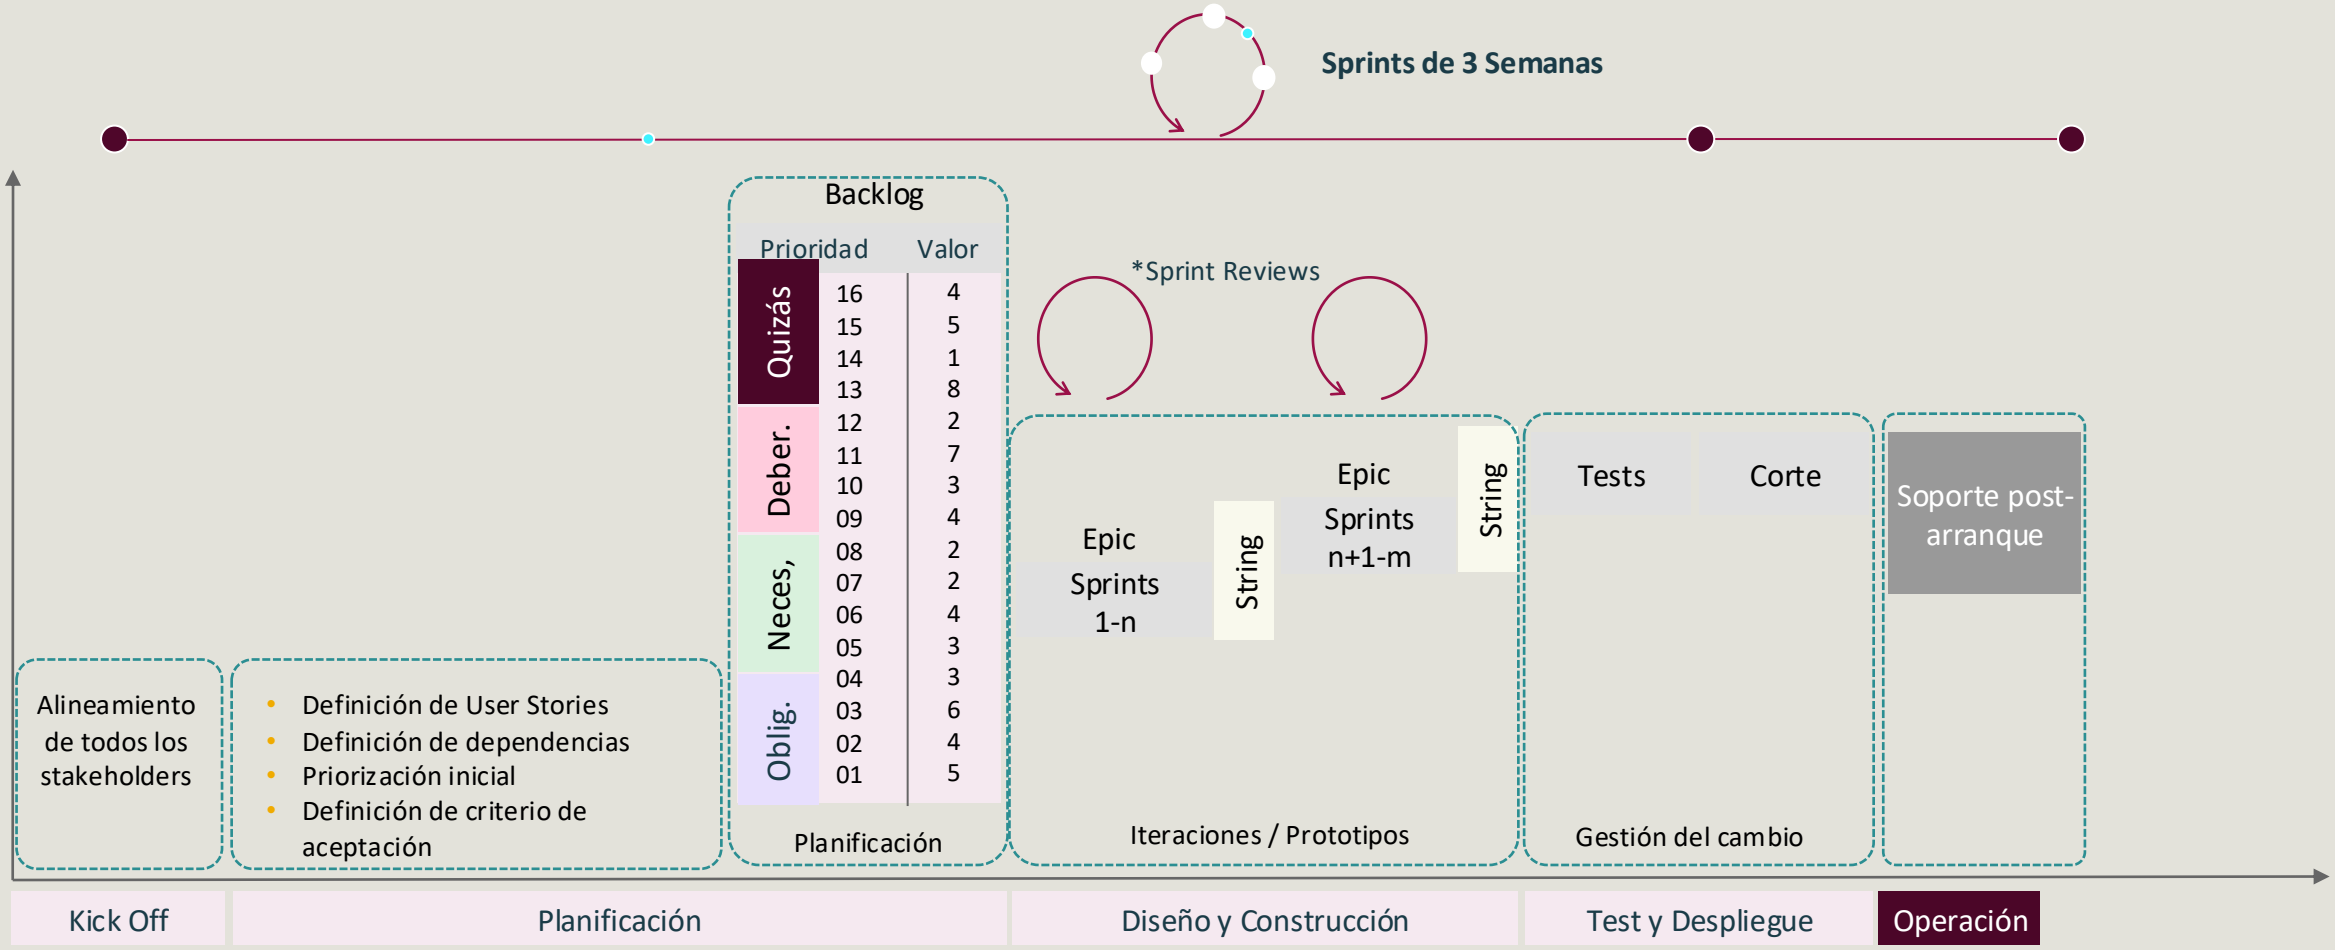

Analizaremos y priorizaremos los requisitos en un Product Backlog haciendo partícipe a LDA desde el inicio del proyecto y realizando, además de los seguimientos en los comités operativos, un seguimiento continuo del proyecto en las sesiones propuestas

Migración de datos

6.1.3

DISCOVERY + DEFINICIÓN +UX | IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN | **MIGRACIÓN DE DATOS** | PRUEBAS Y CALIDAD

MINSAIT

Estrategia de Migración y Transformación de Datos

Resumen

La estrategia de Migración de Datos garantiza una transición segura, consistente y completa de los datos heredados hacia la nueva plataforma de Salesforce. Está diseñado para preservar la continuidad del negocio, mantener la integridad de los datos y garantizar el cumplimiento de los estándares de gobernanza y calidad de LDA. Nuestro enfoque abarca el ciclo de vida de transformación de datos de extremo a extremo, desde el descubrimiento inicial hasta la validación y soporte posterior a la migración.

Objetivos

- Garantizar una migración precisa y verificada de todos los datos operativos y de mantenimiento (O&M) críticos de los sistemas heredados.
- Ofrecer un proceso transparente, auditable y repetible, minimizando el riesgo de pérdida o corrupción de datos.
- Estandarizar las estructuras de datos y mejorar la calidad y la gobernanza de los datos en distintas geografías.
- Apoyar la creación de un modelo de datos unificado integrado Talend Open Studio. (Valorándose realizar la migración inicial a través de las interfaces configuradas en la capa de integración)

Key Success Factors


- Interacción con los usuarios de negocio para definir datos críticos, criterios de validación y seguimiento de pruebas.
- Pruebas iterativas para minimizar interrupciones durante la puesta en marcha.
- Crear un Marco de Migración de Datos basado en herramientas como Talend para garantizar la eficiencia y el cumplimiento.
- Gobernanza sólida y trazabilidad y auditabilidad total de todas las actividades relacionadas con los datos.

Metodología

La migración de datos seguirá un enfoque por fases y controlado, estructurado en torno a las siguientes actividades clave, detalladas en las siguientes páginas.



Estrategia de Migración y Transformación de Datos



1. Descubrimiento y Evaluación de Datos

Objetivo

- Definir el alcance y el plan de Migración y Transformación de Datos.

Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos
- Principales stakeholders de negocio de LDA
- Stakeholders de TI de LDA
- Representante del equipo de pruebas de LDA

Actividades


- Workshops con stakeholders de negocio y de TI
- Identificar todas las fuentes de datos (sistema legado de Galgo)
- Catalogar las entidades y tipos de datos (por ejemplo: Órdenes de Trabajo, Activos, Historial de Mantenimiento, Credenciales de Técnicos, Registros de Inventario).
- Evaluar los volúmenes de datos, la estructura, las dependencias y la calidad de los datos
- Definir los casos de prueba y los criterios de aceptación
- Definir el alcance de la migración y las prioridades de negocio junto con los stakeholders de LDA, así como el plan de cutover

Estrategia de Migración y Transformación de Datos

Resultados esperados

El **Plan de Migración de datos** define la planificación prevista para la migración de datos y los recursos necesario para completar las tareas entre el equipo de proyecto y los recursos asignados por parte de LDA con sus respectivos roles y responsabilidades.

Mediante las **Dependencias de Datos** se describirán los datos adicionales de nivel superior o inferior necesarios para que la solución Salesforce funcione correctamente y también se identificarán dependencias específicas que dictarán el orden de migración de datos. Por ejemplo, es necesario disponer de los datos de clientes para poder realizar una cotización.

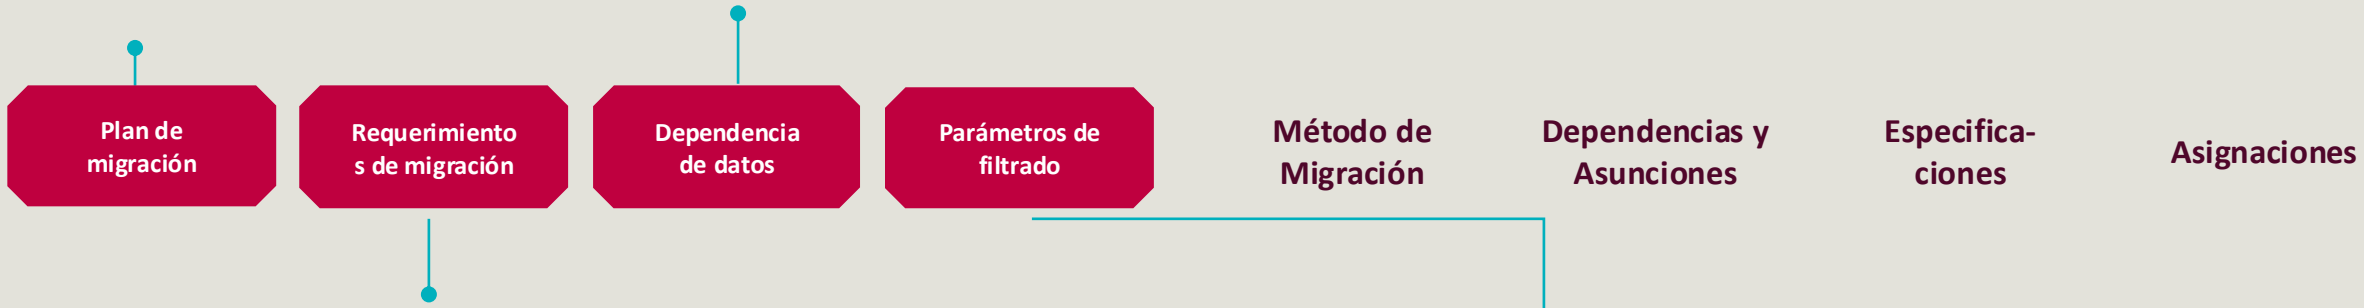

Los **Requerimientos de Migración de datos** definirán la lista específica de entidades de datos y la(s) fuente(s) para la cumplimentación de cada entidad. Se considerarán varios tipos de entidades:

- Entidades de Configuración.
- Entidades de Datos Maestros.

  Para la carga de estas entidades se deberá tener terminado la **Armonización de Datos Globales** definiendo el mapeo a la nueva codificación adoptada.
- Entidades de Transacciones (datos para carga inicial de transacciones a fecha de arranque).

Se definirán **Parámetros de filtrado de datos** que proporcionará directrices para filtrar los datos que se van a migrar. Los parámetros de filtro de datos identifican criterios específicos para seleccionar los registros de datos de cada entidad a migrar.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos

Resultados esperados

El **Método de migración de datos** describirá los métodos de conversión y migración específicos que se usarán. La determinación de los métodos de migración de datos disponibles dependerá en gran medida de la entidad de Salesforce que se está implementando, los orígenes de los datos existentes que se van a migrar y la cantidad de conversión y depuración necesarias. Estos datos se pueden organizar por origen de datos o método, lo que sea más conveniente. Se permiten diferentes formatos de importación de datos (Excel, XML, Delimitado, ancho fjio, etc.)


Mediante las **Especificaciones de migración de datos** se detallarán las especificaciones de diseño para cada proceso de migración de datos que se debe desarrollar. Esto puede ser un proceso personalizado para automatizar las tareas de conversión y migración de datos, o los requisitos de desarrollo de SQL.



Se definirán **Dependencias y Asunciones** que mostrarán las decisiones tomadas y las limitaciones detectadas al diseñar el proceso de migración de datos. Las asunciones y restricciones encontradas debido a las limitaciones de la aplicación y/o impuestas por los usuarios u otra agencia pueden tener un impacto sustancial en el diseño general de los procesos de migración de datos. Estos supuestos y restricciones deben identificarse específicamente y su impacto en la migración de datos debe abordarse para su consideración durante la fase de desarrollo.

Las **Asignaciones de migración de datos** mostrarán la asignación o mapeo de los campos de datos en Salesforce y definirán el origen de cada uno. Solo se asignarán los campos de datos obligatorios y los datos opcionales que el cliente necesita para sus procesos empresariales. Esta documentación también se utilizará como referencia sobre las decisiones y discusiones durante la fase de diseño.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos



2. Mapeo de Datos y Diseño de Transformaciones

Objetivo

- Identificar el mapeo entre los datos de origen y destino, así como las reglas de transformación y depuración de datos.
- Diseñar los scripts de transformación y depuración de datos.

Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos
- Principales stakeholders de negocio de LDA
- Stakeholders de TI de LDA

Actividades

- Workshops con stakeholders de negocio y de TI.
- Mapear las entidades y atributos del sistema legado con las entidades de Dataverse en Salesforce FSC 365 (WorkOrder, Account, Asset, Resource, Product, etc.).
- Definir reglas de transformación para estandarizar formatos, resolver discrepancias y alinearse con los estándares de datos maestros de LDA.
- Diseñar scripts de depuración de datos para eliminar duplicados, registros obsoletos e inconsistencias.
- Documentar la lógica de mapeo y las reglas de transformación en un Documento de Especificación de Mapeo de Datos.orkshops with business and IT stakeholders

Entregable

- Documento de Mapeo y Transformación de Datos – mapeos a nivel de tabla/columna y reglas de transformación.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos



3. Herramientas y Automatización

Objetivo

- Implementación y configuración de una herramienta de Data Migration (Se valorará la reutilización de las integraciones para la realización de las migraciones) .
- Configuración de entornos (por ejemplo: test, calidad y producción).
- Pruebas técnicas unitarias y de integración.


Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos
- Stakeholder de TI de LDA.

Actividades

- Configurar herramienta de Data Migration para procesos ETL low-code, complementados con scripts de migración cuando sea necesario.
- Configurar entornos de staging para la transformación y validación antes de la importación.
- Aplicar conectores para la ingesta segura de datos en Salesforce.
- Ejecutar pruebas unitarias y de integración para asegurar la configuración del Data Migration Framework en cada entorno.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos

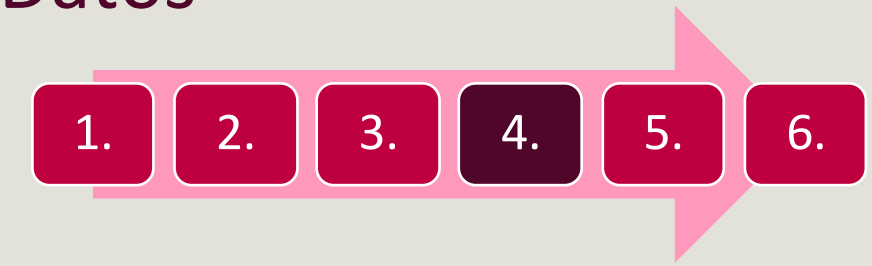

4. Pruebas de Migración y Validación

Objetivo

- Pruebas dry-run y pruebas de aceptación.
- Aceptación formal de las pruebas de migración de datos.


Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos LDA Test Team LDA Business key stakeholders
- Equipo de pruebas LDA
- Principales stakeholders de negocio de LDA
- LDA IT stakeholders

Actividades

- Realizar múltiples ciclos de prueba en entornos no productivos (dry runs).
- Validar la integridad de los datos, la integridad referencial y el cumplimiento de las reglas de negocio.
- Conciliar los datos migrados con las extracciones del sistema legado utilizando informes de comparación automatizados.
- Obtener la aprobación formal del negocio después de cada ciclo de validación.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos

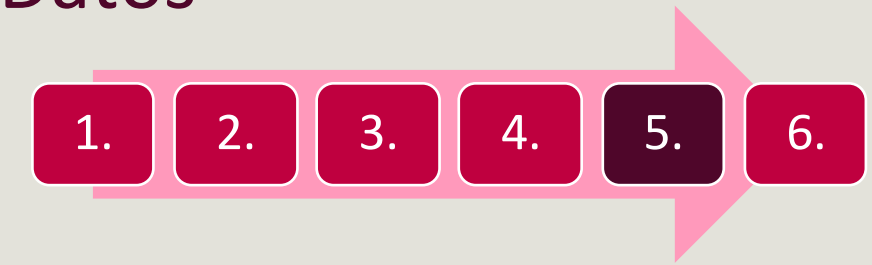

5. Cutover Final y Migración de Puesta en Producción

Objetivo

- Ejecutar la migración de datos alineada con la Estrategia de Migración y Transformación de Datos y el Plan de Cutover.


Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos
- Principales stakeholders de negocio de LDA
- Stakeholders de TI de LDA

Actividades

- Ejecutar la migración en alineación con la Estrategia de Migración y Transformación de Datos y el Plan de Cutover (por fases según geografía y tipo de activo).
- Congelar los sistemas de origen cuando sea necesario y realizar el extract-transform-load (ETL) final.
- Realizar la validación end-to-end en producción antes de la activación de los usuarios.

Estrategia de Migración y Transformación de Datos



6. Verificación Post-Migración y Soporte

Objetivo

- Objetivo Soporte post migración/hypercare
- Transferencia de conocimiento

Stakeholders

- Equipo de Migración de Datos
- Principales stakeholders de negocio de LDA
- Stakeholders de TI de LDA

Actividades

- Monitorizar el uso de datos en vivo y corregir problemas residuales mediante scripts controlados
- Proporcionar informes de verificación post-migración incluyendo métricas de calidad de datos y registros de resolución de incidencias
- Realizar sesiones de transferencia de conocimiento con los equipos de operaciones y soporte de LDA


Pruebas y calidad

6.1.4

DISCOVERY + DEFINICIÓN +UX | IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN | MIGRACIÓN DE DATOS | **PRUEBAS Y CALIDAD**


MINSAIT

La correcta implementación de la plataforma se fundamenta en la definición y ejecución de cuatro tipologías de pruebas



Pruebas de Sistema


Verifica el correcto funcionamiento de un componente o sistema concreto e independiente, asegurando que funcione correctamente de acuerdo a la especificación de requisitos y alcance funcional del sistema



Pruebas integradas

Asegurar el correcto funcionamiento de un sistema global, compuesto de varios componentes o subsistemas.


Se definen flujos completos que incluyen varios subsistemas, priorizando la verificación de las interacciones e interfaces entre ellos



Pruebas de aceptación

Definir y validar los flujos que garantizan que el producto desarrollado cubre las necesidades especificadas por el cliente.

Permite validar el cumplimiento de los requerimientos de usuario

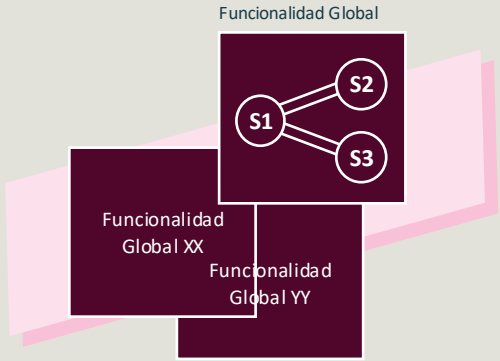

Pruebas de regresión

Determinar y verificar los flujos más importantes del producto, debido a su criticidad o a su utilización.

Permite asegurar la calidad de la funcionalidad más importante del producto tras cambio de sistema por mantenimiento o cambio de entorno

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua

- El proceso propuesto se inicia con la identificación de riesgos que potencialmente impacten en la calidad del producto y riesgos del proyecto de Testing.
- La siguiente actividad en el proceso es la evaluación de riesgos, donde se categorizará cada riesgo (funcionalidad, rendimiento, seguridad, etc.) y se determinará su probabilidad e impacto.
- La mitigación de riesgos consistirá:
    - Planificación de Pruebas cubriendo los riesgos identificados y evaluados.
        - Medidas específicas, como dedicar un mayor esfuerzo a los riesgos más importantes, seleccionar los recursos y técnicas a utilizar, planificar las revisiones, o establecer actividades de seguimiento y control en función del impacto de cada riesgo.
    - Monitorización continua, ajustándose periódicamente cada riesgo (incluido su impacto) y, probablemente, se identificarán nuevos riesgos, actualizando los diferentes planes si es necesario.

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua

Partiendo de la documentación inicial del proyecto y de la planificación del equipo de desarrollo se definirán / determinarán los siguientes aspectos:

- Viabilidad de las pruebas. Objetivos y alcance de las pruebas.
- Elementos del sistema a probar y excluidos.
- Tipos de pruebas a realizar: unitarias/sistema, integración, catálogo, rendimiento.
- Definición del enfoque general de las pruebas, y de los niveles de prueba.
- Integración y coordinación las actividades de prueba en las actividades del ciclo de vida del software.
- Características del entorno de pruebas.
- Política de pruebas de regresión.
- Necesidades para el diseño y ejecución de casos: principalmente datos y documentación.
- Planificación de las actividades de análisis, diseño e implementación de pruebas. Planificación de la ejecución y evaluación de las pruebas.
- Estimación de tiempos y esfuerzos: tiempos globales (Cronograma), tiempo por prueba (si necesario), ciclos de prueba a realizar, número de casos prueba / caso de uso, tiempos de diseño / caso de prueba.
- Roles y responsabilidades. Asignación de recursos a las diferentes actividades definidas.
- Selección de métricas para monitorizar y controlar la preparación y ejecución de pruebas, y resolución de defectos.
- Nivel de detalle de los procedimientos de pruebas para proporcionar suficiente información de soporte.

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua

- Este proceso consistirá en la definición de la Estrategia de Pruebas a realizar, de forma particular para un proyecto, tomando como base las establecidas actualmente de manera global para todo el servicio. La Estrategia de Pruebas describe los requerimientos genéricos para las actividades de testing, así como el detalle cómo llevarlas a cabo.

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua

- La actividad principal de Monitorización y Control será el seguimiento y análisis de las Métricas e Indicadores que permitan medir y controlar las actividades (internas y externas) de Pruebas desde diferentes ángulos.
- A partir de esta medición y de la comparación con sus valores objetivo (valoración absoluta) o con valores de mediciones precedentes (valoración relativa) se tomarán las medidas necesarias para corregir las posibles desviaciones identificadas, y para prevenir futuras desviaciones. Estas métricas, además, servirán de entrada al Proceso de Mejora Continua.

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua

- Es este proceso se consolidará la información de Monitorización de Pruebas en distintos tipos de informes para informar a las partes interesadas. En general se elaborarán dos tipos de informes:
- Informe de seguimiento, que se genera periódicamente como entradas para las reuniones de seguimiento, incluyendo:
  - Métricas definidas sobre los casos de prueba e incidencias.
  - Estado de incidencias y detalle.
  - Estado respecto a objetivos (avance), desviaciones detectadas, y riesgos probables y eliminados.
  - Informe Final de pruebas, el cual incluirá:
    - Detalle de todos los casos prueba ejecutados (cuando, quien y versión de ejecución).
    - Resultado obtenido en cada caso de prueba, y evaluación por el equipo de pruebas.
    - Detalle de cada una de las incidencias no solucionadas, descartadas y/o diferidas.
    - Estado de pruebas respecto a requisitos del proyecto.
    - Conclusiones.

Nuestra metodología de pruebas está basada en TMMi e incluye los siguientes procesos de gestión de pruebas

Gestión de Riesgos

Planificación de Pruebas

Estrategia de Pruebas

Monitorización y Control

Test y Reporting

Mejora Continua


- En este proceso se analizará el rendimiento de los distintos procesos y actividades, tanto de Pruebas (análisis, diseño, implementación, ejecución, etc.) como de Gestión de Pruebas, identificando las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para cada uno de ellos. Posteriormente se deberán planificar y abordar las acciones mejoras correspondientes.
- De forma resumida, las siguientes son las actividades correspondientes al proceso propuesto:
  - Análisis de indicadores de las actividades de pruebas y del desempeño de los procesos correspondientes.
  - Realización de auditorías, y gestión de las no conformidades detectadas en las mismas.
  - Identificación y gestión de acciones correctivas y preventivas de los Procesos de Pruebas detectadas en la ejecución de las Actividades de Pruebas, sin necesidad de realizar auditorías (por ejemplo, en el proceso de Monitorización y Control).
  - Asignación de un responsable para la implementación de las medidas identificadas, previa aceptación de las mismas.
  - Seguimiento de las acciones establecidas.

Equipo y carga de trabajo

6.2


MINSAIT

Equipo de Proyecto propuesto

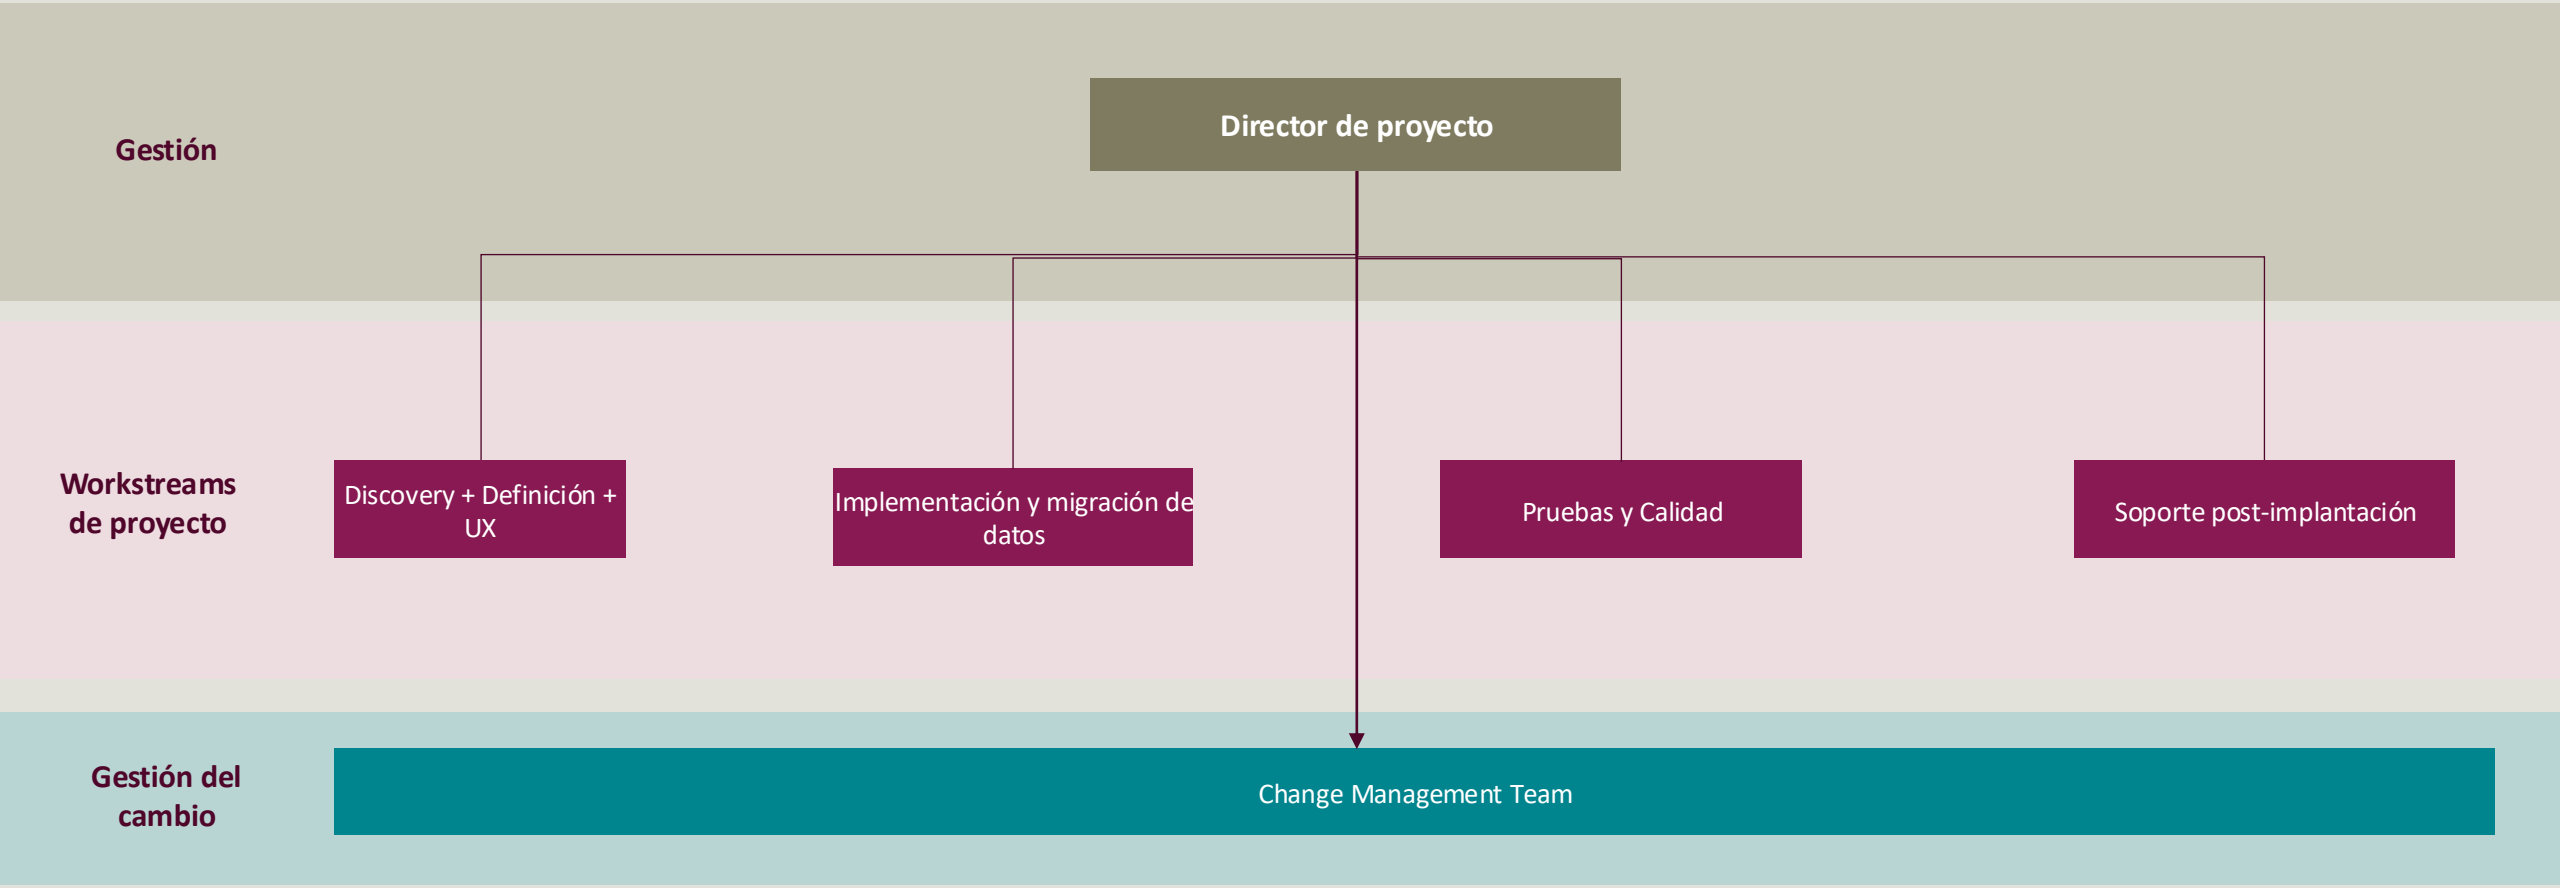

Equipo de proyecto propuesto

Director de Proyecto

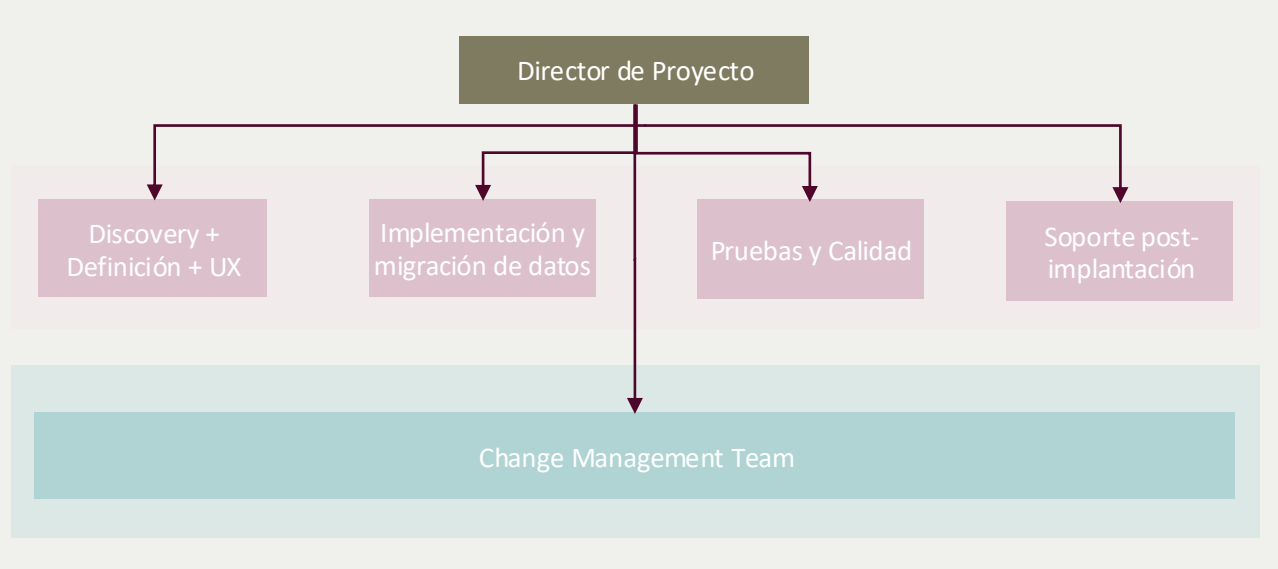


El Director de Proyecto actúa como figura central de coordinación y gobierno durante toda la implantación, garantizando la correcta ejecución del plan, la coherencia entre los diferentes workstreams y el alineamiento continuo con los objetivos estratégicos de Línea Directa. Su función es asegurar que el proyecto avanza según el alcance definido, dentro del marco temporal y económico establecido, y con los niveles de calidad esperados en cada entrega.

Entre sus responsabilidades destacan la planificación integral del proyecto, la gestión del roadmap funcional y técnico, la coordinación de dependencias entre Salesforce, Genesys, Integración, Datos, QA, Canales y Change Management, así como la anticipación y mitigación temprana de riesgos. Actúa además como punto único de contacto entre el equipo de Minsait y los responsables de Línea Directa, facilitando la toma de decisiones y asegurando la transparencia en todo momento.

El Director de Proyecto lidera las ceremonias de gobernanza, consolida el reporting ejecutivo, vela por la adecuada priorización del backlog y supervisa el trabajo de los equipos multidisciplinares, asegurando consistencia metodológica y la correcta ejecución del modelo híbrido propuesto (Waterfall para gobernanza y Agile/Scrum para las fases de construcción). Gracias a su visión global y su experiencia en proyectos CRM y Contact Center de gran escala, garantiza la necesaria alineación entre los equipos de Salesforce y Genesys y asegura una implantación controlada, sostenible y orientada a valor para Línea Directa.

Equipo de proyecto propuesto

Discovery + Definición + UX

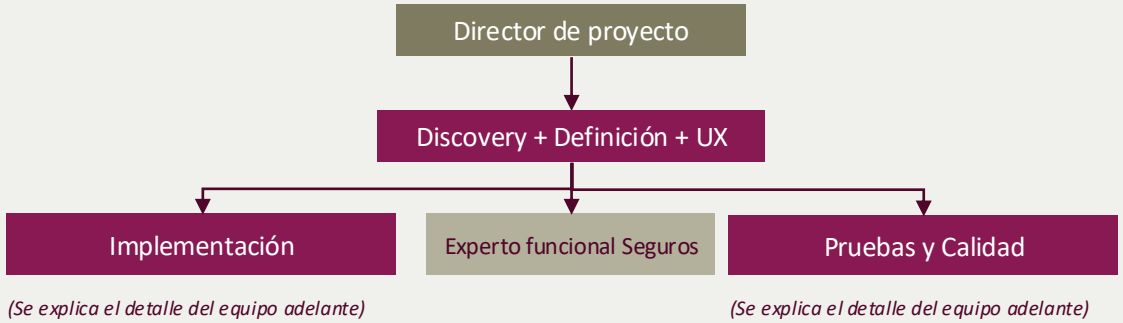

Durante la fase de Discovery, Definición y UX se contará con un experto funcional en seguros con perfil consultivo, cuya misión será asegurar que los requisitos y procesos propios del negocio asegurador se traduzcan correctamente al modelo y capacidades de la vertical de Salesforce. En esta etapa, trabajarán de forma totalmente coordinada el equipo de implantación, el experto funcional en seguros y el equipo de pruebas y calidad, con el objetivo de construir una hoja de ruta realista, coherente y alineada entre todas las partes. Aunque el detalle de roles de implantación y QA se desarrolla en las slides posteriores, su aportación en esta fase se centra en colaborar estrechamente con el experto funcional para definir una solución que refleje fielmente la operativa del sector seguros y garantice consistencia con los requisitos. Además, la participación temprana del equipo técnico será clave para identificar y diseñar las integraciones necesarias entre todos los sistemas en cada una de las fases, asegurando desde el principio la viabilidad técnica y la coherencia end-to-end de la solución.

Experto funcional Seguros


El experto funcional de seguros actúa como referente del negocio asegurador durante la fase de descubrimiento y definición, aportando una comprensión profunda de los procesos clave (suscripción, tarificación, gestión de pólizas, siniestros, entre otros) y traduciéndolos a requisitos funcionales claros, priorizados y alineados con el estándar de la vertical Financial Services Cloud. **Su responsabilidad principal es asegurar que la solución responda fielmente a la realidad operativa del negocio, que los flujos definidos sean consistentes, aplicables y escalables, y que las decisiones funcionales se tomen con base en criterios objetivos, propios del sector y de la plataforma.**



Gracias al assessment ya realizado, este perfil puede aportar un valor diferencial desde el primer día: llega con un **entendimiento sólido del AS-IS**, las ineficiencias detectadas, los puntos de fricción entre áreas, las dependencias entre sistemas y las oportunidades de mejora. Esto le permite orientar la definición hacia un modelo más optimizado, proponer ajustes funcionales fundamentados, anticipar riesgos y asegurar que la solución diseñada sea coherente con la estrategia del cliente. **El assessment también proporciona una visión clara de las prioridades del negocio, lo que permite al experto funcional guiar la hoja de ruta con enfoque realista** y pragmático, asegurando que los entregables de cada fase maximicen valor y minimicen retrabajo. En combinación con los equipos de implantación, QA y tecnología, **su papel es clave para construir una solución sólida, alineada con la industria y perfectamente adaptada al contexto actual de LDA.**

Equipo de proyecto propuesto

Implantación y migración de datos

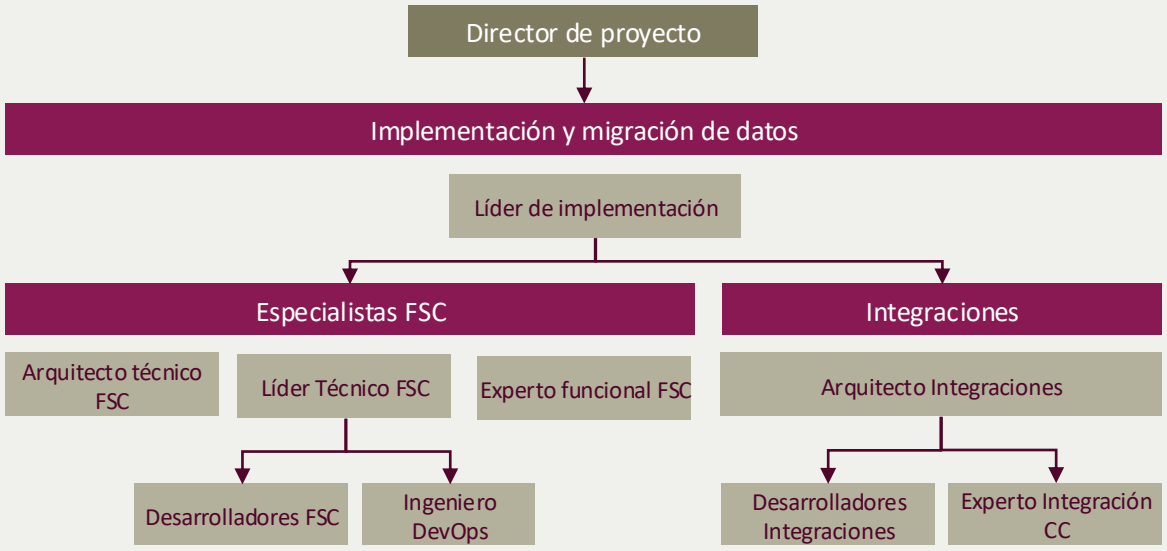

Para garantizar una implantación sólida, ordenada y alineada con la complejidad del proyecto, se propone un equipo estructurado en **dos líneas de trabajo: el equipo especialista en FSC y el equipo de integraciones**, que permitirá gestionar de forma eficiente el elevado volumen de tareas previstas. **Este equipo liderará la configuración y parametrización de la solución, así como la definición y construcción de las integraciones con los sistemas externos**. La coordinación global estará a cargo de un jefe de proyecto, responsable de asegurar la alineación continua con el resto de equipos y de mantener la planificación bajo control. **Dentro de cada línea existirá un arquitecto técnico especialista**, cuya función será garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas y la coherencia técnica en todas las decisiones. Dado el número de perfiles involucrados en la parte de Salesforce, se incorpora también un **líder técnico FSC, encargado de guiar, coordinar y orientar al equipo de desarrolladores** para asegurar consistencia y calidad. Paralelamente, el **experto funcional FSC actuará como enlace entre las necesidades del negocio y el equipo técnico**, trasladando y traduciendo correctamente los requisitos, y trabajando estrechamente con el experto en seguros para asegurar que la solución se adapte fielmente a los procesos del sector. Por su parte, **el arquitecto de integraciones liderará a los desarrolladores de integraciones**, permitiendo que esta línea avance en paralelo a la configuración de la herramienta y asegurando que los plazos y dependencias entre sistemas se cumplan sin riesgos. Todo ello conforma un **equipo equilibrado y especializado, diseñado para abordar el proyecto con garantías** y asegurar una implantación robusta y alineada con las necesidades del cliente.

Equipo de proyecto propuesto


Implantación y migración de datos	
Líder de implementación	El Jefe de proyecto se encargará de liderar todo el proyecto, planificar y gestionar las tareas con el cliente, así como con el equipo de trabajo. Será el responsable de cumplir con el éxito del proyecto y de que todos los entregables sean de la calidad esperada.

FSC	
Arquitecto técnico FSC	Diseñar, gobernar y asegurar la implementación de soluciones tecnológicas escalables, seguras y alineadas con los procesos del sector financiero, aprovechando al máximo las capacidades nativas de FSC y del ecosistema Salesforce.
Experto funcional FSC	Asegurar que la solución diseñada y construida en FSC responda fielmente a las necesidades del negocio financiero, alineando procesos, datos y funcionalidades con las capacidades estándar de la plataforma y con las mejores prácticas del sector. Es el puente estratégico entre negocio y tecnología, garantizando que la organización adopte FSC de forma eficiente, segura y orientada al valor.
Líder técnico FSC	Responsable de dirigir la ejecución técnica del proyecto, asegurando que el desarrollo cumpla con la arquitectura definida, las buenas prácticas de Salesforce y los estándares de calidad. Supervisa al equipo de desarrolladores, revisa código, desbloquea problemas técnicos y garantiza que las entregas sean robustas, escalables y alineadas con el diseño funcional y técnico.
Desarrolladores	Encargado de construir y configurar la solución en la plataforma. Sigue las directrices del Líder Técnico y del Arquitecto,
Ingeniero DevOps	Garantizar que el ciclo de vida de desarrollo sea ágil, automatizado, estable y seguro, asegurando que los equipos puedan desplegar software de forma continua y fiable.

Integraciones	
Arquitecto Integraciones	Responsable de diseñar y gobernar la arquitectura de integraciones usando MuleSoft, asegurando que los sistemas se conecten de forma segura, escalable y reutilizable. Define patrones de integración, modelos API-led, estándares de seguridad y gobierno, coordina con equipos de Salesforce y sistemas core, y garantiza que las integraciones cumplan las mejores prácticas y el diseño global de la solución.
Desarrolladores Integraciones	Responsable de construir APIs e integraciones en MuleSoft siguiendo el diseño del Arquitecto de Integraciones. Desarrolla APIs System, Process y Experience, configura conectores, aplica políticas de seguridad, gestiona data mappings y asegura que las integraciones sean fiables, reutilizables y alineadas con el modelo API-led.
Experto Integración Contact Center	Encargado de diseñar, configurar y optimizar integraciones entre Genesys y CRM garantizando la correcta orquestación de interacciones.

Equipo de proyecto propuesto


Pruebas y Calidad

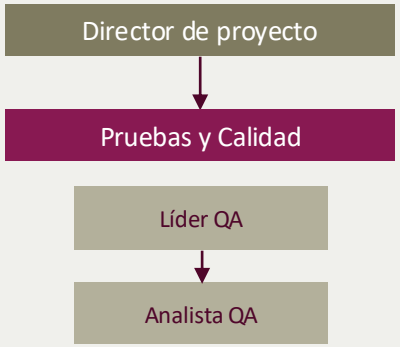

Los desarrolladores garantizan la calidad de su código a nivel unitario e integral, mientras que el equipo de QA se centra en pruebas transversales, E2E y de negocio, necesarias para un proyecto con múltiples integraciones y para asegurar un UAT eficiente y sin regresiones.

Líder QA	El Líder de QA es responsable de definir y coordinar la estrategia global de calidad del proyecto, asegurando que las pruebas se planifiquen y ejecuten de forma coherente en un entorno con múltiples integraciones. Supervisa la cobertura end-to-end, gestiona riesgos, prioriza defectos y actúa como punto de enlace con negocio para garantizar que las entregas cumplan los estándares funcionales y operativos esperados.
Analista QA	El Analista de QA diseña y ejecuta casos de prueba detallados, validando escenarios funcionales, de integración y de regresión, y aportando evidencias claras del comportamiento del sistema. Colabora estrechamente con los desarrolladores para reproducir y verificar defectos, y apoya al negocio durante el UAT, asegurando que las funcionalidades entregadas cumplen correctamente los requisitos definidos.


Soporte post-implantación

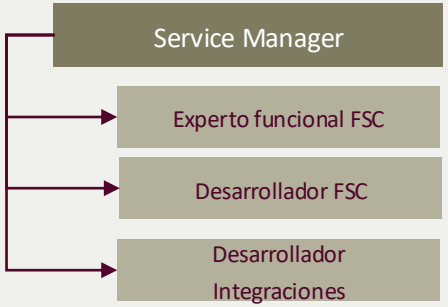

Service Manager	Garantizar la continuidad operativa del servicio tras la implantación, coordinando las actividades de soporte, supervisando niveles de servicio, priorizando incidencias y asegurando una comunicación fluida entre negocio y el equipo técnico. Su foco está en la estabilidad, la rápida resolución de problemas y la gestión proactiva de mejoras para que la solución evolucione de forma controlada.
Experto funcional FSC	Se encarga de analizar y resolver incidencias funcionales, validar comportamientos del sistema frente a los procesos del negocio financiero y asegurar que los cambios posteriores a la implantación sigan alineados con las capacidades estándar de FSC. Su objetivo es mantener la coherencia funcional, proponer ajustes que mejoren la operativa y guiar al negocio en el uso adecuado de la plataforma.
Service Manager	Da soporte técnico a la plataforma Salesforce, investigando y resolviendo defectos, implementando pequeños ajustes correctivos y asegurando que cualquier evolución respete las buenas prácticas de la plataforma. Colabora estrechamente con el Experto Funcional para validar soluciones y garantizar que la plataforma se mantenga estable y acorde a las necesidades del negocio.
Desarrollador de integraciones	Mantener y evolucionar las interfaces entre Salesforce y los sistemas externos, identificando fallos en flujos de datos, corrigiendo errores en APIs o middleware y asegurando que las integraciones sigan siendo robustas ante cambios en cualquiera de los sistemas involucrados.

Equipo de proyecto propuesto

Change Management Team

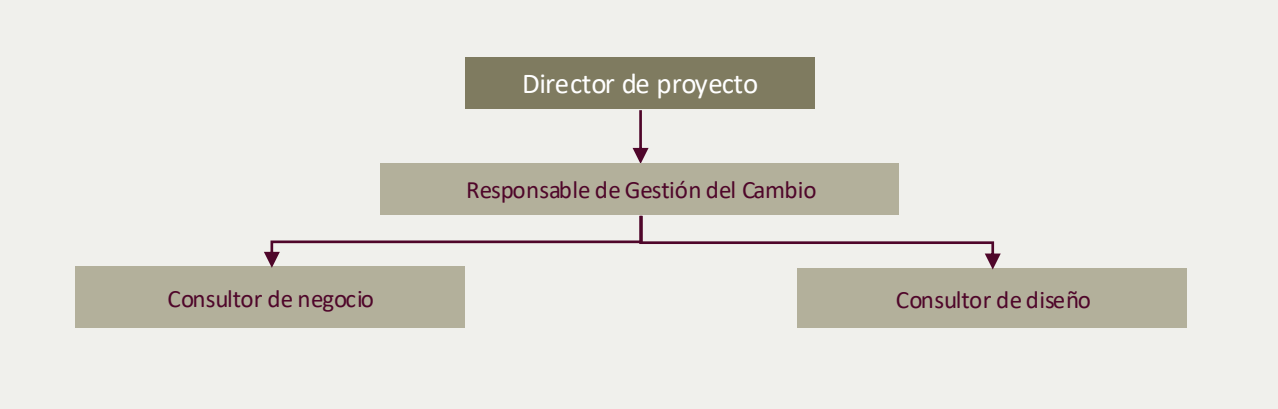

La implantación de un CRM implica una transformación en la forma de trabajar de los equipos. Por este motivo, se establece una estructura de Gestión del Cambio diferenciada del equipo de implantación técnica, con el objetivo de asegurar que el sistema no solo se implemente correctamente, sino que sea comprendido, adoptado y utilizado de manera efectiva por los usuarios. Esta separación permite dedicar recursos especializados a acompañar a la organización durante la transición, traduciendo los cambios del sistema en impactos claros para la operativa, preparando a los usuarios para las nuevas formas de trabajo y garantizando que la comunicación, la formación y los materiales de apoyo estén alineados con las necesidades reales de los equipos. De esta manera, se maximiza la adopción del CRM y se asegura que la implantación genere valor para la organización

Responsable de Gestión del Cambio	Lidera y coordina las iniciativas relacionadas con la adopción del nuevo CRM, asegurando que las acciones definidas en el plan de gestión del cambio se ejecuten correctamente y que los entregables se desarrollen en tiempo y forma. Actúa como punto de conexión entre el equipo de implantación, el equipo de gestión del cambio y los stakeholders de la organización, garantizando la alineación entre las decisiones del proyecto y las necesidades de los usuarios. Además, supervisa el desarrollo del assessment inicial, coordina la preparación de comunicaciones y materiales formativos, participa en la impartición de formaciones y realiza el seguimiento de la adopción del sistema para impulsar las acciones de refuerzo
Consultor de negocio	Se encarga de diseñar las iniciativas de gestión del cambio. Analiza el punto de partida de la organización, identifica y clasifica los grupos de usuarios y stakeholders impactados y define la estrategia de comunicación, motivación y formación asociada al proyecto. A partir de este análisis, establece las acciones de adopción necesarias y define los journeys por grupo de usuario, asegurando que las iniciativas respondan a las necesidades reales de los equipos. Durante las distintas releases del proyecto, adapta y concreta estas acciones en función de las funcionalidades que se incorporan, definiendo los contenidos formativos, coordinando con key users y participando en el seguimiento de la adopción y en la identificación de acciones de refuerzo
Consultor de diseño	Es responsable de transformar la estrategia y los contenidos de gestión del cambio en materiales claros, estructurados y visualmente atractivos para los usuarios finales. Diseña y elabora los distintos soportes necesarios para acompañar la implantación del CRM, como presentaciones, guías de usuario, materiales formativos y comunicaciones del proyecto. Su trabajo facilita la comprensión de los nuevos procesos y funcionalidades, contribuyendo a mejorar la experiencia de aprendizaje durante las formaciones y a reforzar la adopción del sistema.

Gestión del Cambio y Adopción

07




MINSAIT

La ejecución de un assessment inicial fijará las bases de la gestión del cambio que luego se ejecutarán de forma acompasada a cada release

Framework de la Gestión del Cambio

I *Assessment* inicial de preparación del del Cambio



- Analizar el **punto de partida** (procesos, cultura, competencias, niveles de resistencia, etc.)
- Identificar y clasificar los **grupos de usuarios / stakeholders** y entender su operativa actual
- Definir cómo ejecutar **comunicación y formación** en el proceso de gestión del cambio
- Establecer la metodología de las **acciones de adopción**
- Resultará un **journey de acciones** (formaciones y comunicaciones) **por grupo de usuario**
- Definir **modelo de acompañamiento, seguimiento y refuerzo**

4 semanas

A ejecutar de forma previa a la preparación de la primera release

II Gestión del cambio ligada a cada *release*



- **Revisión y refinamiento del enfoque preliminar definido en el assessment** que deberá ajustarse y personalizarse.
- Se **elaborarán los materiales seleccionados** en base a las características de cada release funcional
- Se ejecutarán las **acciones de gestión del cambio** a **asociadas a cada release**
  - **Acciones de comunicación y motivación** antes de la certificación intermedia o ejecución de releases parciales
  - **Acciones de formación** tras la certificación intermedia de la release y antes de implantación
  - **Acciones seguimiento y control** continuas**, y de refuerzo**

8 semanas por reléase (4 de preparación y 4 de ejecución)

A ejecutar en paralelo a cada release funcional y posteriormente para seguimiento y control

El assessment inicial será el punto de partida para conceptualizar la la gestión del cambio que se refinará y ajustará en cada release

Framework de la Gestión del Cambio – Assessment inicial

I *Assessment* inicial de preparación del del Cambio



- Analizar el **punto de partida** (procesos, cultura, competencias, niveles de resistencia, etc.)
- Identificar y clasificar los **grupos de usuarios / stakeholders** y entender su operativa actual
- Definir cómo ejecutar **comunicación y formación** en el proceso de gestión del cambio
- Establecer la metodología de las **acciones de adopción**
- Resultará un **journey de acciones** (formaciones y comunicaciones) **por grupo de usuario**
- Definir **modelo de acompañamiento, seguimiento y refuerzo**

4 semanas

A ejecutar de forma previa a la preparación de la primera release

II Gestión del cambio ligada a cada *release*

- **Revisión y refinamiento del enfoque preliminar definido en el assessment** que deberá ajustarse y personalizarse.
- Se **elaborarán los materiales seleccionados** en base a las características de cada release funcional
- Se ejecutarán las **acciones de gestión del cambio** a **asociadas a cada release**
  - **Acciones de comunicación y motivación** antes de la certificación intermedia o ejecución de releases parciales
  - **Acciones de formación** tras la certificación intermedia de la release y antes de implantación
  - **Acciones seguimiento y control** continuas**, y de refuerzo**

8 semanas por reléase (4 de preparación y 4 de ejecución)

A ejecutar en paralelo a cada release funcional y posteriormente para seguimiento y control

El assessment inicial permitirá definir, acotar y planificar la gestión del cambio para garantizar el éxito de las acciones posteriores ligadas a cada release

Ámbitos, objetivos y entregables del assessment inicial

¿A quién va dirigido?

1 Mapa de stakeholders y gobierno del cambio

- **Mapa de audiencias impactados en cada releáse** (gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones)
- **Plan de involucración** desde fases tempranas

¿Qué se realizará?

2 Diseño de la estrategia de comunicación y plan de formación

- **Diseño del plan de comunicación y motivación genérico** asociado a las releases funcionales
- **Diseño del plan de capacitación y formación**, definiendo y determinando la tipología de materiales necesaria

¿En qué formato?

3 Planteamiento de las acciones de adopción

- Definición de acciones y la metodología para su ejecución, **que serán adaptables en cada release**

Resultado

4 Definición de Journeys resultantes

- Identificación de los journeys por grupos de usuario sobre el plan de formación y comunicación, y las acciones de adopción

¿Cómo lo seguimos y aseguramos la adopción?


5 Diseño de KPIs, coaching operativo y acompañamiento en campo, y metodología de refuerzo

- **Diseño de indicadores y métricas clave para el seguimiento objetivo** del impacto, adopción, alertas ante desvíos y definición de planes de mitigación,
- Acompañamiento durante las primeras semanas de uso real del CRM
- **Gestión de dudas, soporte funcional y resolución de bloqueadores**
- **Diseño de la metodología** para impulsar **acciones de refuerzo** ante desviaciones
- Transición al **Centro de Excelencia CRM**

La identificación y definición del mapa de audiencias nos debe permitir maximizar el impacto en el diseño de estrategias objetivo

Mapa de stakeholders y gobierno del cambio

Preliminar

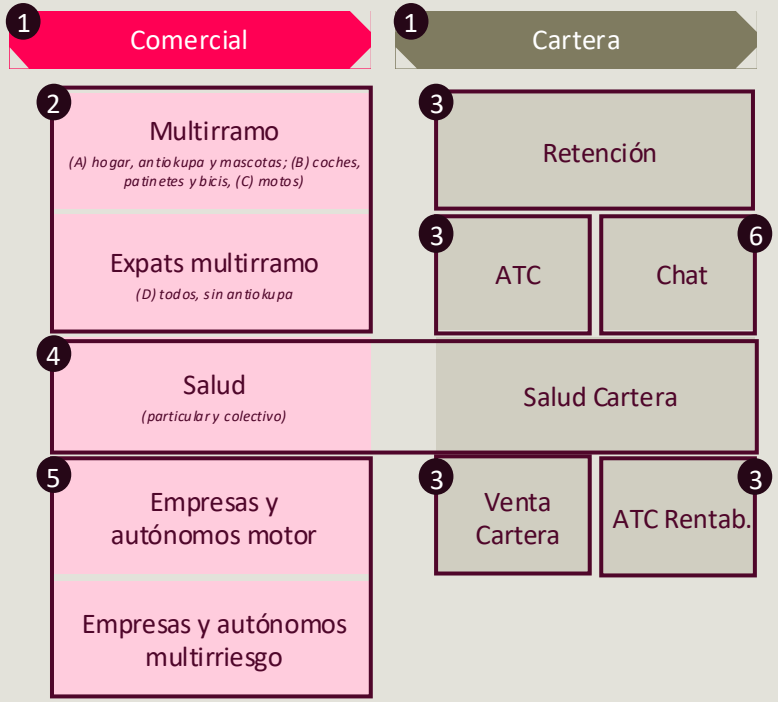

Plan de afectación usuarios, alineado con releases *(ver detalle en sección de implantación CRM)*

Para cada release será clave identificar impactados y afectados: gestores, supervisores, asesores, coordinadores, calidad, quejas y reclamaciones

1. *MVP*
2. *Cotización integral:*
   - *(A) Hogar, antiokupa, mascotas*
   - *(B) Coche, patinetes y bicis*
   - *(C) Motos*
   - *(D) Expats, todos sin antiokupa*
3. *Suplementos (ATC+ATC rent.) y cross-sell (venta cartera) Retención, recibos y pagos, y recobros (retención)*
4. *Salud comercial y cartera*
5. *Empresas*
6. *Chat*

La i**dentificación y análisis de colectivos** permite entender a los usuarios y sus necesidades para **personalizar las medidas de adopción** para maximizar su impacto apalancándose en **diferentes dinámicas**

Formulación y validación de hipótesis	Realización de encuestas por colectivos	Organización de workshops	Neurociencia	Planteamiento de focus groups

Aspectos relevantes

- Será necesario **analizar los diferentes colectivos identificados a priorizar por la compañía**
- Se realizarán **dinámicas de escucha activa** al usuario en las que identificar sus miedos, preocupaciones y motivaciones respecto al cambio
- De esta forma podremos **desarrollar un "mapa" de impacto que nos ayude a estructurar las acciones**
- **En el proceso de análisis podremos identificar las figuras de la compañía que actuarán como impulsores del cambio**, creando un referente para el resto de la organización

La estrategia de comunicación debe contemplar la definición de elementos que estructuren el plan a ejecutar

Diseño de la estrategia de comunicación (1/2)

Grupo de interés

Utilizar la **estructuración del equipo y la segregación de usuarios** para ajustar a cada colectivo la comunicación. Se debe considerar que las necesidades e intereses son distintos para cada grupo, por tanto, el contenido, el canal y la frecuencia de las comunicaciones deben ajustarse.

Objetivos de comunicación

Definir los objetivos de comunicación, es decir, lo **que se quiere lograr a través de la comunicación**.

Principalmente con las comunicaciones de gestión del cambio se pretende **hacer partícipe a los usuarios del avance del proyecto y hacerles partícipes de los beneficios y logros derivados de la reléase.**

Mensaje de comunicación

Crear el mensaje de comunicación. El mensaje debe ser claro, conciso y adaptado a cada grupo de interés. El **mensaje debe ser coherente con la visión, misión y valores de la organización y debe ser comunicado de forma consistente** a lo largo del proyecto de gestión del cambio.

Canales de comunicación

Seleccionar los **canales de comunicación más adecuados** y de mayor impacto para llegar a los grupos de interés identificados

LDA dispone del canal de email "Iseazy" para personal interno, teams, etc. aunque se propondrán también sesiones presenciales, newsletters, redes sociales, vídeos, etc. según conveniencia y definición en el assessment inicial


Planificación de comunicación

Establecer un **plan de comunicación que incluya el calendario de actividades, los responsables de cada actividad y los indicadores de seguimiento y evaluación**. El plan de comunicación debe ser actualizado y ajustado a medida que avanza el proyecto

En el assessment inicial se definirá la tipología de acciones informativas y motivacionales a lanzar para lograr un mayor impacto

Diseño de la estrategia de comunicación (2/2)

No exhaustivo

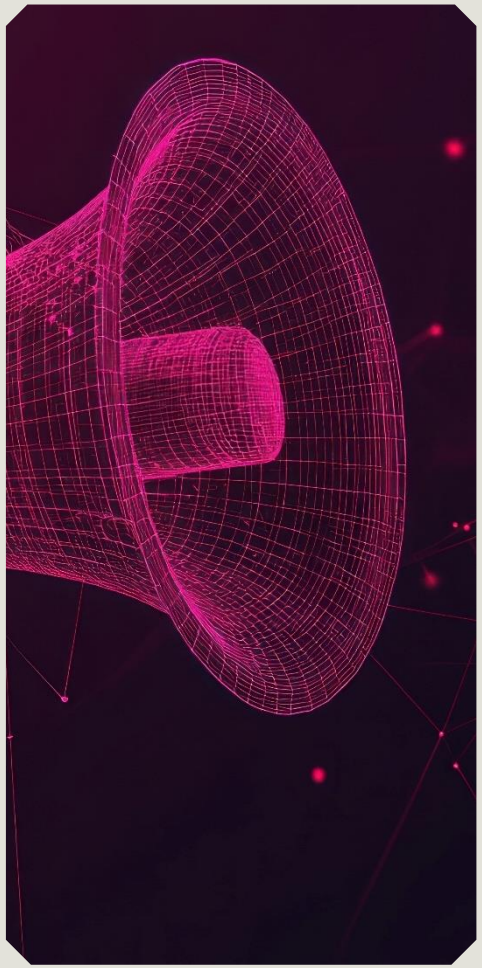

Acciones informativas

Comunicación de estado y avance del proyecto	• Informar del avance • Comunicar cambios de alcance • Informar de las fechas clave • Informar de los próximos pasos
Comunicación consecución de hitos clave	• Comunicar un hito logrado • Comunicar cierre de fase
Comunicación formaciones	• Informar sobre las formaciones a realizar • Comunicar dedicación necesaria
Comunicación de comités	• Informar sobre los comités planificados • Comunicar dedicación necesaria
Comunicación de publicación de documentos	• Difundir la disponibilidad de nuevo contenido formativo

Acciones motivacionales

Comunicación beneficios del cambio	• Explicar la visión del proyecto y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio
Comunicación que involucren a los stakeholders en el proceso de cambio	• Promover la participación y la colaboración de los usuarios • Promover la aportación de conocimiento y experiencia
Comunicaciones que celebren los éxitos y los logros alcanzados	• Reconocer los logros y los avances del proyecto • Celebrar logros con los stakeholders
Comunicaciones que fomenten el aprendizaje y el desarrollo	• Promover el uso de los materiales formativos, el aprendizaje y el desarrollo

La estrategia de formación contemplará las necesidades de los usuarios y guiará el diseño de acciones formativas de cada release

Diseño del Plan de Formación

Segregación de usuarios por roles

Categorizar a los colectivos de usuarios (operadores, supervisores, Back Office, mixtos, etc.) en tres dimensiones principales:

- Capacidad: grado de conocimiento/Expertise
- Necesidad: entender cómo les afecta el cambio
- Grado de aversión a la transformación: identificar su predisposición al cambio

Objetivos de formación

Con base en la evaluación de habilidades y conocimientos, se deben definir los objetivos para cada formación o grupo de usuarios. Estos objetivos deben ser específicos y medibles, alcanzables, relevantes, y con un tiempo definido.

Métodos de formación

Propondremos diferentes métodos de formación, como la elaboración de materiales o la coordinación de eventos formativos (sesiones prácticas, simulaciones y manuales operativos). Es importante seleccionar los métodos de formación que mejor se adapten a las necesidades de la organización y a los objetivos de formación definidos

Contenido de formación

Una vez especificados los objetivos y métodos de formación, se debe desarrollar el contenido. Esto puede incluir documentación, píldoras formativas o sesiones impartidas con materiales didácticos, guías, ejercicios, entre otros recursos, que ayuden a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios.

Plan de formación y verificación

Se debe planificar la implementación de la formación, incluyendo la programación de sesiones de formación, la asignación de recursos y la coordinación de la logística necesaria.

Asimismo, se definirán mecanismos de verificación de la transferencia (evaluaciones, certificaciones internas o equivalente).

Desarrollaremos diferentes acciones de adopción, en función de la estrategia definida, para lograr el mayor impacto e involucración

Planteamiento de las acciones de adopción

Sesiones prácticas liderada por un perfil experto y donde se resuelvan dudas planteadas por los usuarios

Jornadas formativas temáticas con la participación de los equipos involucrados en el proyecto

Segregación y personalización de sesiones adaptadas a la expertise, necesidades y aversión a la transformación de cada usuario



Demos de productos, servicios, funcionalidades y herramientas

Coffee corner para reunir a equipos multidisciplinares y crear un foro de diálogo

Espacios de conexión para compartir contenidos entre equipos involucrados

Podcasts y entrevistas para hacer zoom en contenidos relevantes

Píldoras formativas y microlearning bajo demanda en streaming

No existe una acción de adopción óptima para todos los casos y **su elección dependerá de las necesidades de adopción**, **tipología de usuarios**, **complejidad del cambio a adoptar**, **capacidades internas** y **cultura de la organización**


Una vez definido el plan de capacitación y comunicación, y las acciones de adopción se establecen los journeys para cada grupo

Definición de Journeys resultantes (1/2)

Deben definirse los Journeys de adopción en base al programa de Gestión del Cambio…



Programa de Gestión del Cambio

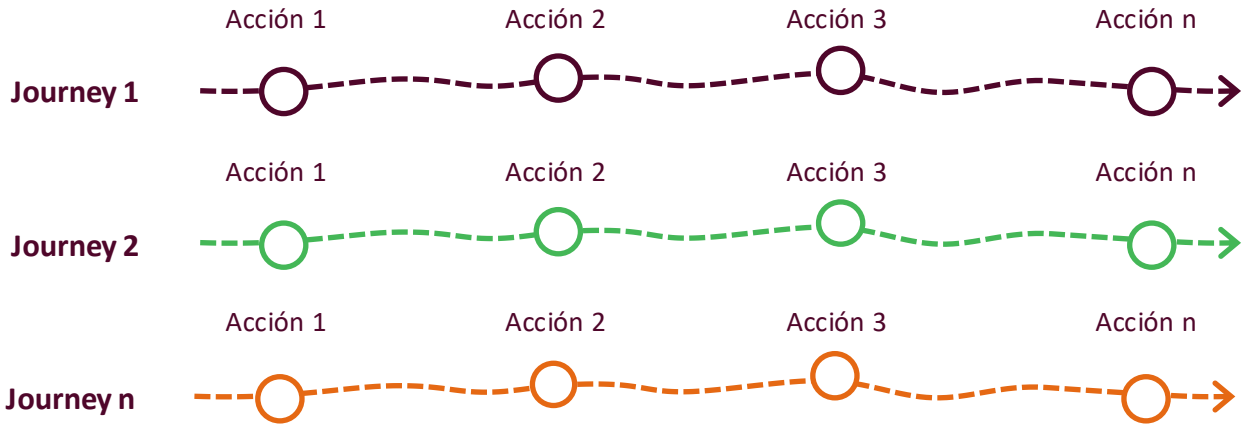

Los *journeys* de adopción facilitan el seguimiento y el progreso gradual hacia la meta final y ayudan a **mitigar riesgos** permitiendo **realizar ajustes** y asegurando una **transición más suave y exitosa**

… con el objetivo de establecer, capturar y cuantificar los impactos




- **Establecer metas medibles y concretas** para cuantificar el retorno del programa y evaluar el éxito de la implantación
- **Alinear las expectativas** de todas las áreas involucradas para lograr una visión común y coherente
- **Establecer metas ambiciosas a largo plazo, lo que requiere dedicación y perseverancia en su consecución**

El programa de gestión del cambio finaliza cuando se hayan alcanzado los objetivos establecidos

Los journeys incluyen acciones de adopción, comunicaciones y para cada grupo en base a necesidades y comportamientos

Definición de Journeys resultantes (2/2)

Ilustrativo

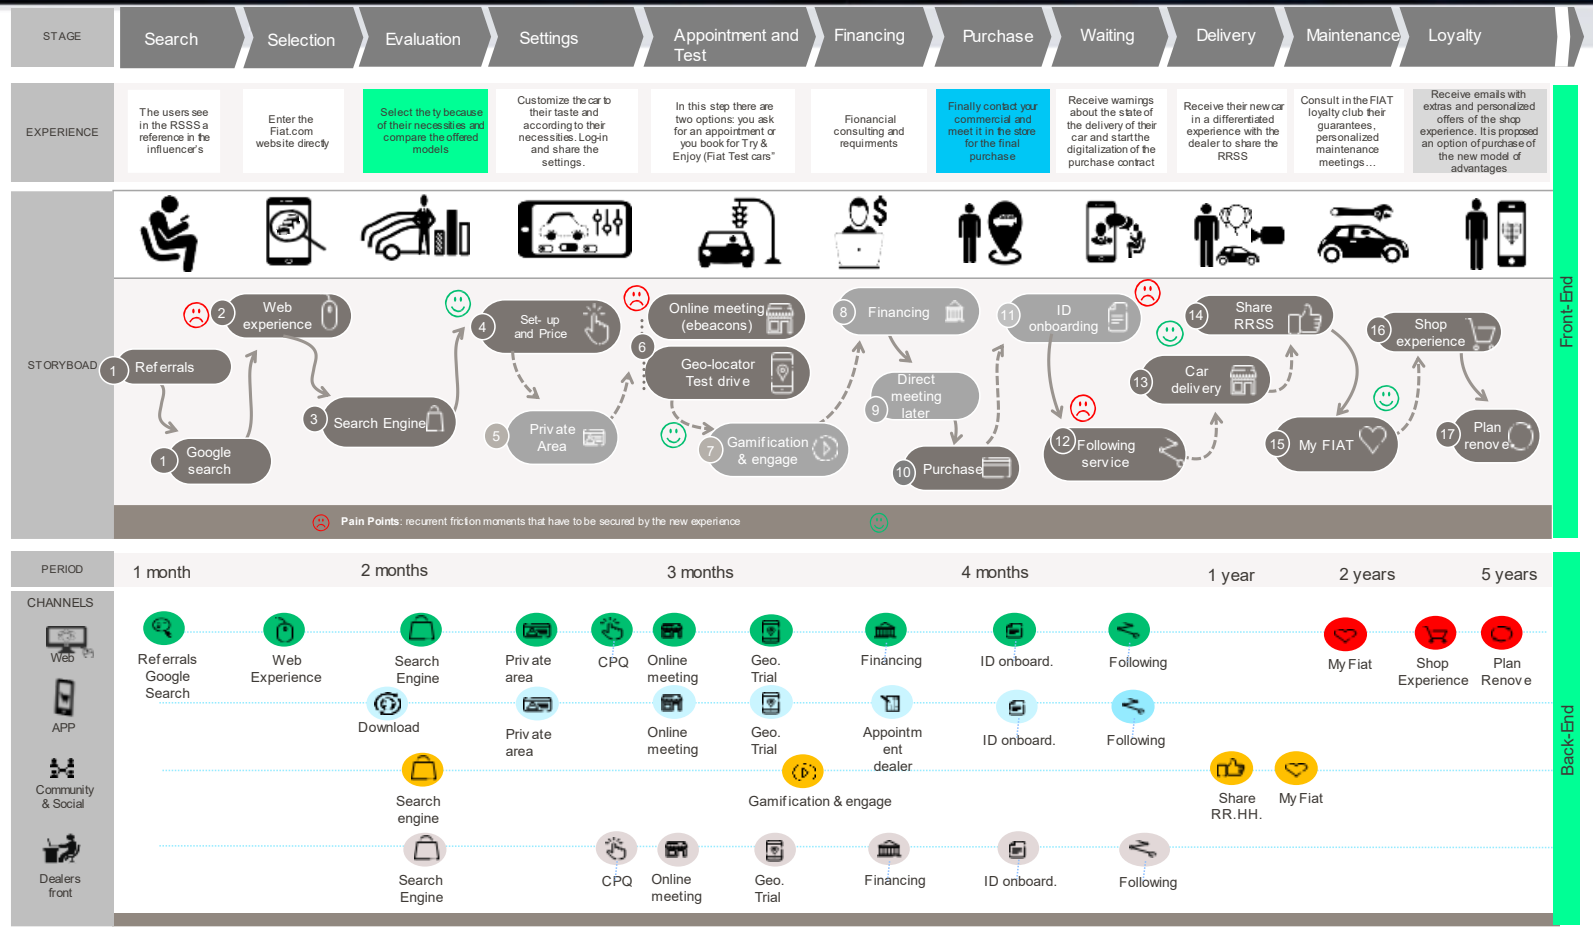


Objetivos de un journey de adopción

- Diseñar un viaje que permita **experimentar la gestión del cambio** de forma personalizada en función del **perfil, capacidades y comportamiento** del usuario
- **Medir y capturar la experiencia del usuario** durante la adopción del cambio
- **Eliminar los "puntos de dolor"** identificados durante el proceso de cambio y **potenciar los "momentos de la verdad"** definidos

La definición de KPIs durante el assessment permitirá medir la adopción de las funcionalidades implementadas en cada release

Elaboración de KPIs, plan de seguimiento y control (1/2)



- Se identificará la **información e indicadores disponibles** en Salesforce para las funcionalidades implementadas
- Se propondrán **nuevos indicadores** que permitan medir:
  - **Uso de la herramienta**
  - **Utilización de funcionalidades implementadas**
  - **Satisfacción** del usuario
  - **Fiabilidad** de las nuevas funcionalidades implementadas

Indicadores de uso (nivel de uso por colectivo)	• Número de cotizaciones con pricing dinámico generadas al día por usuario • Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario • Uso de la funcionalidad de volcado de recibos • Número de solicitudes de abono procesadas
Indicadores de soporte	• Número de incidencias generadas en funcionalidad de actualización de datos en póliza • Número de registros de error generado por día • Número de consultas al apartado FAQ • Incidencias funcionales repetitivas • Tiempo medio de incidencia abierta en el sistema
Otros indicadores	• Grado de satisfacción de los usuarios • Curva de aprendizaje y rendimiento, • Número de visitas a los cursos subidos a la plataforma • Puntuaciones medias de los tests ejecutados por usuarios

Los KPIs podrán monitorizarse a través de la fijación de umbrales y alertas en un cuadro de mando de adopción de cada release

Ilustrativo

Elaboración de KPIs, plan de seguimiento y control (2/2)



- Se reportan los resultados periódicamente según las KPIs establecidas y con acompañamiento experto
- Es clave la monitorización del despliegue
- La **definición de umbrales y controles** permite configurar alertas ante desviaciones no contempladas
- Los indicadores acordados podrán ser agregados en **un cuadro de mando de gestión del cambio** para facilitar su visualización
- Una comunicación fluida con las diferentes áreas implicadas es una palanca óptima para el transcurso del proyecto

Ejemplos de monitorización:

- Número de expedientes enviados a través de la nueva funcionalidad
- Ratio de abandono del nuevo proceso de cotización para el Contact Center Inbound
- Número de clics promedio para realizar la emisión
- Número de incidencias generadas en el nuevo proceso de carga automática de recibos
- Páginas y lugar en las que se realizó el abandono

Seguimiento de conexiones a la herramienta





Seguimiento de emisiones realizadas con nuevo portal

En el assessment inicial se definirá la estrategia de refuerzo y control, que deberán activarse ante desviaciones en los KPIs definidos

Diseño de la metodología y estrategia de refuerzo

Recopilación de Feedback



Medición y análisis de los resultados recopilados en las **encuestas** e **indicadores de seguimiento y adopción**

Plan de seguimiento



- Seguimiento del uso del nuevo sistema y análisis de datos recopilados con los indicadores
- Análisis de seguimiento de incidencias para identificar lagunas formativas, FAQs, etc.

Acciones correctivas



- Identificación de colectivos/ áreas con resistencia al cambio
- Acompañamiento a los usuarios identificados y refuerzo de material formativo para asegurar una correcta transmisión de conocimiento, mitigación de lagunas formativas y formación en casos prácticos del día a día

Análisis Beneficios vs plan



Evaluación del éxito de la implantación considerando los targets definidos y objetivos cumplidos en términos de adopción para los distintos perfiles de la organización

Assessment inicial de preparación del del Cambio

1 | 2 | 3 | 4 | **5**

Un traspaso de conocimiento asegura continuidad operativa, minimiza riesgos y maximiza el valor generado por el proyecto

Elementos clave a considerar para el traspaso del conocimiento

	Propósito	Contenido	
Marco del traspaso	Establecer el propósito, alcance y lineamientos del proceso de transferencia. **Define el "por qué" y el "para qué"**	• Objetivo del traspaso • Alcance temático (qué conocimientos se transfieren)	• Criterios de éxito • Roles clave involucrados
Inventario de conocimiento	Identificar y **clasificar de forma estructurada el conocimiento clave** que debe ser transferido, asegurando cobertura completa	• Lista de temas/procesos clave • Nivel de criticidad o riesgo • Formato de transferencia propuesto	• Fuente del conocimiento (persona, documento, herramienta)
Mecanismos de transferencia	Determinar los **métodos y medios por los cuales se realizará el traspaso** de forma efectiva y comprensible para los destinatarios	• Tipos de actividades (talleres, demos, capacitaciones, entregas documentales)	• Agenda detallada • Materiales de apoyo • Participantes por sesión
Soporte documental y repositorio	**Garantizar** que toda la información transferida quede **registrada, accesible y mantenible para su uso futuro**	• Manuales, plantillas, flujos, lecciones aprendidas • Estructura del repositorio	• Accesos definidos • Responsable de custodia
Plan de continuidad	Asegurar que el conocimiento transferido se mantenga vigente**, se actualice y se utilice correctamente en el tiempo**	• Responsables post-proyecto • Mecanismos de actualización • Canales de soporte y consulta	• Indicadores de apropiación y uso

Una vez realizado el *assessment inicial* de la gestión del cambio iniciaremos la ejecución de las actividades asociadas a cada una de las *releases*

Framework de la Gestión del Cambio – Gestión por *release*

I *Assessment* inicial de preparación del del Cambio



- Analizar el **punto de partida** (procesos, cultura, competencias, niveles de resistencia, etc.)
- Identificar y clasificar los **grupos de usuarios / stakeholders** y entender su operativa actual
- Definir cómo ejecutar **comunicación y formación** en el proceso de gestión del cambio
- Establecer la metodología de las **acciones de adopción**
- Resultará un **journey de acciones** (formaciones y comunicaciones) **por grupo de usuario**
- Definir **modelo de acompañamiento, seguimiento y refuerzo**

4 semanas

A ejecutar de forma previa a la preparación de la primera release

II Gestión del cambio ligada a cada *release*



- **Revisión y refinamiento del enfoque preliminar definido en el assessment** que deberá ajustarse y personalizarse.
- Se **elaborarán los materiales seleccionados** en base a las características de cada release funcional
- Se ejecutarán las **acciones de gestión del cambio** a **asociadas a cada release**
  - **Acciones de comunicación y motivación** antes de la certificación intermedia o ejecución de releases parciales
  - **Acciones de formación** tras la certificación intermedia de la release y antes de implantación
  - **Acciones seguimiento y control** continuas**, y de refuerzo**

8 semanas por reléase (4 de preparación y 4 de ejecución)

A ejecutar en paralelo a cada release funcional y posteriormente para seguimiento y control

Para organizar cada reléase, emplearemos el framework de trabajo de Minsait para la gestión del cambio alineado con el equipo interno de Línea Directa

Framework de Gestión del cambio ligada a cada *release*

Definición | Desarrollo | Pruebas | Despliegue

1. Refinamiento del assesment inicial y preparación


Para cada reléase del proyecto de implantación, se refinarán las tareas realizadas en el assesment inicial y se revisarán y ajustarán de forma detallada los **usuarios impactados, se acordará definitivamente las acciones de adopción** (formación comunicación) y se **elaborarán los materiales** que les darán soporte en base a la estrategia del assessment inicial

2. Ejecución

Se ejecutan las **acciones de formación, adopción y comunicación** en línea con la estrategia del assessment inicial

3. Refuerzo

Se recoge el **feedback de usuarios** y se **refuerza ante desviaciones** en indicadores

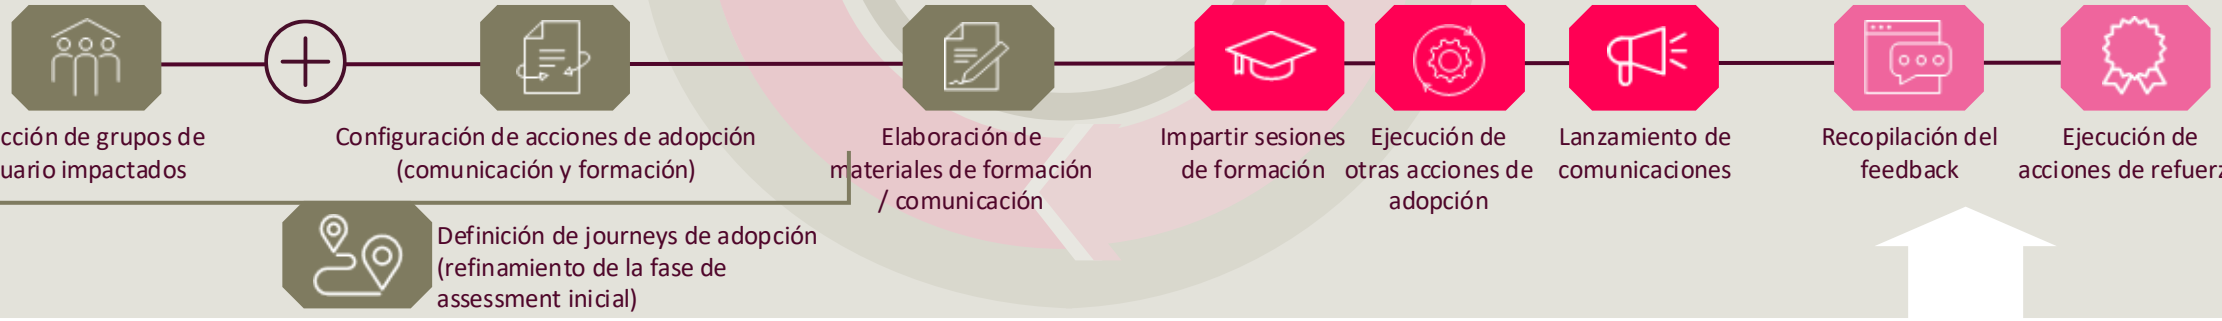


4. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación se realizará en función del **plan de seguimiento, control y refuerzo** definido durante el assessment inicial, que determinará los **indicadores a monitorizar**, los **umbrales** para la fijación de alertas y las **acciones de refuerzo** a ejecutar ante desviaciones

La fase de preparación se ha abordado en su mayor parte durante el assessment inicial, pero será necesario personalizar y adaptar a cada release

Refinamiento del *assesment* inicial y preparación



Grupos de usuarios	Confirmar usuarios impactados por la reléase, el grado de afectación en su día a día y clasificar para determinar las acciones más adecuadas
Formación y materiales	Elaboración de las formaciones acordes al plan para poder realizar el diseño de materiales correspondientes
Comunicación	Adaptar las comunicaciones previstas a los contenidos específicos de la release y a las características de los usuarios impactados
Acciones de adopción	En base al assessment inicial y las características de los usuarios seleccionar las acciones de adopción para cada grupo y plantear el calendario detallado
Journeys de adopción	Revisar los journeys establecidos en el assessment inicial para garantizar que se realizan las acciones planteadas y ajustar en función de las necesidades específicas de la release

Entregables a construir

Manuales de la operativa completa de la release que se construirá de forma **modular** y **específico a cada rol** (coordinador, supervisor, agente y formador)

Materiales de apoyo para las acciones de gestión del cambio (formativo, comunicación, adopción, motivación, etc.):

- Vídeos
- Píldoras formativas
- Infografías
- Cartelería
- Cursos (SCORM)
- …

Disponemos de capacidades de diseño y elaboración de materiales en formato físico y digital para potenciar la adopción

Elaboración de materiales de formación / comunicación

- Contamos con **elementos de diseño y plantillas propias** que ponemos a disposición del proyecto, pudiendo **adaptarnos al lenguaje de diseño y guía de estilo** de la organización
- Se propone la **personalización de los materiales de formación y comunicación** en función del grupo de usuarios para lograr mayor impacto y adopción aunque seguiremos las líneas corporativas
- Se priorizarán y definirán los **componentes reutilizables para generar un lenguaje común en las acciones formativas** reduciendo de este modo las curvas de aprendizaje y costes

Materiales en función del canal:

- **A través de personas**: Workshops y sesiones grupales para formadores, directores y gerentes
- **Canales internos digitales**: Difusión mediante email, teams, forms ,intranet y blog de empresa
- **Canales internos físicos**: Organización de eventos, rollups e infografías y campañas físicas
- **Canales externos**: Diseño y creación de reels y formaciones interactivas

Reels de formación





Formación mediante Form



Formación iteractiva



Difusión mediante email



Nos adaptaremos a la guía de diseño y estilo de Línea Directa para la elaboración de los materiales y proponemos **consensuar los materiales** a elaborar **en función del impacto y contenidos**

II Gestión del cambio ligada a cada *release*

1 | **2** | 3 | 4

En base a la estrategia de comunicación definida en el diseño se personalizarán las acciones de comunicación a lanzar


Ejecución del plan de comunicaciones

- El **envío de comunicaciones** debe realizarse desde canales que garanticen el mayor impacto en función el grupo de usuarios
  - **Teams y plataformas de trabajo colaborativo** frente a correos electrónicos
  - **Eventos corporativos** frente a la intranet de la organización

LDA dispone del canal de email "Iseazy" para personal interno, teams, etc. aunque se propondrán también sesiones presenciales, newsletters, redes sociales, vídeos, etc. según conveniencia y definición en el assessment inicial

tanto **antes de la acción de adopción** para generar interés como **después para generar continuidad** y **recoger feedback**

- Se propone utilizar acciones de refuerzo y recompensa (premios, recompensas, distinciones, etc.) para animar a los participantes a **involucrarse en las actividades**

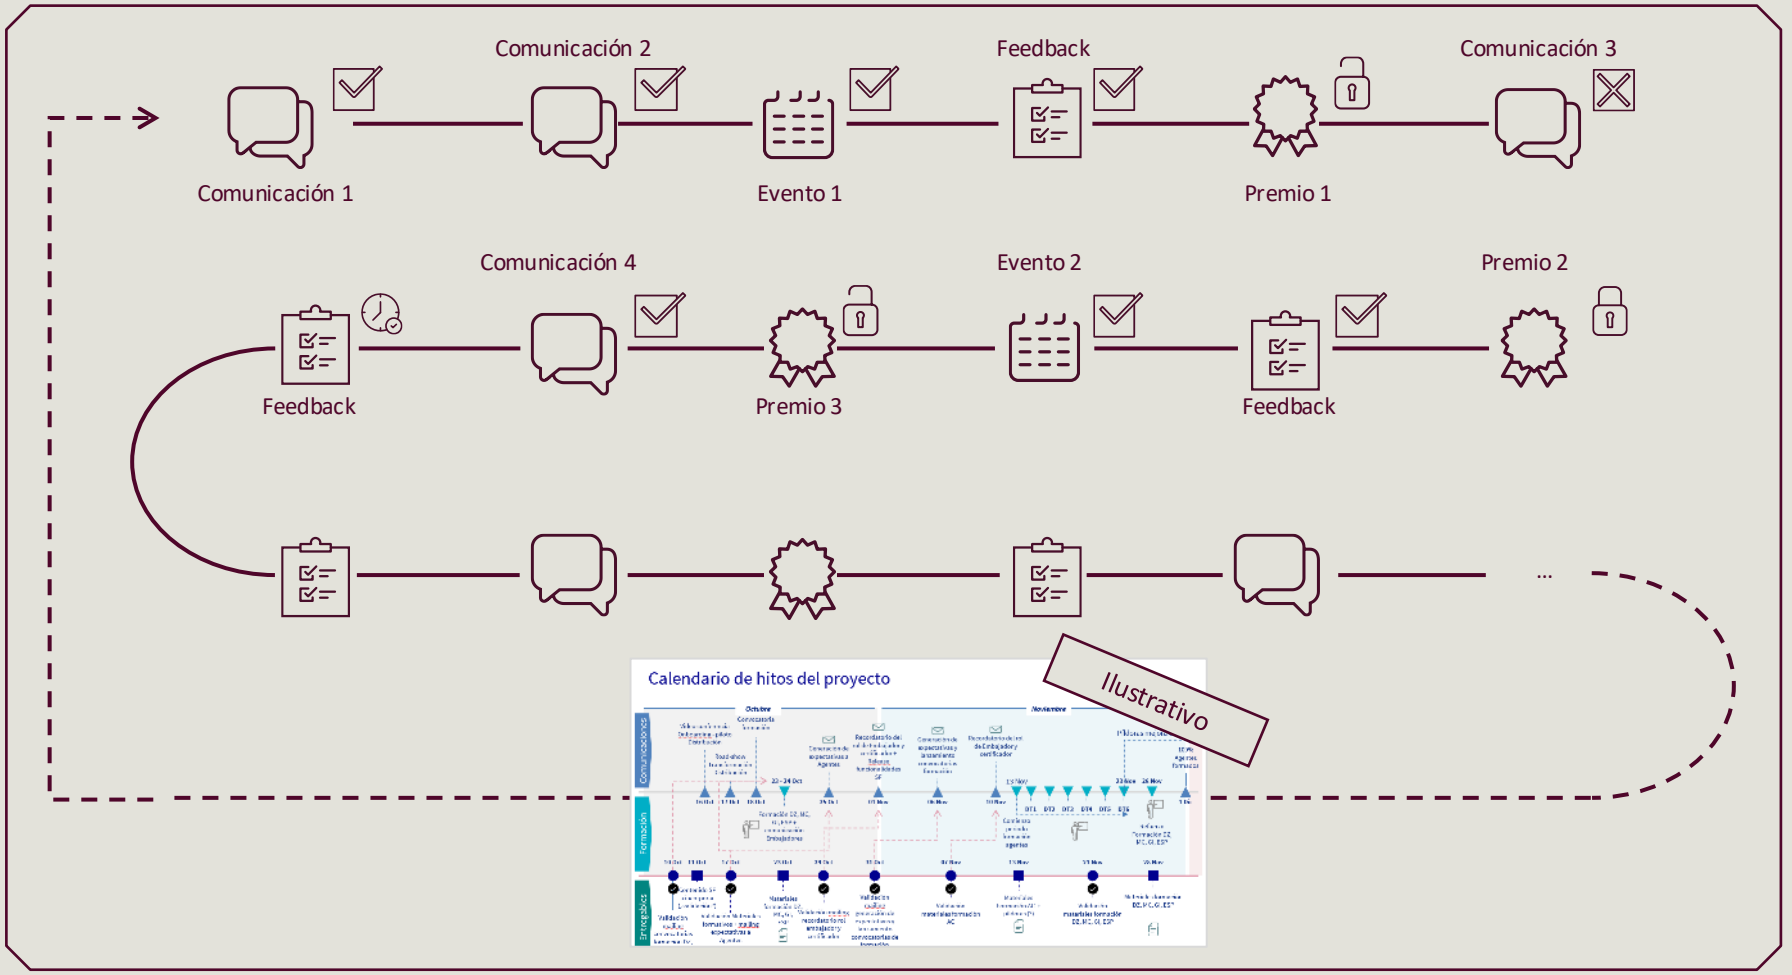

Ejecutaremos la formación en base a la estrategia definida en el diseño de planes y los materiales elaborados en la preparación


Ejecución del plan de formación

- La ejecución de la formación se **realizará siguiendo el Plan de Formación** establecido en los pasos anteriores
- Cada uno de los formadores que recibirán la formación tendrá asignado un **itinerario formativo establecido en el journey de adopción**
- El enfoque de la formación será mixto incluyendo **sesiones presenciales con ejercicios prácticos y formación online**
- Toda la documentación generada **podrá almacenará en el repositorio online** de la organización
- Las sesiones organizadas desde **plataformas de colaboración como Teams potencian la participación** frente a canales tradicionales como intranet o correo

Documentación formación práctica



Videos formativos soportados en plataformas de trabajo colaborativo

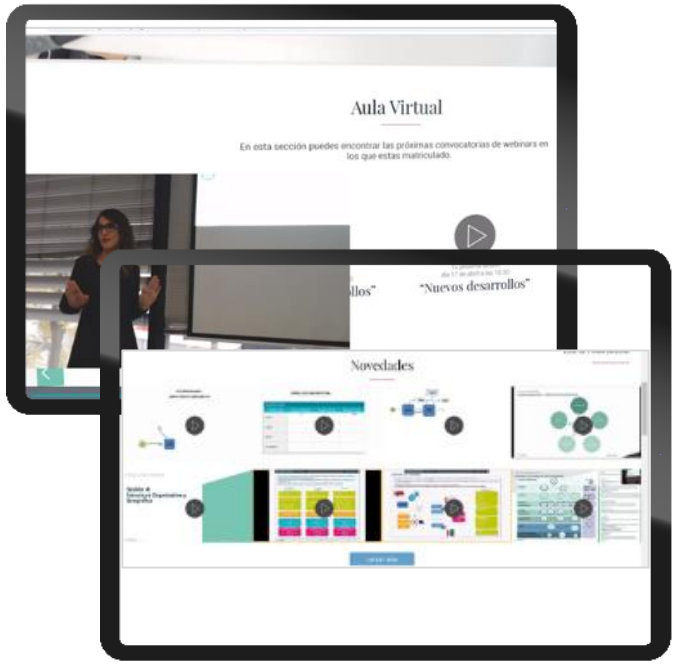

Es clave que se definan Mecanismos de verificación de la transferencia mediante evaluaciones, certificaciones internas o equivalente

II Gestión del cambio ligada a cada *release*

1 | **2** | 3 | 4

En función del volumen y tipología de usuarios e impacto funcional previsto, se utilizará la dinámica de formación óptima

Ejecución de formación en base a escenarios

Preliminar

Por volumen de usuarios	0 - 30	30 - 50	50 - 100	+100
Roles	Directivos, responsables y formadores	Supervisores y coordinadores	Agentes seleccionados como impulsores	Grupos de agentes en función de operativas
Dinámicas contempladas	One-to-one, coffee corner, entrevistas personales, etc.	Sesiones grupales, eventos, espacios de conexión, etc.	Demos en remoto, sesiones en vivo, etc.	Sesiones grabadas, píldoras, vídeos, etc.
Formato de la formación	Presencial	Presencial / Remoto	Remoto	Remoto

Por número de sesiones

Preliminar

Con la información de la que disponemos y bajo las premisas de:

- Formar a un colectivo de 1.000 agentes de Contact Center
- Release funcional tipo de 5 meses de duración
- Preparación previa de las sesiones de 1 mes
- Ejecución de las acciones formativas durante 1 mes
- Sesiones formativas de 20 usuarios en total

Estimamos las sesiones y perfiles involucrados:

50 sesiones en total
1000 agentes / 20 agentes por sesión

2-3 sesiones diarias
50 sesiones / 20 días laborables

3 perfiles del equipo de proyecto involucrados
Reparto de la formación diaria en 2-3 franjas horarias durante la jornada para evitar impactar a la operación de los Contact Center

El **assessment inicial de la gestión del cambio** permitirá identificar la **composición de los equipos involucrados** y su operativa actual con el objetivo de identificar el **gap funcional** asociado a cada release, los **colectivos impactados** y la **estrategia óptima de formación**

Tras la realización de las dinámicas de formación recogeremos el feedback y aspectos de mejora a aplicar en las próximas sesiones

Ejecución del feedback

Ilustrativo

Se han detectado puntos de mejora sobre los que hacer hincapié en las próximas formaciones

	Muy desfavorable	Desfavorable	Favorable	Muy favorable	Valoración media
TOP 3 EVALUACIONES FAVORABLES	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	8,89
Han fomentado la participación de los asistentes	0,0%	0,0%	20,0%	80,0%	9,33
Interés suscitado por el contenido	0,0%	0,0%	40,0%	60,0%	8,67
Estructuración del curso y Ritmo del trabajo	0,0%	0,0%	40,0%	60,0%	8,67
TOP 3 EVALUACIONES DESFAVORABLES	0,0%	0,0%	45,0%	55,0%	7,78
Grado en que las prácticas han permitido asimilar los conocimientos teóricos	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	7,33
Exponen con claridad los conceptos e ideas fundamentales	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	8,00
Conocen en profundidad el tema a tratar en el curso/acción formativa	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	8,00

Principales comentarios detectados:
- No se ha proporcionado ningún comentario

Principales puntos de mejora detectados:
- Inestabilidad de los entornos de formación para el correcto desarrollo de las formaciones
- Utilización de "look&field" provisional que genera falsas expectativas a los agentes

Acciones a realizar para la mejora de las formaciones:
- Hacer hincapié en la completitud de las encuestas de satisfacción al final de las formaciones
- Gozar de autonomía para el cambio de perfiles de Salesforce sin dependencia de la compañía
- Clarificar que estamos en una fase de MVP del CRM y que en el futuro vendrán nuevas funcionalidades

Recopilación de feedback

- Una vez realizada la formación se distribuirán **encuestas para valorar las sesiones** y de esta forma incorporar en los siguientes ciclos formativos las mejoras identificadas
- Adicionalmente podemos **realizar la monitorización de toda la actividad online** para detectar los problemas que se encuentran los usuarios y que no se verbalizan en las encuestas
- Se puede habilitar un **Buzón Generico de resolución de dudas** que enriquecerá el material FAQs y permitirá identificar aquellos puntos donde es necesario reforzar la formación

II Gestión del cambio ligada a cada *release*

1 | 2 | **3** | 4

Tras la realización de las dinámicas de formación recogeremos el feedback y aspectos de mejora a aplicar en las próximas sesiones

Ejecución de acciones de refuerzo

Diseño de acción de refuerzo en base a lecciones aprendidas



Ejecución de acción de refuerzo y monitorización de resultados



Aspectos relevantes

- El seguimiento del **impacto de las acciones de adopción y la recogida de feedback** de usuarios y formadores permitirá **enriquecer el diseño de las acciones de refuerzo**
- El **refuerzo se ejecuta sobre las acciones de adopción realizadas** y no sobre el plan de gestión del cambio en base a:
  - **Feedback** de usuarios y formadores
  - **Lecciones aprendidas**
  - **Monitorización realizada** a través de indicadores

II Gestión del cambio ligada a cada *release*

1 | 2 | 3 | **4**

Se definirán KPIs que medirán el uso y éxito de la herramienta, y los monitorearemos a través de cuadros de mando

Seguimiento y evaluación

A Modelo de seguimiento: Construcción de indicadores

- Se identificará la **información e indicadores disponibles** en la propia herramienta o funcionalidad implementada
- Se propondrán **nuevos indicadores** que permitan medir:
  - **Uso de la herramienta**
  - **Utilización de funcionalidades implementadas**
  - **Satisfacción** del usuario
  - **Fiabilidad** de las nuevas funcionalidades implementadas
- Los indicadores se clasificarán en tres grupos:

No exhaustivo

Indicadores de uso
- % de usuarios que acceden al CRM
- Tiempo medio de sesión en la herramienta por usuario

Indicadores de soporte
- Incidencias funcionales repetitivas
- % de empleados que completan acciones de formación

Otros indicadores
- Grado de satisfacción de los usuarios
- Curva de aprendizaje y rendimiento,

B Seguimiento de la adopción: cuados de mando

- Se reportan los **resultados periódicamente según los KPIs** establecidas y con acompañamiento experto
- Es clave la **monitorización del despliegue**
- La **definición de umbrales y controles** permite configurar alertas ante desviaciones no contempladas
- Los indicadores acordados podrán ser agregados en **un cuadro de mando de gestión del cambio** para facilitar su visualización
- Una **comunicación fluida con las diferentes áreas** implicadas es una palanca óptima para el transcurso del proyecto

Seguimiento de emisiones realizadas con nuevo portal



Seguimiento de conexiones a la herramienta



Ilustrativo

Modelo operativo y de relación

08



MINSAIT


Modelo de relación

8.1

MINSAIT

Modelo de relación

Para asegurar la consecución de los objetivos marcados se define un modelo de gestión atendiendo a 3 capas donde se asienta el control por cada interviniente:

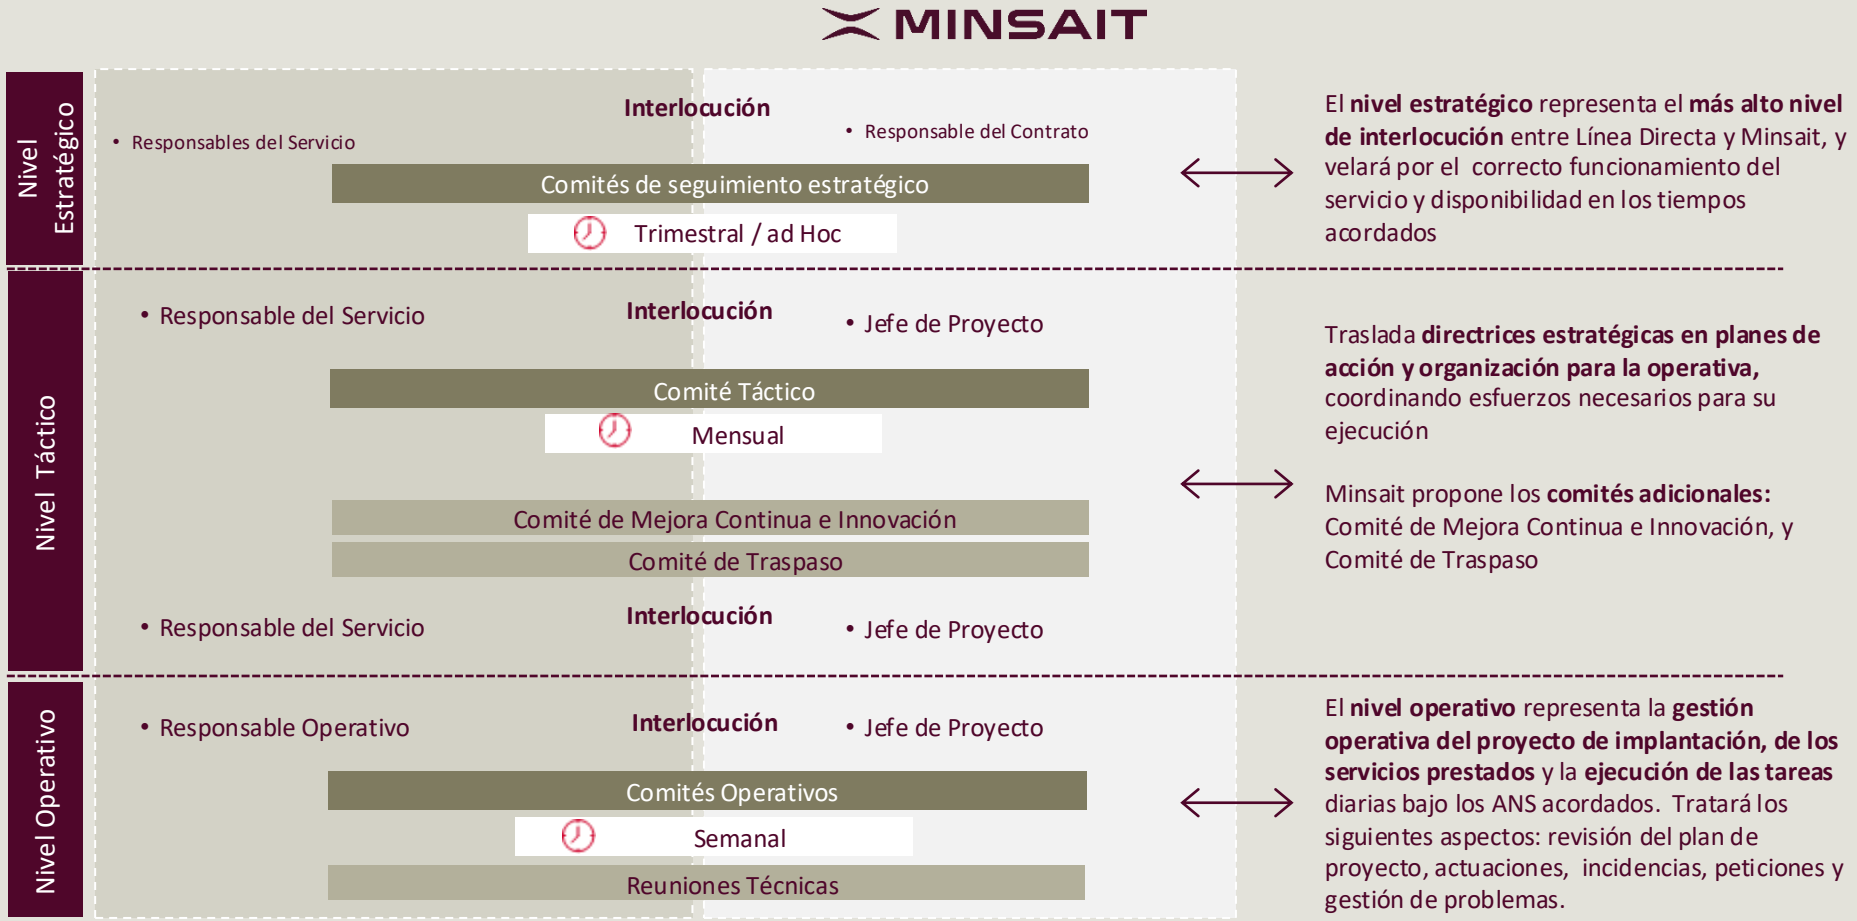

El **nivel estratégico** representa el **más alto nivel de interlocución** entre Línea Directa y Minsait, y velará por el correcto funcionamiento del servicio y disponibilidad en los tiempos acordados

Traslada **directrices estratégicas en planes de acción y organización para la operativa,** coordinando esfuerzos necesarios para su ejecución

Minsait propone los **comités adicionales:** Comité de Mejora Continua e Innovación, y Comité de Traspaso

El **nivel operativo** representa la **gestión operativa del proyecto de implantación, de los servicios prestados** y la **ejecución de las tareas** diarias bajo los ANS acordados. Tratará los siguientes aspectos: revisión del plan de proyecto, actuaciones, incidencias, peticiones y gestión de problemas.

VALOR AÑADIDO

Proponemos establecer un comité de innovación adicional tras la puesta en producción de la Fase 2

Para una implantación óptima, se ha estimado la dedicación necesaria de las diferentes áreas de Línea Directa en las tareas incorporadas en la planificación


El planteamiento escalonado de go-lives que proponemos permite **optimizar el impacto sobre los usuarios**, concentrando los cambios en un único despliegue por tipología de usuario y facilitando así la gestión del cambio y la adopción. Solo en los colectivos más implicados —como el equipo de cotización multirramo, que será el primero en recibir evolutivos— se contempla un máximo de dos go-lives, minimizando el esfuerzo adicional.



Usuarios afectados por cada Go-live

	COMERCIAL					CARTERA				SINIESTROS	
	Multiramo (Hogar + Motor + mascota + antiokupa)	Expats multiramo	Salud	Empresas motor	Empresas multiriesgo	Retención	Digitalización y eficiencia	Venta Cartera	Salud	Motor	Hogar y multirriesgo
Go-live 1: MVP Operativo	X	X									
Go-live 2: Transformación del ciclo comercial	X										
Go-live 3: Gestión postventa		X				X	X	X		X	X
Go-live 4: Transformación integral de Salud			X						X		
Go-live 5: Modelo comercial Empresas				X	X						
Go-live 6: Fidelización y Omnicanalidad conversacional							X				

A partir de este enfoque, **la tabla de dedicación por fase muestra la estimación de esfuerzo que deberá asumir cada tipo de usuario en cada fase del ciclo de vida del proyecto, siendo esta dedicación aplicable únicamente en los go-lives que afectan a cada colectivo**. De esta manera, se obtiene una visión clara, realista y proporcionada de la participación necesaria en actividades como diseño, pruebas o despliegue, asegurando una planificación equilibrada y alineada con el impacto real sobre cada grupo de usuarios.



Modelo de gobierno

8.2

MINSAIT


Metodología de gestión de proyecto

Desde Minsait proponemos realizar tareas de dirección, seguimiento y control del proyecto, **desde el inicio del mismo hasta su finalización**, destacando las siguientes:

Inicio de proyecto	Se entregará a LDA un Acta de Inicio de Proyecto (o de kick-off) que refleje los acuerdos adoptados en la reunión de arranque, además de un **Plan de Proyecto**.
Gestión del avance del proyecto	Minsait aplicará el estándar del valor ganado del *Project Management Institute* (PMI, en adelante) como mecanismo de control del avance, presentando en los diferentes comités un cronograma de proyecto actualizado.
Gestión de riesgos	El Jefe de Proyecto de Minsait mantendrá un Registro de riesgos e incidencias que presentará actualizado en todos los comités de Dirección y Seguimiento.
Gestión de configuración	Minsait prestará una atención principal a esta actividad, por lo que se utilizará el repositorio documental y de código establecido por LDA. De no existir, Minsait se compromete a proporcionar un espacio documental para almacenamiento de los entregables de proyecto.
Control integrado de cambios	Este proceso guiará durante todo el ciclo de vida la gestión del alcance y los requisitos aprobados, de manera que se someterán a la correspondiente valoración las solicitudes de cambio recibidas sobre alcances previamente definidos y aprobados.
Cierre de proyecto	Para finalizar, cuando concluya la transferencia del proyecto a LDA o a un proveedor que éste indique, se entregará el **acta de cierre de proyecto.**

Herramientas de control


Desde Minsait proponemos utilizar Jira como herramienta de seguimiento y control del proyecto, ya que proporciona tableros Kanban para poder visualizar el estado de cada tarea y nos permite controlar el progreso a través del panel de control del proyecto, que proporciona una descripción general de las métricas clave y el progreso del mismo.

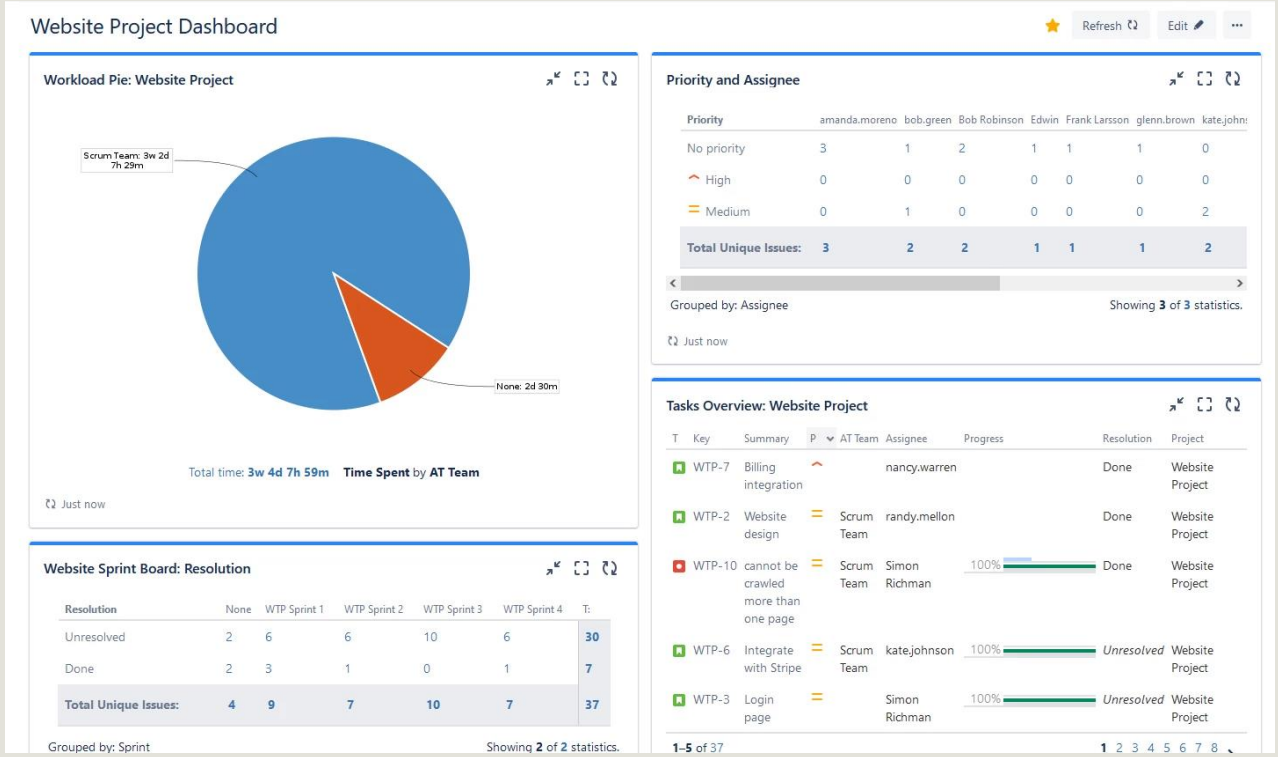

Minsait propone un completo plan de reporting, combinando tanto el informe de seguimiento mensual como otros informes asociados al modelo Scrum. A continuación, se detallan estos informes: informe de seguimiento mensual, informe de seguimiento quincenal, registro de riesgos e incidencias, informe de avance de la transferencia, registro de solicitudes de cambios, planificación y actas de reunión.

Herramientas de control


Como herramientas colaborativas de apoyo a la gestión del proyecto, Minsait propone el siguiente catálogo:

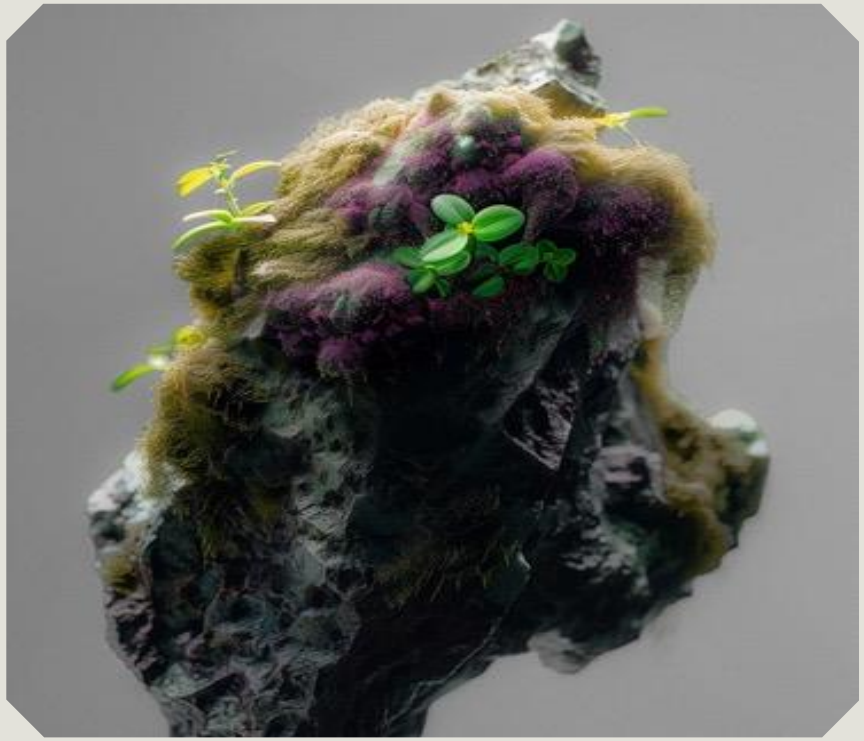

Ámbito	Herramienta	Beneficios que aporta a Línea Directa y Minsait
Gestión de proyectos y tareas	Jira	• Gestionar de forma centralizada el proyecto • Visualizar planificación de alto nivel • Utilizar los Kanban de Jira • Registrar incidencias de las pruebas UAT • Registrar resultados de las pruebas • Integración con SVN
Tareas internas del equipo	Microsoft Planner	• Tareas de gestión • Fechas de seguimiento de entregables • Tareas a corto del equipo técnico
Colaboración	Microsoft Teams	• Creación de un grupo compartido • Compartir documentación de proyecto • Chat formal para el equipo de proyecto • Almacenamiento de actas de los comités • Creación de canales específicos para tareas concretas del proyecto. A modo de ejemplo: ○ Un canal específico para la arquitectura. ○ Un canal específico para la gestión del cambio
	Microsoft Lists	• Compartir en web listado de elementos • Compartir en web listado de documentos • Compartir en web listado de peticiones varias • Compartir en web necesidades de las áreas
Resúmenes de reuniones	Microsoft Onenote	• Centralizar en web resúmenes de reuniones • Centralizar en web resúmenes de comités • Centralizar en web reuniones de aceptación • Dejar traza de acuerdos de las dailys • Centralizar actas con equipos técnicos de Línea Directa.
Cuestionarios	Microsoft Forms	• Para cuestionarios de toma de datos • Para cuestionarios de QA internos • Para realizar checklists internos del equipo

Metodología de gestión de riesgos

El **principal objetivo** de la gestión de riesgos consiste en asegurar que todos los riesgos que puedan afectar al proyecto se identifican lo antes posible y en que se lleven a cabo las **acciones mitigadoras** necesarias para reducir su probabilidad y/o reducir el nivel de impacto en el proyecto.










Una adecuada **gestión del riesgo** debe incluir, al menos, los siguientes **principios**:

- **Seguimiento** de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto
- Tomar **decisiones** basadas en el análisis de riesgos
- El **proceso** de gestión de riesgos debe ser **formal y aprobado** por todas las partes implicadas en el proyecto. La metodología debe ser razonable, si el proceso de gestión del riesgo es demasiado complejo, puede que no se lleve a cabo por lo que no será útil
- El Proceso de Planificación de Gestión de Riesgos se puede describir como el mejor enfoque metodológico para evitar, mitigar y superar los riesgos
- Aunque todos los miembros del equipo de proyecto pueden y deben levantar riegos, el riesgo como tal será gestionado por el equipo de gestión del proyecto, y se debe hacer seguimiento de los riesgos a nivel de Comité de Dirección
- Hay que tener en cuenta que gestión del riesgo no siempre supone la eliminación del mismo, sin embargo, hace que las personas involucradas en el proyecto sean conscientes del riesgo y de cómo se debe actuar cuando se materializa

El valor añadido ofrecido por Minsait es que siempre mantiene el foco en la gestión y la minimización del riesgo en sus servicios y proyectos.

Metodología de gestión de riesgos


Se detallan a continuación cada una de las **etapas metodológicas** de la gestión de riesgos:

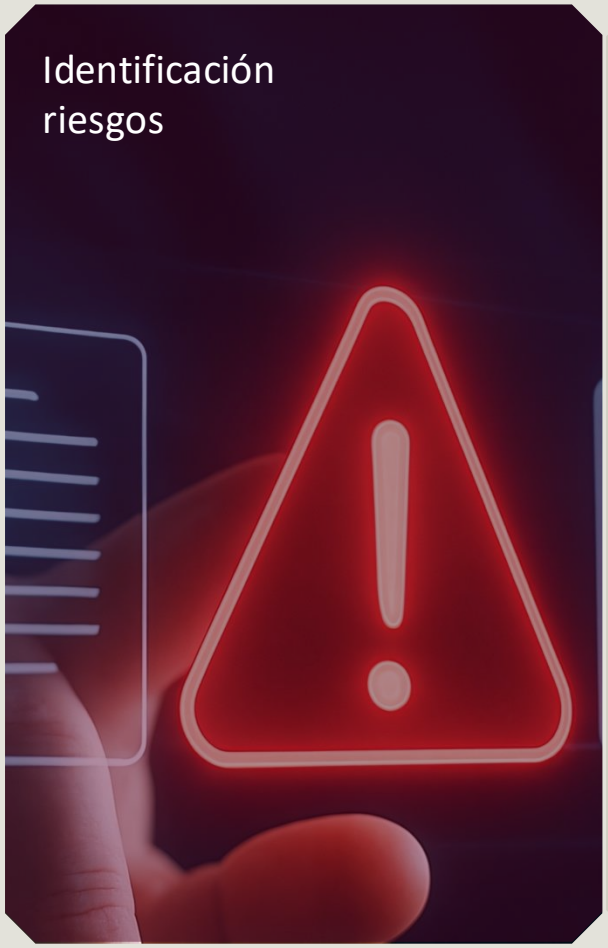


- El registro de riesgos deberá contener una definición del riesgo compuesta al menos por:
  - Su evento o condición de riesgo
  - Su impacto y las causas que provocarían el riesgo identificado y sobre las que se deberán implementar las acciones de mitigación oportunas
- La información del registro se complementará con el detalle de las causas asociadas al riesgo
- El tratamiento del riesgo estará íntimamente relacionado con el valor de severidad obtenido, debiendo establecer en el registro de Riesgos las estrategias de respuesta más adecuadas

Metodología de gestión de riesgos


Análisis de riesgos - Evaluar y Priorizar

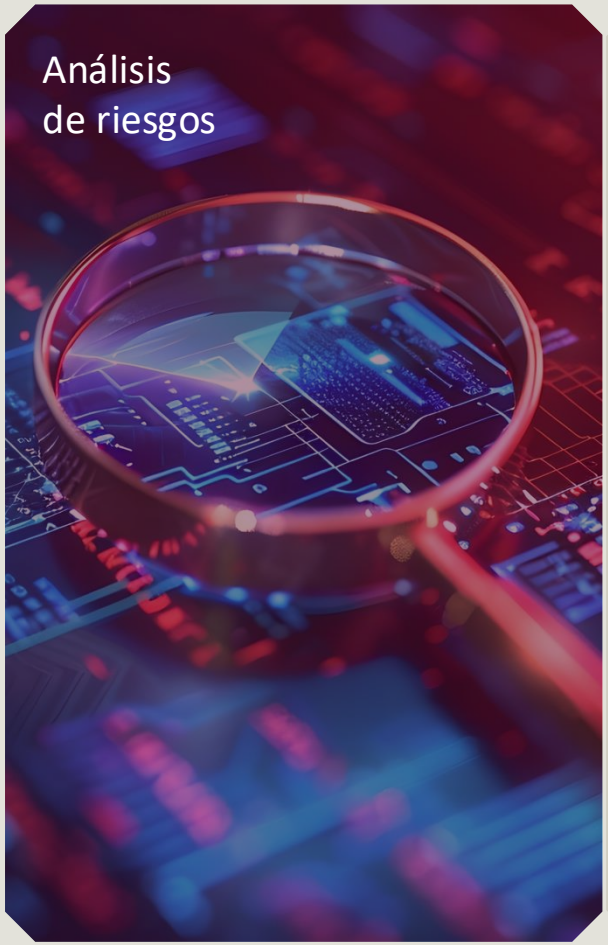

- Una vez descrito cada riesgo, se procede a evaluar la probabilidad de que éste acontezca y la gravedad de su impacto sobre el proyecto en calendario, presupuesto y alcance de acuerdo a la escala de probabilidad e impacto definido
- Como consecuencia de esta evaluación, y mediante la correspondiente **Matriz de Análisis / Riesgos**, se obtendrá la **Severidad (S)** asignada a cada riesgo, y se procederá a **priorizar** dichos riesgos de mayor a menor en función del valor de S obtenido
- También se hará una **evaluación del riesgo residual y/o riesgos secundarios** resultantes de la aplicación de las acciones de respuesta / mitigaciones requeridas, para establecer el nuevo perfil del riesgo

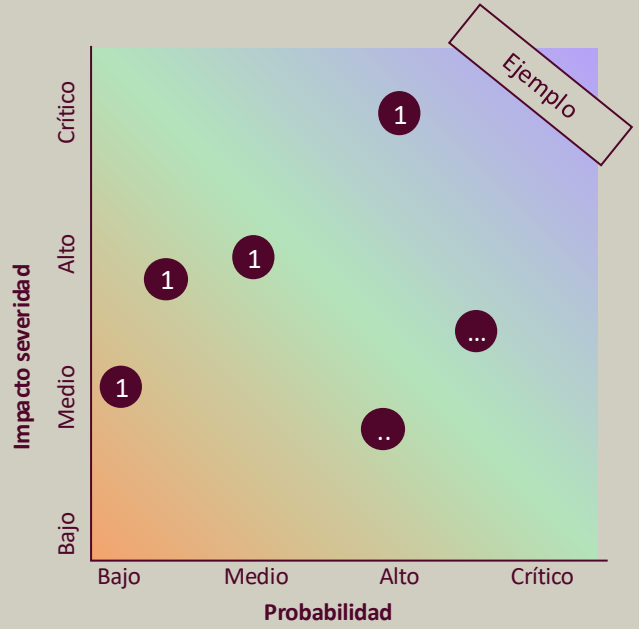


Metodología de gestión de riesgos

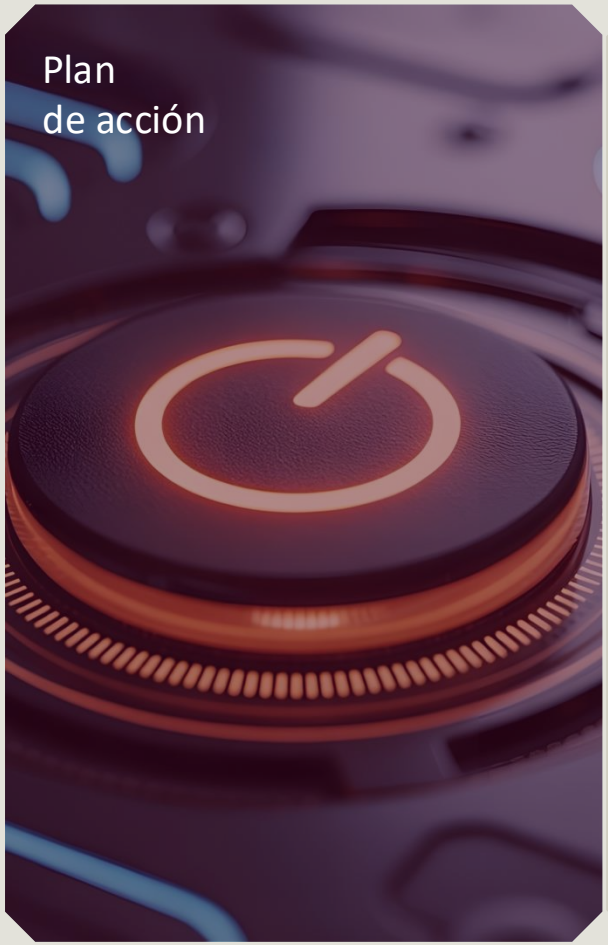

- Para aquellos riesgos priorizados según su severidad sobre los que se deban implementar **Planes de Mitigación**, se establecerán por parte del proyecto las **acciones preventivas necesarias, tendentes a la reducción o eliminación de la probabilidad de ocurrencia o a la reducción o eliminación del impacto del mismo**.
- En los casos en los que la criticidad del riesgo lo aconseje, se establecerán **Planes de Contingencia** en los que determinarán las acciones que será necesario realizar en caso de que el riesgo se materialice.
- Aquellos riesgos que puedan ser aceptados tal cual y, por tanto, no sea necesario el establecimiento de Planes de Mitigación o Contingencia, serán debidamente justificados dentro del **registro de Riesgos** y formarán parte del **seguimiento periódico** del proyecto.
- Los **planes de mitigación y contingencia** correspondientes a cada riesgo se incluirán en el **registro de riesgos del proyecto**, con el objeto de mantener **trazabilidad** de los riesgos con los planes aprobados para cada uno de ellos y posibilitar su seguimiento y comprobación de la eficacia.
- Las modificaciones a los **planes de mitigación** deberán ser aprobadas por el responsable de Proyecto y supondrán la actualización del registro de riesgos del proyecto.

Metodología de gestión de riesgos

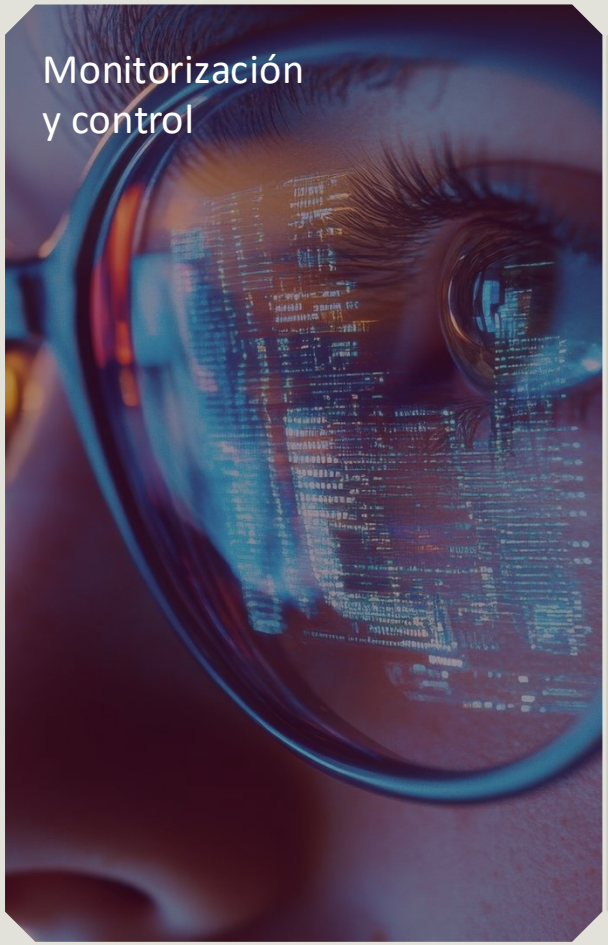

- Una vez incluidas dentro de los planes aprobados las acciones de respuesta para el tratamiento de los riesgos, estos deben ser **monitorizados** con el fin de registrar su evolución, en los **informes de riesgos**.
- La evolución de los distintos riesgos, así como la inclusión de nuevos riesgos será revisada en las distintas reuniones de seguimiento y control del proyecto
- El seguimiento de los riesgos implica el seguimiento de las **acciones** establecidas **en los Planes de Mitigación**, siempre y cuando éstos se hayan establecido, o bien de la supervisión del estado de los riesgos calificados como bajos, con el fin de controlar su probabilidad de ocurrencia. Una vez minimizada o eliminada la probabilidad, así como el impacto del riesgo, el informe de Riesgos habrá de actualizarse y cerrarse.

Entornos de trabajo

A.

Desarrollo

Entorno de tipo Sandbox **utilizado por los desarrolladores** para realizar la implementación y las pruebas, al margen del entorno de producción.

Todos los **evolutivos solicitados y fixes reportados** serán gestionados y solucionados en este entorno.




Movimiento controlado →

B.

Preproducción

El entorno de preproducción será una copia idéntica al entorno de producción de manera que se pueda simular éste con el fin de que los **usuarios de negocio puedan testear las actualizaciones** y asegurar que no dañarán la solución cuando se encuentren desplegadas en el entorno de producción.

Una vez que el proyecto está **totalmente testeado y se han pasado todas las UATs** definidas se desplegará en el entorno de producción.



Movimiento muy controlado →

C.

Producción

Entorno de producción **previsto para utilizarse en el trabajo permanente de la organización**, donde accederán los usuarios finales y donde se trabaja con los datos reales del negocio.



Reportes de Testing ←

Pedidos de nuevas funcionalidades o cambios en el proyecto ←

DevOps y gestión de entornos

Automatización, promoción controlada y gobierno del ciclo de vida



Estrategia de entornos

- Segregación estricta DEV / PRE / PRO
- Separación de Kafka clusters por entorno
- Salesforce orgs diferenciadas
- Configuración externalizada por entorno
- Políticas de acceso diferenciadas



CI/CD y versionado

- Repositorios Git (infra + integración + APIs)
- Versionado semántico de APIs y eventos
- Pipelines automatizados (build, test, deploy)
- Promoción controlada entre entornos
- Infraestructura como código (IaC)



Gestión del ciclo de vida

- Control de cambios y trazabilidad
- Gestión de releases coordinadas (CRM + APIs + eventos)
- Rollback controlado
- Estrategia Blue/Green o Canary (si aplica)
- Gestión de dependencias y compatibilidad

Controles operativos

- Gestión de artefactos y repositorio central
- Escaneo de seguridad en pipeline (SAST/DAST)
- Monitorización post-deploy
- Auditoría de cambios

DevOps y gestión de entornos

Control de Versiones, Despliegue Continuo y Validación - *GIT · Salesforce CLI · OmniStudio Build Tool · DevOps Center*

Control de Versiones GIT

- **Modelos de ramas:**

  Feature Branch Workflow y Gitflow adaptados al ciclo de releases Salesforce.

- **Branching strategy:**

  Ramas dedicadas por ambiente (dev, qa, main). Etiquetado semántico de versiones.

- **Gestión de conflictos:**

  Prevención proactiva, herramientas de análisis y resolución asistida. Formación continua del equipo.

- **Control de cambios:**

  Trazabilidad completa de cada modificación vinculada a user story/caso.

CI/CD & Despliegue de Metadata

- **Herramientas:**

  Salesforce CLI, OmniStudio Build Tool, Copado, DevOps Center, SFDX y Scripts propios.

- **Core Components:**

  Extracción de metadata con Salesforce CLI. Manifiestos de paquetes. Despliegue a org destino.

- **Industries (OmniStudio):**

  OmniScripts, DataRaptors, Templates extraídos/desplegados con Industries Build Tool + CLI.

- **Experience Cloud:**

  Cada comunidad se gestiona como proyecto independiente con paquete único para mayor control.

Validación & Evidencias

- **Pruebas automatizadas:**

  Tests de integración, sistema y UAT ejecutados en cada etapa del pipeline.

- **Generación de evidencias:**

  Registros automáticos de resultados (superados/fallidos) para auditorías y trazabilidad.

- **Revisión manual:**

  Verificación de seguridad, accesibilidad y compatibilidad post-despliegue automatizado.


- **Aprobación stakeholders:**

  Gate de aprobación formal antes de promover a producción. Archivo de evidencias completo.

Modelo de Gobierno del Ciclo de Vida de la Solución: implantación

En este apartado se describirá la **metodología de Gestión de Cambios de Alcance** que servirá de **modelo de Gobierno del Ciclo de Vida** de la Solución, cubriendo tanto los cambios en la fase de implantación como en la fase de soporte, afectando tanto al Core como a las localizaciones.

Durante **implantación** y para asegurar el éxito del proyecto, se recomienda tratar de adoptar las mejores prácticas de las Soluciones de Mercado. Para buscar este objetivo, se ha definido un procedimiento de aprobaciones para minimizar los cambios de alcance y adopción del Estándar.

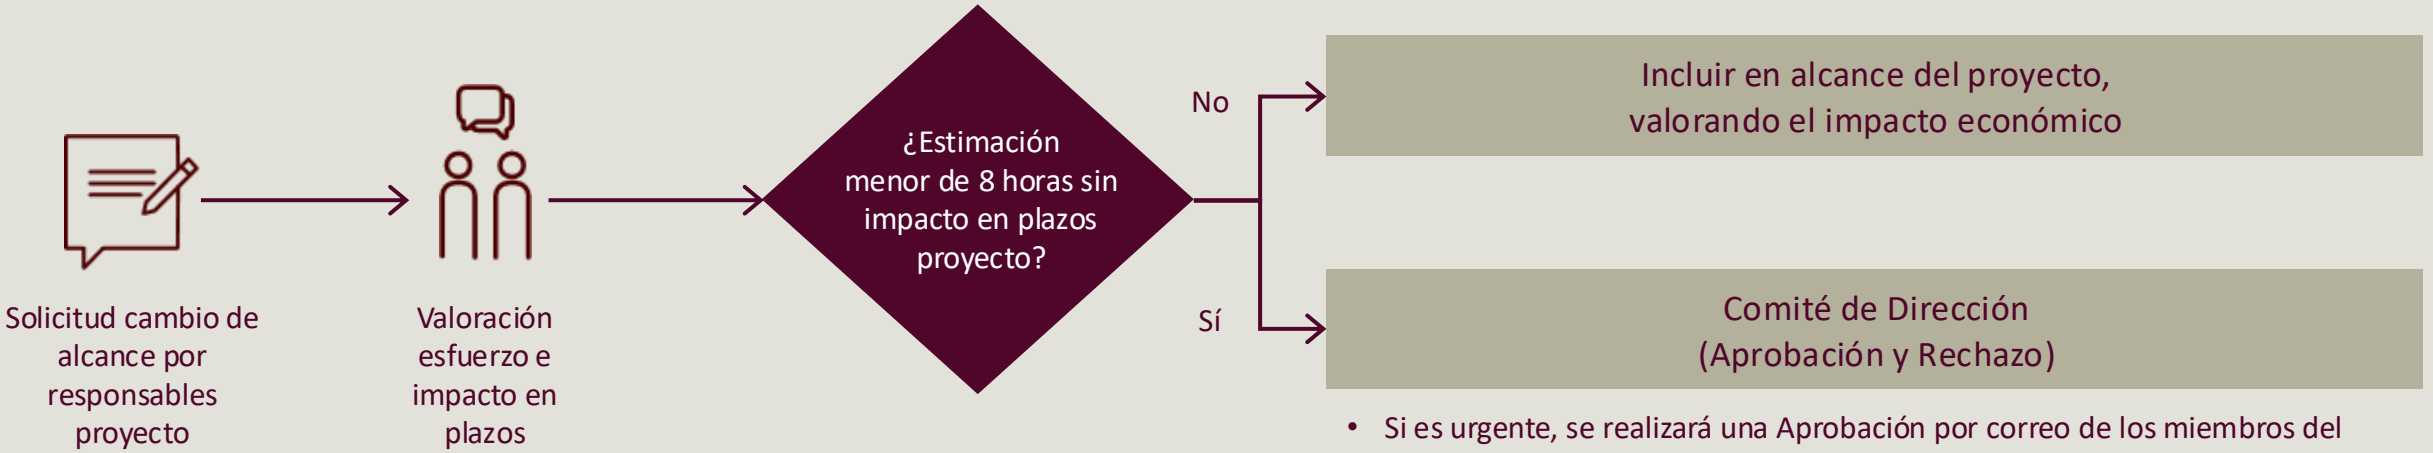

- Si es urgente, se realizará una Aprobación por correo de los miembros del Comité
- Una vez aprobado, se realizará:
  - Ajuste del Plan de Proyecto
  - Notificación a las áreas impactadas por el cambio

A la finalización del diseño se realizará una revisión y se evaluarán las diferencias por exceso o defecto respecto a lo indicado en la oferta y se validará a través del comité de cambios.

Gestión de calidad, seguridad y gobierno del dato

09



MINSAIT

Plan de calidad

Minsait incorpora un Plan de Auditorías y revisión interna de trabajos y entregables que servirá como control de calidad para garantizar en todo momento los estándares del LDA. Las auditorías internas son un elemento clave de **control del sistema de gestión de la calidad del servicio de instalación avanzada,** tanto para asegurar que las actividades y procesos se llevan a cabo bajo los requisitos de calidad previstos, como para evaluar la efectividad general del sistema de calidad.

Se propone:

Un plan de auditorías, que será activado cuando se **incumplan controles de calidad / ANS**, o estos ofrezcan **resultados no esperados** durante un periodo de tiempo considerable.

Revisiones mensuales de trabajo, aleatorios, a cargo del Gestor de Servicio y entregados por el equipo del servicio, con el fin de evaluar la calidad de la entrega y el cumplimiento de los procedimientos definidos para esa tarea.

Check list de verificación técnica y documental , el Jefe de Proyecto, apoyado por los grupos de Consultores y Expertos del fabricante, elaborará esta lista, para evaluar si cada actividad o configuración cumple con los estándares establecidos.

Revisión regular de la documentación almacenada en la Base de Conocimiento del servicio por parte del equipo de gestión del servicio, asegurando la calidad, trazabilidad y estandarización de entregables, en base al Plan de Calidad de la documentación (metodología, roles, calendario de revisiones, checklist de calidad definidos)

Registro de desviaciones, errores o incumplimientos detectados

El resultado de estos controles periódicos se reportará en los Comités Tácticos para implementar **planes de mejora** con el fin de corregir las desviaciones.

Plan de calidad



Fase 1: Definición

Establecer objetivos, alcance, elementos a auditar, recursos, metodología a utilizar, etc. En el caso de auditorías externas, la empresa se implicará en la definición del plan



Fase 2: Ejecución

Aplicar la metodología a los elementos objeto de auditoría para alcanzar los objetivos planteados



Fase 3: Implantación de acciones correctoras

Implantar acciones correctoras bajo un plan detallado y un seguimiento. Es el producto principal de la auditoría, pues el objetivo es mejorar la calidad del servicio y minimizar riesgos.

Concretamente, se realizará un **análisis de las no conformidades detectadas**, cualquiera que sea su origen, emitiéndose un informe con el detalle de las acciones correctoras a llevar a cabo, y su seguimiento hasta su completa resolución. Para la realización de dichas actividades, se seguirán los siguientes pasos:

lisis de no conformidades	Definición de acción correctiva	Inclusión de acción correctiva y seguimiento	Lecciones aprendidas
De una revisión periódica de las actividades, se determina las causas raíz que provocan las no conformidades	Determinar la acción necesaria para corregir la no conformidad y eliminar sus casusas, por ejemplo, refuerzo de la formación del equipo, estableciendo responsables, fechas y actividades concretas	Incluir la acción correctiva tomada en el registro de acciones correctoras para seguimiento. Verificar, tras cierto tiempo, si la medida correctiva o preventiva ha sido efectiva	Se documentarán los defectos comunes y sus soluciones para evitar recurrencias y se expondrán al equipo en las sesiones trimestrales de formación avanzada “Lecciones Aprendidas”

Mejora continua

VALOR AÑADIDO

Minsait pone a disposición de LDA su metodología basada en la mejora continua y adaptada a potenciar la industrialización de las operaciones. Consideramos que este es el modelo a seguir para la integración de la actividad planificada y no planificada de las actividades objeto del servicio:

1 Analizar y Definir

Estudio de la actividad TI realizada y catalogación técnica en los servicios

- Catalogación de actividad y procesos
- Identificación del sistema de medición de la actividad
- Recopilación de herramientas
- Estructuración de cada actividad en tareas y establecimiento de flujos
- Definición e implantación de un sistema de medida real de la actividad realizada (esfuerzos y costes reales)
- Frecuencia, esfuerzo de ejecución y nº de elementos afectados por actividad
- Definición y categorización de procesos y tareas
- Delegación de actividad entre niveles

2 Estandarizar, procedimentar, automatizar

- Identificación de Actividades, Problemas e Incidencias Repetitivas
- Priorización y Plan de Procedimentación y Automatización de actividades.
- Estandarización de la actividad y procesos de forma transversal cuando aplique a varios servicios.
- Plan de Herramientas y Estrategia de Procesos .
- Integración de equipos técnicos especializados del Grupo Cesce o Minsait para automatización complejas con alto impacto .

Plan y ejecución de estandarización, procedimentación y automatización de procesos/actividades

3 Forma y realizar traspaso de Conocimiento

Plan de formación complementaria y traspaso a equipos internos/externos

- Programación de planes de formación a través de las plataformas online del servicio.
- Workshop de refuerzo según mapa de conocimiento por parte de equipo experto.
- Generación de documentación asociada a la actividad intervenida.
- Sesiones de traspaso de conocimiento a equipos técnicos internos y/o externos incluso luego de actualizar actividad o procesos previamente intervenidos.

4 Medir y Controlar

- Seguimiento y control de procesos/ actividad es automatizadas.
- Informes (Cumplimiento de Nivel de Operaciones, Incidencias/Peticiones, Esfuerzos/Costes, Tareas planificadas, CMDB, Top Ten’s).
- Identificación de nuevos procesos y actividades por automatizar .

Medición y control de automatizaciones

Mejora continua

Minsait apuesta por **metodologías Lean IT** para garantizar la calidad y mejora continua del servicio. La implementación de Lean IT persigue optimizar el proceso end-to-end que crea valor para nuestros clientes, **identificando y automatización de actividades y obstáculos que generen ineficiencias.** Para ello trabajamos principalmente en tres grandes líneas:

1. Herramientas	2. Procesos	3. Personas
Automatización de tareas	Racionalización de procesos	Capacitación de roles y perfiles
• Reducción de la demanda • Automatización y monitorización de tareas repetitivas • Eliminación de gaps funcionales • Reducción de tiempos de respuesta y aumento de la disponibilidad de los servicios	• Reducción de tiempo de proceso y de tareas no core • Integración de procesos • Sinergias entre equipos • Mejora de la eficiencia con enfoque en el valor de los procesos • Aplicación de buenas prácticas ITIL 4 en la gestión de servicios ITIL	• Segmentación de niveles de competencia • Mejora de productividad • Planes de formación continua • Gestión del Conocimiento • Workshop de trabajo en equipo • Modelo de trabajo AGILE (Kanban daily meetings, etc)

Informes de Calidad Mensuales

Cada informe mensual de calidad incluye un resumen ejecutivo destacando:


- Logros claves del mes
- Métricas clave proporcionando datos sobre el desempeño
- Calidad de los servicios

una comparación con umbrales de calidad para evaluar el rendimiento, un análisis de tendencias y datos, resultados de auditorías de calidad, acciones correctivas y un plan de mejora continua, además de conclusiones y recomendaciones. Además del PDF, **proporcionamos acceso a un panel de control interactivo en línea** para explorar datos en tiempo real y acceder a informes anteriores para análisis comparativos habilitando un reporting dinámico. El contenido de dichos informes será el reflejado en la siguiente imagen.

Resumen Ejecutivo
Este resumen proporciona una visión general de los principales hallazgos y resultados del mes, resaltando las desviaciones significativas y las áreas que requieren atención.

Métricas Clave del Mes
Incluye datos sobre tiempos de respuesta, disponibilidad, rendimiento, satisfacción del usuario, tasa de resolución en el primer contacto y otras métricas relevantes. Estos datos se presentan en gráficos y tablas para facilitar la interpretación.

Comparación con Umbrales de Calidad
Se compara el desempeño actual con los umbrales de calidad establecidos en el contrato y los Acuerdos de Niveles de Servicio mínimos para identificar desviaciones y el cumplimiento de los estándares predefinidos.



Tendencias y Análisis de Datos
Se realiza un análisis de tendencias y patrones a lo largo del tiempo para contextualizar los resultados del mes. Esto puede incluir gráficos de tendencias y análisis estadísticos.

Resultados de Auditorías de Calidad
Si se realizaron auditorías de calidad durante el mes, se incluyen los resultados y las recomendaciones resultantes, lo que permite evaluar la conformidad con los procedimientos operativos estándar.

Resultados de Auditorías de Calidad
Si se realizaron auditorías de calidad durante el mes, se incluyen los resultados y las recomendaciones resultantes, lo que permite evaluar la conformidad con los procedimientos operativos estándar.

Conclusiones y Recomendaciones
Cada informe concluye con una sección que resume las principales conclusiones y recomendaciones para el próximo mes, proporcionando orientación para las

Plan de seguridad

Teniendo en cuenta que la plataforma a suministrar va a dar soporte a sistemas de información categorizados según el RD 311/2022 o Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) por parte de LDA, tiene todo el sentido que el Plan de Seguridad a diseñar y mantener tenga el ENS como pilar base de cumplimiento. Pero no solo eso, sino que deberá estar alineado con el resto de las obligaciones legales y normativas de LDA. Es por ello por lo que, si bien el desarrollo del presente apartado va a estar enfocado al ENS, una vez se inicien los trabajos se deberá identificar claramente cuáles son las obligaciones de seguridad de la información a tener en cuenta para el Plan de Seguridad (LPIC, LOPDGDD, ISO27001, etc.). El enfoque de Minsait para definir un buen Plan de Seguridad que sea mantenible es sin duda uno basado en un ciclo de Deming o PDCA. Por tanto, debe contemplar el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que garantice la implantación, el control y la revisión periódica de los controles de seguridad requeridos por el ENS (y no sólo de este como se ha comentado en el párrafo anterior). La base metodológica para el despliegue de un SGSI ENS, como no puede ser de otra manera, son las guías CCN-STIC del CCN.

El despliegue de un Sistema de Gestión que permita garantizar el cumplimiento del ENS en la plataforma objeto de licitación va a requerir cuatro grandes fases basadas en PDCA:



VALOR AÑADIDO

Todas las tareas indicadas en las fases descritas a continuación serán realizadas por el Responsable de Seguridad (CSI) de Minsait para el contrato y su equipo de especialistas. Para ello, Minsait involucrará personal especializado en ciberseguridad de SIA, compañía del grupo número 1 de España en el ámbito de los servicios de ciberseguridad.

Plan de seguridad



Planificar:

Esta fase consiste básicamente en la **construcción del Plan de Seguridad**, es decir, del documento que registra y detalla todas las **medidas de protección, las medidas operacionales y las medidas organizativas** necesarias para garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad de la plataforma, de los datos que gestiona y del servicio que presta al LDA y a sus usuarios. Para ello se realizarán las siguientes tareas:

- Identificar a todas las partes y personas responsables de cada uno de los elementos y componentes de la plataforma (Roles y Responsabilidades).
- Activación de la figura de Responsable de Seguridad de Minsait como punto focal de todas las cuestiones relacionadas con la Seguridad de la Información entre el LDA y Minsait dentro del ámbito del contrato.
- Delimitar claramente el alcance de cumplimiento del ENS respecto de la plataforma, en particular aquellos elementos de interfaz con terceras partes que no forman parte de esta licitación. Inventariado categorizado de servicios, sistemas e información dentro de alcance de la plataforma.
- Realizar la declaración de aplicabilidad (SoA) en base al ENS.
- Identificar todas las medidas de seguridad proporcionadas por los distintos proveedores (incluido Minsait) y su grado de madurez.
- Realizar un análisis de riesgos con la herramienta PILAR (metodología MAGERIT) y el consecuente Plan de Tratamiento de riesgos.
- Traslado a todos los proveedores de los riesgos identificados y del Plan de Tratamiento de Riesgos.
- Redacción de la Política de Seguridad, como documento que plasma una declaración de intención de alto nivel respecto de la Seguridad de los productos y servicios proporcionados al amparo del contrato
- Redacción del Plan de Seguridad. En este documento se encontrarán identificadas las medidas de protección, operacionales y organizativas existentes, las partes, grupos o personas responsables de cada una de ellas y los riesgos identificados, así como el responsable de la gestión de cada uno.

Plan de seguridad



Implantar:

En esta fase se van a implantar tanto el **Sistema de Gestión como las medidas de seguridad que fueran necesarias para mitigar el riesgo identificado en base al Plan de Tratamiento de Riesgos construido en la fase anterior**. Para ello se realizarán las siguientes tareas:

- Desarrollo de un marco normativo (políticas, normas y procedimientos) que describa los procesos y procedimientos de seguridad necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma, desde un punto de vista estratégico, táctico y operativo. Esta tarea implicará revisar y adaptar la documentación de seguridad de los distintos fabricantes al contexto del contrato.
- Despliegue de un Modelo Unificado de Controles (MUC) como corpus racionalizado de controles de ENS y de cualquier otra normativa.
- Definición del Ciclo de Vida del Control (CVC) para cada uno de los controles del MUC donde estén definidos: alcance del control, procedimiento asociado de ejecución del control, roles implicados en la ejecución y supervisión del control, periodicidad en la ejecución y verificación del control, proceso de obtención de la evidencia de verificación.
- Desarrollo de Cuadros de Mando con métricas e indicadores (KPIs/KRIs) que permitan medir el estado de los controles de seguridad desplegados.
- Seguimiento con las distintas partes del Plan de Tratamiento de Riesgos y soporte y asesoramiento a las mismas en caso de dudas respecto al despliegue de medidas de seguridad.
- Interfaz entre los distintos equipos y proveedores para la coordinación en el despliegue y mantenimiento de medidas de seguridad.
- Formación y concienciación a todas las partes implicadas en el contrato respecto del Marco Normativo de Seguridad de la plataforma.
- Reporte periódico a LDA del estado de despliegue del Sistema de Gestión.

Plan de seguridad



Verificar:

El objetivo de esta fase es **comprobar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión y por tanto del Plan de Seguridad**, o lo que es lo mismo, el alineamiento de la plataforma y del servicio prestado a las exigencias en materia de Seguridad de la Información requeridas por LDA. La auditoría interna será realizada por un equipo distinto al que implantó el Sistema de Gestión y dio soporte y asesoramiento a los equipos y proveedores en el despliegue de controles de seguridad. Para ello se realizarán las siguientes tareas:

- Definir un plan de auditoría interna de medidas de seguridad para comprobar el correcto alineamiento de la plataforma y del servicio prestado por Minsait respecto del ENS.
- Informar del plan a todas las partes implicadas.
- Reuniones con las personas clave de cada uno de los procesos y sistemas que conforman la plataforma y los servicios asociados para comprobar el estado de los controles del MUC evaluados
- Revisión de toda la documentación aportada por las personas clave.
- Recogida de evidencias que respalden la efectividad de los controles evaluados.
- Redacción del informe de auditoría y traslado a todas las partes implicadas del resultado.
- Soporte a redacción de un Plan de Acciones Correctivas (PAC) por cada una de las partes implicadas.

Plan de seguridad



Mejorar:

Para cerrar el ciclo de mejora continua (PDCA), esta fase busca aplicar aquellos elementos de mejora identificados en la auditoría interna que permitan madurar el Sistema de Gestión y por ende la Seguridad de la plataforma y del servicio asociado y su cumplimiento del ENS y resto de controles del MUC. Para ello se realizarán las siguientes tareas: gestión de las no conformidades identificadas en la auditoría interna mediante el seguimiento de los PAC con las partes interesadas, revisión de Plan de Seguridad incorporando aquellas nuevas medidas de seguridad implementadas desde la última revisión del Plan. El ciclo PDCA se iterará durante todo el contrato, siendo conveniente que por lo menos una vez al año se realice una auditoría interna del Sistema de Gestión.

Plan de contingencia del proyecto

El objetivo es **garantizar la continuidad del proyecto ante cualquier incidencia que pueda afectar la planificación, los recursos o la calidad de los entregables**. El plan establece cómo se detectan, gestionan y resuelven situaciones críticas para minimizar su impacto.

1. IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS

Se monitorizan de manera continua aquellos riesgos o eventos que puedan comprometer el avance del proyecto, entre ellos:

- Retrasos en hitos o entregables clave.
- Dependencias no resueltas con equipos externos.
- Falta de disponibilidad de roles críticos.
- Problemas de calidad en los entregables o en los datos aportados.
- Cambios en requisitos que impactan en alcance o esfuerzo.

2. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El plan se activa cuando se detecta alguno de los siguientes umbrales:

- Desviación del cronograma superior al 3%.
- Riesgos que evolucionan a incidentes bloqueantes.
- Dependencias clave no resueltas en plazo.

3. MEDIDAS CORRECTIVAS

Para cada tipo de incidencia, se aplican acciones predefinidas que permiten restablecer la normalidad del proyecto:

- Replanificación de actividades y caminos críticos.
- Refuerzo temporal del equipo y redistribución de cargas.
- Fast-tracking de decisiones y validaciones.
- Ejecución de tareas en paralelo cuando sea viable.
- Priorización y ajuste de alcance si fuera necesario.

4. FLUJO DE ESCALADO

Se establece un modelo de escalado claro para garantizar la toma rápida de decisiones:

- Project Manager (nivel operativo) – detección y acciones iniciales.
- Dirección del Proyecto (nivel táctico) – decisiones de capacidad, planificación y enfoque.
- Comité de Dirección (nivel estratégico) – resolución de bloqueos de alto impacto y ajustes de alcance.

5. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Informes de estado con actualización de riesgos e incidencias.
- Reuniones extraordinarias cuando se active una contingencia.
- Documentación de acciones correctivas y evaluación de su efectividad.
- Transparencia total sobre impacto, decisiones y próximos pasos.

Plan de recuperación ante desastres y Continuidad del Servicio

Asegurar la continuidad operativa del CRM ante incidentes graves o interrupciones del servicio, apoyándose en las capacidades nativas de la plataforma SaaS seleccionada y en los procedimientos complementarios gestionados por Minsait.

1. ALTA DISPONIBILIDAD Y RESILIENCIA DE PLATAFORMA SaaS

La solución CRM se ejecuta sobre infraestructuras cloud empresariales que proporcionan:

- Alta disponibilidad nativa (>99,9%) gracias a la replicación automática en múltiples centros de datos.
- Mecanismos integrados de failover y balanceo que minimizan las interrupciones del servicio.
- Seguridad, monitorización y cumplimiento normativo gestionados por el proveedor cloud.

2. OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN (RTO/RPO)

El plan se define siguiendo los estándares habituales del sector para soluciones SaaS:

- RTO (Recovery Time Objective): restablecimiento del servicio en menos de 24 horas ante un incidente mayor.
- RPO (Recovery Point Objective): pérdida potencial de datos inferior a 24 horas, gracias a los mecanismos de copia y restauración nativos.

3. COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN

- Copias automáticas gestionadas por el proveedor de la plataforma.
- Procedimientos para solicitar la restauración de datos o entornos cuando sea necesario.
- Exportación periódica de configuración y metadatos, mantenidos por Minsait en el repositorio del proyecto.
- Revisión periódica de las políticas de backup del cliente para asegurar el cumplimiento de sus requisitos internos.

4. RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Si se produce una contingencia que afecte a la operación del CRM, Minsait ejecutará procedimientos definidos para restituir el entorno:

- Restauración de configuraciones, desarrollos y personalizaciones desde el repositorio de código.
- Vuelta a la normalidad de integraciones y flujos críticos.
- Validación funcional del sistema tras la recuperación.
- Ejecución de pruebas básicas para garantizar coherencia y completitud de datos.


6. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

Ante cualquier evento que afecte al servicio:

- Se aplica el proceso de gestión de incidentes alineado con ITIL.
- Se establece comunicación continua con el cliente durante todas las fases del incidente.
- Se documentan las causas, las acciones realizadas y las medidas preventivas para evitar recurrencias.

Roles y responsabilidades en la continuidad del servicio

Establecer un modelo claro de responsabilidades entre el proveedor SaaS (plataforma CRM), el cliente y Minsait como integrador, para asegurar la correcta gestión de la continuidad, recuperación y soporte del servicio.

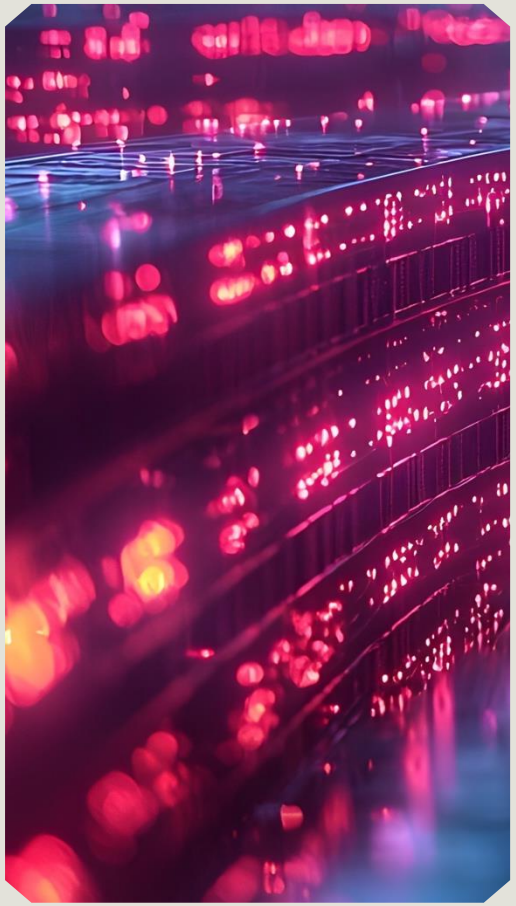

Proveedor SaaS

Responsable de garantizar las capacidades nativas de continuidad y seguridad del servicio:

- Disponibilidad y resiliencia de la plataforma CRM.
- Copias automáticas de datos y servicios de restauración.
- Mecanismos nativos de failover, replicación y seguridad.
- Gestión y resolución de incidentes propios de la infraestructura y del servicio estándar.

Línea Directa

Responsable del gobierno global del servicio y de los procesos internos asociados al uso del CRM:

- Activar solicitudes de restauración cuando sea necesario.
- Definir requisitos de continuidad y niveles de criticidad de los procesos.
- Asegurar dependencias internas (integraciones, accesos, usuarios clave).
- Participar en validaciones posteriores a un proceso de recuperación.

Minsait

Responsable de los elementos personalizados del proyecto y del soporte a la continuidad operativa:

- Mantener el repositorio de configuración, personalizaciones e integraciones.
- Ejecutar procedimientos de restauración de componentes desarrollados.
- Validar la operatividad funcional tras incidentes o recuperaciones.
- Soporte al cliente durante incidentes críticos y coordinación con el proveedor SaaS.
- Documentar las pruebas de continuidad y resultados.

Optimización de costes y sostenibilidad



Se recomienda analizar e implementar distintas estrategias que optimicen la administración y los costos de las licencias, con el fin de maximizar la rentabilidad.

Palancas para la optimización de los escenarios

1

Negociación de descuento en el precio de las licencias



- Asegurar descuentos y la duración de los mismos, en el **precio de las licencias por proveedor y comprender el impacto en el Business Case** (cálculo de plazos de payback y datos de rentabilidad)

2

Optimización del uso de licencias



- Las **licencias** de Salesforce SFC **son nominales**, pero existen planteamientos para optimizar su uso, como por ejemplo, negociar la utilización de licencias en doble turno

3

Pago de las licencias en función de la incorporación progresiva de usuarios



- El precio de las licencias **se comienza a asumir cuando comienza su uso, por lo que será gradual** al igual que la incorporación de los equipos

4

Asegurar que se evitan altos incrementos de precios de las licencias en renovación




- **Asegurar los precios de renovaciones en el acuerdo**, donde los mismos vayan ajustados al IPC, evitando de esta forma incrementos radicales del vendor debido a su capacidad de negociación una vez el CRM esté implantado *(vendor lock-in)*


Fuente: análisis Minsait

Optimización de Consumo en Salesforce

Wallet Salesforce y tarjetas de consumo

La Wallet es un panel centralizado que permite al administrador de Salesforce supervisar y gestionar todo lo que su organización consume y paga, todo desde un único lugar, sin necesidad de navegar por múltiples menús de configuración.
Cada euro que tu organización destina a licencias de Salesforce, créditos de IA o almacenamiento solo genera valor si se monitoriza correctamente.
La Admin Wallet es la herramienta desde la cual tu equipo de IT puede visualizar en tiempo real el consumo, identificar recursos desperdiciados y anticipar cuándo es necesario intervenir para evitar la falta inesperada de recursos críticos.

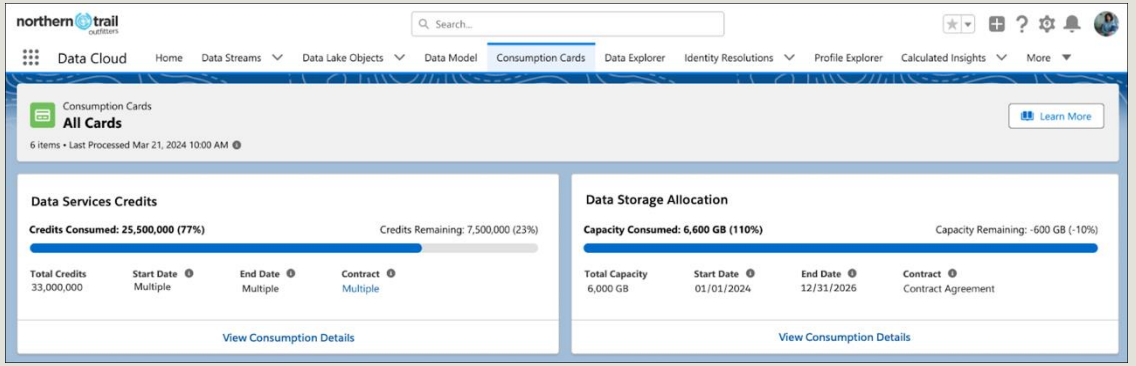

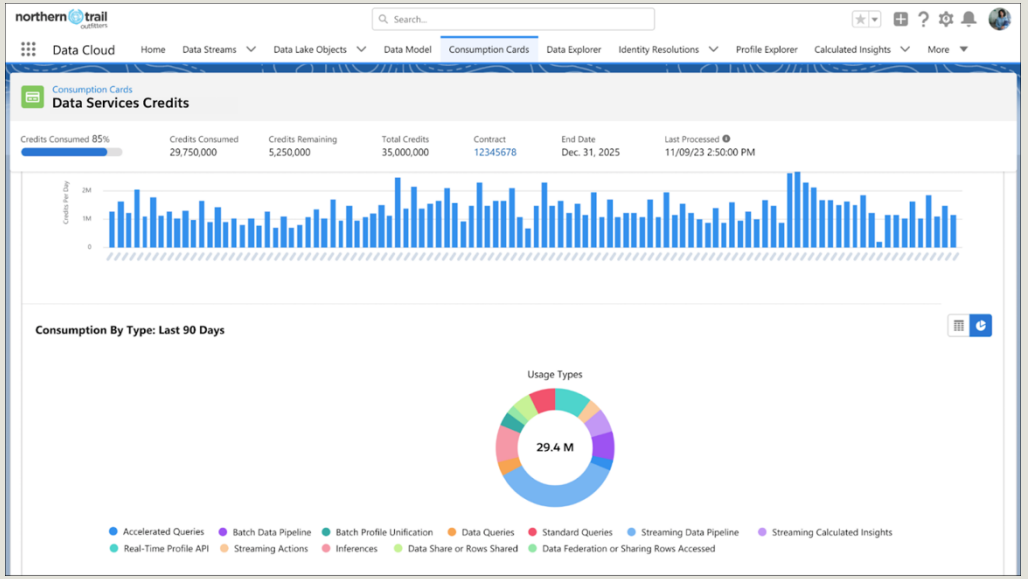

Tres beneficios directos para el negocio:

- Facturación sin sorpresas: alertas automáticas que te notifican antes de alcanzar el límite de créditos de IA, licencias o almacenamiento.
- Licencias efectivas: identifica rápidamente qué usuarios no han accedido en más de 30 días y recupera esas licencias para nuevos integrantes.
- Continuidad en la IA: con monitoreo del consumo de Einstein y Agentforce, puedes prever el agotamiento de créditos y solicitar ampliaciones con tiempo suficiente para negociar.

Modelo de soporte

11



MINSAIT

Minsait presenta una propuesta integral que cubre el alcance del servicio de soporte y mantenimiento demandado

Alcance temporal

El servicio se extenderá durante 12 meses y se iniciará al finalizar el último golive del proyecto de implantación, si bien durante el mismo se ejecutarán tareas de Post-Arranque (hypercare) por parte de otro equipo, para garantizar el éxito del despliegue.



Horario y equipo dedicado al servicio

Minsait se adaptará al horario propuesto para cada uno de los niveles de soporte definidos por LDA.

Minsait prestará el servicio en remoto y con todos los recursos situados **dentro del territorio Español**, lo que permitirá garantizar el crecimiento humano necesario.

El equipo de Minsait estará formado mayoritariamente por **perfiles involucrados en el proyecto con el fin de disminuir la curva de aprendizaje**


Niveles de soporte ofrecidos

El servicio se adaptará al modelo de servicio definido por LDA



Canales de soporte

Los canales de soporte para la comunicación de incidencias



Alcance global del servicio Salesforce: Gestión del Servicio, Mantenimiento Correctivo y Soporte

Con el servicio correctivo y soporte garantizaremos la continuidad operativa y la estabilidad de la ORG de LDA bajo un modelo de **SLA de respuesta de hasta 2 horas** para incidencias críticas

Gestión del Servicio

- Gobernanza y Reporting
- Gestión de la Transición
- Seguimiento y control de la demanda
- Monitorización SLAs
- Gestión del conocimiento
- Programa de formación a usuarios finales
- Gestión del cambio
- Aseguramiento de Calidad y Riesgos
- Identificación de casos de automatización (IA) en el servicio buscando eficiencias operativas

Correctivo (Nivel 1 extendido, Nivel 2 y Nivel 3) y Soporte

Nivel 1 (L1) extendido – Atención y Gestión de Usuarios:

- Triage y Clasificación
- Resolución de Consultas de Operación
- Asistencia a reuniones

Nivel 3 (L3) – Seguimiento y Escalado:

- Escalado de incidencias al fabricante Salesforce y seguimiento
- Escalado de incidencias a otros sistemas
- Seguimiento y coordinación proactiva de incidencias que afecten a Salesforce y Mulesoft pero dependan de otros sistemas

Valor Añadido

Nivel 2 (L2) – Soporte Funcional y Gestión de Datos:

- Mantenimiento Genérico de la Plataforma
- Operaciones Masivas de Datos
- Gestión de Documentación
- Soporte a Procesos de Negocio
- Soporte a pruebas UAT, pruebas Integradas e implantación
- Monitorización y reporting diario de Org PRO
- Documentación de los procedimientos que se vayan solicitando y mantenimiento de la Base de Datos de Conocimiento del servicio
- Desarrollo de mejoras que disminuyan la entrada de incidental actual


Nivel 2 (L2) – Mantenimiento Correctivo Técnico y DevOps:

- Resolución de Causa Raíz
- Gestión del Ecosistema Integrado. Soporte a integraciones críticas
- Eficiencia operativa DevOps con Copado (Sanboxes y Producción)
- Evaluación de impacto de nuevas releases de Salesforce
- Analizar y comunicar a LDA impacto de novedades y cambios de las releases Salesforce
- Actualización de Certificados

No exhaustivo

Pilares del modelo de servicio y gobierno para el mantenimiento de Salesforce y Mulesoft

Pilares clave para optimizar el soporte, aumentar la eficiencia operativa y potenciar la capacidad innovadora en el mantenimiento de la plataforma

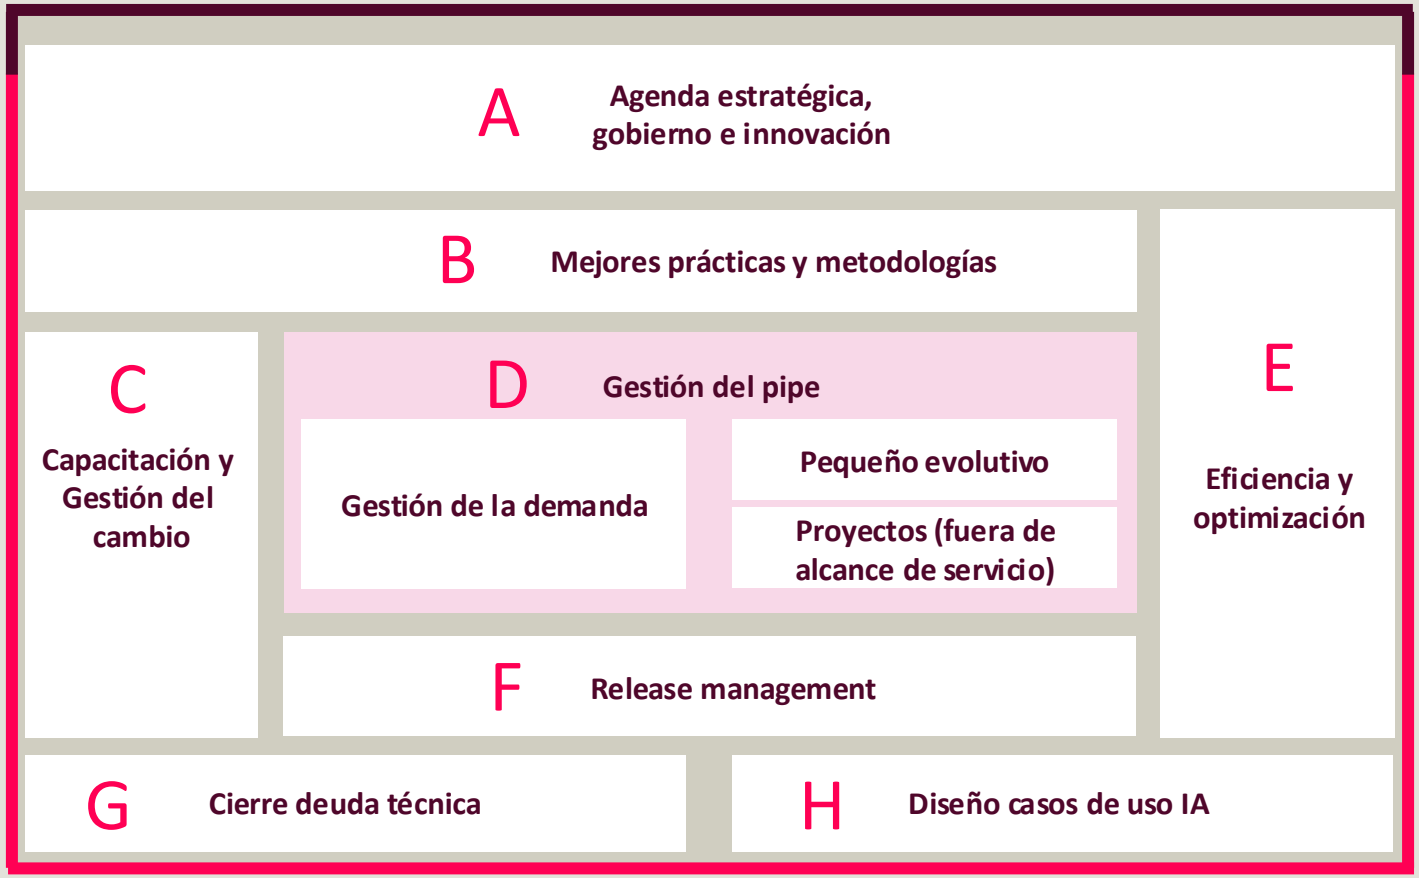

A — Definición del **roadmap estratégico** asegurando el mantenimiento y el buen uso de la plataforma y **alineación con los objetivos** de LDA manteniendo un **gobierno y mecanismos de decisión** eficaces

B — Establecer **estándares y buenas prácticas** en el ciclo de vida del desarrollo, para garantizar **calidad, seguridad y escalabilidad**

C — Soporte a LDA en los programas de formación continua de los usuarios de negocio en para mejorar conocimiento funcional y **disminuir dependencias del equipo de soporte**

D — Gestión del **pipeline actual y futuro de demanda**, desde la evaluación y priorización hasta las fases de desarrollo e implantación de pequeños evolutivos, no proyectos

E — Establecer mecanismos de control que aseguren la **optimización de procesos y eficiencia de costes y esfuerzos**

F — Establecer un marco común para planificar, probar y desplegar **de forma ágil y controlada** con Copado y control de versiones GitHub

G — **Abordar de forma progresiva la deuda técnica** acumulada, aplicando planes de mejora continua para mantener la plataforma saludable, reducir riesgos y **optimizar el rendimiento**

H — Alineados a los procesos de negocio, impulsar casos de uso innovadores, maximizando el **aprovechamiento de las capacidades de Salesforce** y asegurando la experiencia del cliente

El equipo está diseñado para garantizar la ejecución controlada, escalable y sostenible de Salesforce, cumpliendo todos los objetivos marcados

Roles que integran el servicio

Dirección y gobierno

Service Manager

Gestiona el servicio de forma integral, asegurando la eficiencia del soporte correctivo bajo SLA y liderando la evolución continua y mejora del servicio.

Responsable de diseñar roadmap IA.

Líder Técnico

Responsable de la resolución de incidencias técnicas complejas y referente técnico en evolutivos, garantizando calidad de código y reducción de deuda técnica.

Release Manager / DevOps

Coordina despliegues, automatiza pipelines y gestiona entornos, asegurando releases controlados, seguros y eficientes.

Desarrollador / Consultor Salesforce

Analizan, diseñan e implementan evolutivos y mejoras funcionales, participando también en la remediación de deuda técnica. Diseñar dashboard que permitan a LDA ver la rentabilidad.


Desarrolladores / Consultores Mulesoft

Analizan, diseñan e implementan evolutivos y mejoras funcionales, del entorno Mulesoft

Ilustrativo

En base a las necesidades, objetivos y perfiles identificados como necesarios hemos definido un organigrama propuesto

Organigrama del Servicio Salesforce

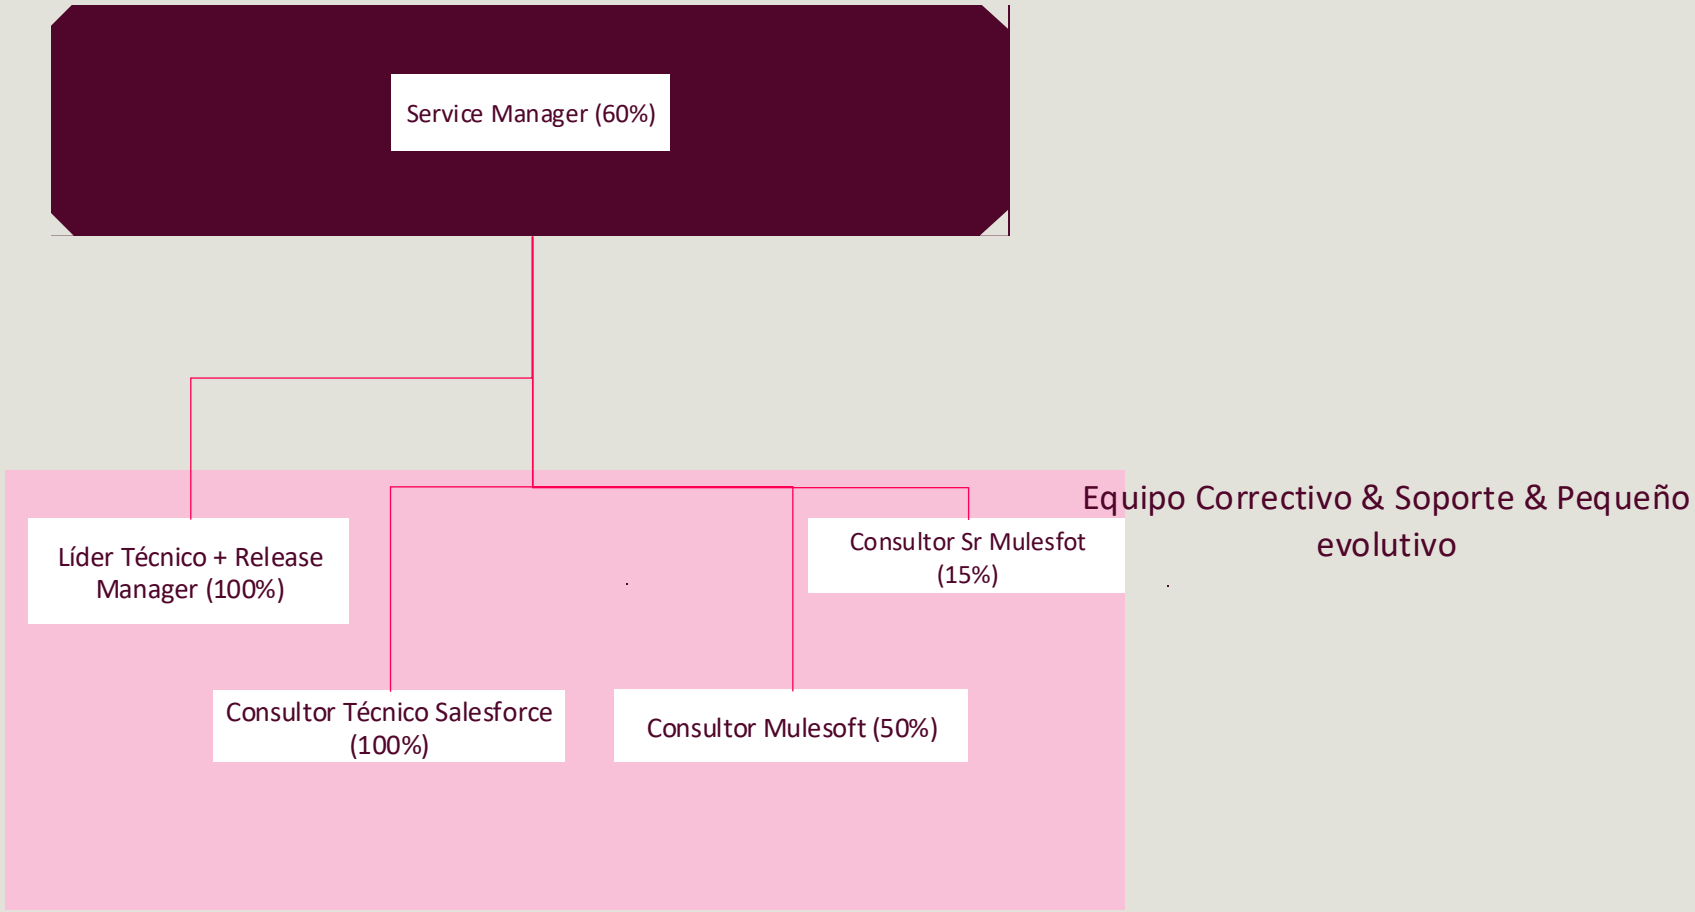

Propuesta sujeta a discusión

Proponemos un modelo de gobernanza flexible estructurado en 3 niveles para agilizar la toma de decisiones y asegurar la correcta interlocución

Modelo de gobernanza y coordinación con LDA

	Comité de Dirección (Nivel Estratégico)	Comité Operativo (Nivel Ejecutivo)
Periodicidad	Mensual	Quincenal/Semanal
Funciones	• Validar la **evolución estratégica del servicio** y su alineación con los objetivos de LDA • **Revisar indicadores clave** de rendimiento (KPIs) y cumplimiento de **SLAs** • Escalar temas críticos y **resolver bloqueos** de alto impacto • Aprobar **cambios relevantes en alcance** y priorización del roadmap Salesforce	• Supervisar la ejecución y **avance de la demanda priorizada** por LDA • Controlar la capacidad de ejecución del servicio **(planificación y recursos)** • Garantizar la **calidad de entregables** técnicos y funcionales • Identificar y gestionar **riesgos operativos** • Ajustar **dependencias** y tiempos
Participantes	• Sponsor Ejecutivo (LDA) • Steering Committee (LDA) • Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait)	• Responsable del Servicio (LDA) • Service Manager (Minsait) • Product Owners (LDA)
Coordinación con LDA	• El Service Manager informa a LDA del avance, obstáculos y necesidad de ajuste de prioridades • En los comités estratégicos y operativos se pueden incluir responsables del Negocio LDA	

Comités Técnicos (Nivel Operacional)


Se definirán los comités específicos necesarios para garantizar todos los ámbitos del servicio:

- **Comité de Arquitectura** – para alinear estándares y mejores prácticas
- **Comité de Innovación** – para analizar y validar iniciativas y soluciones de mejora y optimización, además asesoramiento de adopción de la IA en los procesos de negocio
- **Comité de competencias** – realizará el seguimiento de la gestión del conocimiento, planes de capacitación, transferencia de conocimiento…
- **Comité de gestión de la demanda** – realizará el seguimiento de la calidad de los recursos, planes de capacitación, transferencia
- **Comité de gobierno modelo de datos** – para velar por la integridad, coherencia y eficiencia del modelo
- **Comité de priorización de deuda técnica** – para priorizar el backlog de deuda

También se podrán convocar comités adicionales para cubrir necesidades adicionales

Diseñamos un servicio con cuatro capas que garantiza el día a día, elimina causa raíz y reduce progresivamente hasta un 20% anual el volumen de incidencias y/o soporte

El modelo se apoya en 4 pilares:

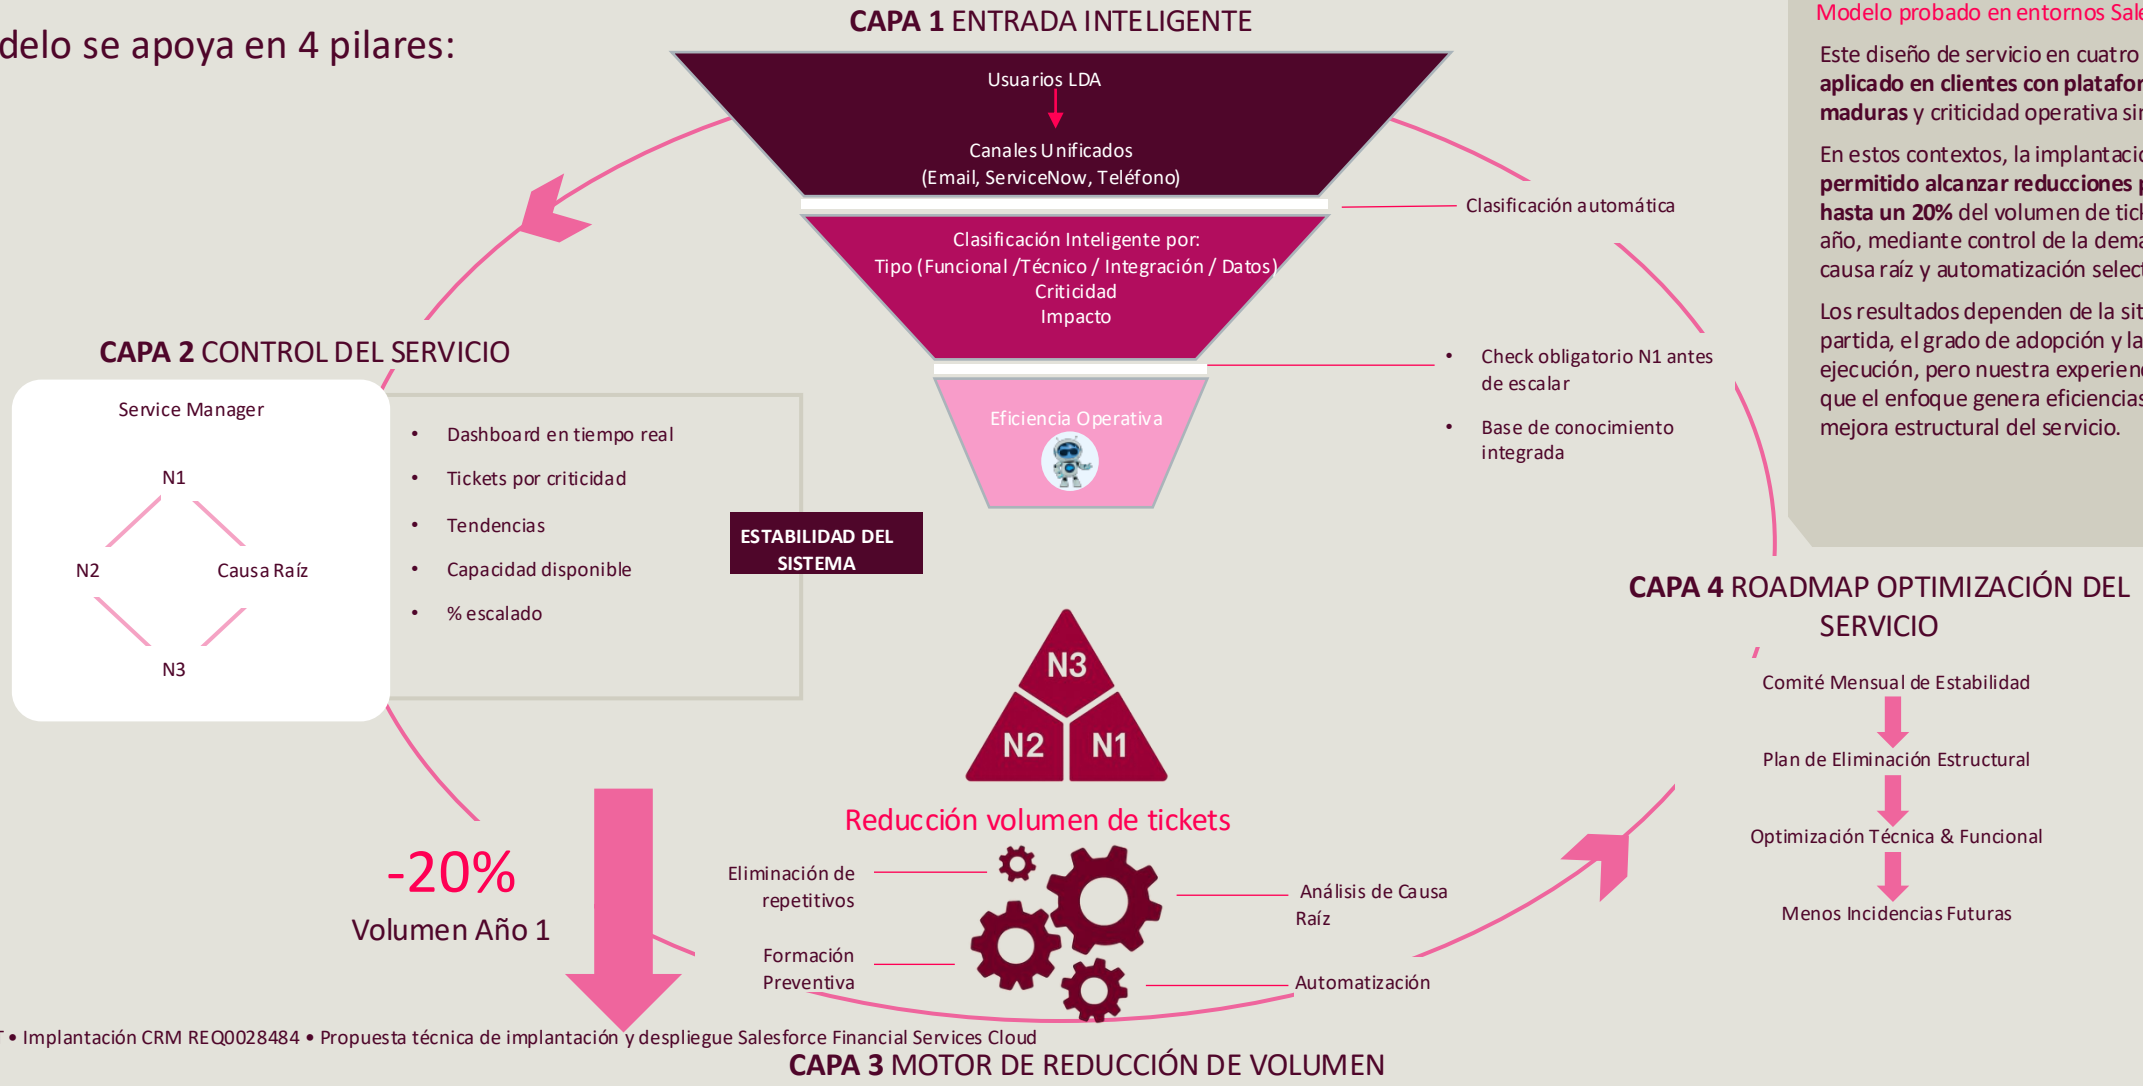

Modelo probado en entornos Salesforce Maduros


Este diseño de servicio en cuatro capas ha sido **aplicado en clientes con plataformas Salesforce maduras** y criticidad operativa similar a LDA.

En estos contextos, la implantación del modelo **ha permitido alcanzar reducciones progresivas de hasta un 20%** del volumen de tickets en el primer año, mediante control de la demanda, análisis de causa raíz y automatización selectiva.

Los resultados dependen de la situación de partida, el grado de adopción y la disciplina de ejecución, pero nuestra experiencia demuestra que el enfoque genera eficiencias sostenibles y mejora estructural del servicio.

Evolucionamos a un modelo correctivo inteligente que no solo resuelve incidencias, sino que identifica patrones, elimina causa raíz y mejora progresivamente la estabilidad y eficiencia del sistema

Visión del Modelo Correctivo Inteligente

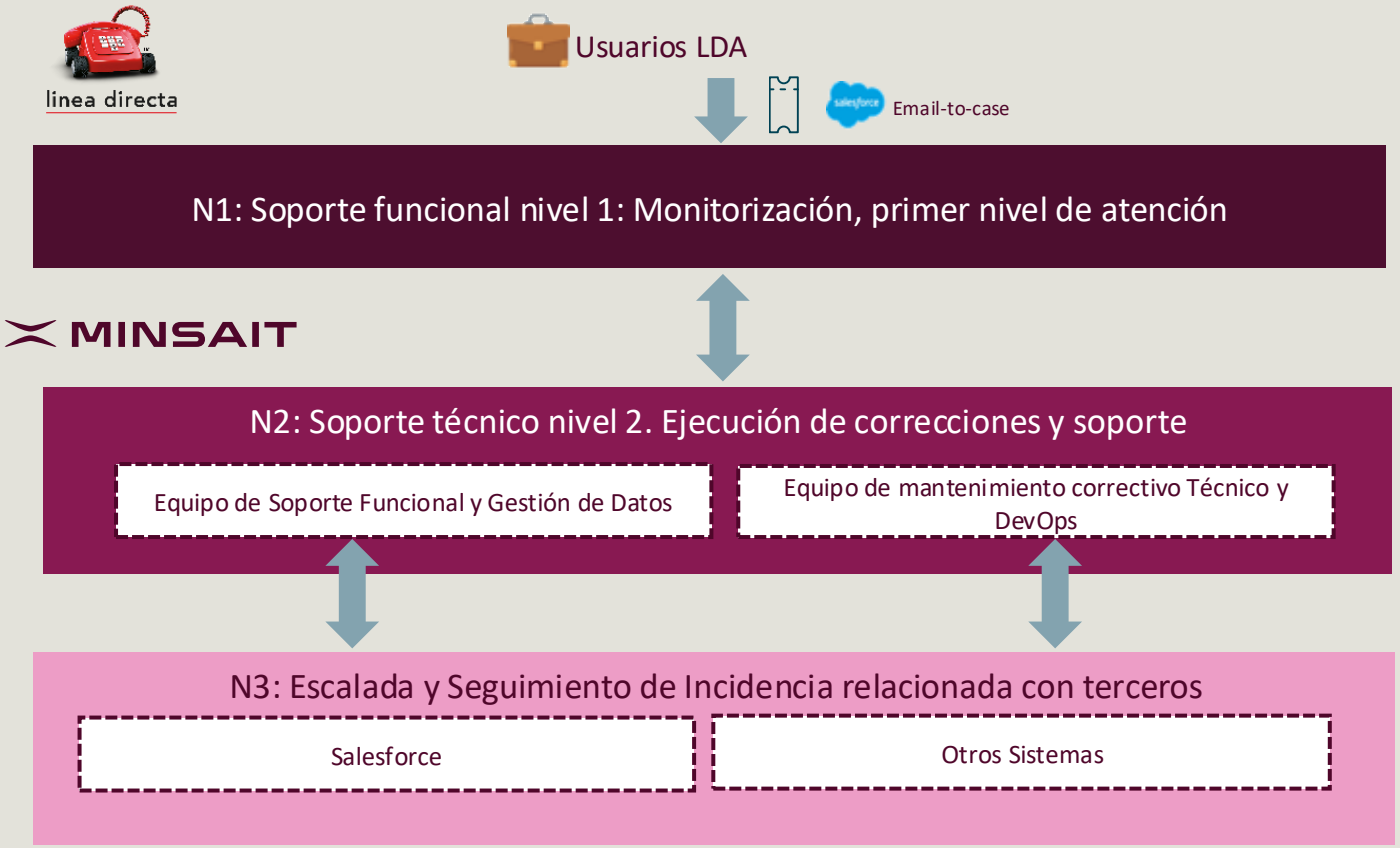

Soporte N1: Equipo multidisciplinar horizontal responsable de resolver peticiones, dudas funcionales e incidencias de menor complejidad, ejecutar las tareas preventivas y planificadas, así como las de operación, elaborar y ejecutar procedimientos operativos sobre las peticiones.

Objetivo 2º Año: 40% de resolución el primer contacto

Incorporación progresiva de herramientas IA (AgentoForce) de apoyo que permitan mejorar eficiencia sin perder control y calidad en la atención

N2 Funcional: Configuración avanzada, gestión de datos masivos y soporte al portal de clientes.

N2 Técnico: Resolución de errores en APEX, integridad de integraciones

N3: Seguimiento y coordinación proactiva de incidencias que afecten a Salesforce pero dependan de otros sistemas

Operación del Día a Día

- **Health Check Diario**: Cada mañana revisamos los logs de integración (Salesforce – Sistemas LCA) y los procesos críticos antes del inicio de la actividad del usuario.
- **Gestión Ágil de Incidencias**: Trabajamos con tableros visuales tipo Kanban para controlar el flujo de tickets en tiempo real, priorizar correctamente y evitar acumulaciones o bloqueos en N2.
- **Priorización por Impacto Real**: Las incidencias se gestionan según su impacto en negocio, no solo por orden de llegada.
- **Comunicación Clara y Continua:** El usuario recibe actualizaciones automáticas y periódicas sobre el estado de su caso.
- **Seguimiento Diario Interno**: Revisamos los tickets abiertos, los SLA comprometidos y los posibles riesgos operativos.

Nos comprometemos a garantizar la calidad del Servicio bajo los Acuerdos de Nivel de Servicio propuestos

Fase 1: Revisión

Durante la **fase de prestación** del servicio, serán revisados los SLA por parte de LDA y Minsait para determinar el valor comprometido de ambas partes.

Fase 2: Validación

- ✓ Validar que los plazos de gestión de las diferentes actividades se ajustan a los procedimientos de trabajo en vigor en cada momento.
- ✓ Garantizar que los Niveles de Calidad están correctamente definidos.

Fase 3: Adaptación

Los SLA deberán adaptarse en caso de modificación del alcance del servicio, y su actualización debe ser consensuada entre LDA y Minsait.





Medición / Seguimiento de SLA

Incumplimiento SLA



Análisis de Incidencias

Motivos Internos

Implantación Medidas Correctoras

Motivos Externos

- Cambio Proceso
- Impacto de Terceros



Presentación Evolución Nivel de Cumplimiento SLA



Revisión Análisis de Incumplimiento SLA (Motivos Externos)



Los Acuerdos de Nivel de Servicio, se basan en los siguientes parámetros, los cuales se definen en base a los condicionantes específicos de cada servicio:

 Cumplimiento

 Plazo

 Calidad

Los SLAs serán revisados y medidos a lo largo de toda la vida del servicio

Proceso de Revisión del Nivel de Cumplimiento de los SLAs



- Todos los SLAs serán **medidos desde el comienzo** del Servicio
- **Mensualmente** se revisarán conjuntamente los **informes entregados** en el Comité de Seguimiento. Dichos informes permitirán determinar el cumplimiento o incumplimiento de los SLAs.
- Incurriremos **en penalizaciones en caso de fallo en la provisión de los servicios**, según los requisitos definidos por LDA en el pliego.
- Los SLAs **serán adaptados a las necesidades del Servicio, pudiéndose incorporar nuevos indicadores, modificar los ya existentes**, etc. Este acuerdo será analizado conjuntamente en los distintos comités de seguimiento.

(*) Exclusiones a los SLAs

Nos mantenemos **eximidos de la obligación de cumplir con los indicadores de Servicio acordados**, y de cualquier penalización asociada, cuando dicho incumplimiento sea debido a los siguientes puntos:

- De cara a la medición de los tiempos de resolución, se excluyen los **tiempos de terceras partes** en las que el equipo de servicio no es responsable.
- **Problemas** para los que se determine que están causados por acciones que **no sean responsabilidad del equipo del servicio** o tengan realmente una causa justificada.
- Incumplimientos de los SLAs debido a **peticiones que excedan las volumetrías del alcance y su porcentaje de tolerancia**.
- Cualquier **problema resultante** de no aplicar las recomendaciones justificadas por el equipo del servicio y previamente aceptadas por Aguas Andinas.
- Circunstancias que constituyan una **situación de emergencia o causas de fuerza mayor**.

11. MODELO DE SOPORTE

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de posibles SLAs acordados por LDA y Minsait y minimizar cualquier riesgo de penalización, implantamos un modelo de gestión por criticidad estructurado, con control continuo y mecanismos preventivos de escalado

El procedimiento por Criticidad y Control de SLA se articula en tres niveles: respuesta, resolución y control preventivo.

High

Caída del CRM o fallo en proceso crítico de negocio

- Activación inmediata tras registro en Service Now
- Revisión prioritaria por N1 en menos de 30 minutos.
- Escalado automático a N2/N3 si no se resuelve en primera intervención.
- Comunicación activa cada 60 minutos hasta estabilización.
- Seguimiento directo por el Responsable del Servicio.
- Registro de causa raíz obligatorio en caso de impacto significativo.

Medium

Funcionalidad core degradada

- Priorización en la cola operativa.
- Análisis en N2 dentro del SLA comprometido.
- Monitorización diaria hasta cierre.
- Revisión semanal de incidencias repetitivas para prevención.

Low

Errores no bloqueantes o consultas de reporting

- Gestión planificada dentro de backlog priorizado.
- Agrupación de tareas cuando sea eficiente.
- Seguimiento en comité semanal de operación.

Minor

Incidencias o dudas menores

- Gestión en bloque.
- Optimización por eficiencia operativa.
- Revisión mensual de patrones repetitivos.

Proporcionaremos a LDA la información necesaria para realizar un control exhaustivo del estado del servicio…

El principal elemento de control y gestión de las operaciones se basa en los Informes de Actividad:

- Minsait presentará a LDA los **datos necesarios para el seguimiento** de los principales indicadores del servicio.
- Se presentarán los **datos básicos de la gestión del servicio** consolidados y/o individualizados por aplicación cuya misión principal es **vigilar los indicadores clave en el servicio**.



Mantener el control sobre la actividad y poder anticiparnos a desviaciones sobre el histórico del proyecto



Es un elemento de garantía del servicio y una herramienta fundamental para evaluar la eficacia y calidad del mismo.

Posibles tipologías de Informes

Reporting estructurado, normalizado y orientado a los diferentes niveles

Informes de Calidad

- Indicador de calidad por Macro actividades y Actividades individuales
- Identificación de los principales puntos de mejora
- Propuesta de acción y mitigación

Informes de Mejora Continua

Informes del Plan de Mejora Continua:

- Seguimiento de las Mejoras propuestas
- Resultados de las mejoras implantadas

Cuadros de Mando e Informes de Control (sistema)

- Cuadro de Mando Global de Operaciones / Etapa del Proceso
- Listados e Informes de Control

- Seguimiento diario de la operatoria
- Gestiones, Documentos
- Detección anticipada de anomalías

***Status* diario de las Operaciones**

Formación

Gestión de Personas

Incidentes

Anomalías

Principales objetivos del Reporting:

- ✓ Proporcionar **información agregada** y de **detalle** para permitir evaluar la calidad de los servicios
- ✓ Dotar a LDA de la **información necesaria** para que pueda realizar un seguimiento lo más detallado posible del estado general del servicio.
- ✓ **Optimizar la calidad** del servicio ofertado y ofrecer a LDA información válida para evaluar el rendimiento.
- ✓ **Gestión de conocimiento** en base a los informes realizados en el conjunto de la prestación de servicio.

(*) En la fase de establecimiento se concretarán las herramientas, procedimientos, cálculos y reporting que se generará durante el servicio, que como regla general será con sistemas corporativos de LDA

Nuestro modelo correctivo incorpora un Plan de Reducción Estructural del Volumen, con objetivo de disminuir un 20% el número de incidencias durante el primer año de servicio

El plan contempla cinco líneas de actuación:

Eliminación de repetitivos

Quick Wins Operativos

- Identificación y análisis de las tipologías más frecuentes para proponer tareas susceptibles de automatización o estandarización

Acciones previstas

- Automatización de tareas recurrentes de N1
- Reseteo de contraseñas
- Asignación o modificación de perfiles
- Reactivación de usuarios
- Creación de plantillas de resolución para incidencias repetidas
- Estandarización de respuestas

3 primeros meses → *Aplicar automatizaciones o asistente IA* → *Medición*

- Reducción volumen tickets de bajo valor operativo

Autoservicio y Base de Conocimiento

Enriquecer la base de Conocimiento

- Publicación de guías prácticas para incidencias frecuentes
- Activación de *Guidance* Salesforce
- Artículos tipo "cómo hacer"
- FAQs operativas
- Integración de sugerencias automáticas en el momento de creación del caso
- Implementación de agentes asistentes (AgentForce)

- Reducción volumen tickets de bajo complejidad

Análisis Mensual de **Top 5** Incidencias Recurrentes

Identificación de tipologías de incidencias

- Análisis técnico detallado
- Identificación de causa raíz
- Evaluación de impacto
- Plan de acción correctivo y preventivo
- Seguimiento en comité mensual

- Eliminación progresiva de incidencias estructurales

Refactorización y Mejora Técnica

Refactorización progresiva del código medida que se interviene

- Optimización de procesos que generen errores recurrentes
- Corrección de validaciones defectuosas
- Mejora de integraciones inestables
- Simplificación de automatismos complejos

- Disminución de incidencias técnicas recurrentes

Formación Preventiva

Identificación de patrones de error debido al desconocimiento funcional

- Píldoras de formación específicas
- Comunicaciones dirigidas a colectivos con mayor tasa de incidencia
- Guías operativas simplificadas


- Reducción de errores funcionales

Roadmap de mejora progresiva, con objetivos medibles y gobierno mensual, orientado a reducir las incidencias desde el primer año y evolucionar con un modelo eficiente e inteligente

Evolución Inteligente del Servicio

-20%

Incidencias Año 1

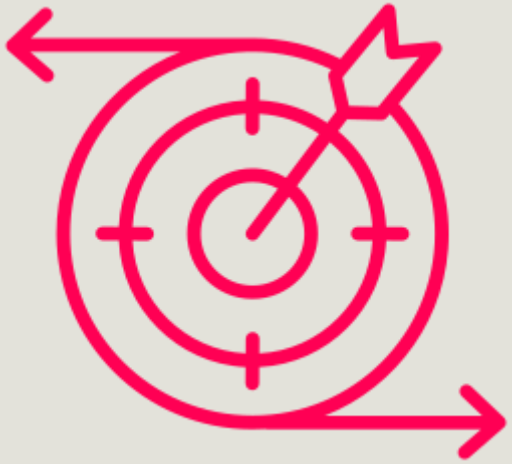

KPIs Objetivo

- +15% Autoservicio
- +40% FCR
- + 70% Usuarios adopción nuevas funcionalidades



Mes 1-3 Plan de Reducción Estructural

- Revisión en Comité de Innovación para priorizar y tomar decisiones correctivas

Mes 4-9 Optimizar

Implementar la acción correctiva decidida conjuntamente con LDA

Innovación

Evolución progresiva del servicio validada en Comité

Mes 1-3 → Mes 10-24

Listado de entregables

12



MINSAIT

Documentación adicional…

De forma adicional a lo contemplado en este documento de propuesta, el plan de proyecto que Minsait presenta a LDA se complementa con la siguiente documentación:



Minsait – Minsait - 2026 - LDA Implantación CRM - Propuesta Técnica Salesforce FSC_06032026

- Tipo documento: pdf
- Propuesta técnica



Minsait – Minsait - 2026 - LDA Implantación CRM - Propuesta Económica Salesforce FSC_06032026

- Tipo documento: pdf
- Propuesta económica



Minsait – Anexo Condiciones Particulares del Proveedor

- Tipo documento: pdf
- Anexo de condiciones a la oferta



Minsait – Anexo Seguridad

- Tipo documento: zip
- Cuestionarios Protección de datos y Ciberseguridad



Minsait – Anexo Oferta Técnica

- Tipo documento: pdf
- CVs de perfiles propuestos para el servicio y Referencias

Anexos

13



MINSAIT

CoE

13.1

MINSAIT


Nuestra propuesta de valor diferencial nos convierte en el socio idóneo para acompañar a LDA en el reto de implementar un CoE de Salesforce

¿Qué aporta Minsait a LDA?

Experiencia en la Creación y Operación de CoEs

- Disponemos de **aceleradores** que agilizan la puesta en marcha del CoE
- Disponemos de nuestro **propios CoE Salesforce y Mulesoft** que dan soporte a todos nuestros expertos
- Nuestros profesionales están **certificados en múltiples disciplinas** que garantizan la calidad del servicio



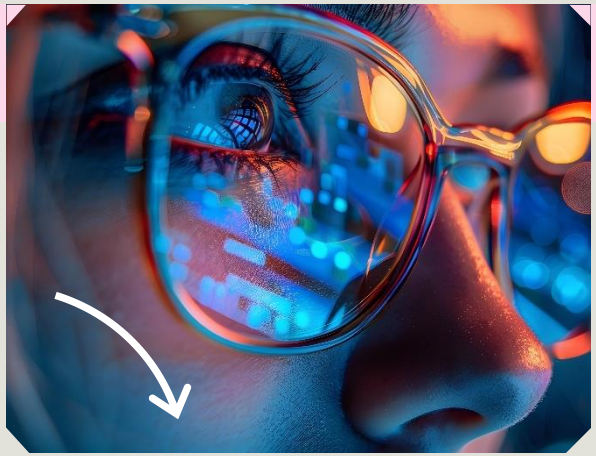

Expertos en desarrollo y diseño

- Minsait es **Partner Global** de Salesforce
- Amplia experiencia en **todas las nubes de Salesforce**
- Especializados en **diseños de arquitectura de integración** sobre Mulesoft y AWS

Capacidades locales expertas

- Disponemos de un **equipo local de Salesforce** en crecimiento
- Complementamos nuestra capacidad con **partners expertos**
- Nuestro equipo de **Consultores de SSFF** ya han colaborado con LDA en proyectos de éxito






Capacitación efectiva de los equipos

- Nuestra experiencia y capacidades nos habilitan para **formar y escalar a equipos multidisciplinarios**
- Presentamos un **plan formativo** para capacitar a los equipos e incrementar la adopción de los usuarios
- Mediremos el éxito a través de **KPIs y evaluaciones de competencias**

El Centro de Excelencia debería crearse inicialmente con equipo de expertos Salesforce y Mulesoft, enfocándose en cerrar brechas técnicas y funcionales, transfiriendo la responsabilidad del equipo de proyecto a LDA de manera progresiva

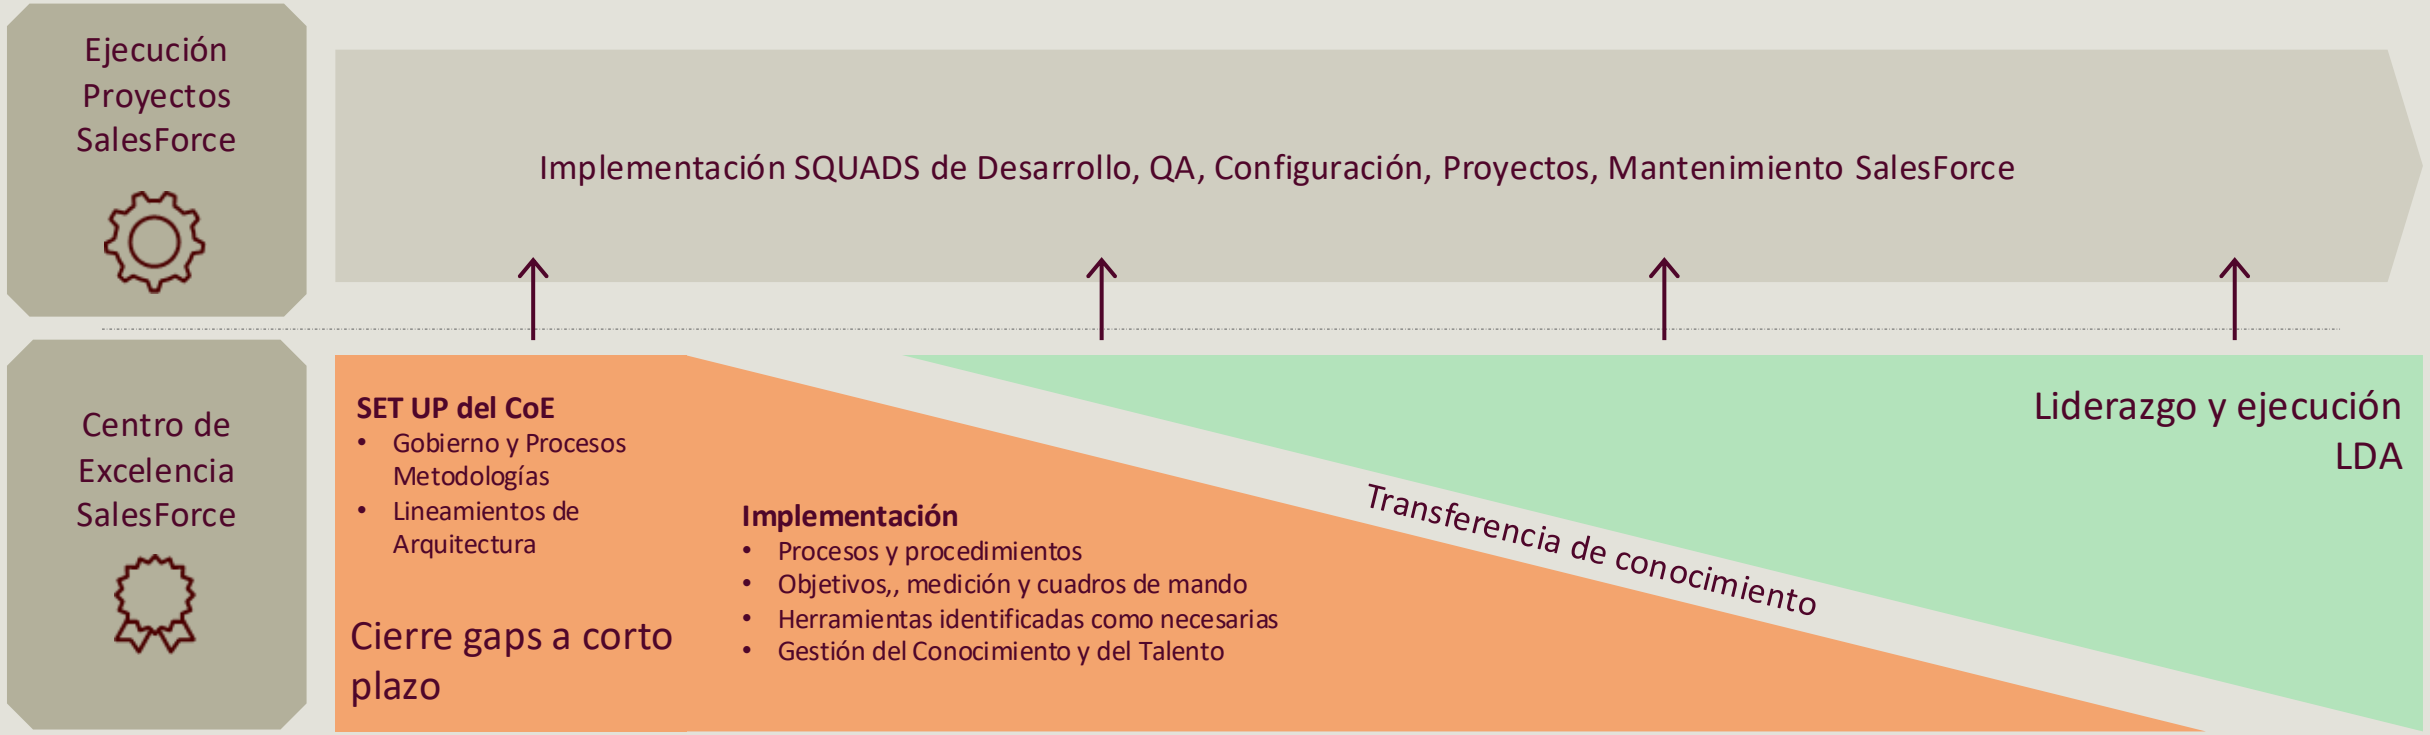

En paralelo iniciará las labores de consolidación e implementación de los procesos de gobierno, arquitectura, autoridad de diseño y gestión del conocimiento a través de métricas y KPIs, transfiriendo gradualmente capacidades y conocimiento desde el proyecto a LDA en un proceso gradual y guiado.

Hemos seleccionado los casos de éxito más representativos relacionados con los elementos clave del reto de LDA

Referencias principales

1
Creación y Operación CoEs

- Diseño de CoE adaptados **al contexto y madurez** de la organización
- **Definición de modelo operativo y organizativo** para garantizar cumplimiento de objetivos
- **Prioridad de la gestión del conocimiento y del talento** para fortalecer capacidades

2
Assessment Técnico


- **Evaluación funcional y técnica** integral de la plataforma
- Análisis de código, arquitectura y seguridad con equipos y **herramientas especializadas**
- Identificación de “quick wins” y definición de **roadmap de remediación**

3
Capacitación técnica y adopción

- Minsait cuenta con múltiples referencias en proyectos para **incrementar la adopción**
- También ponemos el foco en asegurar la correcta **gestión del cambio** en los equipos (técnicos y de negocio)

En base a las necesidades de LDA, hemos establecido los pilares básicos que deben guiar la actividad del CoE Salesforce

Funciones y objetivos del CoE

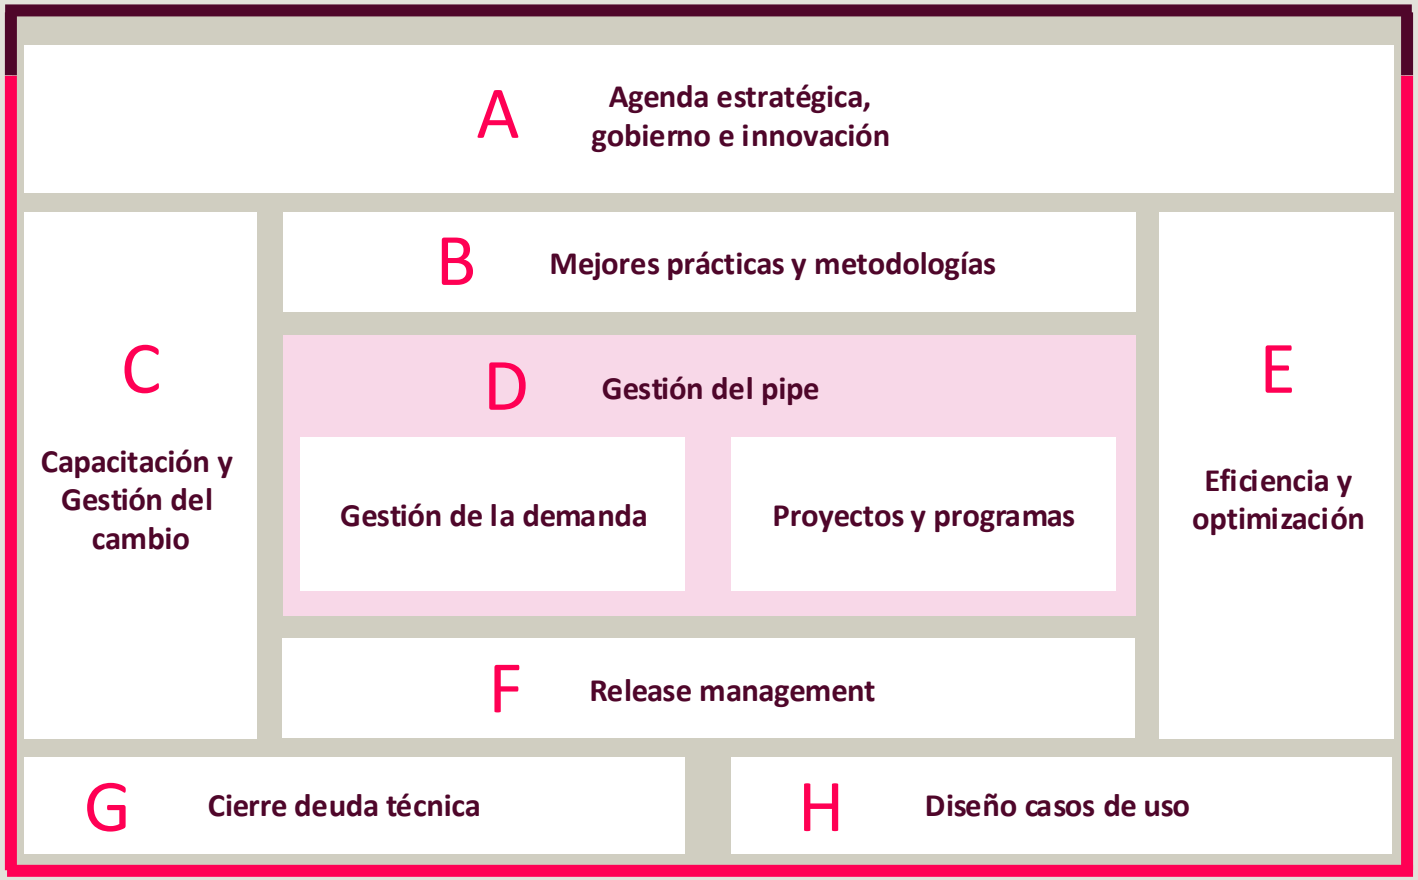

No exhaustivo

A Definición del roadmap estratégico asegurando la alineación con los objetivos del LDA manteniendo un gobierno y mecanismos de decisión eficaces

B Establecer estándares y buenas prácticas en el ciclo de vida del desarrollo, para garantizar calidad, seguridad y escalabilidad

C Programas de formación y certificación continua de los equipos asegurando la retención del conocimiento dentro de LDA

D Gestión del pipeline actual y futuro de iniciativas, desde la evaluación y priorización hasta las diferentes fases de desarrollo e implantación

E Establecer mecanismos de control que aseguren la optimización de procesos y eficiencia de costes y esfuerzos

F Establecer un marco común para planificar, probar y desplegar de forma ágil y controlada


G Remediar la deuda técnica acumulada, aplicando planes de mejora continua para mantener la plataforma saludable, reducir riesgos y optimizar el rendimiento

H Alineados a los procesos de negocio, maximizando el aprovechamiento de las capacidades de Salesforce y asegurando la experiencia del cliente

En base a las necesidades, objetivos y perfiles identificados como necesarios hemos definido un organigrama que engloba el bloque funcional y el técnico

Organigrama del CoE Salesforce

Ilustrativo

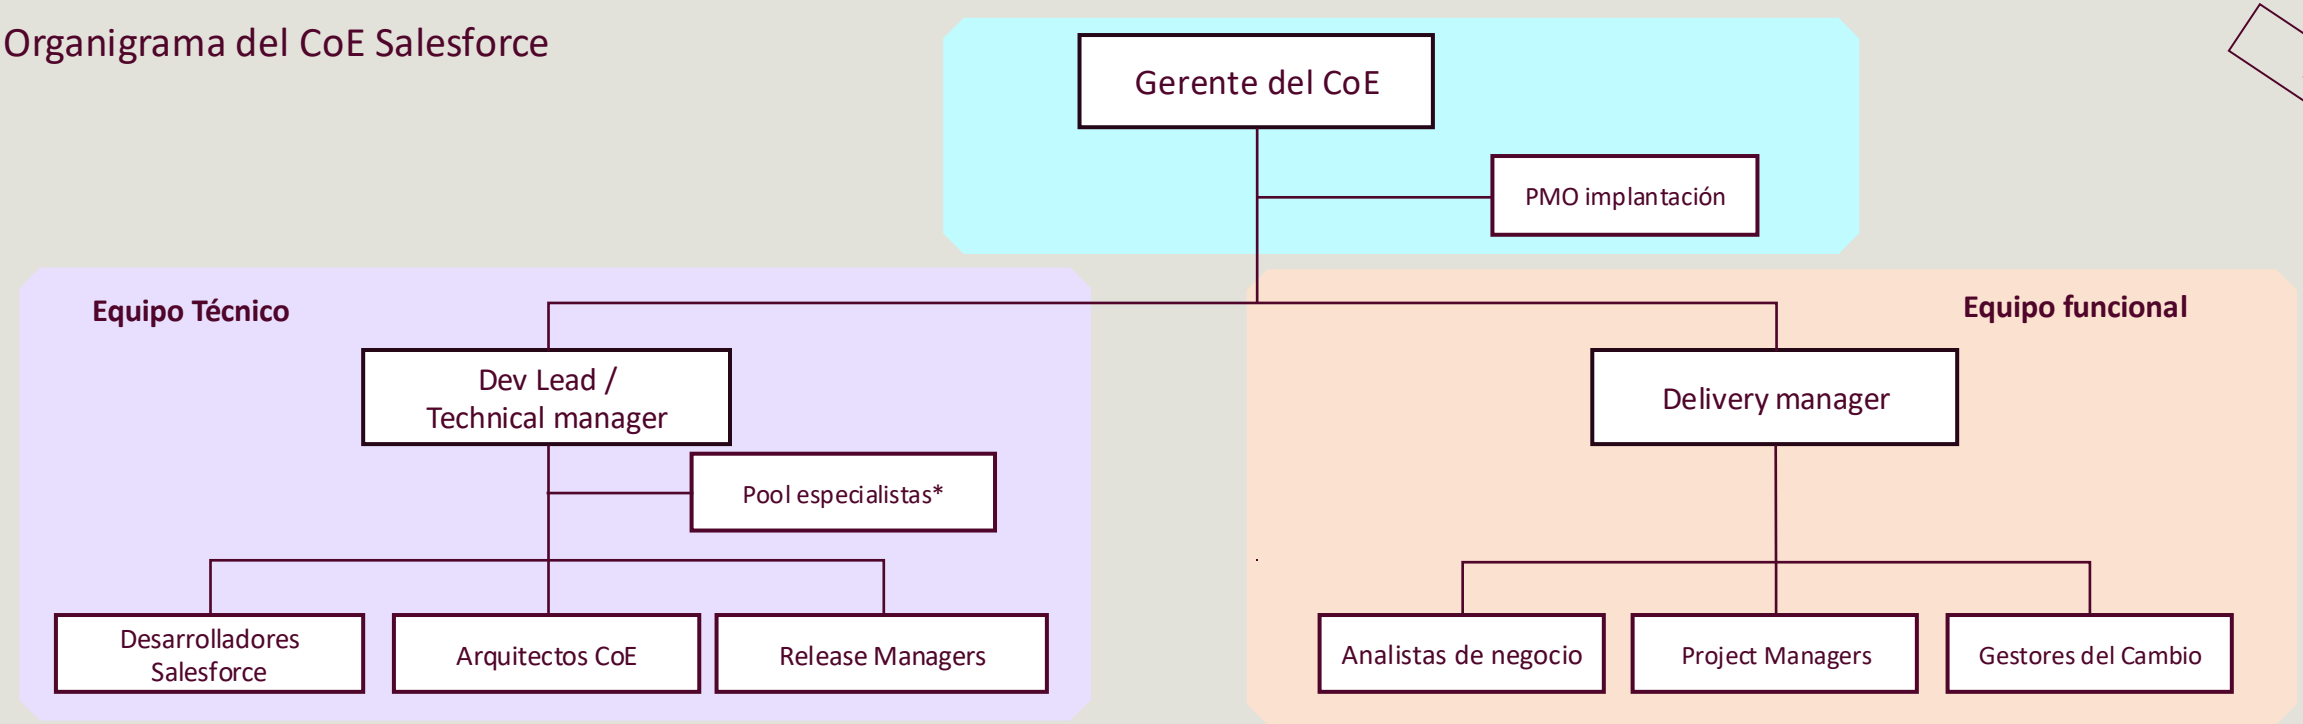

Pool especialistas*

- Arquitecto Integraciones
- Especialista Mulesoft

Perfiles bajo demanda (se integran en equipos de LDA)

- Desarrolladores Salesforce/Mulesoft
- Arquitectos Salesforce /Mulesoft
- Administradores Salesforce

La implantación de un CoE de Salesforce tiene impacto en diversos ámbitos de la organización, y para medirlo hemos definido una serie de KPIs de mejora

No exhaustivo



KPIs de Gobierno y Metodología	Objetivo
Nº de evolutivos entregados en plazo	70%
Velocidad de entrega (Story Points / LDA)	+ 20%
Tasa de rechazo de entregables en UAT	-5%
Cobertura de pruebas automáticas	≥ 85% (1 año)
Ratio de deuda técnica resuelta	≥ 70% (6 meses)

KPIs de Capacitación	Objetivo
Nº de usuarios formados	≥ 100 (1 aó)
% de asistencia a sesiones formativas	≥ 80%
Nº de formaciones completadas por usuario	≥ 2 por año
% de usuarios certificados internamente	≥ 80%
Satisfacción con la formación (NPS)	+50 puntos

KPIs de Evolución y Mejora Continua	Objetivo
Nº de revisiones de arquitectura realizadas	≥ 2 por mes
Nº de licencias activas sin uso	< 5%
% de cumplimiento del roadmap anual	≥ 90%
Nº de integraciones monitorizadas y operativas	≥ 90%

KPIs release management	Objetivo
% reducción de errores y rework	≥ 70% año 1
% Cobertura de pruebas automatizadas	≥ 85%
% Proyectos que cumplen con la totalidad de estándares de desarrollo establecidos	≥ 95%
% Reducción Time to Market de proyectos	≥ 30% año 1
Nº de automatizaciones de tareas repetitivas	≥ 10 año 1

Durante la fase de creación se acordarán con el LDA tanto los KPIs de medición definitivos como los valores iniciales y objetivos a cubrir


El momento es ahora: unamos capacidades para transformar ideas en valor real

MINSAIT
