

Plan de transformación

CRM Salesforce

Línea Directa & NTT DATA
Marzo

PROPUESTA ECONÓMICA

© 2025 NTT DATA, Inc.

Aviso Legal

El contenido de esta oferta es confidencial y titularidad de **NTT DATA Spain.** Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, total o parcial, gratuita u onerosa, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de **NTT DATA Spain**.

El cliente garantiza que la información facilitada para elaborar esta oferta es completa, adecuada y veraz, sin que haya omitido ningún dato susceptible de alterar o modificar en modo alguno las conclusiones a que deba llegar **NTT DATA Spain** en el contexto de la ejecución de los servicios.

Si decidiese no llevar a cabo los servicios objeto de esta oferta, el cliente deberá destruir o devolver a **NTT DATA Spain** todas las copias de este documento.

NTT DATA Spain podrá hacer referencias al proyecto en materiales comerciales, propuestas y/o presentaciones a terceros por cualquier medio, incluyendo internet. A tal efecto, el cliente autoriza a **NTT DATA Spain** a utilizar en cualquier medio y de forma gratuita, indefinida y sin limitación territorial, de cuantas marcas, logos, nombres comerciales o signos distintivos estuviesen vinculados con su identidad, productos y/o servicios.

Considerando que la presente oferta se enmarca dentro del procedimiento de contratación de los servicios descritos, el contenido y eficacia de la misma queda sometida a la concurrencia de las siguientes condiciones:

- La negociación y firma de mutuo acuerdo y a satisfacción de las partes de un Contrato de Servicios. Dicho contrato regulará detalladamente las condiciones de los Servicios a prestar por NTT DATA SPAIN S.L.U (en adelante "NTT DATA), así como cualquier otra cuestión relativa a la relación, modelo económico y alcance de los servicios.
- En caso de que NTT DATA sea el adjudicatario, se revela su intención de negociar el contenido de ciertas cláusulas donde se incluirán, sin carácter limitativo, las siguientes premisas:
    - a) La responsabilidad quedará limitada al importe total de los servicios, excluyéndose la tipología existente de daños indirectos y lucro cesante,
    - b) Se permitirá a NTT DATA Spain la terminación en caso de impago del Cliente, abonándole todas aquellas cantidades pendientes de pago y aquellas originadas de inversiones llevadas a cabo por NTT Data Spain en el marco de la prestación del servicio,
    - c) Las condiciones de uso, facturación, cobro y garantías sobre las soluciones de Software serán aquellas otorgadas en exclusiva por el fabricante

© 2026, **NTT DATA Spain**. Todos los derechos reservados.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Aviso Legal

- d) Se considerará como un contrato autónomo e independiente, sin afectar o ser afectado respecto de otros acuerdos comerciales o contratos de prestación de servicios entre NTT DATA Spain y el Cliente.
- e)Sobre la Propiedad Intelectual de los resultados, NTT DATA seguirá en todo momento lo pactado y las instrucciones del cliente para que pueda hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual sobre los resultados de acuerdo con la normativa legal vigente.
- f) La incorporación de una cláusula específica y bilateral de Compliance que se pacte en el futuro Contrato de mutuo acuerdo entre las partes y que deberá reflejar parámetros de Compliance equivalentes para las dos partes contratantes.

- La presente oferta ha sido realizada por NTT DATA utilizando y aportando para la ejecución del Contrato en caso de resultar adjudicataria, el activo Axet, así como cualesquiera otros que se pudieran incorporar durante la ejecución del Contrato, cuya propiedad intelectual le pertenece en exclusiva tal y como se lo reconoce la legislación pertinente. En ese sentido, NTT DATA deberá ser y seguirá siendo el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el material, la documentación, la tecnología, los productos y el know-how que ha desarrollado, creado y/o del que es propietaria de otra manera antes de la fecha de este procedimiento de contratación y del consecuente Contrato, en caso de que la presente oferta sea la adjudicataria, y nada de lo aquí contenido constituirá, supondrá el reconocimiento o implicará una transferencia o licencia con respecto a la misma.
- Los servicios ofertados pueden incluir el uso interno de tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) como parte de los procesos organizativos y técnicos descritos. Al aceptar esta oferta, el Cliente autoriza a PROVEEDOR a emplear herramientas basadas en IAGen y declara conocer sus características y riesgos.
- NTT DATA garantiza que sus herramientas homologadas de IAGen estarán debidamente entrenadas y ajustadas al propósito de los servicios descritos, utilizando IAGen de manera segura y responsable, siempre bajo supervisión humana y conforme al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, los estándares de seguridad informática y las políticas internas de la compañía.
- En cuanto a la Propiedad Intelectual, NTT DATA se compromete a seguir en todo momento las instrucciones del Cliente para asegurar sus derechos de propiedad intelectual sobre los resultados, conforme a la normativa vigente.
- La coincidencia entre la información obtenida por NTT DATA y facilitada por el Cliente durante el proceso de contratación en relación con los Servicios, y los supuestos e información considerados por NTT DATA para la preparación de la presente oferta.
- La colaboración del Cliente para que NTT DATA pueda realizar los estudios previos necesarios y estimar las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios.
- La obtención de las validaciones y autorizaciones necesarias de los comités internos y/o externos de NTT DATA.
- NTT DATA se reserva el derecho de ajustar el alcance, condiciones de ejecución y/o precios, además de poder retirar su oferta en fases posteriores del proceso de licitación, sin incurrir en penalizaciones, riesgos reputacionales ni dañar la relación con el Cliente.

© 2026, **NTT DATA Spain**. Todos los derechos reservados.

© 2025 NTT DATA, Inc.



Contacto

Objetivo del documento: Respuesta a la solicitud de propuesta de 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484

Fecha de entrega: 06 de marzo de 2026

Personas de contacto: Christopher Stevens Díez
Director, Insurance +34 677 948 624
christopher.stevensdiez@emeal.nttdata.com

Validez de la oferta: 120 días

© 2025 NTT DATA, Inc.

Índice



1. Carta de presentación y compromiso
2. Introducción al Precio
3. Presupuesto Detallado
4. Consideraciones y supuestos de estimación

1 Carta de presentación y compromiso

© 2025 NTT DATA, Inc.

Declaración de entendimiento

El RFP CRM_Implantación se enmarca dentro del Programa de Transformación del Contact Center de Línea Directa y no debe abordarse como iniciativa aislada.

Programa de Transformación del Contact Center

Implantación CRM (Salesforce)

Modernización Contact Center (Genesys)

Impacto Común

- Agentes del Contact Center
- **Procesos Comerciales y atención**
- **Visión 360º del cliente**
- **Mejora de eficiencia y experiencia**

Modelo Transformado (Motor de Valor)

- **Cliente 360º en tiempo real**
  - Perfil único
  - Valor, riesgo y propensión visibles
  - Contexto omnicanal
- **Agente empoderado**
  - Next Best Action dinámico
  - Ofertas personalizadas
  - Argumentario inteligente
- **Gestión estratégica**
  - Cross-sell sistemático
  - Upsell contextual
  - Retención basada en valor
  - Fidelización activa

Modelo Actual (Centro de Coste)

- **Cliente fragmentado**
  - Información dispersa por producto (Autos, Hogar, Salud)
  - Sin contexto en tiempo real
- **Agente reactivo**
  - Atiende llamadas
  - Sin visión comercial estructurada
  - Upselling oportunista
- **Gestión táctica**
  - Campañas masivas
  - Retención basada en descuentos por producto
  - Foco en volumen

Dos iniciativas, una única transformación operativa y cultural para los agentes y el modelo económico del canal. Cada interacción se convierte en una oportunidad de crecimiento. La calidad del dato cliente es clave para sacar el máximo partido.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Contexto Estratégico

Línea Directa afronta una transformación estructural que impacta **modelo comercial, arquitectura tecnológica y operación**.

Transformación del modelo comercial

- Evolución de póliza/producto → cliente/oportunidad multiproducto.
- Gestión comercial unificada (captación, upsell, retención).
- IA integrada en la interacción comercial y de servicio.

Impacto operativo a gran escala

- +2.000 usuarios impactados (CC, operativos, partners, consultivos).
- Equipos multitarea con alta dependencia del sistema
- Implica transición progresiva con convivencia de sistemas sin afectar a la operación



Modernización del ecosistema tecnológico

- Sustitución del pseudo-CRM (Galgo como front acoplado al core).
- Convivencia obligada CRM–Galgo durante la transición.
- Integración real-time con core + coordinación con Genesys Cloud y Lakehouse.

Exigencia de control y Gobierno

- Cumplimiento estricto de requisitos regulatorios (DORA, RGPD, ciberseguridad).
- Trazabilidad, resiliencia e idempotencia en los flujos de integración.
- Necesidad de un modelo de gobierno que alinee arquitectura, alcance funcional y control presupuestario.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Nuestra propuesta de valor

Respondemos a los retos identificados con un enfoque que busca la transformación orientada a **eficiencia operativa, control arquitectónico y sostenibilidad económica**.

Transformación del modelo cliente


- Evolución a modelo cliente–oportunidad multiproducto.
- Retención y venta cruzada bajo visión 360º real.
- Recomendaciones contextuales integradas en la interacción.

Mejora estructural de conversión y fidelización

IA orientada a eficiencia operativa

- Resúmenes automáticos y asistencia al agente en tiempo real.
- Automatización de validaciones y tareas repetitivas.
- Priorización predictiva en captación y retención.

Reducción directa de tiempos operativos y OPEX

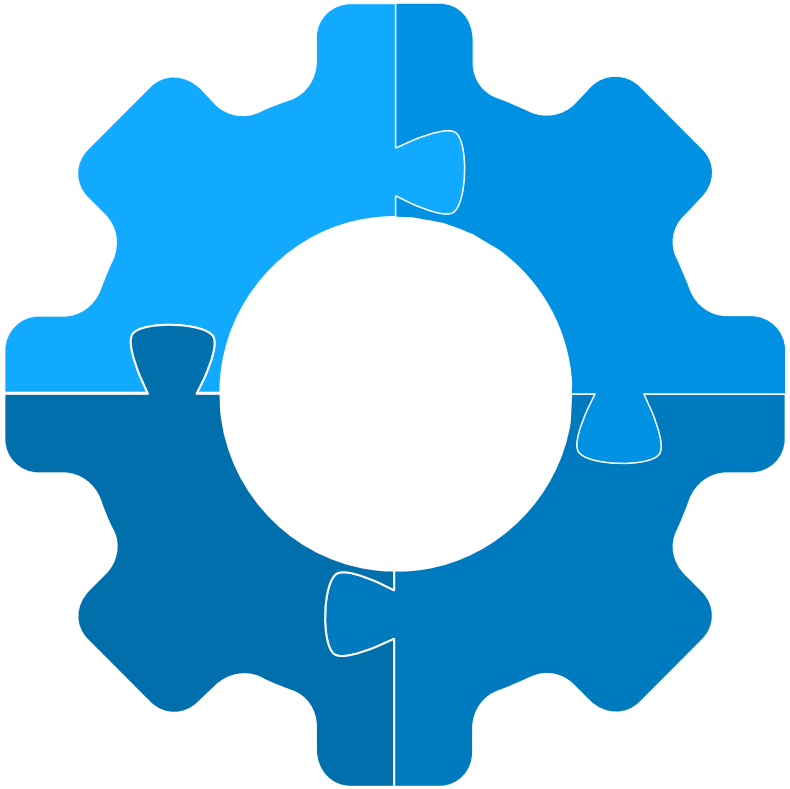

Arquitectura de convivencia sin riesgo

- CRM como front único, con convivencia progresiva con Galgo.
- Integración real-time resiliente y gobernada.
- Reconciliación estructurada bajo modelo maestro definido.

Modernización sin disrupción operativa

Sostenibilidad económica y control

- Licenciamiento racional por perfil y uso real.
- Máxima adopción estándar, mínima customización controlada.
- Roadmap por fases que optimiza CAPEX y OPEX.

Transformación escalable y financieramente sostenible.

© 2025 NTT DATA, Inc.

¿Por qué NTT DATA?

Combinamos **conocimiento sectorial**, **capacidad tecnológica y experiencia en transformación** para acompañar a Línea Directa en un programa estructural, no solo en una implantación tecnológica. Nuestra propuesta se sustenta en:

Equipo multidisciplinar

Hemos conformado un **equipo multidisciplinar** compuesto por:

- **Conocimiento sector asegurador**
- **CRM + Arquitectura + Integración**
- **Gestión del cambio**
- **Especialistas en entornos CC**
- **UX y operación contact center**

Visión End2End integrada

Modelo End-to-End **CRM + Core + Contact Center**

- **Integración real entre CRM Strategy, Salesforce, Genesys e integración legacy.**
- **Diseño del proceso completo cliente (captación → gestión → retención).**
- **Gobierno transversal que evita optimizaciones parciales.**
- **Priorización basada en impacto global, no en silos tecnológicos.**

Herramientas propias

Disponemos de **herramientas y aceleradores** clave

- **Aceleración de desarrollo con IA**
- **Framework de definición y priorización funcional**
- **Patrones de integración**
- **Modelos de medición de eficiencia**
- **Enfoque Augmented CRM**

Referencias contrastadas

Experiencia demostrada en transformaciones complejas

- **Implantaciones CRM en aseguradoras de gran escala.**
- **Integraciones Salesforce con Contact Center**
- **Programas de transformación con +1.000 usuarios.**
- **Proyectos con alta exigencia regulatoria.**

Referencias contrastadas en grandes clientes del sector asegurador y de otras industrias, que nos avalan como partner tecnológico en grandes corporaciones

© 2025 NTT DATA, Inc.

Racional de la solución

La solución y el enfoque elegidos equilibran **transformación ambiciosa, control de riesgo y sostenibilidad económica**.

Plataforma adecuada al modelo LDA

CRM #1 en el mundo

Plataforma **consolidada**, con ecosistema global y hoja de ruta tecnológica **estable** a largo plazo.

Líder sector asegurador en España

Amplia base instalada en aseguradoras nacionales e internacionales, con **aceleradores** específicos de industria.

Maximizar el estándar

Configuración sobre capacidades nativas, reduciendo desarrollos a medida y **deuda técnica** futura.

Evolución nativa con IA

Capacidades de **IA embebidas** en la plataforma (asistencia, automatización y analítica avanzada), sin soluciones externas fragmentadas

Capacidad de adaptación

Arquitectura flexible para acompañar **cambios regulatorios, de negocio o de modelo comercial.**

Escalabilidad garantizada

Modelo cloud preparado para soportar **crecimiento en usuarios, procesos y volumen** sin rediseños estructurales.

Integración con Contact Center

Integración nativa con **Genesys Cloud**

Transformación adecuada al contexto LDA

Transformación por bloques	Modelo estructurado en Foundational e Incremental Blocks, asegurando **base sólida antes de escalar funcionalidad**	
Despliegue progresivo sin "big-bang"	Convivencia CRM–Galgo controlada, priorizando **estabilidad operativa** del Contact Center.	
Gobierno arquitectónico transversal	Comité de **Design Authority** para controlar modelo de datos, integración y estándar vs customización.	
Gestión del cambio estructurada	Equipo dedicado desde el inicio, con **métricas de adopción** y acompañamiento específico al CC.	
Optimización de costes	**IA** para acelerar diseño, configuración y pruebas, reduciendo el **CAPEX**.	Optimización de **licencias** para reducción del **OPEX**
Especialización en CRM + Contact Center	Equipo con experiencia en Salesforce, Genesys Cloud y Gestión del Cambio asegurando **integración coherente y experiencia operativa optimizada**	

© 2025 NTT DATA, Inc.

Compromiso

Nos comprometemos con el resultado operativo y la evolución sostenible del modelo CRM de Línea Directa.

Compromiso con impacto en el negocio

- Alineación directa con objetivos de conversión, retención y eficiencia.
- Métricas de impacto definidas desde el inicio.
- Seguimiento conjunto negocio–IT durante todo el programa.

Compromiso con la estabilidad operativa

- Protección prioritaria del Contact Center en cada despliegue.
- Modelo por fases sin disrupción crítica.
- Soporte intensivo en fase de estabilización.

Compromiso con la transferencia y autonomía

- Capacitación estructurada al CoE CRM interno.
- Documentación y modelo de gobierno entregado.
- Autonomía progresiva en la evolución futura.

Compromiso como socio estratégico

- Queremos establecer una relación de largo plazo, no para un proyecto puntual
- Equipo senior involucrado durante todo el programa.
- Capacidad de acompañar evolución en IA, arquitectura y modelo cliente.

2 Breve Resumen

© 2025 NTT DATA, Inc.

Estrategia de Transformación: Visión y principios

Transformamos la forma de operar, no la herramienta.
Evolucionamos el modelo operativo de LDA hacia un modelo cliente-céntrico, escalable y sostenible.
Impulsamos con IA la eficiencia durante las distintas fases de la transformación

NUESTRA ESTRATEGIA

Bloques funcionales transversales

Capacidades estructurales que se desarrollan una vez y se reutilizan en todas las fases.

Oas de negocio incrementales

Despliegues progresivos por dominio funcional (producto/proceso), entregando valor visible desde las primeras fases.



¿Por qué este modelo encaja con Línea Directa?

- Permite convivencia controlada con Galgo durante la transición
- Evita un Big Bang incompatible con el modelo multitarea actual
- Acompasa el despliegue del nuevo CCaaS (Genesys Cloud)
- Reduce riesgo operativo y regulatorio
- Permite priorizar según dependencias reales del Core
- Incorpora Gestión del Cambio en cada release
- Controla crecimiento de licencias de forma progresiva

Así entendemos que debemos acompañaros en este camino:

Evolucionando el modelo operativo de forma **progresiva y estructural**, orientada a valor desde la Fase 1, minimizando el riesgo operativo y garantizando una convivencia controlada con Galgo y CCaaS.

Convivencia estructurada con el ecosistema actual: Esta estrategia requiere la convivencia controlada entre Galgo, el nuevo CRM y el Core asegurador, adoptando un enfoque estructurado para evolucionar hacia una visión cliente 360º sin comprometer la operación diaria.

Alineamiento continuo entre sistemas y equipos: Exige coordinación permanente entre CRM, Core, CCaaS (Genesys Cloud), Data/Lakehouse y herramientas satélite, asegurando sincronización en tiempo real, eficiencia operativa y coherencia de datos.

Modelo "One Team" extendido al ecosistema LDA: Implica un modelo de trabajo integrado entre Negocio, IT, Arquitectura, Data, CCaaS y los distintos owners de sistemas impactados, garantizando decisiones ágiles y una transición progresiva sin fricciones.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Modelo por Bloques

Hemos definido los bloques en función de los elementos estructurales que transforman el modelo comercial y de cartera de LDA, no en función de módulos tecnológicos: **Cambio de modelo operativo** (No solo funcionalidad) + **Reutilización transversal (**Que sirva a todas las oleadas) + **Reducción de deuda técnica** (Evitar duplicidades por ramo)



Incremental Blocks

Cada oleada despliega capacidades completas para un ámbito de negocio concreto, apoyándose en los bloques fundacionales comunes.

Implementado de forma iterativa, poniendo foco en las necesidades reales de cada ramo

Foundational Blocks

Los bloques fundacionales se desarrollan transversalmente y evolucionan de manera incremental para soportar cada nueva oleada.


Desarrollados de forma transversal para soportar las distintas funcionalidades del negocio

Las oleadas entregan valor visible.
Los bloques fundacionales aseguran coherencia, estabilidad y escalabilidad.
La combinación de ambos permite transformar sin romper.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Transformación por oleadas

El despliegue se estructura en oleadas autónomas, con control de dependencias y sin paralelización de construcción, para **proteger calidad y estabilidad** en convivencia con Galgo y CC.

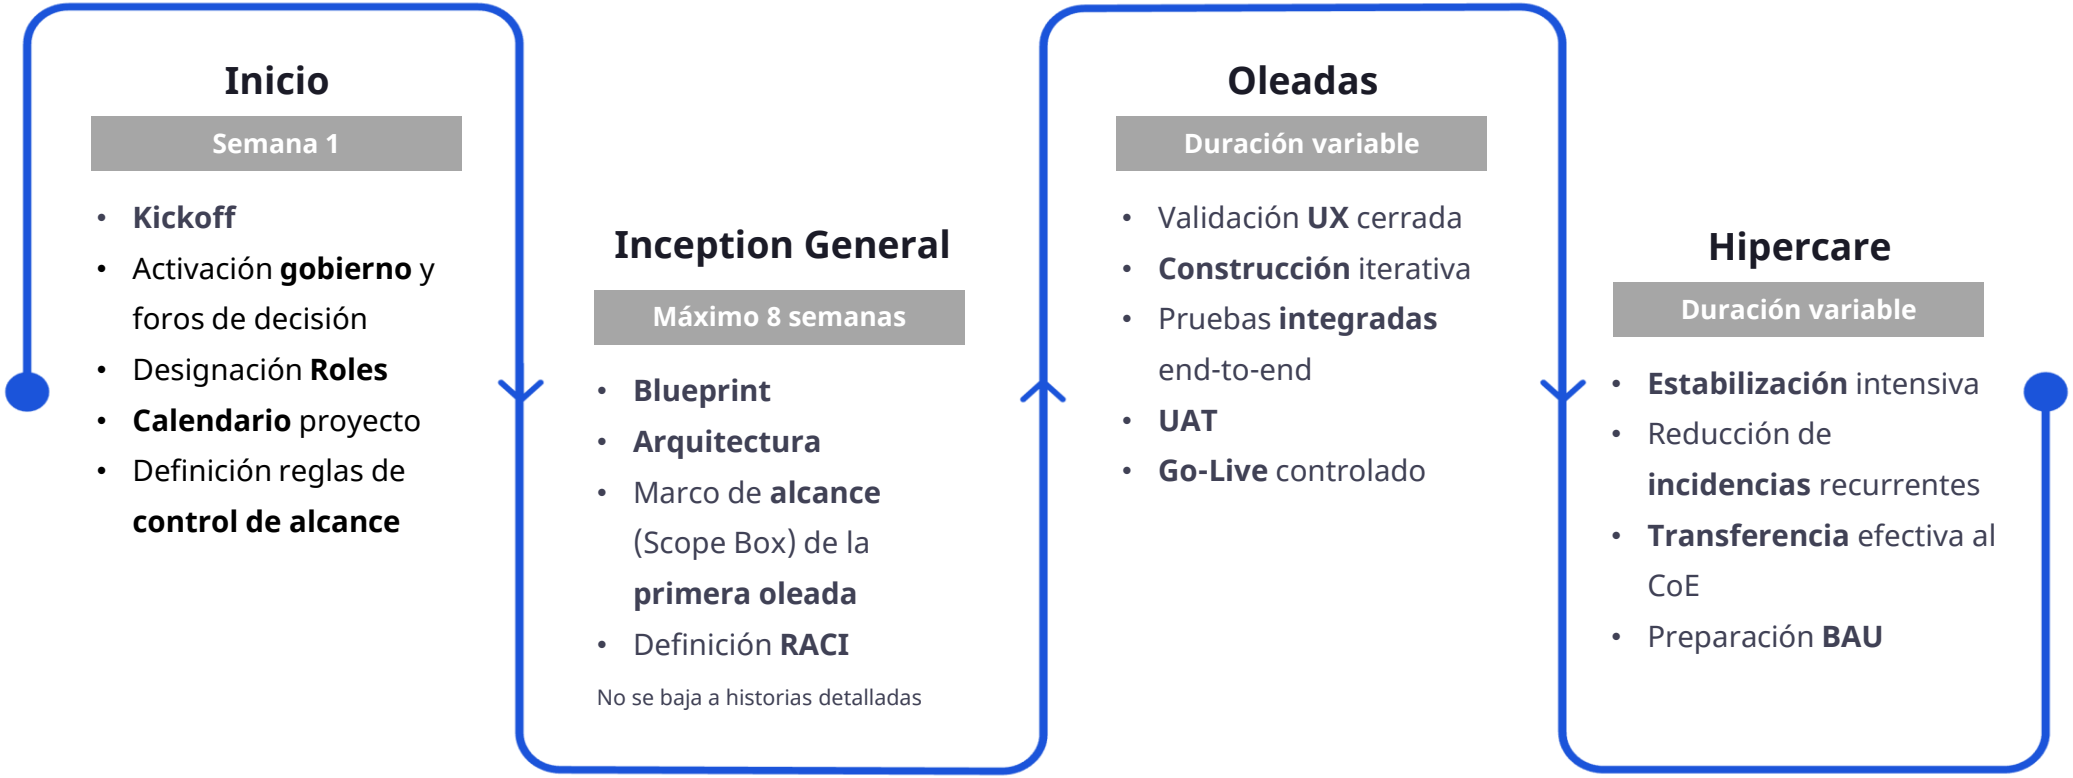

Regla estructural:
no se paraleliza construcción de oleadas. La calidad y la estabilidad priman sobre la velocidad aparente.

© 2025 NTT DATA, Inc.


Introducción: De fases técnicas a oleadas de Negocio

Transformamos el modelo asegurador por **dominios funcionales con valor visible,** no por módulos tecnológicos.

Base estructural
Cliente 360 · Datos · Integración · Experiencia Agente

Primer dominio controlado
Hogar como piloto de alto impacto y bajo riesgo

Escalado progresivo por ramos
Reutilización · Aceleración por ramos · Control de riesgos

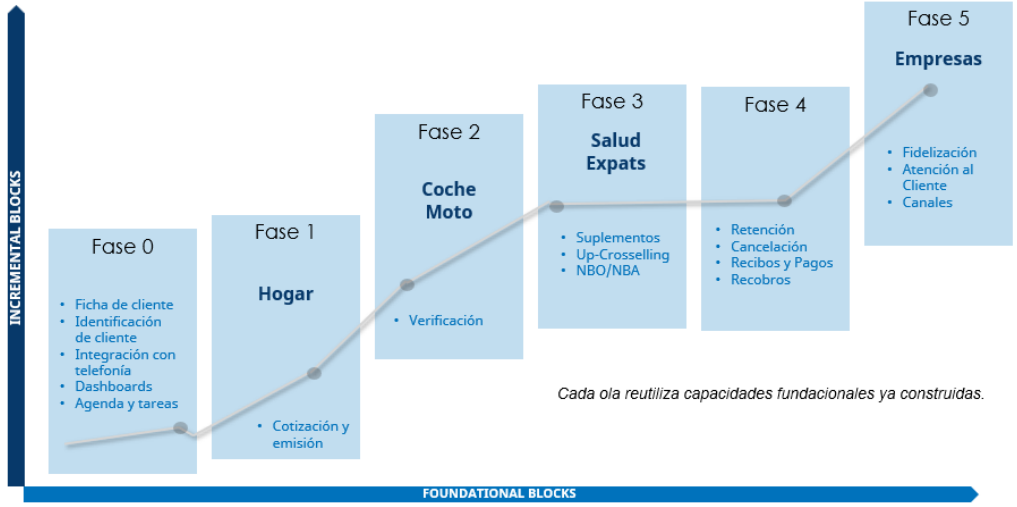

*Este modelo reorganiza las fases definidas por LDA para **acelerar tiempos, generar sinergias transversales y agrupar capacidades críticas**, sin alterar el roadmap.*

¿Por qué este modelo encaja en LDA?

- ✓ Minimiza riesgo en una operación de 2.000 usuarios (1.600 agentes)
- ✓ Permite convivencia controlada con Galgo
- ✓ Prioriza inversión según impacto real

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Olas de Negocio


Cada ola despliega un **dominio funcional concreto** (producto o proceso), reutilizando **bloques fundacionales ya construidos**, garantizando **coherencia operativa, reducción de riesgo y generación temprana de valor**.

Fundacional (Base Operativa)	Venta Nueva (Hogar como piloto)	Venta Motor (Auto / Moto)	Cartera y Suplementos	Gestión de Cartera Activa	Omnicanalidad y Fidelización
Crear la base cliente 360 y sustituir el frontal operativo sin riesgo.	Implantar modelo oportunidad multiproducto en un ramo controlado.	Escalar modelo comercial a ramos core de volumen.	Gestionar ciclo de vida activo del cliente.	Estructurar la gestión del ciclo de vida de la póliza y proteger la rentabilidad de la cartera.	Consolidar CRM como plataforma relacional única.
CONTENIDO DE NEGOCIO					
• Identificación unificada cliente • Ficha Cliente 360 (visión multipóliza) • Agenda estructurada • Historial interacciones • Integración CTI con Genesys • Primeros asistentes IA (resumen llamadas)	• Oportunidad estructurada • Carrito multiproducto • Cotización Hogar completa • Versionado de ofertas • Integración pricing core • Firma digital	• Cotización Coche y Moto • Verificación y documentación pendiente • Multicierre • Gestión de riesgo integrada • Persistencia en core	• Suplementos (motor y hogar) • Upselling y cross-selling • Gestión multipóliza coordinada • Recibos y pagos • Recobro estructurado	• Gestión estructurada de retención • Procesos de cancelación y precancelación • Control y gestión de recibos • Seguimiento y gestión de impagos • Procesos de recobro • Visión económica integrada por cliente	• Chat integrado • Atención al cliente • Programas fidelización • Encuestas NPS • Customer journeys • Métricas cliente 360
IMPACTO ASEGURADOR					
• Reducción TMO • Mejora experiencia agente • Base real para modelo cliente-level	• Profesionalización del funnel • Mayor conversión • Eliminación de Excel y procesos manuales	• Escalado del modelo multiproducto • Mayor control sobre descuentos	• Incremento ticket medio • Reducción fricción operativa	• Reducción churn • Mayor trazabilidad operativa	• Mayor satisfacción cliente • Activación relacional continua • CRM como plataforma estratégica

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Planificación y fases

La planificación parte de un **horizonte base de 12 meses**. La fecha exacta de arranque se alineará con el calendario natural y la disponibilidad de los equipos, ajustando hitos y ventanas de pruebas en consecuencia. Durante el periodo de hypercare, se cubrirá el correctivo que no corresponda con garantía con la partida actual para correctivos de CRM.

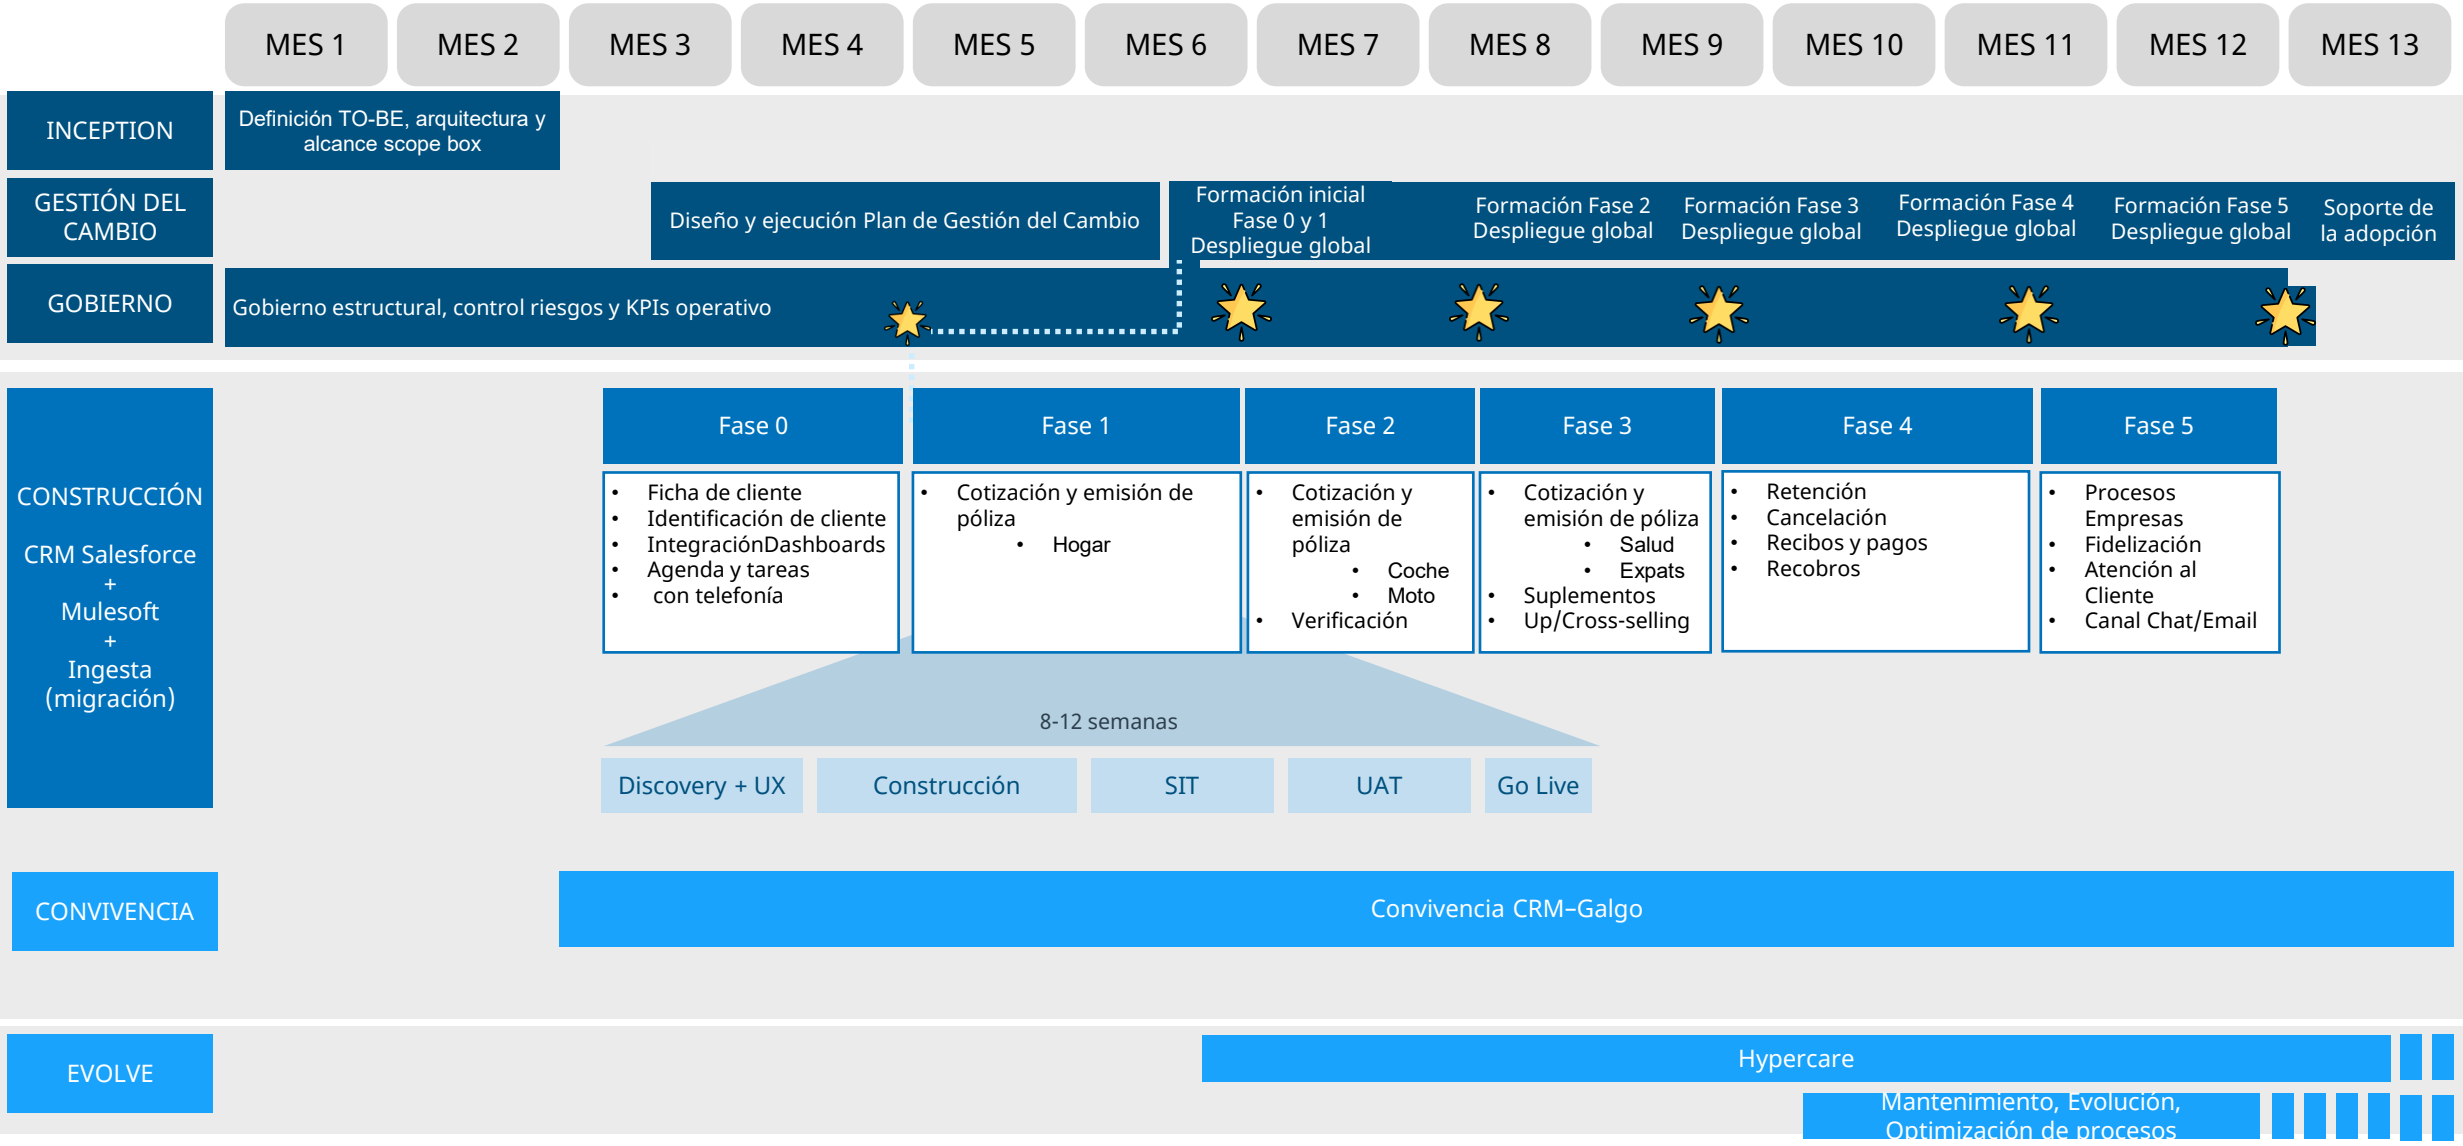



3 Introducción al Precio

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Modelo Económico y Gobierno

La presente propuesta se formula bajo un modelo **Fixed Price condicionado a la validación de supuestos durante la fase de Incepción General**, dada la incertidumbre actual en determinados ámbitos críticos como integraciones, migración y carga de datos, gestión del cambio, plan de implantación y definición detallada del modelo de responsabilidades (RACI).

La **Incepción General** actuará como fase de validación inicial para confirmar alcance, asunciones clave, riesgos y responsabilidades, estableciendo un **Gateway o Punto de Control** que permitirá ratificar, ajustar o redefinir el programa sobre una base consolidada.

Adicionalmente, al cierre del **Discovery + UX de cada fase**, se realizará una revisión formal para confirmar el alcance detallado, alinear presupuesto y evaluar posibles optimizaciones conforme al grado de madurez alcanzado.

Desde el punto de vista contractual, se propone la formalización de un **contrato** que regule las condiciones generales del Programa, integrado por las diferentes partes del proyecto en cada fase. Cada oleada de implantación estará precedida por su correspondiente etapa de Discovery-UX y su ejecución quedará sujeta a formalización escrita. Este modelo aporta flexibilidad y control, permitiendo gestionar de forma estructurada posibles ajustes de alcance, garantizando al mismo tiempo alineación presupuestaria, reducción de incertidumbre y adecuada gobernanza del Programa.

Procesos de Control y Monitorización del Programa: El Programa LDA se sustentará en un marco estructurado de gobierno, control y seguimiento, basado en los siguientes procesos clave:

- **Monitorización del Programa:** seguimiento periódico a través del Comité de Proyecto, incluyendo reporting de avance, gestión de riesgos e incidencias y control de hitos.
- **Gestión de la Calidad:** implantación de un modelo de aseguramiento de calidad orientado a garantizar la correcta entrega del proyecto y la calidad de los artefactos, configuraciones y desarrollos realizados.
- **Transferencia de Conocimiento:** ejecución de un plan estructurado de transferencia hacia LDA, incluyendo validación documental y acompañamiento progresivo para facilitar que el equipo de LDA asuma gradualmente mayores responsabilidades en el programa.
- **Gestión de Cambios:** aplicación de un proceso formal acordado que contemple identificación, análisis, decisión y seguimiento de solicitudes de cambio con impacto en alcance, plazo o coste.
- **Gestión de Riesgos:** enfoque estructurado basado en la identificación temprana de riesgos, definición de estrategias de mitigación y seguimiento continuo con revisión y actualización periódica.

Este modelo de gobierno permitirá asegurar transparencia, control presupuestario y adecuada gestión del alcance a lo largo del ciclo de vida del Programa.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Presentación escenarios

Escenarios de Propuesta Económica: con el objetivo de adaptarnos al modelo de decisión y gobierno que LDA considere más adecuado, planteamos dos escenarios de colaboración. Ambos garantizan la calidad de la implantación, pero difieren en el alcance de responsabilidad y en el modelo de gestión del riesgo

Gestión Integral del Programa (Modelo End-to-End)

- Propuesta recomendada por NTT DATA. Este escenario contempla la gestión completa del programa bajo un modelo end-to-end, donde NTT DATA asume la responsabilidad integral desde la definición hasta la puesta en marcha
- Alcance:
  - Inception General del Programa
  - Implantación CRM
  - Diseño e implantación de la capa Middleware
  - Carga inicial de datos (incluyendo transformación y validación)
  - Gestión del Cambio
  - Soporte y Mantenimiento

Valor diferencial

- Un único responsable integral del programa (one single point of accountability).
- Optimización global de planificación, costes y dependencias.
- Reducción de riesgos en integraciones y calidad del dato.
- Aceleración del time-to-market al evitar fricciones entre proveedores.
- Gobierno unificado de arquitectura, datos y procesos de negocio.

Modelo Acotado con Integración y Datos Liderada por LDA

- Este escenario contempla un perímetro más acotado para NTT DATA, en caso de que LDA decida mantener la responsabilidad directa sobre la capa middleware y los procesos de transformación de datos, apoyándose en integradores especializados en sus entornos legacy y mainframe
- Alcance NTT DATA:
  - Inception General (alcance ajustado)
  - Implantación CRM hasta integración con middleware (MuleSoft)
  - Carga en CRM de datos previamente transformados por LDA
  - Coordinación técnica en integración y datos
  - Soporte y Mantenimiento
- Responsabilidades clave:
  - La responsabilidad de la capa middleware y la transformación de datos recaería en LDA.
  - NTT DATA establecería mecanismos formales de coordinación técnica para minimizar riesgos de dependencia, integración y planificación.
- Consideraciones relevantes:
  - Modelo con mayor necesidad de sincronización entre equipos.
  - Incremento potencial del riesgo en plazos si no se garantiza una gobernanza técnica sólida y dependencia directa de terceros en componentes críticos de integración y datos.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Explicación de escenarios

Ambos escenarios mantienen el modelo target. La diferencia radica en el nivel de industrialización y en la distribución del riesgo entre NTT DATA y LDA.

Línea	Escenario 1 Cobertura Integral	Escenario 2 Modelo Esencial compartido
Implicaciones	✓ Menor riesgo operativo ✓ Mayor previsibilidad ✓ Mayor inversión inicial ✓ Industrialización completa	✓ Reducción CAPEX inicial ✓ Mayor implicación técnica LDA ✓ Mayor dependencia de madurez técnica en integración y dataDependencia mayor de madurez interna
Gestión del programa	Gobierno transversal del programa de transformación	Gobierno transversal del programa de transformación
Definición	Blueprint detallado por proceso, Prototipado, escritura de historias de usuario, validación intensiva con negocio	Blueprint detallado por proceso, Prototipado, escritura de historias de usuario, validación intensiva con negocio
Implementación	Diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del alcance en las distintas oleadas propuestas	Diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del alcance en las distintas oleadas propuestas
Integración	Diseño, construcción y gobierno completo de las integraciones requeridas para cobertura E2E del proceso.	Diseño de arquitectura y definición de contratos. Construcción adicional y estabilización asumida parcialmente por LDA.
Data	Extracción, transformación, calidad, carga y reconciliaciones gestionadas por NTT DATA.	Carga en CRM de datasets definidos. Extracción, transformación y calidad asumidas por LDA o terceros.
Gestión del cambio	Gestión del cambio para los distintos colectivos siguiendo plan de puesta en producción por oleadas	Gestión del cambio para los distintos colectivos siguiendo plan de puesta en producción por oleadas

Escenario sujeto a diferencias

Escenarios iguales

La diferencia económica se concentra en Integración y Data, dominios que concentran el mayor riesgo técnico y estructural del programa

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Resumen de Precio Escenario 1

El **precio total estimado para la Incepción General e Implementación del proyecto asciende a: 2.481.813 € (sin IVA)**

- **Incepción General:** fase inicial orientada a validar los supuestos de estimación, confirmar el alcance detallado, definir el modelo de responsabilidades (RACI), identificar riesgos y dependencias, y establecer el plan definitivo de ejecución. Esta fase constituye el punto de validación previo a la consolidación del precio cerrado y tiene una duración estimada de **dos meses.**
- **Implantación:** incluye todas las actividades necesarias para la construcción y despliegue de la solución por oleadas:
  - **Discovery + UX:** Validación funcional + prototipos navegables + diseño técnico (integraciones / datos / seguridad),
  - **CRM Software Development**: Parametrización, configuración y desarrollos específicos sobre la plataforma CRM
  - **Integración Middleware**: Diseño, construcción y pruebas de integraciones con los sistemas corporativos mediante la capa de middleware definida
  - **Migración de Datos**: Diseño de la estrategia de migración, transformación, carga de datos cliente y ejecución de pruebas de calidad y consistencia.
  - **Gestión del Cambio:** definición e implementación del plan de adopción organizativa, incluyendo comunicación, formación, acompañamiento a usuarios clave y soporte al despliegue para garantizar la correcta adopción de la solución.
- **Soporte y Mantenimiento:** una vez finalizada la implantación, se contempla un servicio de soporte y mantenimiento evolutivo y correctivo: **204.119 € (sin IVA)**

.

Concepto	Esfuerzos hrs	Importe sin IVA	Importe con descuento
Gestión Programa	**3.484**	**358.507 €**	**340.582 €**
Inception	555	57.107 €	54.251 €
Implementación	2.929	301.400 €	286.330 €
Incepción General	**2.775**	**210.975 €**	**200.426 €**
Implantación Total	**25.553**	**1.789.225 €**	**1.699.764 €**
Discovery + UX	4.048	392.858 €	373.215 €
CRM Dev. Build, Test, Integ	8.917	400.537 €	380.510 €
Integración Middleware	4.407	281.690 €	267.606 €
Migración de Datos	8.181	317.103 €	301.248 €
Gestión del Cambio	**3.576**	**253.728 €**	**241.042 €**
Soporte y Mantenimiento	**5.238**	**214.862 €**	**204.119 €**
TOTALES	**40.626**	**2.827.297 €**	**2.685.932 €**

(*) El presente desglose de precios aplica exclusivamente en el marco de una adjudicación integral del programa en su conjunto y no podrá interpretarse como base para adjudicaciones parciales o independientes, las cuales requerirían, en todo caso, una revisión y actualización específica de las condiciones económicas

(**) En el alcance de esta propuesta, en el ámbito de la Gestión del Cambio se incluye el Escenario 1 del Plan de Aprendizaje con la Formación de Formadores por fase. De manera opcional proponemos una Escenario adicional que incluiría un Plan de Aprendizaje, que complementa el escenario cotizado con la ejecución de la Formación a Usuario Final por un equipo de formadores de NTT Data con **un coste adicional de 242.000 €**

- Los costes arriba indicados son totales (sujetos al mencionado ajuste a la finalización del Incepción General y a re evaluación global de programa) para el alcance definido en base a la información a la que NTTDATA dispone. Estos costes **incluyen los servicios profesionales de NTT DATA así como gastos de desplazamiento, viajes, y cualquier otro asociado al servicio excepto viajes solicitados expresamente por LDA y no contemplados en la planificación del servicio.** Las tarifas están vinculadas al acuerdo de adjudicación del Programa en su globalidad y los precios indicados no incluyen Impuestos que sean aplicables.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Resumen de Precio Escenario 2

El **precio total estimado para la Incepción General e Implementación del proyecto asciende a: 1.634.194 € (sin IVA)**

- **Incepción General:** fase inicial orientada a validar los supuestos de estimación, confirmar el alcance detallado, definir el modelo de responsabilidades (RACI), identificar riesgos y dependencias, y establecer el plan definitivo de ejecución. Esta fase constituye el punto de validación previo a la consolidación del precio cerrado y tiene una duración estimada de **dos meses.**
- **Implantación:** incluye todas las actividades necesarias para la construcción y despliegue de la solución por oleadas:
  - **Discovery + UX:** Validación funcional + prototipos navegables + diseño técnico (integraciones / datos / seguridad),
  - **CRM Software Development**: Parametrización, configuración y desarrollos específicos sobre la plataforma CRM
  - **Integración Middleware**: Diseño, construcción y pruebas de integraciones con los sistemas corporativos mediante la capa de middleware definida
  - **Migración de Datos**: Diseño de la estrategia de migración, transformación, carga de datos cliente y ejecución de pruebas de calidad y consistencia.
  - **Gestión del Cambio:** definición e implementación del plan de adopción organizativa, incluyendo comunicación, formación, acompañamiento a usuarios clave y soporte al despliegue para garantizar la correcta adopción de la solución.
- **Soporte y Mantenimiento:** una vez finalizada la implantación, se contempla un servicio de soporte y mantenimiento evolutivo y correctivo **204.119 € (sin IVA)**

Concepto	Esfuerzos hrs	Importe sin IVA	Importe con descuento
Gestión Programa	**3.484**	**358.507 €**	**340.582 €**
Inception	555	57.107 €	54.251 €
Implementación	2.929	301.400 €	286.330 €
Incepción General	**2.775**	**210.975 €**	**200.426 €**
Implantación Total	**14.792**	**894.343 €**	**849.625 €**
Discovery + UX	4.048	392.858 €	373.215 €
CRM Dev. Build, Test, Integ	8.917	400.537 €	380.510 €
Integración Middleware	1.655	90.283 €	85.769 €
Migración de Datos	172	10.664 €	10.131 €
Gestión del Cambio	**3.576**	**256.380 €**	**243.561 €**
Soporte y Mantenimiento	**5.238**	**214.862 €**	**204.119 €**
TOTALES	29.865 €	1.935.067 €	1.838.314 €

(*) El presente desglose de precios aplica exclusivamente en el marco de una adjudicación integral del programa en su conjunto y no podrá interpretarse como base para adjudicaciones parciales o independientes, las cuales requerirían, en todo caso, una revisión y actualización específica de las condiciones económicas

(**) En el alcance de esta propuesta, en el ámbito de la Gestión del Cambio se incluye el Escenario 1 del Plan de Aprendizaje con la Formación de Formadores por fase. De manera opcional proponemos una Escenario adicional que incluiría un Plan de Aprendizaje, que complementa el escenario cotizado con la ejecución de la Formación a Usuario Final por un equipo de formadores de NTT Data con **un coste adicional de 242.000 €**

- Los costes arriba indicados son totales (sujetos al mencionado ajuste a la finalización del Incepción General y a re evaluación global de programa) para el alcance definido en base a la información a la que NTTDATA dispone. Estos costes **incluyen los servicios profesionales de NTT DATA así como gastos de desplazamiento, viajes, y cualquier otro asociado al servicio excepto viajes solicitados expresamente por LDA y no contemplados en la planificación del servicio.** Las tarifas están vinculadas al acuerdo de adjudicación del Programa en su globalidad y los precios indicados no incluyen Impuestos que sean aplicables.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Plan de Facturación

El plan de facturación propuesto para cada una de las fases del Programa se detalla a continuación. La estructura definitiva será confirmada tras la finalización de la **Incepción General**, una vez validados el alcance, planificación y modelo de ejecución. A título indicativo, la facturación se articulará conforme a hitos de avance y/o entregables claves asociados a cada fase, garantizando alineación entre progreso real del proyecto y devengo económico.

Incepción General: 50% a la firma/inicio de la fase y 50% a su finalización. El segundo pago se devengará tras la aceptación formal, sin reservas, de los entregables definidos para esta fase.

Hito-Fase	Porcentaje	Importe sin IVA	Importe con descuento (3%)
Inicio	50%		
Fin	50%		
TOTAL	100%		

Implantación de las Fases: Los hitos del Programa serán definidos durante la etapa de Incepción General, en coherencia con la hoja de ruta acordada. NTT DATA se compromete al cumplimiento de los hitos y entregables que se establezcan de mutuo acuerdo para cada una de las funcionalidades y fases definidas. Asimismo, en un plazo máximo de dos (2) semanas desde la finalización del correspondiente **Discovery + UX**, ambas partes acordarán el esquema definitivo de facturación aplicable a la Fase. Cada oleada se gestionará bajo modalidad **Fixed Price**, con facturación asociada a hitos de avance y aceptación de entregables clave. A título indicativo, el esquema de facturación por oleada sería el siguiente:

Hito-Fase Implantación Oleadas	Porcentaje
Inicio de la Oleada / Kick-off	10%
Cierre Discovery + UX	20%
Fin Construcción	35%
Fin Pruebas Integradas	15%
Fin UAT	10%
Go-Live / Preparación Despliegue	5%
Fin Hypercare	5%
TOTAL	100%

- Las facturas serán emitidas por NTT DATA una vez verificado el cumplimiento de los hitos anteriormente indicados y serán abonadas por LDA en un plazo de 60 días desde la fecha de recepción de la factura.
- NTT DATA facturará los servicios a LDA, con domicilio social en España, conforme a la normativa fiscal aplicable.
- Los importes indicados en la presente propuesta no incluyen los impuestos indirectos aplicables, que serán repercutidos conforme a la legislación vigente en cada momento.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Introducción: Plan de Facturación

A título indicativo, la facturación se articulará conforme a hitos de avance y/o entregables claves asociados a cada fase, garantizando alineación entre progreso real del proyecto y devengo económico.

Gestión del Cambio: Nuestros honorarios profesionales se estiman en función de la duración y la dedicación prevista y las tarifas asociadas a los perfiles involucrados en la propuesta. El Plan de Facturación para la **Gestión del cambio para la Incepción General** e implementación

- 10% al finalizar la aceptación del entregable de Gestión del Cambio de la fase de Inception a las dos semanas de finalización de la fase (inicio mes 3.)
  Hito: Diagnóstico de situación inicial y Plan de Gestión del cambio a alto nivel.
- 20 % al finalizar Fase 0 (Fase anterior a la Fase 1 de Go live) de diseño de Plan de Gestión del cambio con planes asociados y ejecución de materiales relacionados (inicio mes 5)
  Hito: Plan de Gestión del Cambio con Plan de Comunicación y Plan de Formación y materiales de formación (versión 1) y de comunicación.
- 20% al finalizar el mes 7 (Fase 2 con primer Go live), con ejecución del Plan de Gestión del cambio, diseño de materiales (versión actualizada) y programa de Formación de Formadores realizado.
  Hito: Programa de Formación de formadores Fase 1 realizado
- 20% al finalizar al finalizar el mes 10 (Fase 3), con ejecución del Plan de Gestión del cambio, diseño de materiales (versión actualizada) y programa de Formación de Formadores para Fase 3 realizado.
  Hito: Programa de Formación de formadores Fase 3 realizado
- 20% al finalizar al finalizar el mes 13 (Fase 5), con ejecución del Plan de Gestión del cambio, diseño de materiales (versión actualizada) y programa de Formación de Formadores para Fase 5 realizado.
  Hito: Programa de Formación de formadores Fase 5 realizado
- 10% al cierre de proyecto con Informe de cierre de proyecto y transferencia de conocimiento a Línea Directa.
  Hito: Sesiones de soporte semanales y acciones de refuerzo realizadas para última fase (Fase 5)
  Ejecución del Plan de sostenibilidad y transición al Centro de Excelencia CRM
  Entrega de Informe de cierre

El Pla de Facturación para Soporte y Mantenimiento será mensual.

4 SLA´s contemplados

© 2025 NTT DATA, Inc.

KPIS de Ejecución

Medimos la ejecución por su **impacto** en **eficiencia**, **crecimiento** y **rentabilidad** aseguradora.

1. Gobierno y planificación

Medimos control, cumplimiento y predictibilidad

% Hitos cumplidos en fecha

Desviación plazo y esfuerzo vs baseline aprobado
(% plazo y esfuerzo)

Cumplimiento roadmap releases

Variación backlog
(% cambio por dependencias)

Riesgos abiertos vs mitigados

Lead time decisión LDA

2. Calidad y estabilidad de la solución

Medimos calidad técnica, estabilidad y cumplimiento

Defectos críticos en UAT
(% sobre total)

Ratio reapertura incidencias

Cobertura de pruebas
(% requisitos testados)

Defect leakage
(errores detectados post Go)

Cumplimiento checklist seguridad / arquitectura

Cumplimiento estándares integración RT

3. Gestión de Dependencias e Integración

Garantizamos sincronización bidireccional estable y trazable

% Integraciones desarrolladas vs plan

Latencia media integración (p95)

Errores integración / reintentos

Eventos CDC procesados correctamente (%)

Reconciliaciones automáticas exitosas

Incidentes de sincronización datos

4. Adopción y Go-Live

En Plan de Trabajo debes medir readiness, no impacto negocio

% usuarios formados por colectivo

% certificación interna superada

Índice readiness Go-Live

Incidencias funcionales primera semana

Uso CRM vs Galgo
(tracking progresivo)

Nivel feedback early adopters

Estos KPIS se acordarán durante el inicio del proyecto, asegurando un foco claro desde el inicio, que nos permita medir el éxito de la ejecución

© 2025 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Penalizaciones de Proyecto (Implantación)

Supuesto	Aplicación	Límite
Retraso en hitos críticos	% sobre el milestone afectado por semana de retraso	Cap máximo por hito
Entregables con defectos graves	Corrección sin coste + posible ajuste económico	—
Abandono injustificado	Penalización contractual específica	Según contrato

Penalizaciones de Servicio (Soporte L2/L3)

Vinculadas exclusivamente al **incumplimiento de SLA acordados**.

KPI mensual SLA	Aplicación
≥ 95% cumplimiento	Sin penalización
< 95%	Penalización proporcional sobre fee mensual de soporte

- Cálculo mensual.
- Basado en métricas objetivas (ServiceNow).
- Aplicación sobre fee mensual del servicio, no sobre el total del contrato.
- Exclusión de dependencias externas (Core, terceros)

Límites y equilibrio

- Penalización máxima mensual: **Cap razonable sobre el fee de soporte**.
- No acumulable indefinidamente.
- Revisión conjunta en comité de seguimiento.

- Las penalizaciones se aplicarán previa validación conjunta en comité de seguimiento.
- Las penalizaciones serán aplicables únicamente ante incumplimientos **directamente imputables al proveedor**, excluyendo impactos derivados de terceros o dependencias fuera de su ámbito de control.
- Aplicación proporcional, vinculada a entregables comprometidos.
- Durante el periodo de estabilización post Go-Live (primer mes), las desviaciones SLA serán monitorizadas sin aplicación automática de penalización.
- El cómputo del SLA considerará únicamente tiempos dentro del horario de servicio y estados imputables al proveedor.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Medición del SLA (mensual)

- Medición mensual sobre KPI acordados.
- Basado en métricas objetivas (ServiceNow).
- Validación en comité de seguimiento.
- Penalización proporcional al nivel de desviación.

El cálculo se realizará sobre el porcentaje global de cumplimiento mensual del SLA acordado, no por incidente individual.

Periodo de estabilización

Durante la fase de transición / primer mes post Go-Live:

- Monitorización de SLA.
- Sin aplicación automática de penalizaciones.
- Ajuste conjunto de umbrales si procede.

Esquema de Penalización por Cumplimiento SLA

Cumplimiento mensual SLA	Penalización sobre fee mensual AM
≥ 95%	0%
90% – <95%	1%
85% – <90%	2%
80% – <85%	4%
70% – <80%	6%
<70%	8%–10% (según severidad y validación en comité)

- Penalización máxima mensual: **10% del fee de soporte AM**
- No acumulable indefinidamente.

Principio de Responsabilidad

Las penalizaciones aplicarán únicamente ante incumplimientos **directamente imputables al proveedor**.

Exclusiones de Aplicación

No aplicarán penalizaciones cuando el incumplimiento derive de:

- Dependencias externas (Core, Genesys, terceros).
- Acción u omisión del cliente.
- Cambios de alcance no formalizados.
- Fuerza mayor.
- Incidencias fuera del horario de servicio (según cómputo acordado).

- El cumplimiento SLA se garantiza dentro del dimensionamiento acordado (≈400h/mes).
- Si la volumetría supera el 10–15% durante 2 meses consecutivos, se revisará el modelo antes de aplicar penalización.
- Prioridad correctamente asignada por el cliente.

5 Consideraciones

© 2025 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance

Generales

- El proyecto CRM y Contact Center (Genesys) evolucionan en paralelo con planificación coordinada.
- El modelo de trabajo podrá ser híbrido (no 100% presencial continuo) y se permite modelo mixto onshore/nearshore/offshore: nuestro modelo de delivery contempla para el desarrollo ciertas partidas en offshore.
- No se contemplan cambios regulatorios relevantes durante la implantación.
- El alcance funcional descrito en RFQ es completo y no se contemplan macroprocesos adicionales fuera de los identificados, y si los hubiera se recalibrará el alcance
- La definición de KPIs e informes será cerrada antes de desarrollo.
- LDA proporcionará: Acceso a Galgo/Mainframe.
- Sobre las credenciales presentadas, en caso de ser requerido, se contrastará la posibilidad de acceso a persona de contacto mismas (será necesario confirmar autorización).
- No se han considerado esfuerzos de equipos ajenos a los descritos en esta oferta. Por lo tanto, no se han tenido en cuenta esfuerzos de adaptaciones en otros sistemas, tales como el core (COBOL / CICS / DB2), más allá del consumo de servicios expuestos por LDA.
- La automatización de pruebas no está incluida en esta propuesta. Desde NTT DATA tenemos áreas prestando este servicio bajo diferentes herramientas, recomendamos Selenium. En caso de requerirse, sería un servicio que solicitar adicionalmente a esta RFP.
- No se contempla un enfoque Big Bang; el despliegue será incremental por olas funcionales.
- La lógica aseguradora (pricing, reglas técnicas, underwriting, etc.) permanece en Galgo salvo decisión expresa en fase de diseño.
- No se incluyen reingenierías completas de procesos legacy fuera del perímetro definido en cada fase.Cualquier evolución normativa futura (DORA, RGPD, Solvencia II, etc.) posterior a la adjudicación podrá implicar revisión de alcance.

Discovery

- La estimación de la implantación de NTT DATA se ha basado en los requerimientos facilitados en la RFP, que han sido analizados por NTT DATA y su análisis sirve para la estimación de esfuerzos y el precio entregado a LDA
- A la fecha, existe un cierto nivel de incertidumbre (datos, integraciones, ...etc), por lo que el éxito de esta fase requerirá flexibilidad, colaboración y confianza mutua. Como resultado del análisis de Discovery, podrán identificarse ajustes en el alcance funcional, técnico o de integración inicialmente considerado en la presente oferta. Dichos ajustes serán formalmente documentados en un Informe de Alcance Final (Scope Validation Report), que incluirá:
    - Requerimientos y premisas confirmados, priorizados y validados en cuanto a su complejidad.
    - Nuevos desarrollos o integraciones identificadas, con su complejidad técnica confirmada.
    - Estimación revisada de esfuerzo y actualización del plan de releases.
- En caso de que los ajustes identificados impliquen variaciones relevantes de esfuerzo, cronograma o coste, se aplicará un proceso conjunto de revisión de requerimientos, analizando las categorías must, need y nice to have, con el objetivo de mantener el proyecto dentro del presupuesto original. Si, tras dicha revisión, el resultado acordado implicase un incremento presupuestario relevante, ambas partes podrán:
    - Activar el proceso de gestión de cambios previsto en el Modelo de Gobierno, para su evaluación y aprobación en el Comité de Proyecto
    - O bien acordar una salida pactada, en caso de no llegar a un acuerdo en el coste sobre la implantación facilitado tras el Discovery, tanto LDA como NTT DATA podrán optar a la finalización del contrato. En este caso
    - NTT DATA dejaría finalizada la definición funcional y realizaría un traspaso de conocimiento de dicho funcional valorado entre 2 y 4 sesiones
    - Hasta la aprobación del Scope Validation Report, los hitos de planificación y estimaciones de esfuerzo asociados al desarrollo o implantación tendrán carácter provisional y orientativo

Necesidades de entornos y usuarios

- Se considera necesario, para no impactar en el desarrollo del proyecto y comprometer las fechas establecidas, el poder disponer en la fecha planificada de los entornos, herramientas, plataformas de desarrollo, usuarios habilitados, etc. necesarias para la realización del proyecto

Herramientas

- Se contempla la utilización de las herramientas JIRA y Office como herramientas de trabajo para documentar la solución implementada.
- LDA deberá proporcionar accesos, entornos y credenciales en tiempo y forma.
- Se asume disponibilidad de herramientas corporativas de CI/CD. No se incluye la creación de un nuevo modelo DevOps corporativo.

Licencias y Software necesario para el desarrollo

- La adquisición de licencias de uso del producto Salesforce y el resto que se utilicen en la implantación del proyecto se realizará por parte de LDA con dichos vendors sin ejercer NTT DATA como intermediario.
- Las licencias deben estar disponibles al inicio del proyecto.

Idiomas

- Se contempla la configuración de idiomas del aplicativo Salesforce en Español e Inglés.
- Se contempla configuración estándar en Español e Inglés.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance

Implantación:

- Por cada oleada, se incorporará una planificación detallada del proyecto que incluirá todos los hitos, tareas y entregables bajo responsabilidad de NTT DATA, así como las actividades dependientes de terceros. Dicho plan identificará las fechas clave de colaboración o entrega requeridas por cada parte (por ejemplo, definición y desarrollo de integraciones, ejecución de pruebas funcionales y UAT, fases de validación y despliegue). En ningún caso se asumirán costes derivados de causas no imputables a NTT DATA (p. ej., demoras por aprobaciones del Cliente, cambios de alcance, dependencias externas no gestionadas por el Proveedor). Existirá un límite de responsabilidad económica por el proyecto a acordar entre las partes
- NTT DATA se compromete a cumplir el calendario de implantación acordado y los Acuerdos de Nivel de Servicio de implantación. Definiciones operativas
    - Retraso Imputable al Proveedor: desviación respecto al Calendario Comprometido causada por hechos bajo control del Proveedor (p. ej., falta de disponibilidad del equipo acordado, demoras en entregables propios, incidencias técnicas no relacionadas con dependencias de LDA o terceros).
    - Desviación: diferencia entre la fecha/alcance planificado y el real (hitos, duración de UAT, fecha de paso a producción).
    - En caso de que se produzcan retrasos en los hitos de implantación imputables a NTT DATA, el proveedor asumirá los costes razonables y directamente atribuibles a dichas desviaciones, siempre que se trate de impactos derivados de causas bajo su control (por ejemplo, falta de disponibilidad de recursos comprometidos, incidencias técnicas propias o demoras en entregables críticos).
    - Cualquier eventual sobrecoste imputable al retraso deberá centrarse exclusivamente en los costes adicionales de implantación o en los recursos necesarios para recuperar el plan de proyecto, y no en los costes de licenciamiento, que estarán amparados por las condiciones del acuerdo Salesforce–LDA
- Impactos por otros proyectos: en caso de replanificación del proyecto por causas ajenas a NTT DATA deberá revisar el posible impacto en planificación y coste asociado.
- Cambio de alcance y causas no imputables: todo cambio de alcance, dependencia externa, o decisión del Cliente que afecte al plan se gestionará mediante Change Request con su traza de impacto en plazo/coste/ANS. Estos casos no generan asunción de costes por parte del Proveedor. Anexos útiles: 1. Plantilla de Registro de Desviaciones (campos: ID, Hito, Fecha detección, Causa, Imputable a, Impacto plazo/coste, Acción, Owner, ETA, Estado; 2. Catálogo de causas tipo (p. ej., staffing, calidad de entregable, dependencia externa, entorno, decisión de negocio); 3. Cuadro de mando ANS con indicadores y umbrales de alerta/penalización
- Procedimiento de Cambios en el alcance: En caso de que, durante la ejecución de las tareas amparadas por esta propuesta, se modifiquen los supuestos, plazos, actividades previstas, etc., ambas partes se reunirán a solicitud de NTT DATA para redefinir el cronograma de ejecución y los esfuerzos previstos, así como para acordar una valoración económica de los impactos que se formalizarán en una Nota de Cambio, si corresponde. A través del Comité de Dirección, LDA y NTT DATA deben firmar la Nota de Cambio del sistema como prueba de la aceptación y compromiso de ambas partes, proporcionando una copia a NTT DATA. LDA y NTT DATA se comprometen a incluir en todas las reuniones de seguimiento de proyectos, como punto del orden del día, la revisión del estado de las Notas de Cambio pendientes. El plan de facturación se regularizará con los ajustes acordados en los comités de dirección
- Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) serán medidos y evaluados conforme a las condiciones establecidas tras el Discovery y de acuerdo con las métricas validadas entre LDA y NTT DATA. No obstante, se establece que los incumplimientos de los ANS ocasionados por causas ajenas a NTT DATA o atribuibles a terceros —incluidos proveedores externos, dependencias de sistemas no gestionados por NTT DATA o incidencias en infraestructuras fuera del ámbito del servicio— no serán considerados en el cálculo de los indicadores de desempeño y, por tanto, no serán objeto de penalización. Se propone un límite de penalización máximo de un 1,5% de la facturación.
- NTT DATA ofrece una garantía de 1 año a partir de la entrada en producción y aceptación formal del sistema por parte de LDA. Esta garantía cubrirá únicamente incidencias justificadas y atribuibles directamente a los servicios prestados por NTT DATA, entendiendo por incidencias aquellas deficiencias o errores respecto a los requisitos técnicos y funcionales acordados. LDA deberá acreditar la imputabilidad de la anomalía a NTT DATA. Si el proyecto evoluciona hacia nuevas fases licitadas de forma independiente, la supervisión del período de garantía se integrará en el Comité de Seguimiento Operativo de dichas fases. En caso contrario, se mantendrá un Comité específico hasta la finalización de la garantía. Cualquier retraso no atribuible a NTT DATA implicará una revisión del alcance, cronograma, esfuerzo y coste del proyecto. NTT DATA se compromete a subsanar sin coste adicional para LDA durante la fase de garantía, aquellas incidencias que efectivamente sean imputables al presente proyecto y generar los componentes de despliegue necesarios para su implantación en entorno de Integración, para lo cual NTT DATA dispondrá de un equipo dedicado en exclusividad a LDA con el fin de gestionar las respuestas necesarias en el periodo que discurre la garantía.
- El horario de trabajo de los equipos será de 9:00 a 18:30 de lunes a jueves y de 8:00 a 15:00 los viernes. Del 15 de Julio al 15 de septiembre se contempla la jornada intensiva (de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes en ese periodo)

© 2025 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance

Integraciones

- Se contempla el uso de APIs y conectores estándar de Salesforce/MuleSoft.
- No se incluyen desarrollos de middleware adicionales fuera de MuleSoft salvo acuerdo específico.
- Se asume que las APIs necesarias estarán disponibles y con SLA adecuados por parte de LDA.
- El rendimiento de sistemas terceros queda fuera del control del integrador.
- No se incluye la construcción de un nuevo Data Lake/Lakehouse, únicamente su integración.

Convivencia con Galgo

- Se asume modelo híbrido de integración: Galgo → CRM mediante patrón Event-Driven (near real time).CRM → Galgo mediante APIs síncronas (real time).
- No se modificará el contrato canónico de eventos publicados por Galgo.
- La transformación y adaptación al modelo CRM será responsabilidad del integrador.
- Se habilitarán mecanismos de idempotencia, reintentos y DLQ en capa CRM.
- Se evaluará la necesidad de procesos de reconciliación periódica por entidad.
- La sincronización bidireccional temporal durante pilotos podrá impactar en esfuerzo de integración.

Pruebas:

- LDA gestionará la disponibilidad de los equipos de QA/Negocio necesarios para la realización y soporte de las pruebas UAT definidas para cada entrega funcional, así como la coordinación necesaria para que todos los sistemas, datos de prueba y configuraciones requeridas por las funcionalidades y sistemas estén desplegados y operativos en los entornos de UAT. LDA asumirá cualquier indisponibilidad de los sistemas requeridos en las pruebas o retrasos por la falta en las entregas del resto de aplicativos que suponga un retraso en las pruebas o la no disponibilidad para hacer los casos de prueba completos. En caso de tener impacto sobre la planificación, se tratará como un cambio de alcance del proyecto. LDA identificará el responsable de adaptar y realizar las pruebas sobre los sistemas que se integren con la nueva solución, definiendo quién será responsable de suministrar los datos de los sistemas conectados

Migración de Datos

- La migración se limita a información activa y operativa.
- Se contempla migración inicial únicamente de datos necesarios para operación CRM.
- Solo se migrarán las tablas que sean necesarias para el CRM
- No se incluye limpieza estructural masiva del histórico.
- El histórico financiero completo permanece en el sistema Core.
- No se contempla consolidación MDM corporativa fuera del alcance CRM.
- Las reglas de negocio son definidas y validadas por Línea Directa.
- Los mapeos origen-destino son definidos y validados por Línea Directa
- La reconciliación se limita a entidades y atributos críticos acordados.
- No se contempla implantación de una solución corporativa de gestión maestra de datos
- Desde el punto de vista técnico la estimación de migración se basa en
    - Premisas técnicas:
        - Disponibilidad, estabilidad y calidad de los datos de origen.
        - Entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción operativos.
        - Ventana de puesta en producción definida y acordada.
        - Volúmenes dentro de los rangos facilitados.
        - Acceso a responsables funcionales para validación.
    - Premisas Organizativas
        - Designación de responsables de datos por parte de Línea Directa.
        - Validación formal de los mapeos antes de su ejecución.
        - Capacidad de toma de decisiones ágil ante discrepancias.
        - Participación activa del negocio en la validación final.

- .

© 2025 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance

Soporte Post Producción

- La duración del soporte post producción es de 12 meses desde la salida del MVP, con inicio escalonado siguiendo las siguientes directrices.

- El importe cubrirá el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, así como la gestión integral del servicio, conforme a los horarios y coberturas establecidos por LDA.
- Soporte Correctivo (incidencias críticas) y Soporte de fabricante 24x7
- Servicio de desarrollo: 8x5 (L-J 8:30 – 18:00 y V 8:00 – 15:00)
- Se han incluido dietas y gastos de desplazamiento para visitas puntuales del responsable de servicio a las oficinas de LDA.
- Se ha incluido una bolsa de horas para actuaciones en remoto fuera de horario que no sean provocadas por mal funcionamiento de las plataformas, bugs o similar.
- Cualquier hora fuera horario adicional para fines de semana se facturará a 75€/hora para fines de semana (Sábado, Domingo y Festivos) y 100€/hora para festivos especiales (Navidad, Nochevieja,...).
- La fase de transferencia y estabilización inicial será sin coste para LDA
- Las comunicaciones relacionadas con cortes de servicio por subidas a Producción serán comunicadas por LDA, en el medio y forma que se considere, pero añadiendo a los responsables del equipo de NTT DATA como destinatarios, aparte del resto de personas que LDA considere.
- El equipo propuesto trabajará en remoto, aunque podrá personarse de manera puntual en las oficinas de LDA para cualquier tipo de reunión que sea necesario realizar de manera presencial previo aviso por LDA. El tiempo de preaviso se acordará entre LDA y NTT DATA.
- El precio no incluye el plan de traspaso para que otro proveedor pudiera asumir el servicio (fase devolución de servicio) que estará fuera de los meses de contrato, en caso de extensión ser revisará para aplicar el IPC

Gestión del Cambio

- El plan estará sujeto a ajustes derivados de la fase de Inception y alineado al roadmap del Plan de Transformación. Durante cada fase, se refinará en la etapa inicial de Discovery bajo un enfoque cíclico e iterativo.
- **Volumetría:** Alcance estimado de 2.000 usuarios distribuidos en 4 colectivos. Cualquier modificación del roadmap, releases o ampliación de colectivos tras su aprobación implicará revisión presupuestaria.
- **Gobernanza y Coordinación:** El diseño del Plan de Comunicación y del Plan de Formación requerirá colaboración con el área de Personas y Comunicación de Línea Directa.
- La difusión del proyecto y materiales se realizará junto con el área de Comunicación. Los detalles se concretarán tras la fase de Inception.

Gestión del Cambio

- Línea Directa identificará usuarios clave y referentes internos que actuarán como impulsores durante la formación y adopción.
- El equipo implantador deberá facilitar con antelación la documentación funcional (procesos, roles, funcionalidades y plataforma) antes de cada release para permitir la correcta generación de materiales formativos.
- **Plan de Aprendizaje:** Se contemplan horas orientativas por usuario y fase, distribuidas en: Sesiones teóricas (visión global y procesos), sesiones prácticas basadas en casos reales. sesiones de seguimiento y resolución de dudas, apoyo experto del especialista Salesforce. El enfoque definitivo (contenido, número de sesiones, duración y calendario) se definirá tras la fase de Inception según el alcance por ola.
- **Escenarios de Formación**
    - **Escenario 1:** Formación de Formadores en las 5 fases .La formación a usuarios finales será impartida por equipo interno de Línea Directa y COE CRM Salesforce.
    - **Escenario 2:** NTT impartirá tanto la Formación de Formadores como la formación a usuarios finales en cada fase, con un equipo de 5 formadores y despliegue alineado a cada entrada en producción en una propuesta de 5 olas.
- **Materiales y Soporte:** Todos los materiales habrán de estar disponibles en repositorio digital e incluirán: Manual de usuario completo, Infografías y guías rápidas (Journey Map), Vídeo demo con avatar, videopíldoras grabación de webinars. Los manuales se elaborarán a partir de la documentación técnica Salesforce generada por el equipo implantador. La carga de materiales formativos e itinerarios y la gestión de alumnos en la plataforma digital de formación propia de LDA será responsabilidad de LDA.
- **Idioma** de los materiales y entregables de Gestión del cambio será castellano.
- **Entorno de formación**: para la práctica de la formación se creará un juego de datos de prueba basado en los principales procesos y roles y será necesario disponer de un entorno para pruebas en Salesforce preparado con la configuración correcta y el número suficiente de datos (a ser puesto a disposición por el equipo técnico del proyecto).
- Durante el Go Live se proporcionará acompañamiento y soporte y se realizará un seguimiento de la adopción, medición de resultados y, en caso necesario, se implementarán acciones correctivas.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Consideraciones al alcance

Gestión del Cambio

- **Responsabilidad de Línea Directa: s**erá responsable de cargar, alojar y actualizar en su propia plataforma digital de aprendizaje (IsEazy) el programa formativo y de realizar la administración pertinente de los alumnos. Así mismo tendría que facilitará periódicamente al equipo de gestión del cambio los indicadores de formación que permitan ir conociendo el avance del aprendizaje
- *En caso de ser necesario, para el apoyo en la gestión de la plataforma digital de formación, se podría ofrecer de manera opcional un perfil administrador de plataforma que pueda colaborar en la carga de datos, alta de cursos y gestión de usuarios (fuera del alcance de esta propuesta).*
- Es imprescindible contar con el equipo interno responsable de la Gestión del Cambio de Línea Directa y con el área de Personas y Comunicación para coordinar internamente las actividades del proyecto, validar entregables y metodología, colaborar con el equipo de Gestión del cambio de NTT Data y tomar decisiones sobre el proyecto.

Aprobaciones de entregables

- Como modelo de aprobación de entregables desde NTT DATA proponemos el siguiente, si bien se acordará en tiempo de kick-off:
    - La aprobación de los documentos entregables por parte de LDA deberá de ser en un período máximo de 10 días laborales desde su entrega.
    - El procedimiento de aprobación de los entregables, así como el de las actas de reunión es el siguiente:
    - Presentación del entregable
    - Modificación de entregable con las matizaciones a realizar por las áreas intervinientes (Plazo de modificación 5 días)
    - Revisión de las modificaciones introducidas (Plazo de 3 días)
    - En caso de no respuesta en los plazos previstos se darán por aprobados los entregables
    - Las pruebas de UAT deben ser realizadas y certificadas por el equipo de negocio de LDA, con soporte del equipo NTT DATA.
    - El equipo de NTT DATA generará los planes de pruebas durante la fase de construcción que deben ser aprobadas por LDA tal y como se indica más arriba.

Contact Center - Genesys

- CRM y CCaaS evolucionarán en paralelo con coordinación de releases y salida productiva alineada, aunque con gobiernos independientes.
- Genesys Cloud será el motor exclusivo de los canales (voz, chat, email) y del enrutamiento.
- El CRM será el sistema de gestión operativa y relacional donde se ejecutan procesos, casos, oportunidades y visión 360º.
- El agente operará en una única consola integrada con CTI embebido y screen pop en tiempo real.
- Toda interacción relevante generará automáticamente registros trazables en el CRM (caso, oportunidad o actividad).
- La sincronización de interacciones y eventos será en tiempo real o near-real-time, sin procesos batch.
- Se definirá explícitamente la frontera funcional entre lógica de canal (Genesys) y lógica de proceso (CRM).
- Se respetará el modelo de sistemas maestros evitando duplicidades entre Genesys, CRM y Mainframe.
- El modelo soportará la convivencia progresiva entre Galgo y CRM sin impacto en la operación diaria.
- La IA de Genesys y la IA del CRM serán complementarias y no solapadas en sus capacidades.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Penalizaciones de Proyecto (Implantación)

Supuesto	Aplicación	Límite
Retraso en hitos críticos	% sobre el milestone afectado por semana de retraso	Cap máximo por hito
Entregables con defectos graves	Corrección sin coste + posible ajuste económico	—
Abandono injustificado	Penalización contractual específica	Según contrato

Penalizaciones de Servicio (Soporte L2/L3)

Vinculadas exclusivamente al **incumplimiento de SLA acordados**.

KPI mensual SLA	Aplicación
≥ 95% cumplimiento	Sin penalización
< 95%	Penalización proporcional sobre fee mensual de soporte

- Cálculo mensual.
- Basado en métricas objetivas (ServiceNow).
- Aplicación sobre fee mensual del servicio, no sobre el total del contrato.
- Exclusión de dependencias externas (Core, terceros)

- Las penalizaciones se aplicarán previa validación conjunta en comité de seguimiento.
- Las penalizaciones serán aplicables únicamente ante incumplimientos **directamente imputables al proveedor**, excluyendo impactos derivados de terceros o dependencias fuera de su ámbito de control.
- Aplicación proporcional, vinculada a entregables comprometidos.
- Durante el periodo de estabilización post Go-Live (primer mes), las desviaciones SLA serán monitorizadas sin aplicación automática de penalización.
- El cómputo del SLA considerará únicamente tiempos dentro del horario de servicio y estados imputables al proveedor.
- Los SLA y KPIs específicos asociados a la ejecución del proyecto (implantación) se definirán y acordarán conjuntamente en la fase de planificación detallada, en función del alcance y entregables aprobados.

© 2025 NTT DATA, Inc.

Régimen de Penalizaciones Propuesto

Medición del SLA (mensual)

- Medición mensual sobre KPI acordados.
- Basado en métricas objetivas (ServiceNow).
- Validación en comité de seguimiento.
- Penalización proporcional al nivel de desviación.

El cálculo se realizará sobre el porcentaje global de cumplimiento mensual del SLA acordado, no por incidente individual.

Periodo de estabilización

Durante la fase de transición / primer mes post Go-Live:

- Monitorización de SLA.
- Sin aplicación automática de penalizaciones.
- Ajuste conjunto de umbrales si procede.

Esquema de Penalización por Cumplimiento SLA

Cumplimiento mensual SLA	Penalización sobre fee mensual AM
≥ 95%	0%
90% – <95%	1%
85% – <90%	2%
80% – <85%	4%
70% – <80%	6%
<70%	8%–10% (según severidad y validación en comité)

- Penalización máxima mensual: **10% del fee de soporte AM**
- No acumulable indefinidamente.

Principio de Responsabilidad

Las penalizaciones aplicarán únicamente ante incumplimientos **directamente imputables al proveedor**.

Exclusiones de Aplicación

No aplicarán penalizaciones cuando el incumplimiento derive de:

- Dependencias externas (Core, Genesys, terceros).
- Acción u omisión del cliente.
- Cambios de alcance no formalizados.
- Fuerza mayor.
- Incidencias fuera del horario de servicio (según cómputo acordado).

- El cumplimiento SLA se garantiza dentro del dimensionamiento acordado (≈400h/mes).
- Si la volumetría supera el 10–15% durante 2 meses consecutivos, se revisará el modelo antes de aplicar penalización.
- Prioridad correctamente asignada por el cliente.

Los SLAs se revisarán y ajustarán al inicio del proyecto


NTT DATA
