Seguimiento proyecto “LiDIA conocimiento”

25.06.2024

Índice

01. Hitos Despliegue

02. Uso de LidIA

03. Hitos Carga de Contenidos

04. Estado Objetivos

05. Plan de Adopción/Formacion

06. Roadmap Proyecto

1. Hitos Despiegue



linea directa

Hitos Despliegue

Proyecto LidIA

23/10/24

Responsables y Coordinadores

Áreas Comercial y Cartera

Comunicación específica
Sesión explicativa

23/10/24

Supervisores y Colaboradores Formación

Áreas Comercial y Cartera

Comunicación específica
Sesión explicativa

23/10

Áreas Back Office

Comunicación específica

04/11

Grupo Chat

Áreas Comercial y Cartera

Comunicación específica
Sesión explicativa

Hitos Despliegue

Proyecto LidIA

25/11

Nuevo Grupo de Chat

8 personas

Áreas Cartera

Comunicación específica

Sesión explicativa

31/12

Área Front Office

Área Cartera

Comunicación específica

Sesión explicativa

31/12

Área Front Office

Área Comercial

Comunicación específica

Sesión explicativa

05/02

Área Front Office

Nuevo Negocio Comercial

Comunicación específica

Sesión explicativa

2. Plan de Adopción



linea directa

Plan de Adopción y Formacion (Acciones)

Proyecto LidIA

Bloque Adopción/Formacion

Cartera Chat

- 20/01/25 — Adopción a SPV y Asesores
- 04/11/24 — Comunicado inicial sala
- 06/02/25 — Píldora Formativa
- 14/02/25 — Inicio envió material *

Comercial

- 20/01/25 — Adopción a SPV y Asesores
- 05/02/25 — Comunicado inicial sala
- 05/02/25 — Píldora Formativa
- 11/02/25 — Formacion Presencial
- 14/02/25 — Inicio envió material *

* Envíos recurrentes los Viernes todas las semanas.

Bloque despliegue

- Chat Cartera
- NN Comercial
- Operaciones Salud Soporte
- Operaciones Retención

Bloque Conocimiento

- 20/01/25 — Proceso Gobierno

Calidad Cartera

- 14/03/25 — Comunicado a Calidad
- 10/03/25 — Restructuración contenidos Wiki
- XX/02/25 — Escalabilidad Contenidos

Calidad Comercial

- 21/01/25 — Comunicado a Calidad
- 14/02/25 — Restructuración contenidos Wiki
- 05/02/25 — Escalabilidad Contenidos

Bloque Analítica

- Semana 1 — 5 Mensajes
- Semana 2 — 56 Mensajes
- Semana 3 — 89 Mensajes
- Semana 4 * — 245 Mensajes

* Semana 4 **Comienzo Adopción**

- Semana 5 — 178 Mensajes

Grupos Digitalización y Eficiencia “Cartera” (5)

Adopción LidIA

Coordinadores

Mercedes Alburquerque
LDAMAM1
Área Cartera

DIGITALIZACION Y EFICIENCIA

Carmen González López
LDACGL
Area Cartera

DIGITALIZACION Y EFICIENCIA

Miguel Ángel Leña
LDALML9
Area Cartera

DIGITALIZACION Y EFICIENCIA

Digitalización y Eficiencia

2 *Supervisores*

TOMAS GASCO SANCHEZ – LDATGS

CARLOS SANCHEZ CABANILLAS – LDACSC1

Digitalización y Eficiencia

3 *Asesores*

PEDRO FERNANDEZ MARTINEZ– LDAPFM

TOÑI FERNANDEZ ROMERO – LDAMFR

PILAR GORDO MORENO – LDAMGM1

Grupos Coordinadores Nuevo Negocio “Comercial“

Adopción LidIA

Javier Zabal Ferreiro
LDAJZF
Area Comercial

NN COMERCIAL
EMISION EXTERNA

Cesar López Gijón
LDACLG
Area Comercial

NN COMERCIAL
RECEPCION EXTERNA

Almudena Fernandez Peñamedrano
LDAAFP
Area Comercial

NN COMERCIAL
RECEPCION

Víctor Garcia Boza
LDAVGB
Area Comercial

NN COMERCIAL
OPERACIONES SALUD

Aitor Fernandez Garcia
LDAAFG
Area Comercial

NN COMERCIAL
VENTAS INTERNET

Grupos Supervisores NN Comercial (28)

Adopción LidIA



NN Comercial Emisión Externa

5 — *Área Comercial*

IVAN CABALLERO HURTADO - LDAICH
JOSE JUAN DIEZ PRIETO – LDAJDP
SANDRA MARTINEZ MORAIS – LDASMM1
AZAHARA PALOMINO SANCHEZ – LDAAPS2
CRISTINA VALVERDE REQUENA – LDACVR

NN Comercial Recepción Externa

2 — *Área Comercial*

BEATRIZ CABERO SANTOS - LDABCS
JORDI FORNELLS BLANC – LDAJFB1

NN Comercial Operaciones Salud

3 — *Área Comercial*

★ *JAVIER GOMEZ BERLANGA- LDAJGB1*
VICTOR RUMBERO ORDAZ – LDAVRO
MERCEDES TIRADO GOMEZ - LDAMTG

NN Comercial Recepción

13 — *Área Comercial*

CARLOS FERNANDEZ PEREZ - LDACFP2
CARLOS MUÑOZ BOCOS– LDACMB2
VANESSA PEANDRES CAÑAMARES– LDAVPC
MIGUEL ANGEL FEBRERO MILAN– LDAMFM5
LEONARDO DIAZ SANTANA– LDALDS
BEATRIZ PADILLA LOPEZ– LDABPL2
RODRIGO RICO ORTIZ– LDARRO
★ *JULIA RODRIGUEZ CASTELLANO – LDAJRC3*
ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ – LDAAFS
HUAFI MOHAMED MOHAMED – LDAHMM
RAUL GONZALEZ GUTIERREZ –LDARGG
★ *YASMINA LANAU OTIN - LDAYLO*
CARLOS ROMERO VEGA - LDACRV

NN Comercial Ventas Internet

5 — *Área Comercial*

MIRIAM RAMOS OLIVA- LDAMRO2
PATRICIA CAMBRONERO DRUET– LDAPCD
IRENE DEL OSO MORCILLO – LDAIOM
PATRICIA FERNANDEZ GUIJARRO – LDAPFG1
★ *RICARDO ORTEGA GARCIA - LDAROG*

Grupos Cartera “Retención” (607)

Adopción LidIA



Concepción Ruiz Ruiz

111 *Área Cartera*

RETENCIION CARTERA

EQUIPO RECOBRO Y RETENCION 4

Concepción Ruiz Ruiz

22 *Área Cartera*

RETENCION CARTERA

EQUIPO BOOMERAN Y ASESORES

Eva María Ortega

92 *Área Cartera*

RETENCION CARTERA

RETENCION 6

Eduardo Perez-Villamil

161 *Área Cartera*

RETENCION CARTERA

RETENCION 1Y RETENCION 5

Alberto Heredia

96 *Área Cartera*

RETENCION CARTERA

RETENCION 2

Gorka Sanchez Burgos

125 *Área Cartera*

RETENCION CARTERA

RETENCION 3

Grupos Cartera “Salud y Venta a la cartera” (89)

Adopción LidIA



Cecilio de la Torre

14 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA A LA CARTERA

CALLCENTER SALUD RETENCION

Lorena Gomez Diaz

16 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA A LA CARTERA

CALLCENTER SALUD RETENCION

Sofia Conde Sosa

16 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA CARTERA

ATC RENTABLES

Daniel Perez Perez

10 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA CARTERA

CROSSELING

Marta Anton Garcia

13 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA CARTERA

CROSSELING

Daniel Linacero Martin

20 *Área Cartera*

SALUD Y VENTA CARTERA

SALUD Y VENTA CARTERA


2. Uso de LidIA



linea directa

KPI’s Uso LiDiA Año 2024

2433	N.º Mensajes
314	N.º Usuarios activos
Cartera	Área más activa
8,83 sg	Tiempo Medio Respuesta

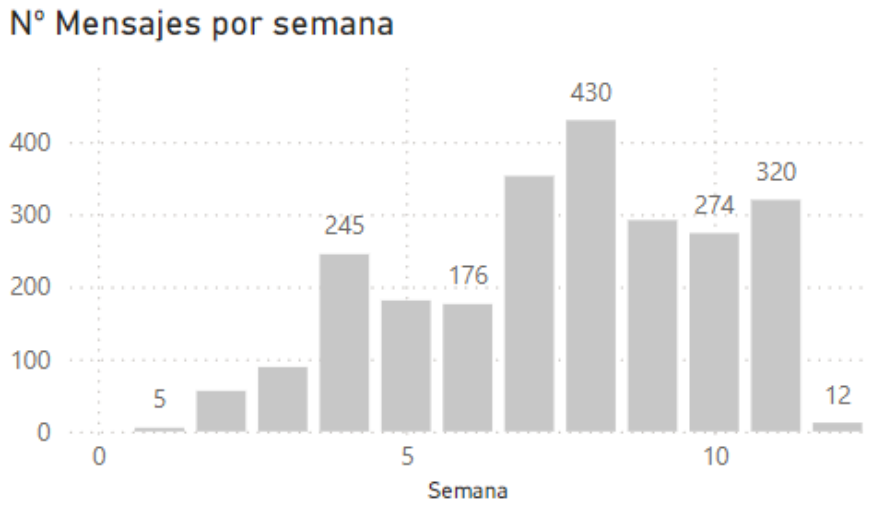

MAR 2025

Datos Generales del mes de Febrero 2025



linea directa

KPI’s Uso LiDiA Marzo 2025

XXX

N.º Mensajes
+ 118%

XXX


N.º Usuarios activos
+ 168%

Comercial

Área más activa

11 sg

Tiempo Medio Respuesta
+ 29%

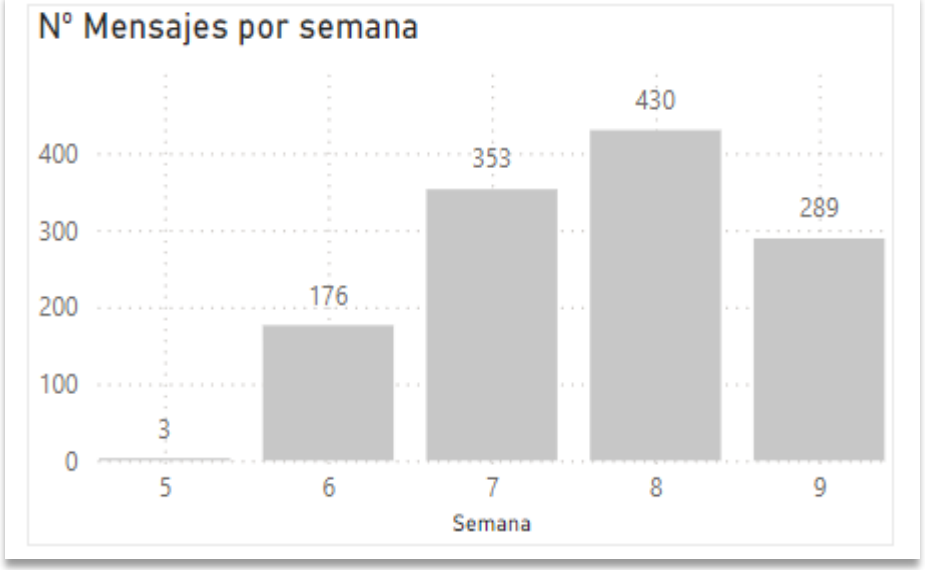

FEB 2025

Datos Generales del mes de Febrero 2025



KPI’s Uso LiDiA Marzo 2025

XXX

N.º Mensajes
+ 118%

XXX


N.º Usuarios activos
+ 168%

Comercial

Área más activa

11 sg

Tiempo Medio Respuesta
+ 29%

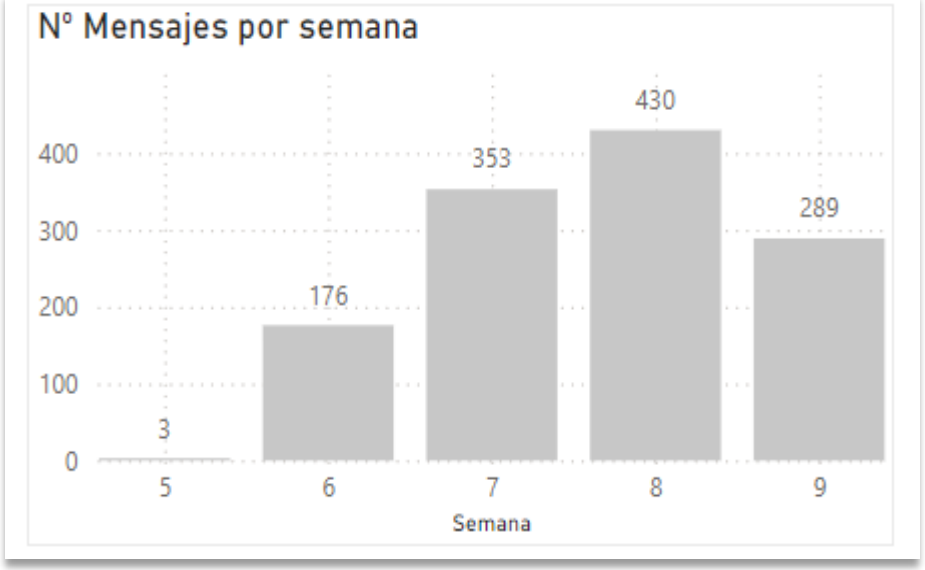

KPI’s Uso LidIA Feb 2025

756	N.º Conversaciones
214	N.º Usuarios
1251	N.º Mensajes
9,05 sg	Tiempo Medio Respuesta
Comercial	Área más activa
468 Conversaciones	Grupo mas activo **NN COMERCIAL**
LDAJMO 57 mensajes	Usuario más activo


Botón Ayuda


14,63%	Sí
8,15%	No
77,22%	No contesta


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos Generales del mes de Febrero 2025 (LDA)

Total Conversaciones	Total Mensajes	Tiempo medio de respuesta
756	1251	9,05
Total Usuarios Distintos	**Personas con Acceso**	**% Distintos / con Acceso**
214	710	30 %

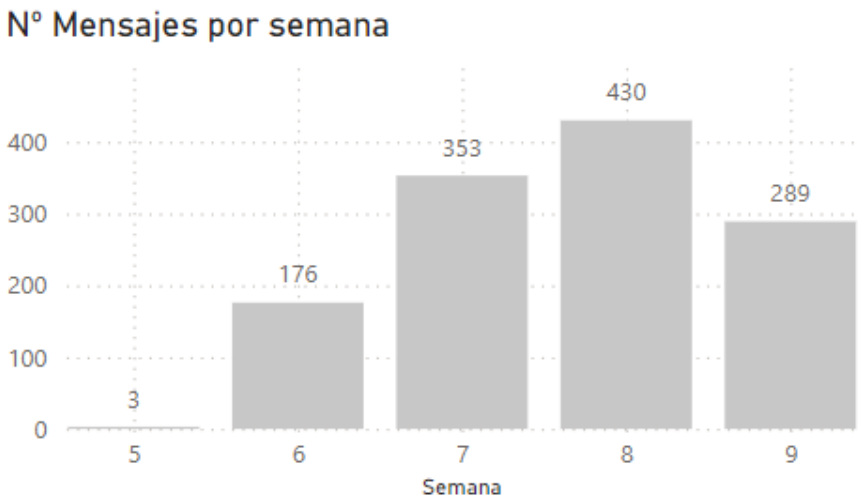

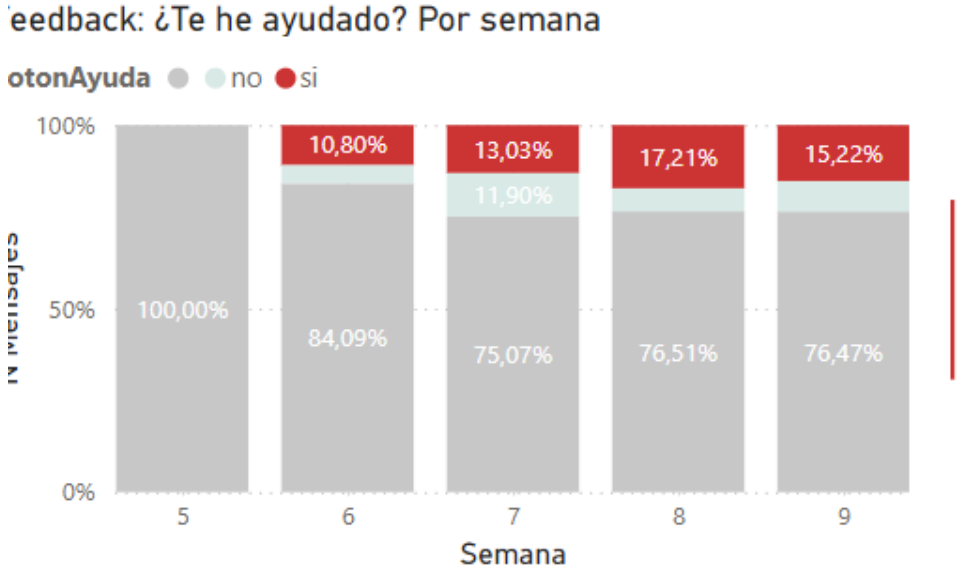


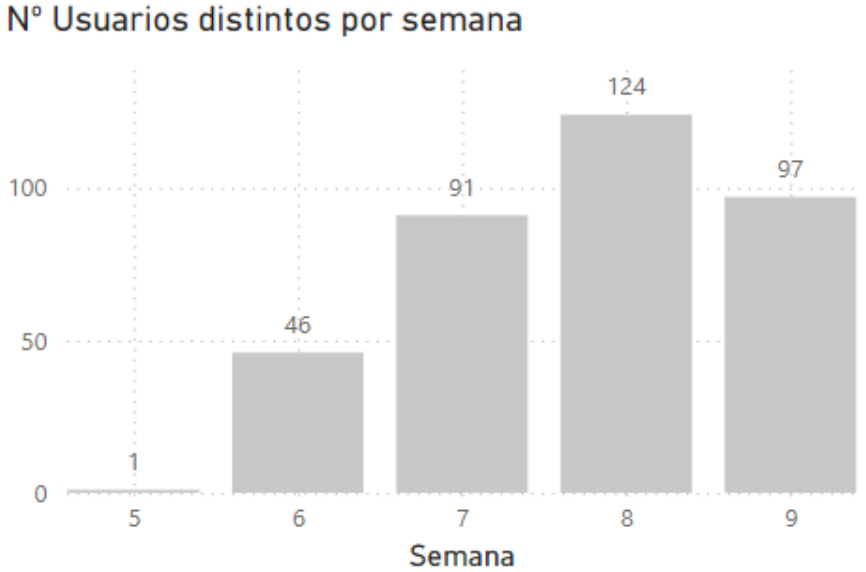



LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos por Departamento del mes de Febrero 2025 (LDA)

Total Conversaciones	Total Usuarios Distintos
756	214
Usuarios con Acceso	% Distintos / con Acceso
710	30 %

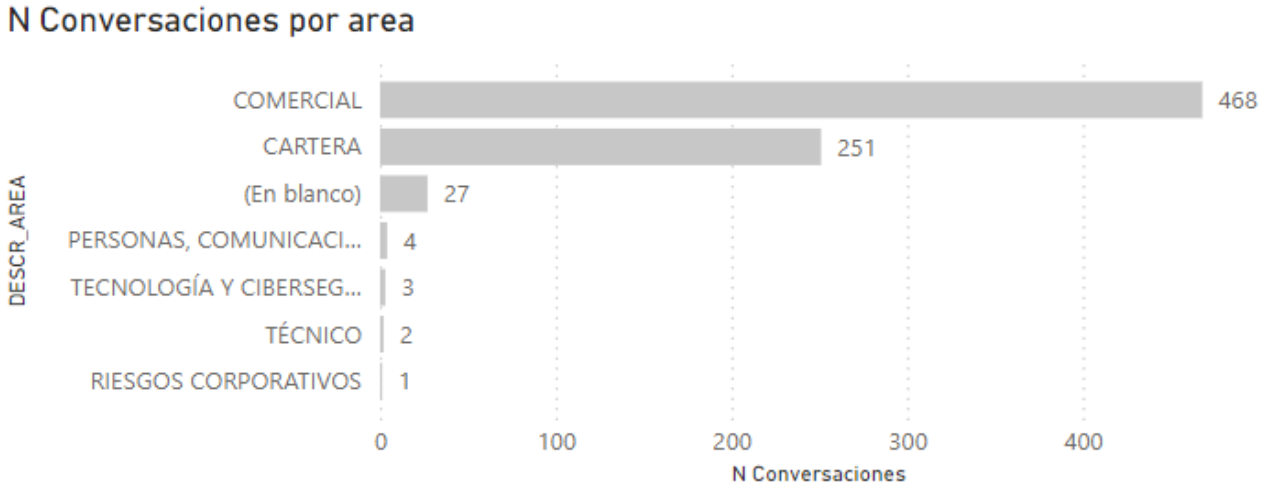


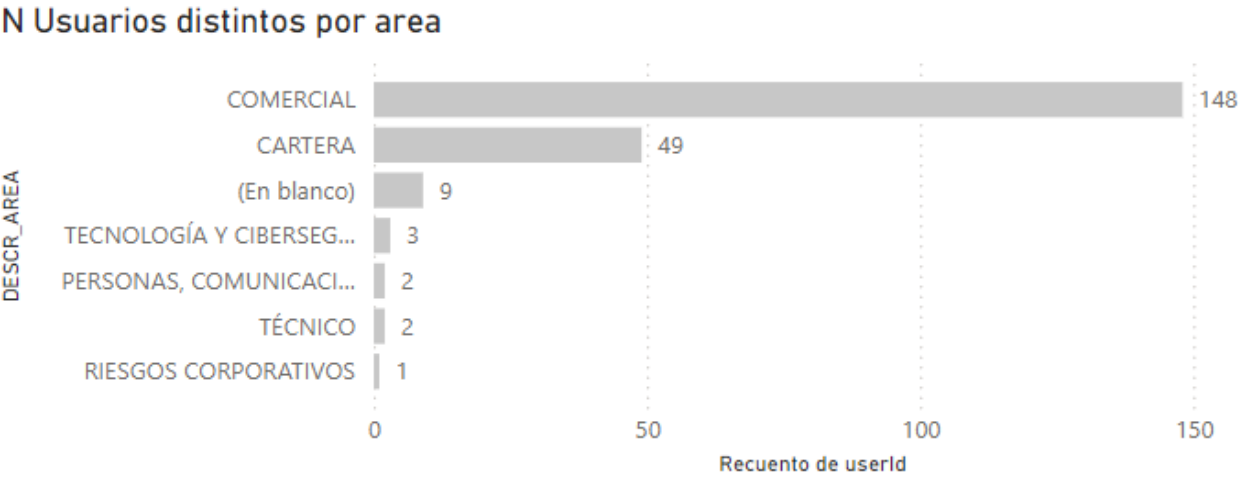


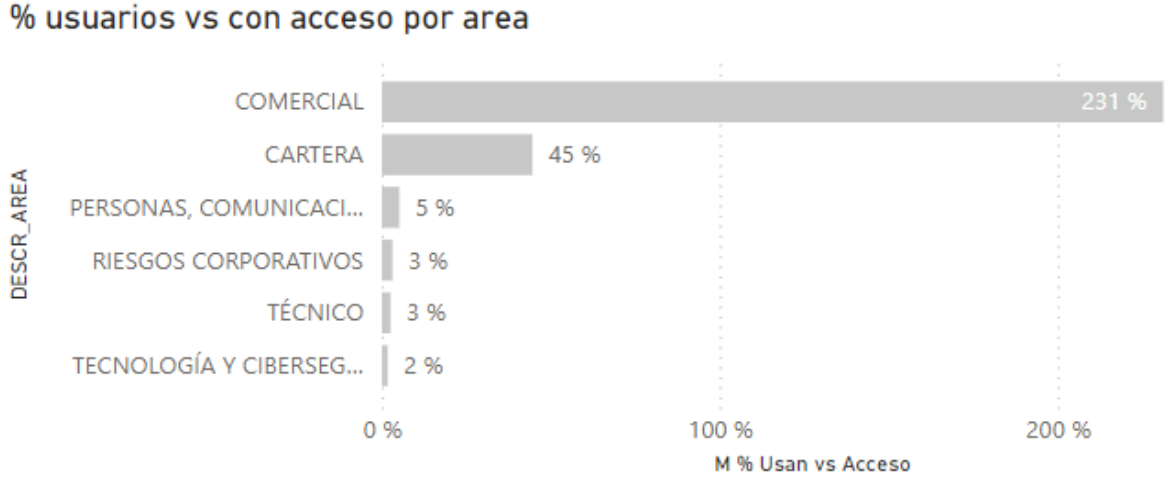


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Precisión de Lidia del mes de Febrero 2025 (LDA)

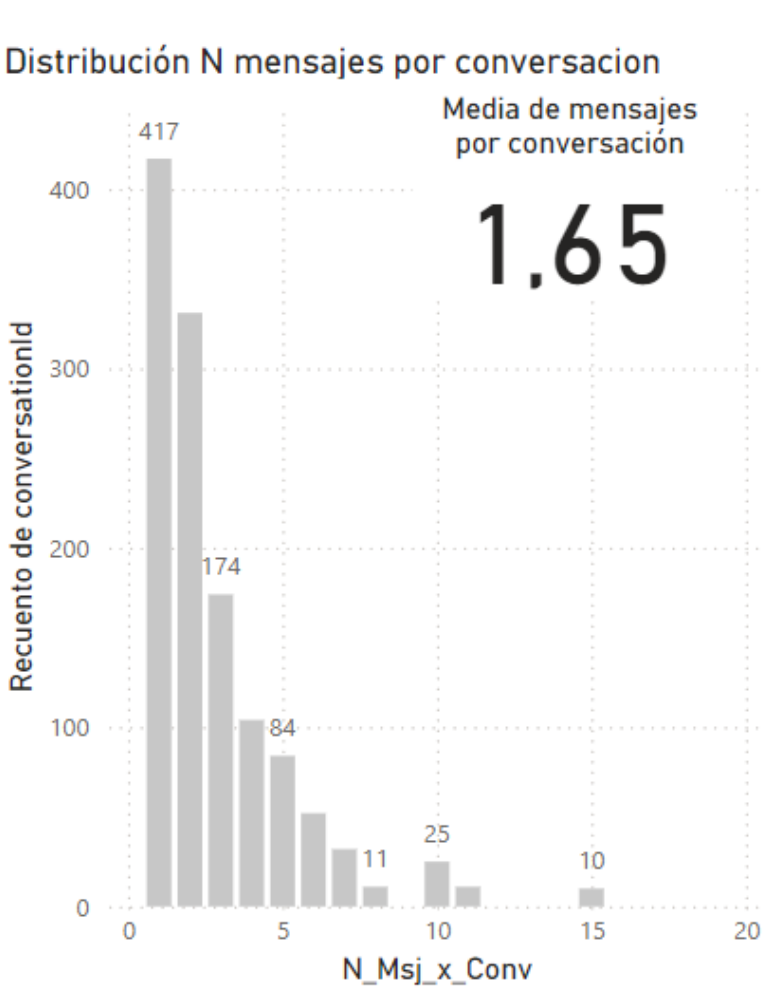

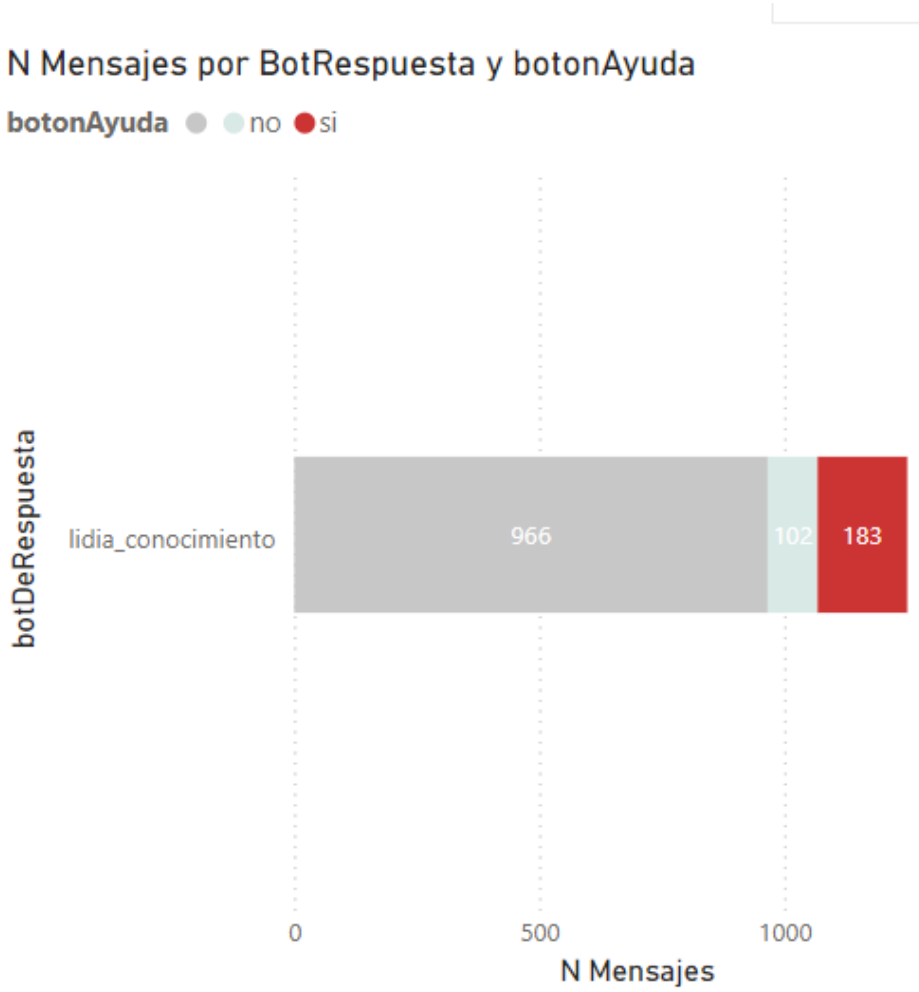

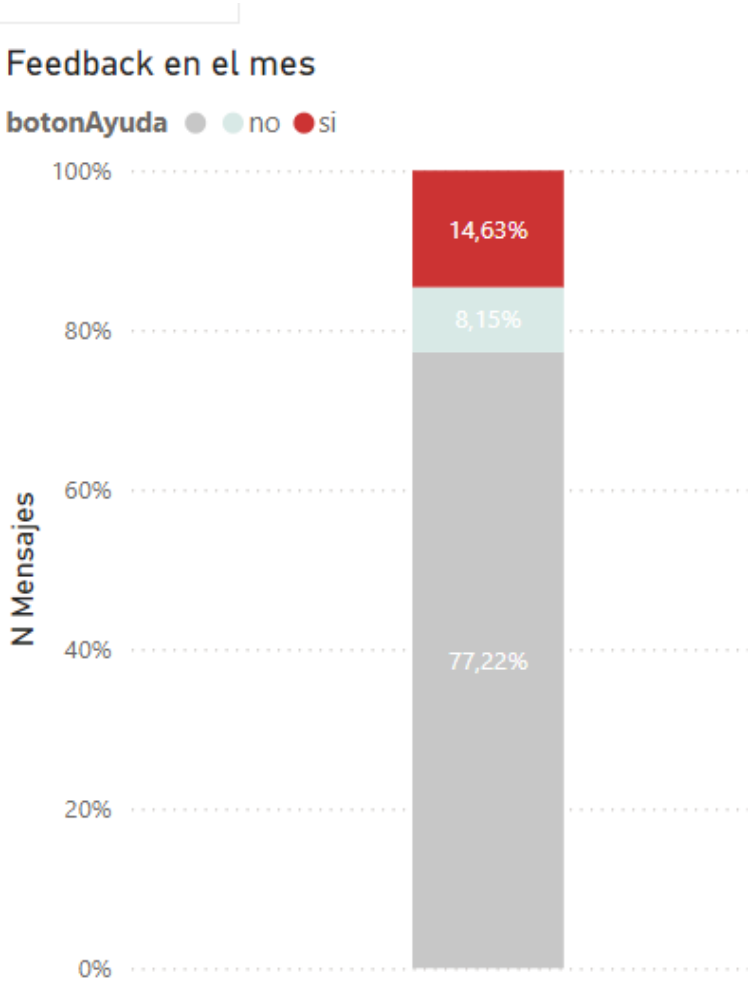


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Eficiencia de Lidia del mes de Febrero 2025 (LDA)

SEGUIMIENTO ESPECIAL

Haciendo seguimiento especial al tiempo de respuesta del Bot por tipo de conocimiento.

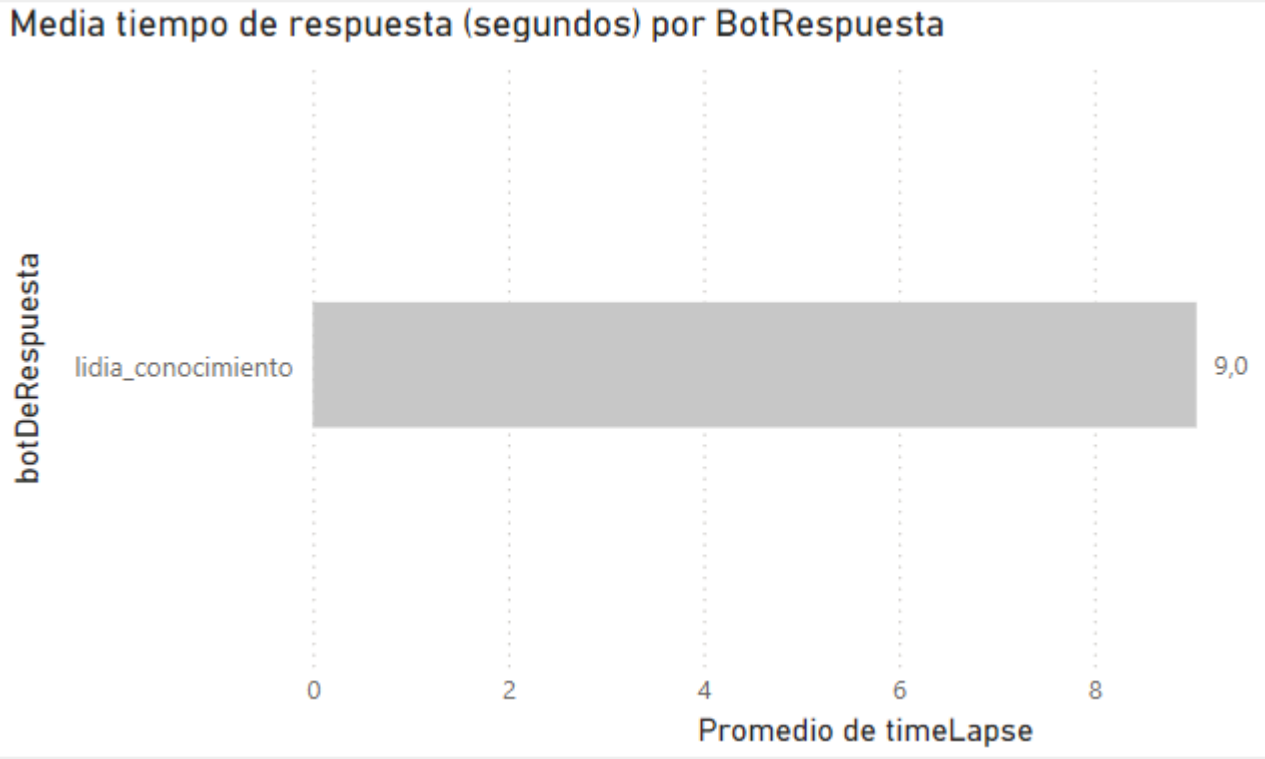

ENE 2025


Datos Generales del mes de Enero 2025



linea directa

KPI’s Uso LiDiA Enero 2025

573	N.º Mensajes + 174%
80	N.º Usuarios activos + 82%
Cartera	Área más activa
7 sg	Tiempo Medio Respuesta - 62%

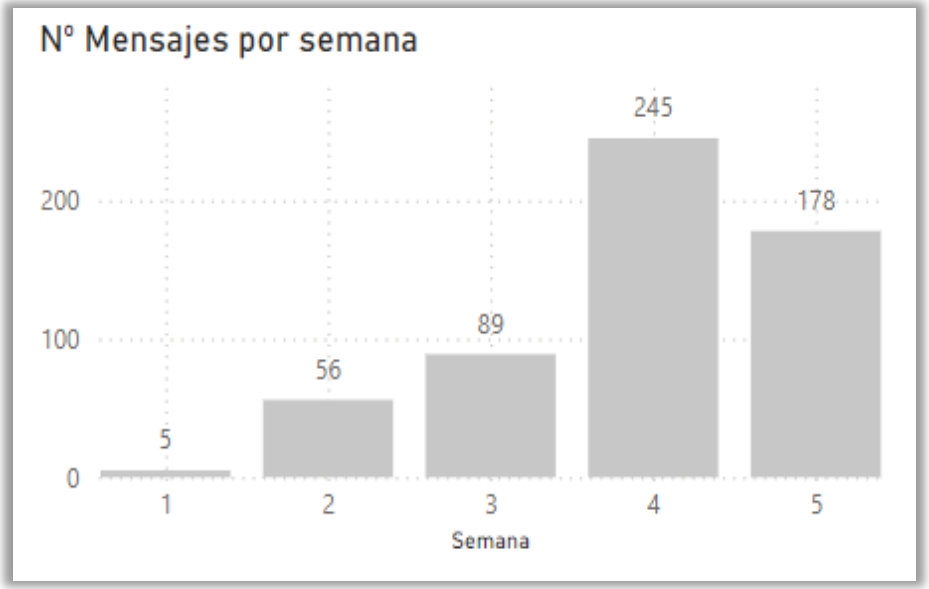

KPI’s Uso LidIA Enero 2025

286 N.º Conversaciones

80 N.º Usuarios

573 N.º Mensajes

7 sg Tiempo Medio Respuesta

Cartera Área más activa

Botón Ayuda

X,XX% Sí

X,XX% No

X,XX% No contesta

143 Conversaciones

Grupo mas activo


CHAT CARTERA


LDAGGB 55 mensajes Usuario más activo


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos Generales del mes de Enero 2025 (LDA)

Total Conversaciones	Total Mensajes	Tiempo medio de respuesta
82	178	6,62
Total Usuarios Distintos	Personas con Acceso	% Distintos / con Acceso
31	710	4 %

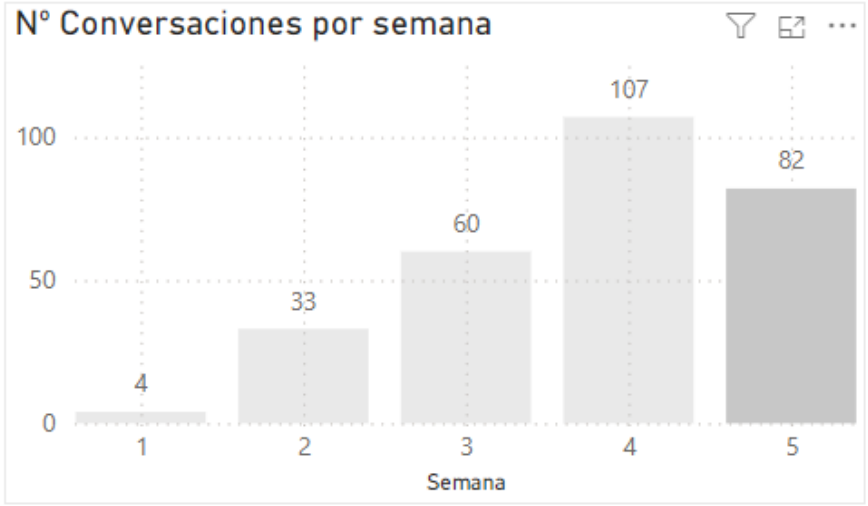

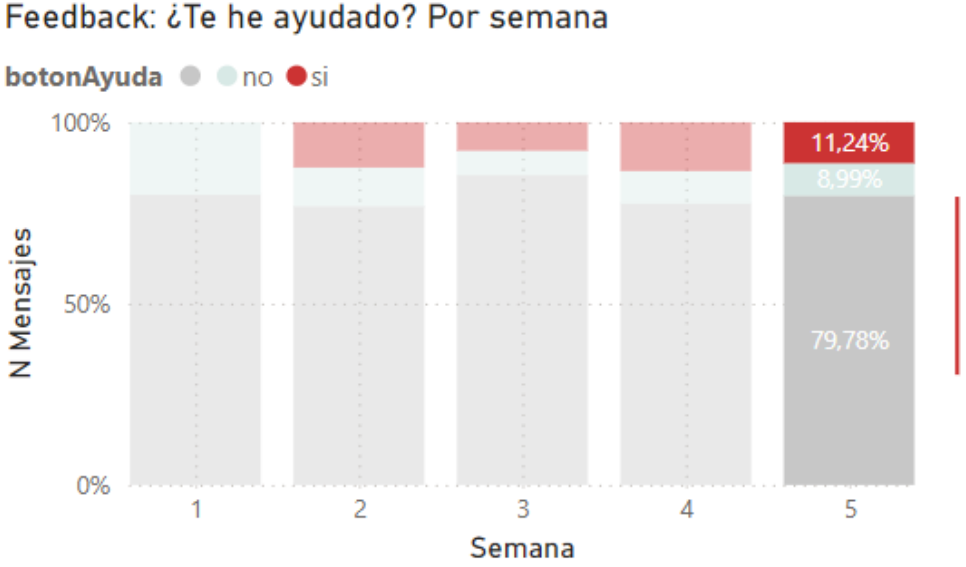


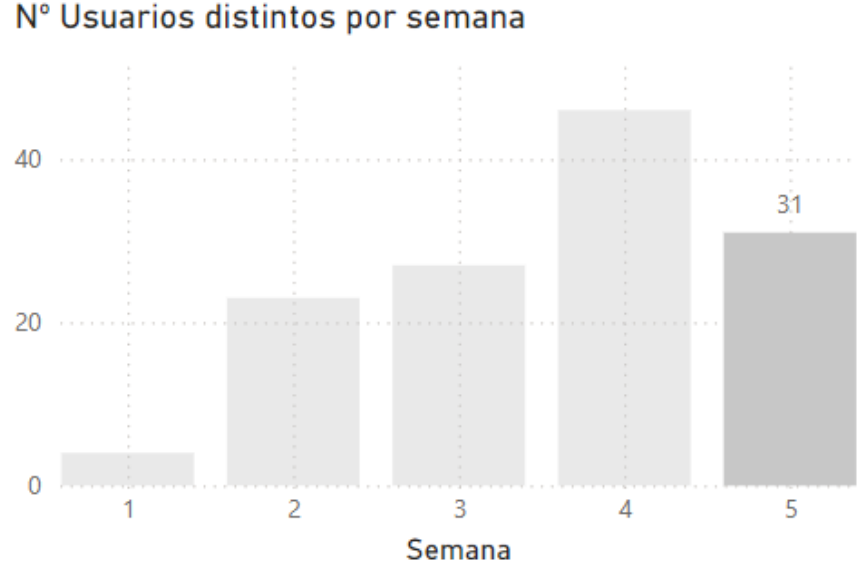



LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos por Departamento del mes de Enero 2025 (LDA)

Total Conversaciones	Total Usuarios Distintos
286	80
Usuarios con Acceso	% Distintos / con Acceso
710	11 %

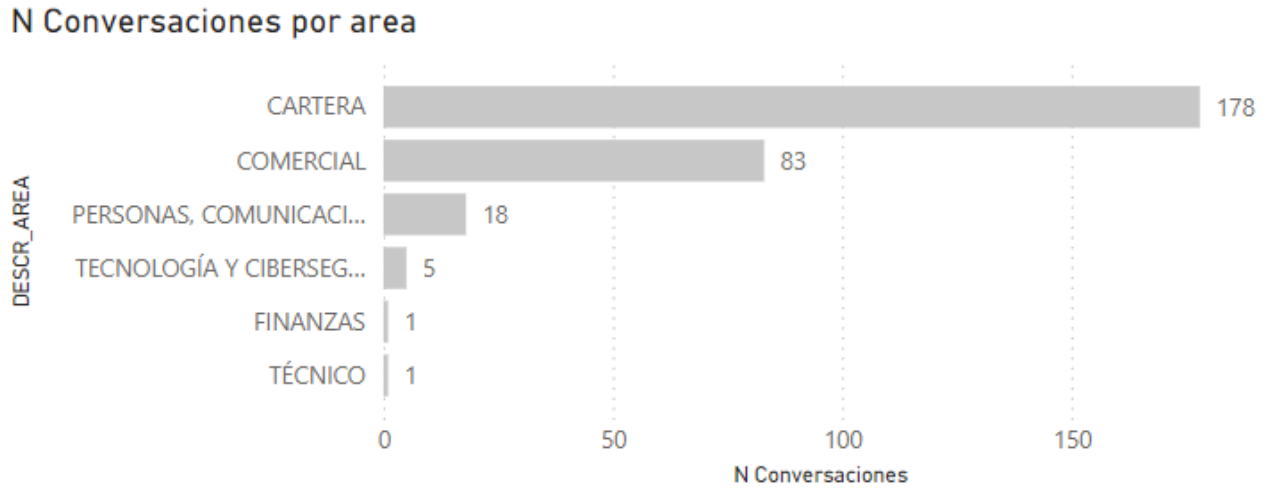


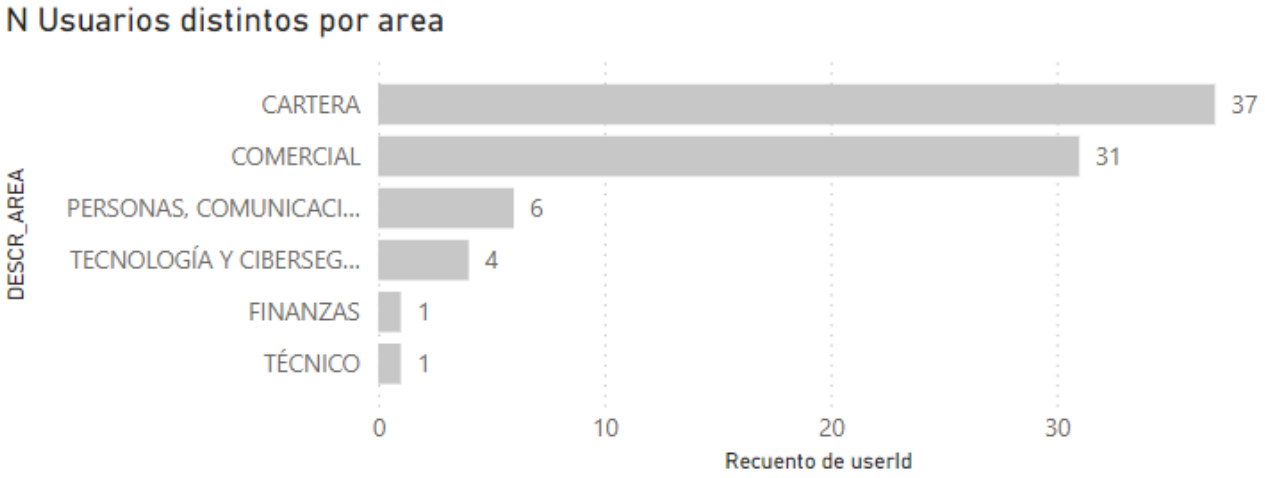


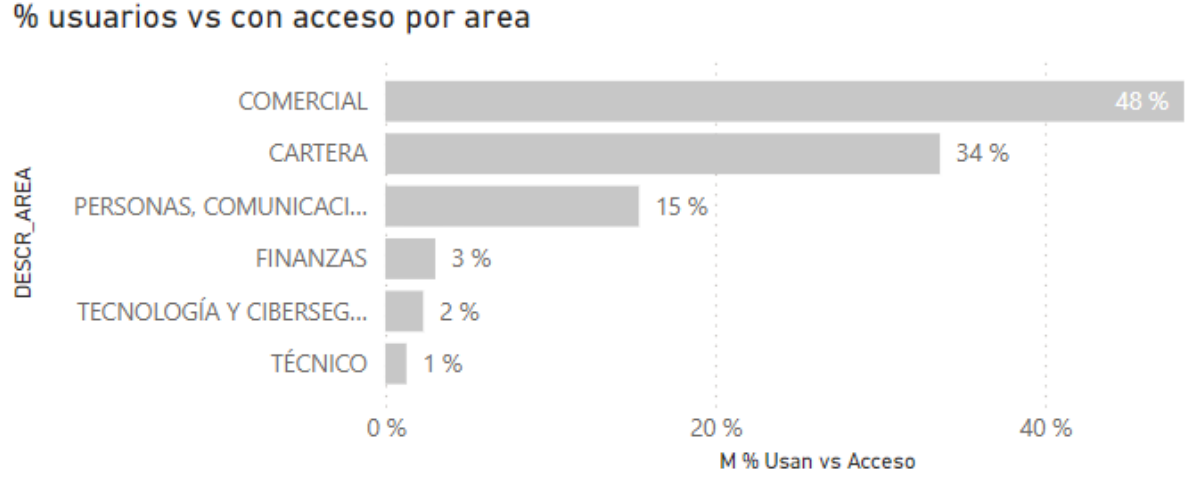


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Precisión de Lidia del mes de Enero 2025 (LDA)

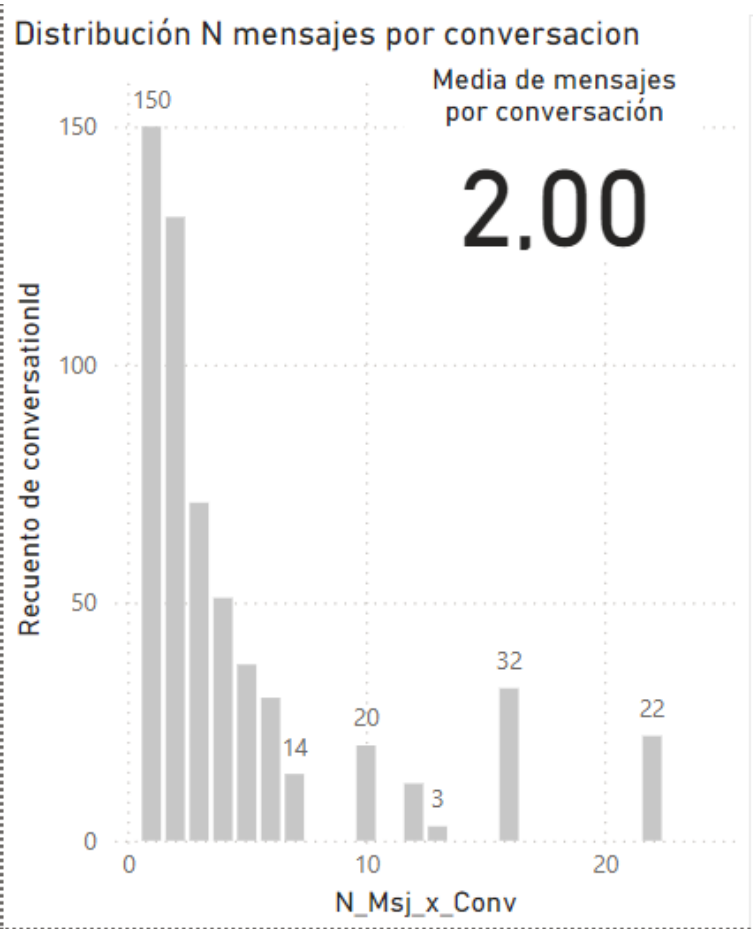

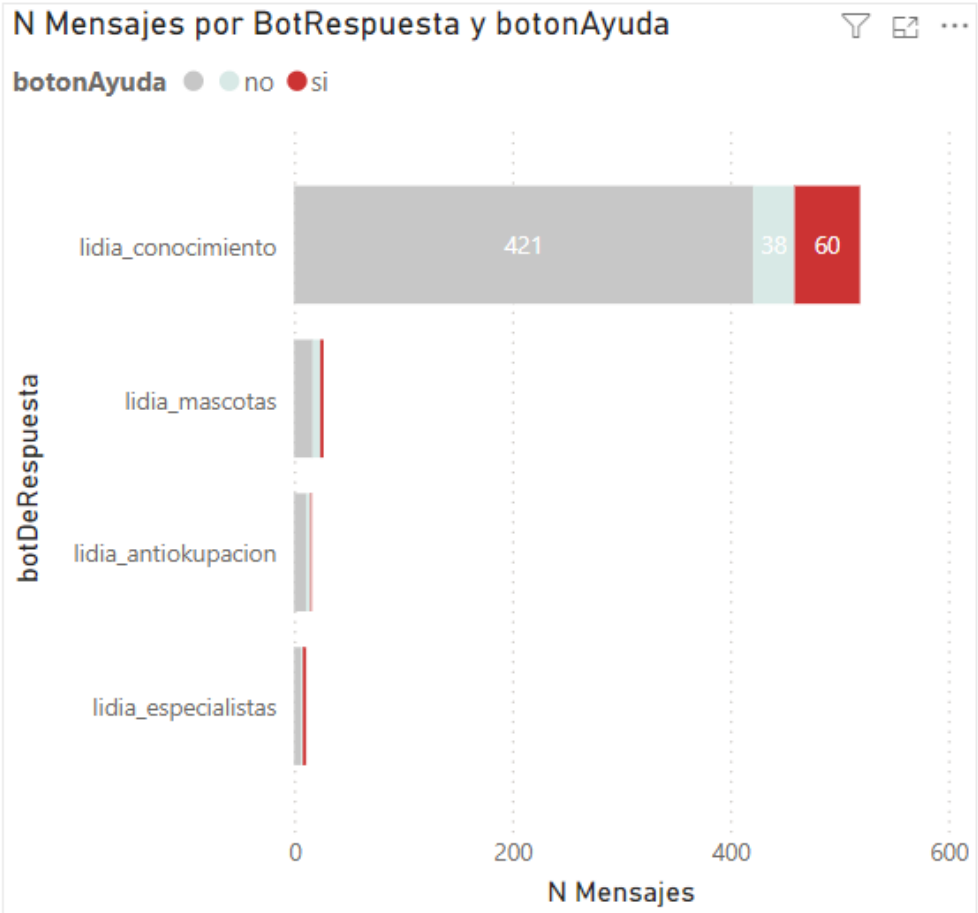

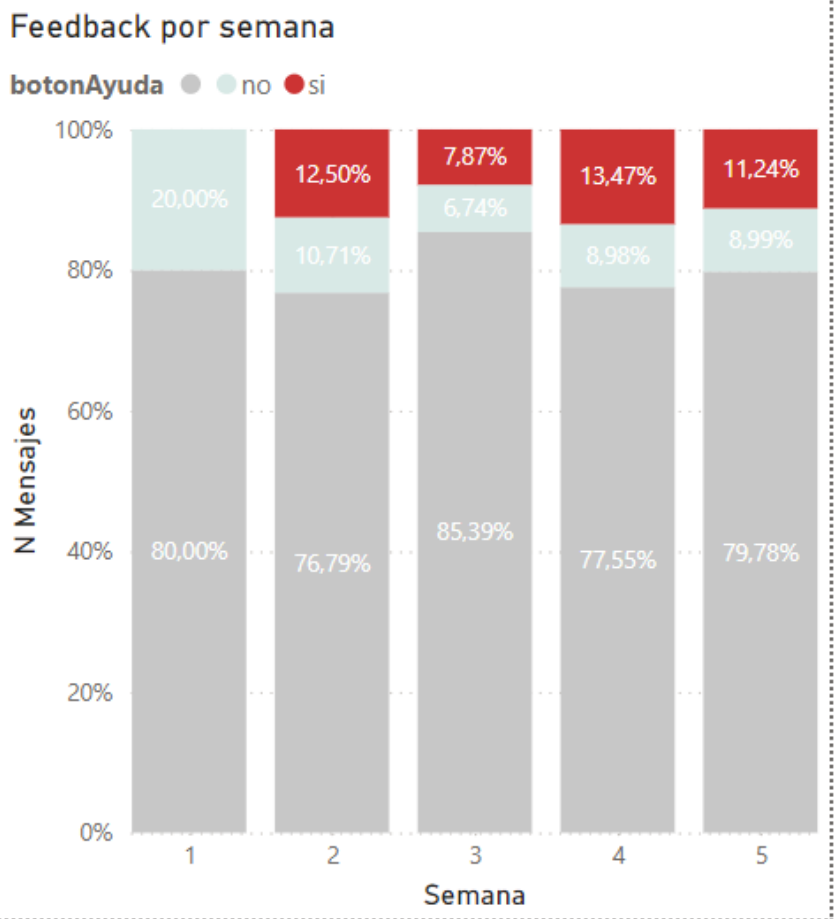


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Eficiencia de Lidia del mes de Enero 2025 (LDA)

SEGUIMIENTO ESPECIAL

Haciendo seguimiento especial al tiempo de respuesta del Bot por tipo de conocimiento.

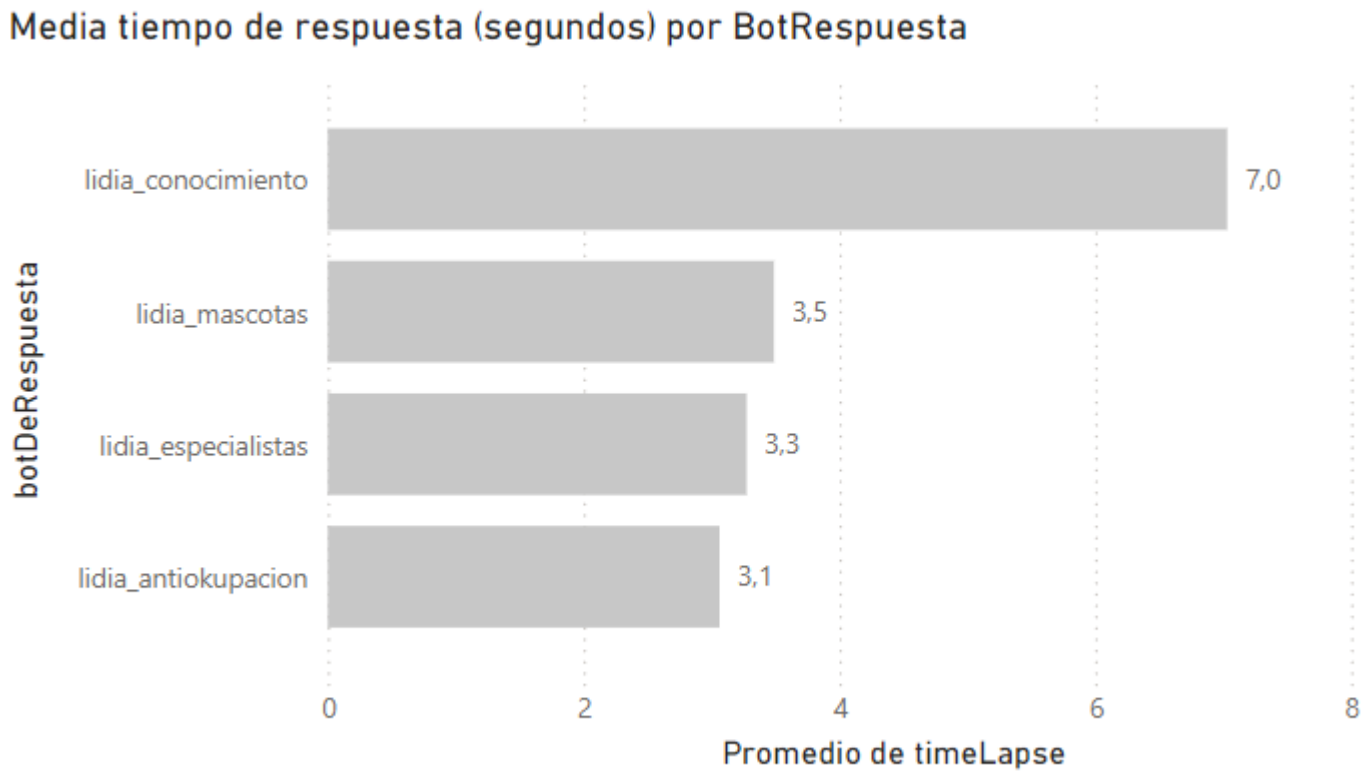


DIC 2024

Datos Generales del mes de Diciembre 2024

linea directa

KPI’s Uso LiDiA Diciembre 2024

209	N.º Mensajes
44	N.º Usuarios activos
Cartera	Área más activa
18,3 sg	Tiempo Medio Respuesta

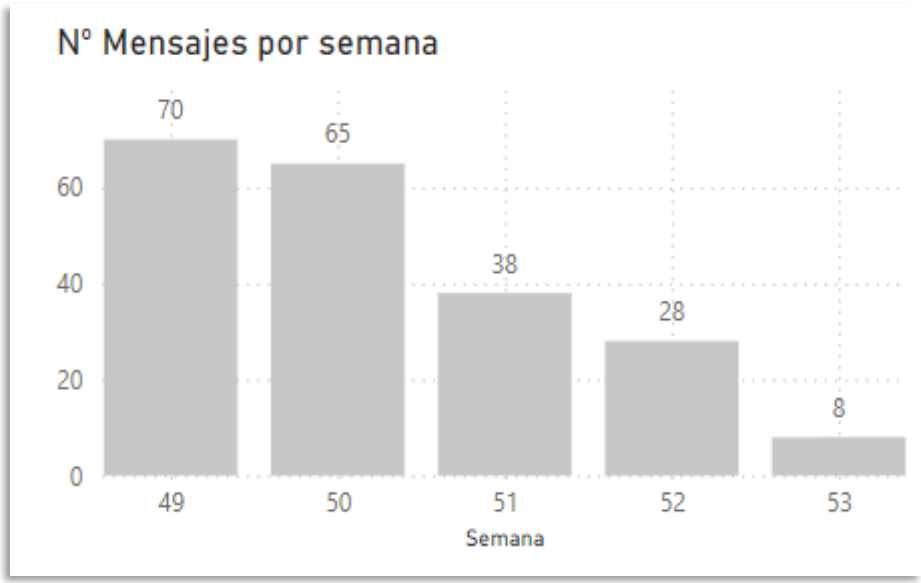

KPI’s Uso LidIA Diciembre 2024

131 N.º Conversaciones

80 N.º Usuarios

209 N.º Mensajes

18,3sg Tiempo Medio Respuesta

Cartera Área más activa

Botón Ayuda

X,XX% Sí

X,XX% No

X,XX% No contesta

88 Conversaciones Grupo mas activo


CHAT CARTERA


LDAACR2 29 mensajes Usuario más activo


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos Generales del mes de Diciembre 2024 (LDA)

Total Conversaciones	Total Mensajes	Tiempo medio de respuesta
131	209	16,82
Total Usuarios Distintos	Personas con Acceso	% Distintos / con Acceso
44	710	6 %

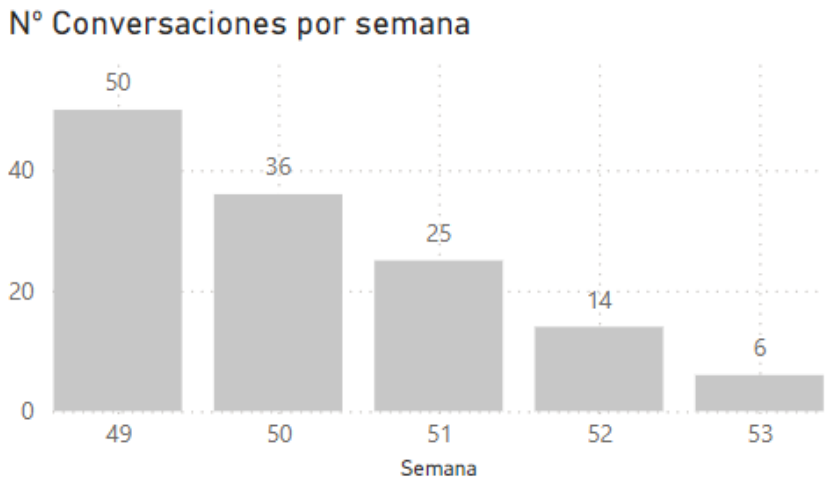

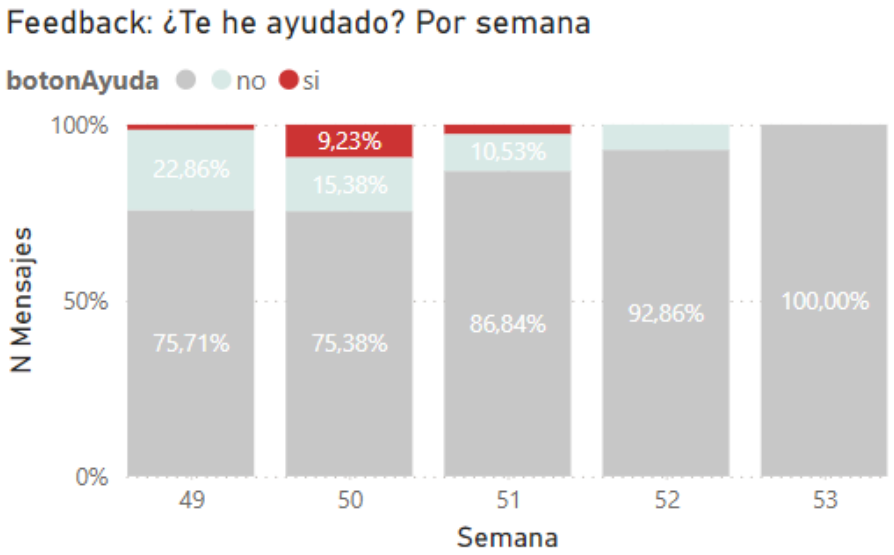


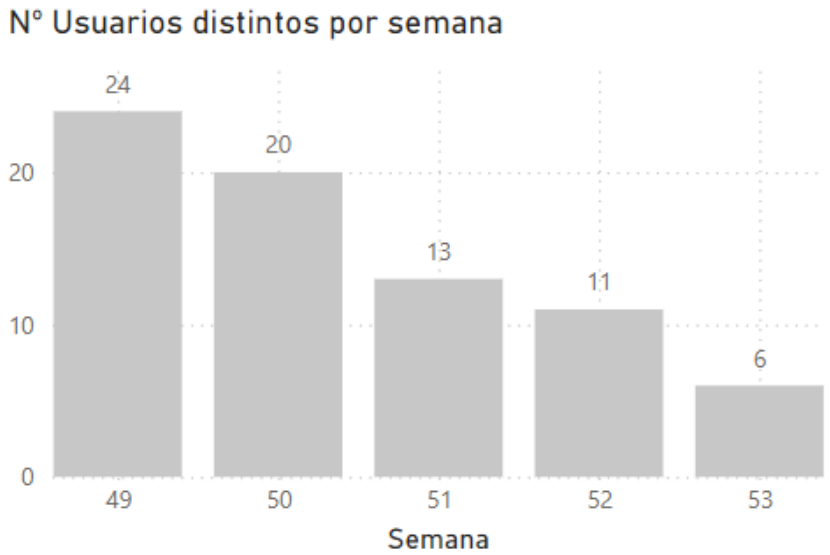



LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos por Departamento del mes de Diciembre 2024 (LDA)

Total Conversaciones	Total Usuarios Distintos
286	80
Usuarios con Acceso	% Distintos / con Acceso
710	11 %

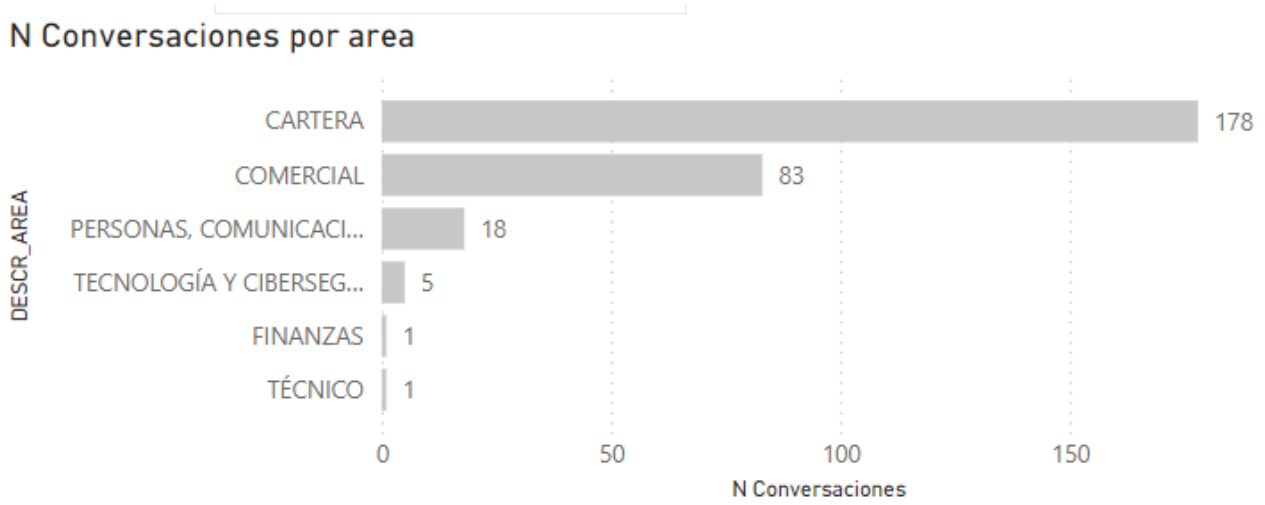


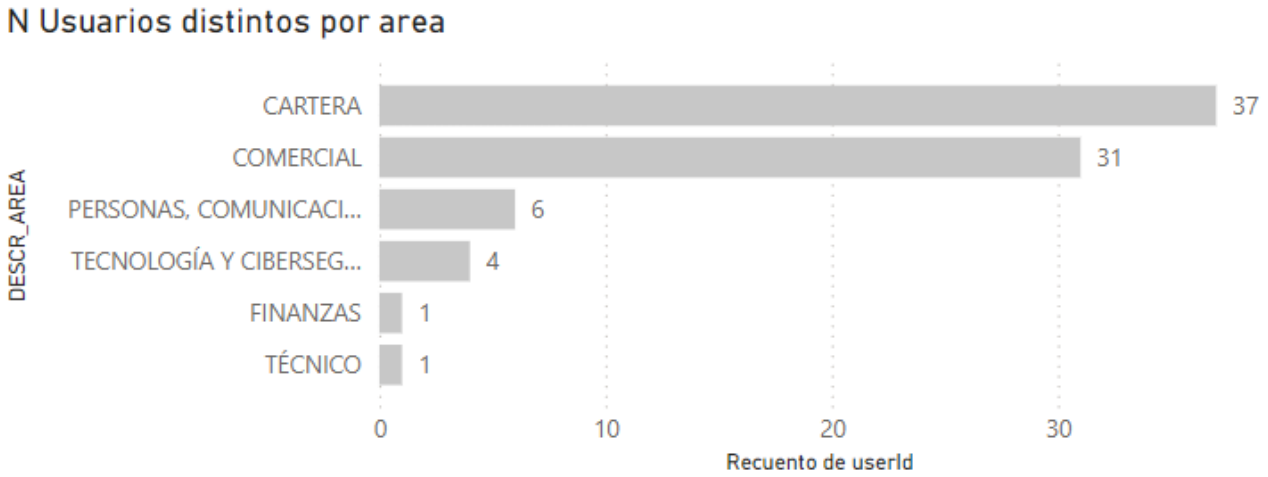


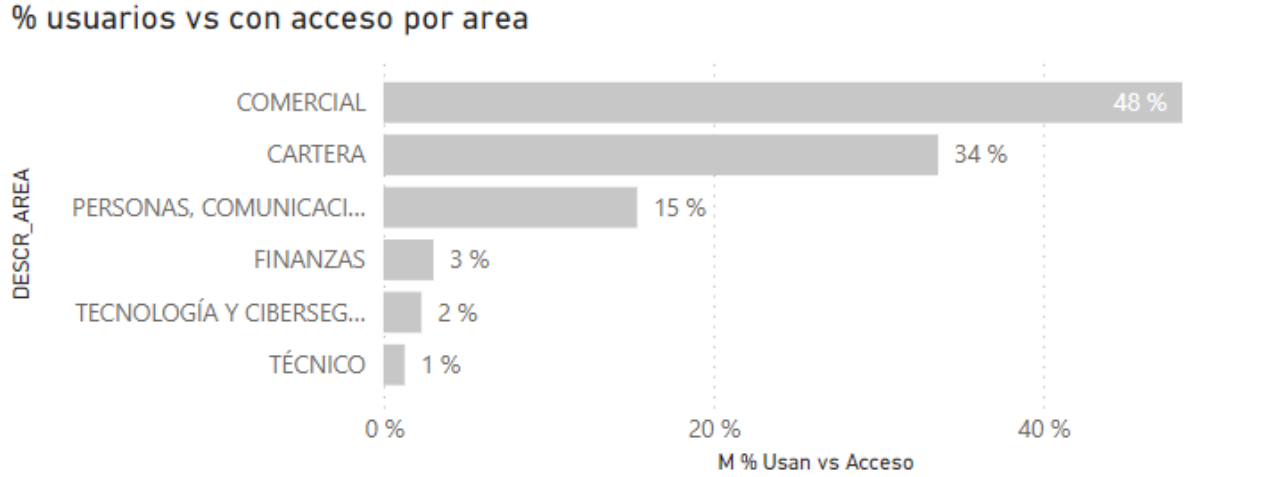


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Precisión de Lidia del mes de Diciembre 2024 (LDA)

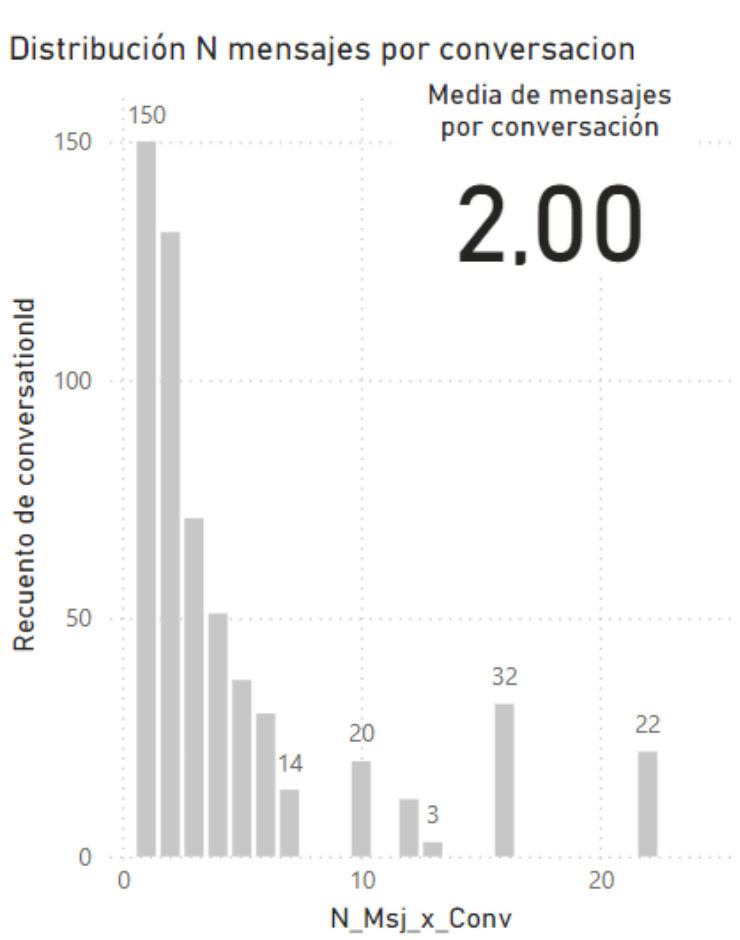

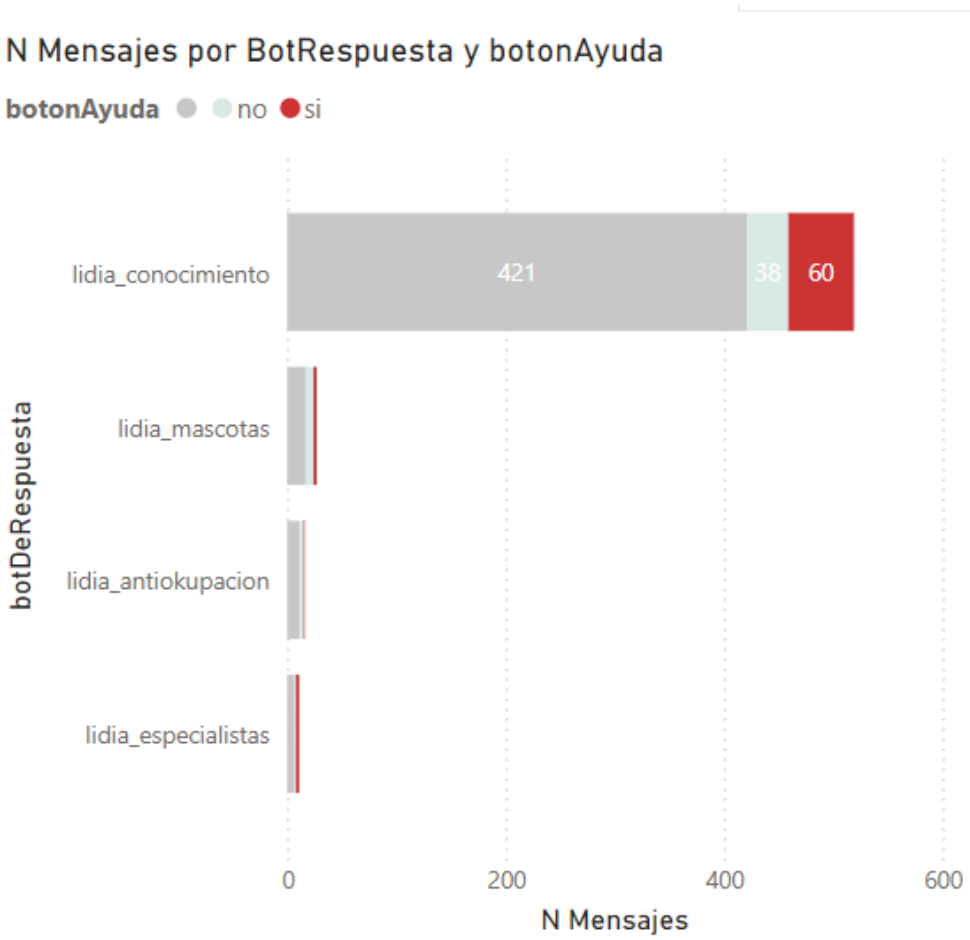

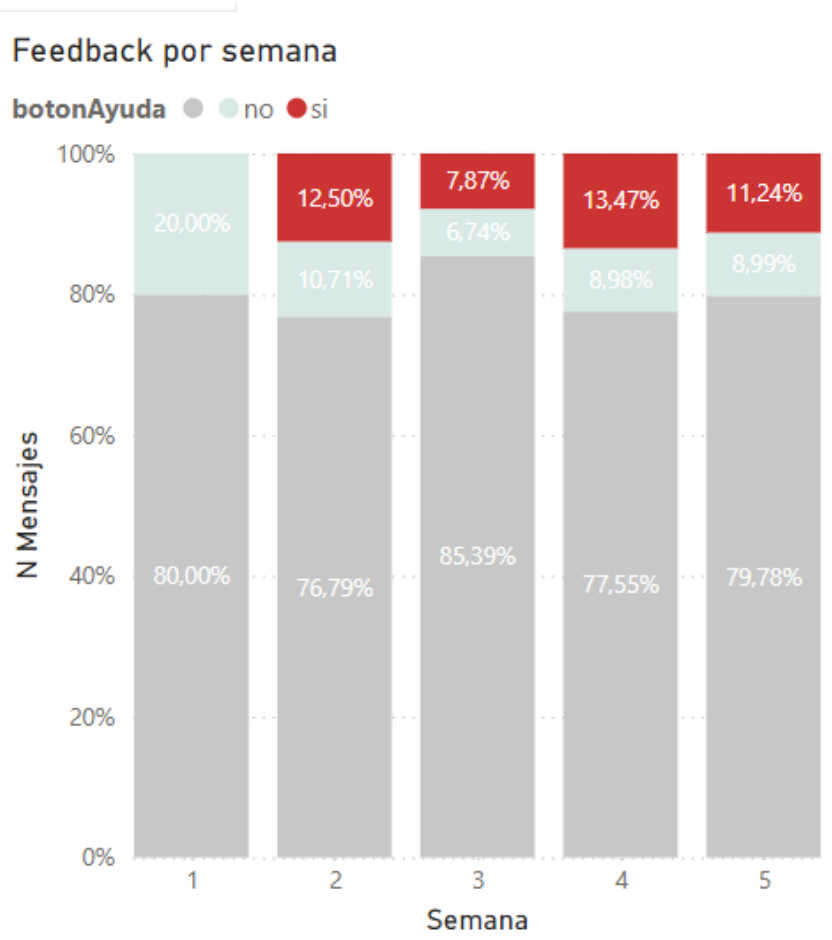


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Eficiencia de Lidia del mes de Diciembre 2024 (LDA)

SEGUIMIENTO ESPECIAL

Haciendo seguimiento especial al tiempo de respuesta del Bot por tipo de conocimiento.

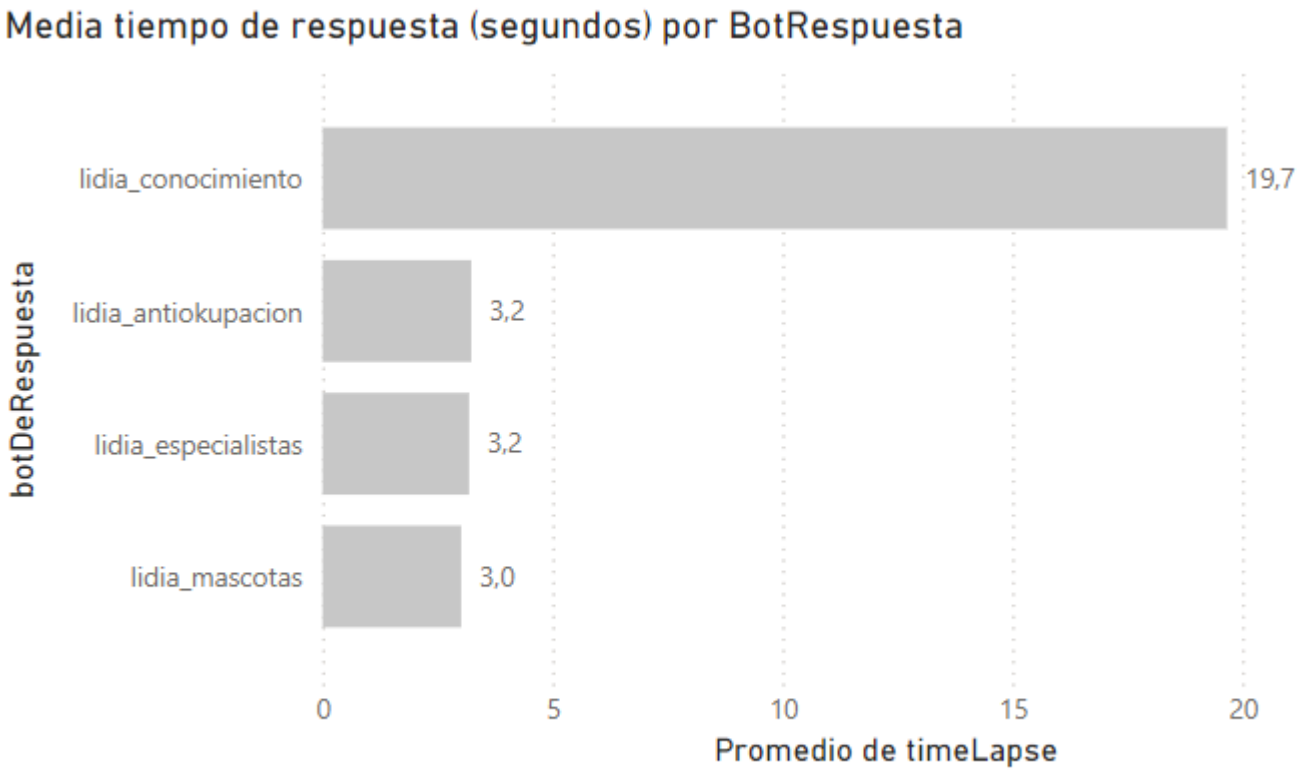

NOV 2024

Datos Generales del mes de Noviembre 2024





linea directa


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos Generales del mes de Noviembre 2024 (LDA)

Total Conversaciones	Total Mens	Tiempo medio de respuesta
624	1063	13,89
Total Usuarios Distintos	Personas con Acceso	% Distintos / con Acceso
104	710	15 %

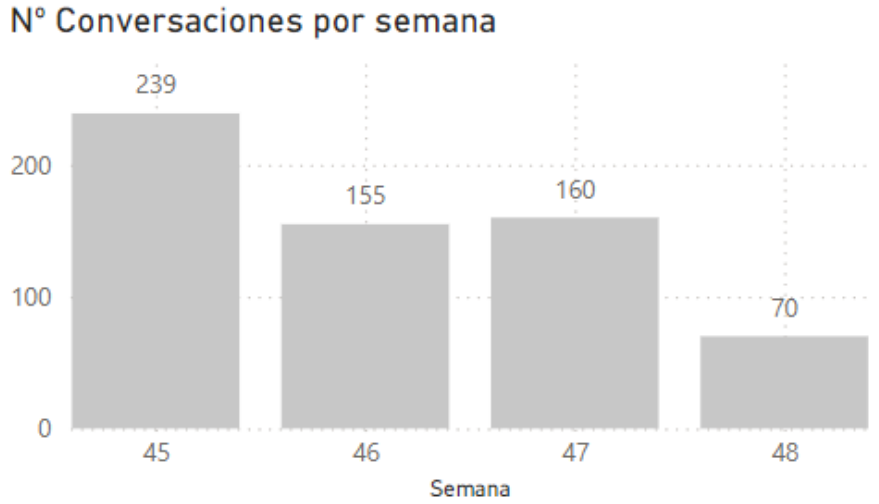

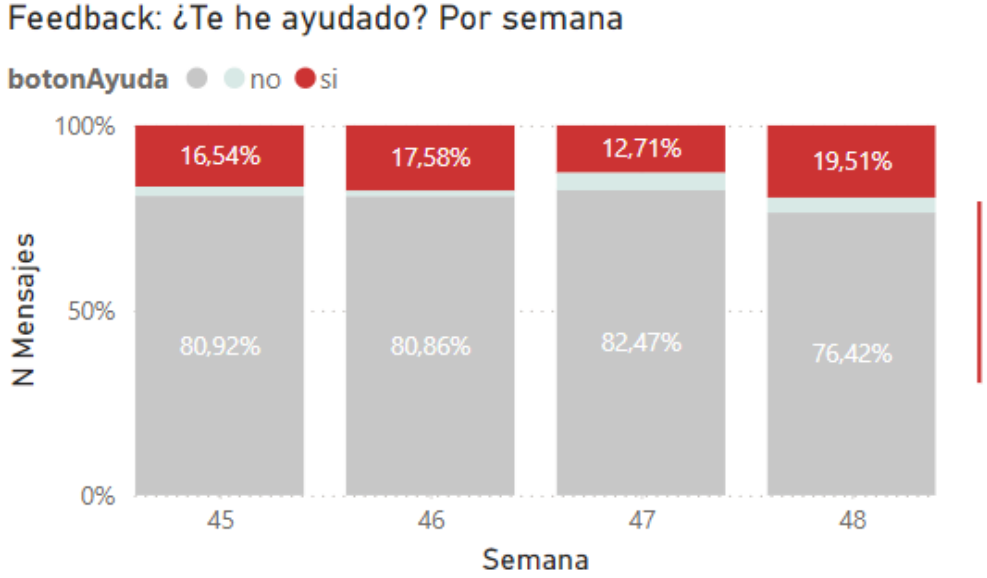


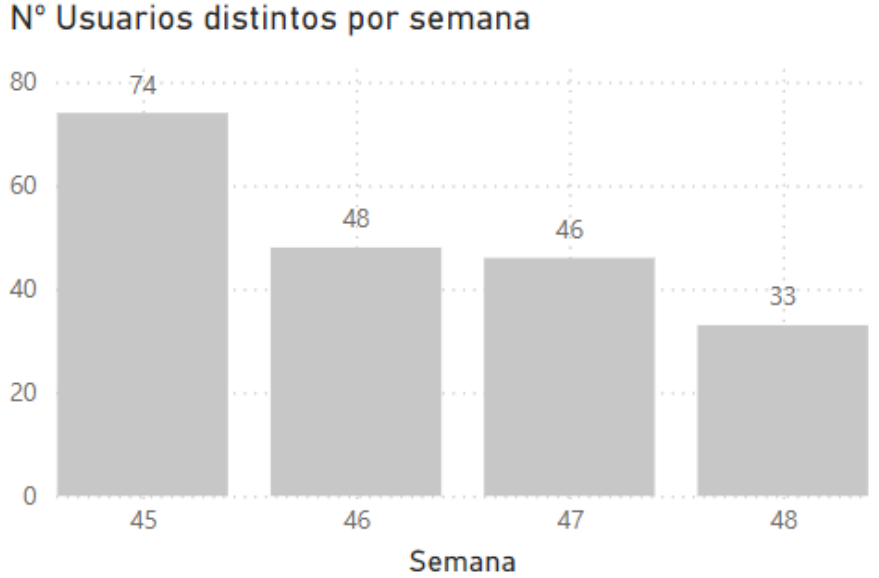



LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos por Departamento del mes de Noviembre 2024 (LDA)

Total Conversaciones	Total Usuarios Distintos
624	104
Usuarios con Acceso	% Distintos / con Acceso
710	15 %

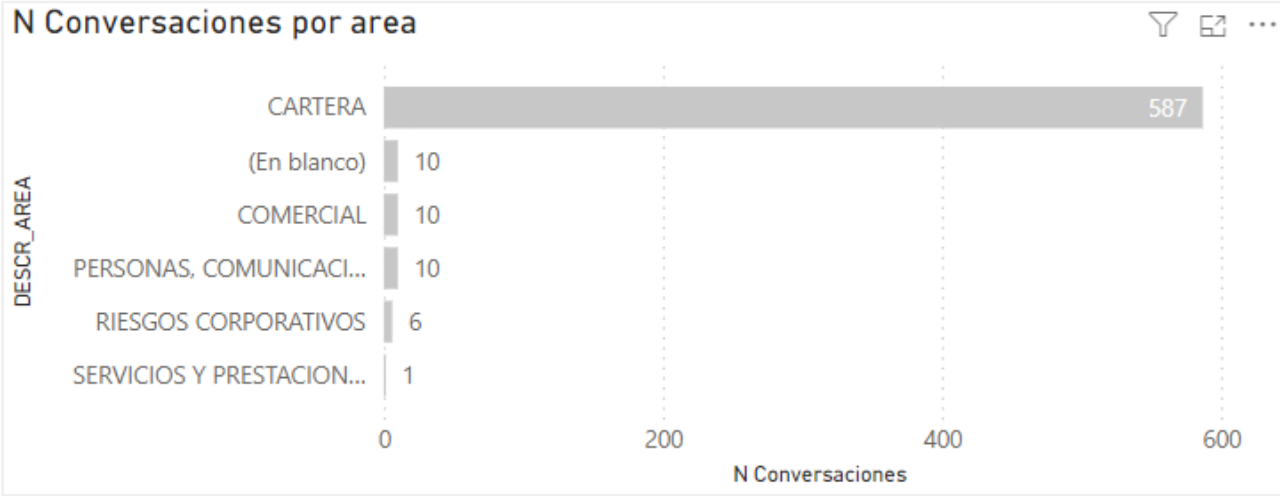


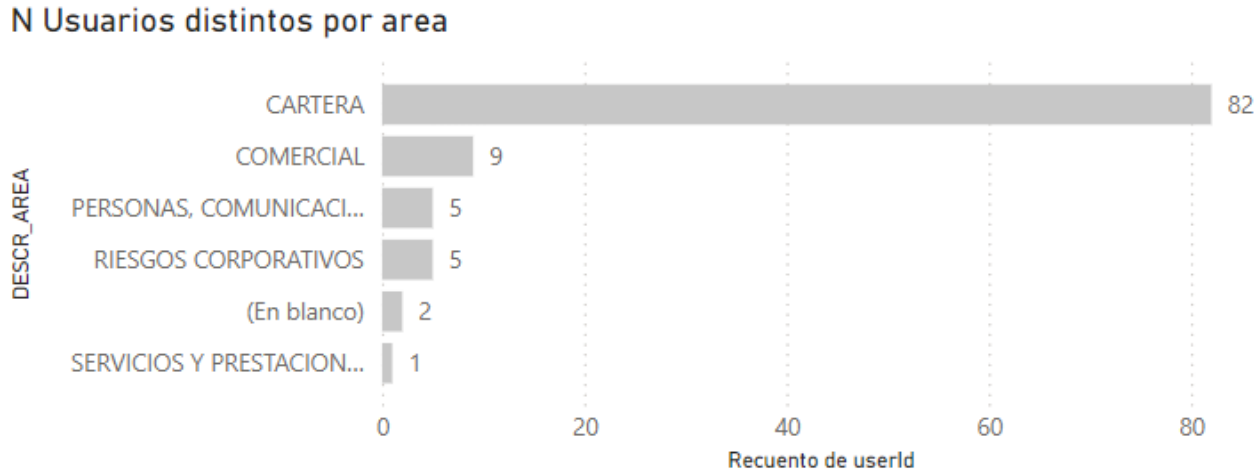


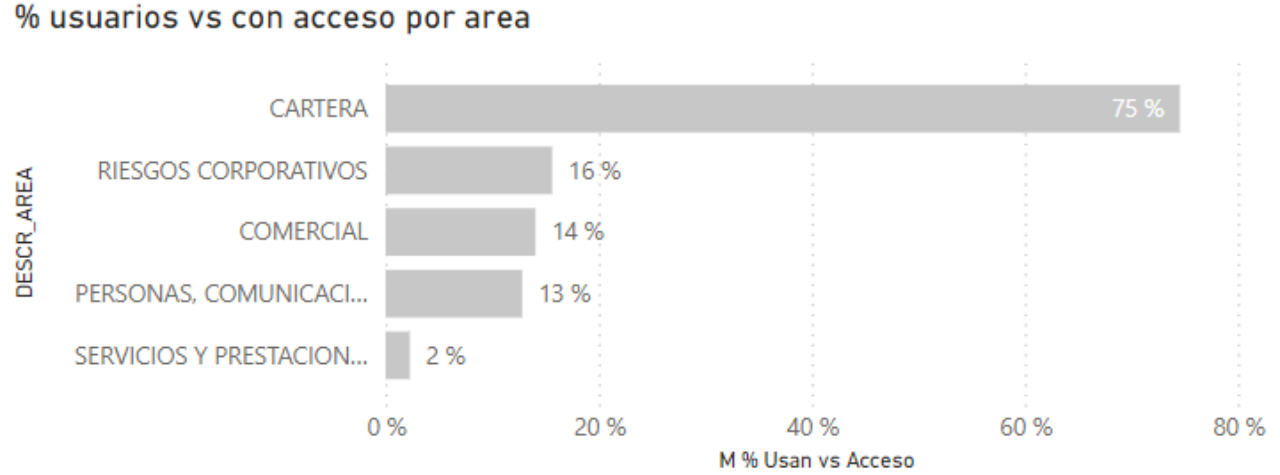


LiDiA – Uso de Lidia Conocimiento

Datos de Precisión de Lidia del mes de Noviembre 2024 (LDA)

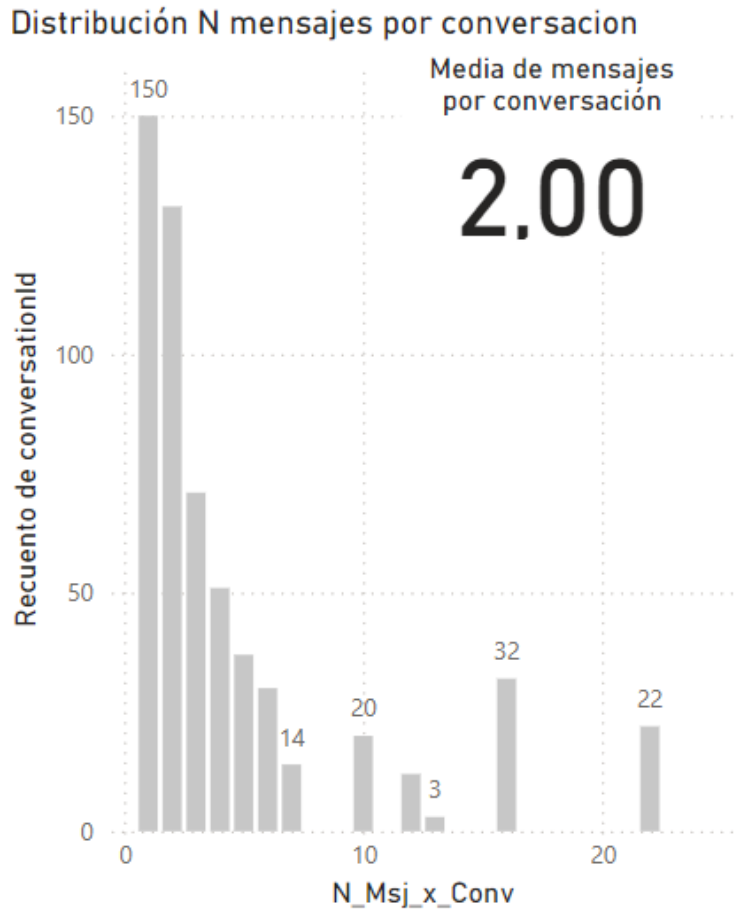

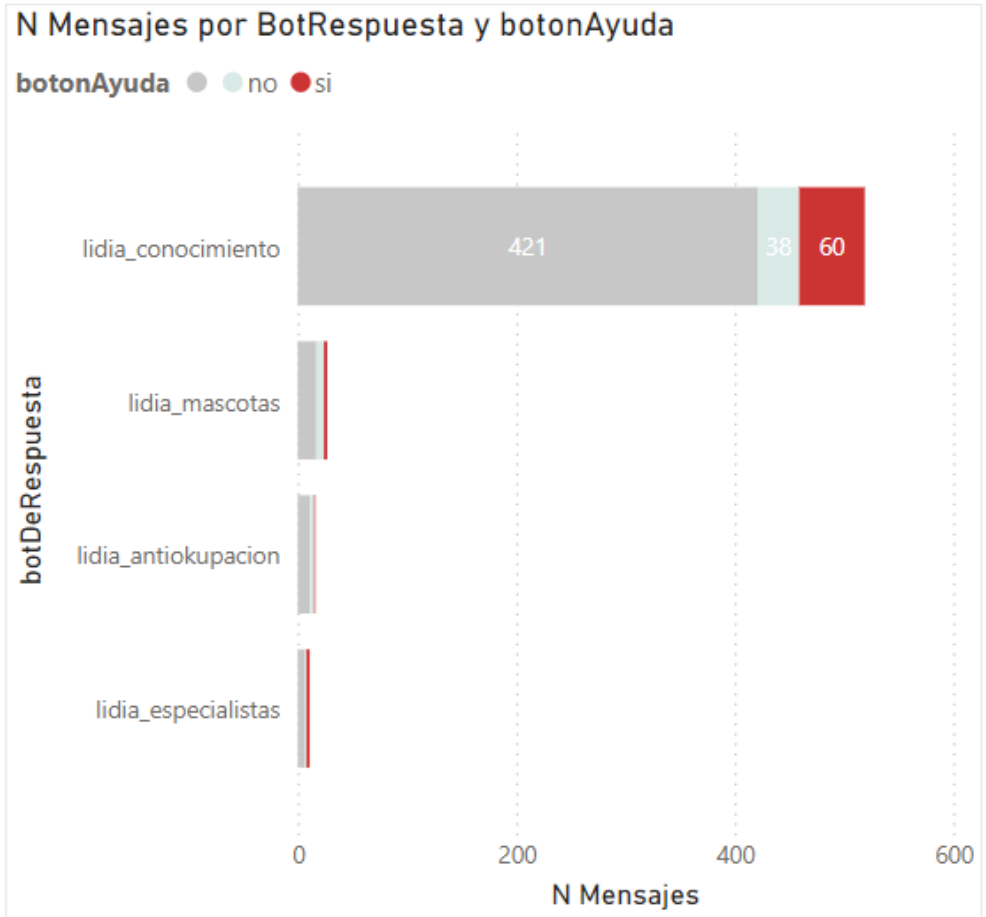

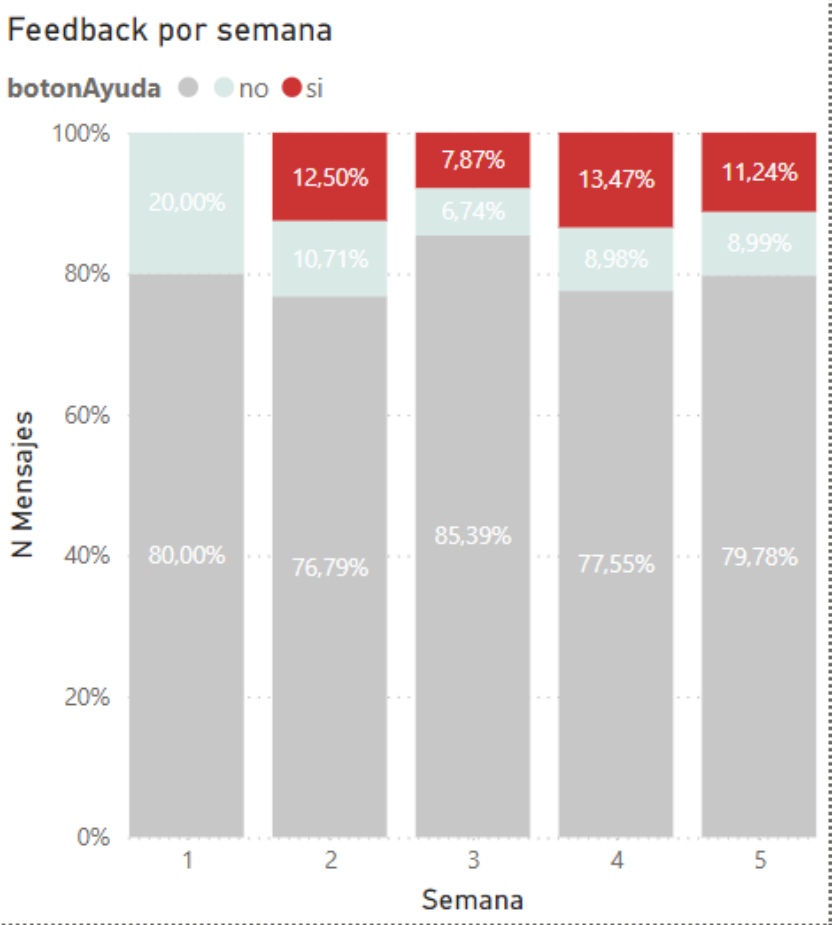

3. Hitos Carga contenidos



linea directa

Hitos carga de contenidos

Proyecto LidIA

10/07

26/09

ACTUALIZACIÓN

Póliza Antiokupación

Información del producto de Antiokupación.

10/07

26/09

ACTUALIZACIÓN

Póliza Mascotas

Información del producto de Mascotas.

10/07

26/09

ACTUALIZACIÓN

Póliza Salud Especialistas

Información del producto de Salud Especialistas.

05/11

Indemnizaciones y Asistencia por la DANA y Catástrofes Naturales

Información de DANA.

21/11

Devolución Condicionada y Prima no consumida

Información específica para Grupo Chat Cartera

21/11

Siniestros Motor y Hogar

Información específica para Grupo Chat Cartera

Hitos carga de contenidos

Proyecto LidIA

21/11

Asistencia en Viaje

Información específica para Grupo Chat Cartera

27/11

Condicionados

Información de todos los productos marca de Linea Directa

18/12

Póliza Salud Completo

Información de documentos base

18/12

Póliza Salud Dental

Información de documentos Base

18/12

Póliza Hogar

Información de detalle de cobertura

18/12

Documentos priorizados de Cartera

Información específica priorizada por cartera

Hitos carga de contenidos

CONTENIDO CARGADO PARA OBJETIVO Q4

Conocimiento General que se cargara del área de Cartera

18/12

Operativas Priorizadas Cuaderno Cartera Bloque 1

Información de Cancelaciones y devoluciones, medidas extracontrato, Aspectos comerciales y consentimiento

18/12

Operativas Priorizadas Cuaderno Cartera Bloque 2

Información de Retención y Negociación, Protección de datos y temas legales

18/12

Operativas Priorizadas Cuaderno Cartera Bloque 3

Por Ser, Recobro, Consultas a otros departamentos, información extensiones, tpv, pólizas ingles vs español

Conocimiento General que se cargara del área de Comercial

18/12

Operativas Manual Comercial

Información de Cancelaciones y devoluciones, medidas extracontrato, Aspectos comerciales y consentimiento

18/12

Operativas Manual Comercial Salud

.

Hitos carga de contenidos

CONTENIDO DE PRUEBAS Y RESULTADO FINAL

Documentos de pruebas realizadas con los equipos de Calidad Cartera y Calidad comercial

ÁREA	INICIO PRUEBAS	DOCUMENTOS DADOS DE ALTA PARA PRUEBAS	DOCUMENTOS QUE SE DECIDEN COMO CRÍTICOS PARA EL ARRANQUE CALL CENTER
Comercial	25/11/2024	434	110
Cartera	28/11/2024	92	48

Conocimiento facilitado por las areas no completos, **falta de información**.

La información **no representa procesos completos** de negocio, solo parte de un proceso.

Información redundada en diferentes documentos.

*La **elevada carga de contenidos** con estas características empeora el rendimiento y la precisión de la respuesta de la IA.*

Corregida esta situación en los documentos y cargados los documentos mas críticos y bien redactadas para Negocio

4. Estado Objetivos



linea directa

Objetivos 1Q - 2024

Proyecto LidIA

Objetivo 31/03

- Lanzado Kick off a la organización
- RUS de infraestructura del Proyecto a 31/03.
- Definido el primer caso de uso.

LidIA Personas
23-339634 - 24-361937

27/02 – Kick Off

06/03 – RUS Fase 1 enviado a IT

26/03 – ACA Fase 1 aceptado

15/03 – RUS Fase 2 enviado a IT

LidIA Conocimiento
23-339604

27/02 – Kick Off

11/03 – Definidos primeros casos uso –Antiokupacion y Especialistas

18/03 – Estandarización de información Especialistas

26/03 - Estandarización de información Antiokupacion

Fase 1 Contenido Intranet carga manual

Fase 2 Contenido Intranet carga automática

linea directa

Objetivos 2Q - 2024

Proyecto LidIA

Objetivo 30/06

Ok PaP:

- Ok PaP petición 23-339634-LIDIA IA - Bloque 1 Fase 1 - IA en LiDiA contenido RRHH
- Ok PaP petición 24-361937-LIDIA IA - Bloque 1 Fase 2 - IA en LiDiA contenido RRHH (*requisitos sin identificación y kpi´s*).
- Ok PaP petición contenidos Nuevos productos : contenidos Antiokupación + Especialistas

LidIA Personas
23-339634 - 24-361937

17/04 – ACA Fase 2 aceptado

20/05 – Inicio Pruebas Training

25/06 – OK Pruebas Seguridad y Secretaria General

→ **Estado de Actual Pruebas**

ESTADO DEFECTOS		
Finalizados	En desarrollo	Evolutivos
67	0	8

LidIA Conocimiento
23-339604

24/04 - Aceptación RUS Áreas Afectadas – Carga contenidos nuevos Negocios

13/05 - Aceptación ACA Áreas Afectadas – Carga contenidos nuevos Negocios

06/06 - Inicio Pruebas Training

→ **Estado de Actual Pruebas**

ESTADO DEFECTOS		
Finalizados	En desarrollo	Evolutivos
71	0	42

* Se han iniciado pruebas del producto Mascotas

linea directa

Objetivos 3Q - 2024

Proyecto LidIA

Objetivo 30/09

- Despliegue en producción de Lidia RRHH + LidIA Conocimiento (Antiokupacíón , Especialistas y Mascotas) (tras test en julio/Agosto early adopters)
- PaP Identificación Usuario
- ACA MVP Biblioteca Conocimiento. - ACA MVP Interface y UX LidIA.
- Cierre protocolo de Gobierno de Lidia.

LidIA Personas
23-339634 - 24-361937

04/07 - PaP Controlado LidIA Grupos Early Adopter RRHH

08/08 - OK ACA Fase 3 RRHH (Identificación usuario)

19/09 – PaP Fase 3 RRHH (identificación usuario)

→ **30/09** Despliegue en producción Lidia RRHH

LidIA Conocimiento
23-339604

10/07 - PaP Controlado LidIA Grupos Early Adopter Conocimiento

15/07 Entrega RUS MVP - Repositorio Información y UX interface

27/09 OK ACA MVP - Repositorio Información

30/09 OK ACA MVP – UX Interface

30/09 Cambio enrutamiento IA (CLU)

→ **30/09** Despliegue en producción Lidia Conocimiento

linea directa

Objetivos 4Q - 2024

Proyecto LidIA

Objetivo 31/12

- Subida contenidos a Conocimiento Negocio LidIA
  - Contenidos priorizados por grupo de Chat Cartera
  - Contenidos priorizados por Área Cartera
  - Contenidos priorizados por Área Comercial

LidIA Conocimiento

- ✓ **04/11 –** Subida contenidos Grupo Chat (32 Usuarios) “Conocimiento DANA”
- ✓ **11/11 –** Apertura a 2 Equipos Cartera (40 Usuarios) “Conocimiento DANA”
- ✓ **21/11 –** Apertura nuevos contenidos “Coberturas de Asistencia y Pólizas de LDA, Gestion y recuperación de Vehículos robados, Cobertura y exclusiones de Hogar, Gestion y procedimientos de siniestros, Pólizas de Seguros y Coberturas” (Chat y Cartera)
- ✓ **09/12 –** Subida y Apertura Conocimiento a nuevo grupo específico equipo de DANA (Apertura partes consorcio) y Nuevo equipo de Retención Cartera
- ✓ **18/12 –** Subida contenidos Salud Comercial “Conocimiento Manual Salud”
- ✓ **18/12 –** Subida contenidos Cartera “Conocimiento Cuaderno Cartera”
- ✓ **18/12 –** Subida contenidos Comercial “Conocimiento Manuales Comercial Intranet”
- ✓ **31/12** – Enviado comunicado de apertura y Nuvos conocimientos a Cartera y Comercial
- ✓ **31/12** – Apertura de Lidia y nuevos contenidos para todos los empelados de las Areas de Cartar y Comercial

linea directa

Objetivos 1Q - 2025

Proyecto LidIA

Objetivo 31/12

- X

LidIA Conocimiento

- ✓ **11/02 –** Inicio de de Formacion Lidia a NN Comercial
- ✓ **21/02 –** Finalización de Formacion Lidia a NN Comercial
- ✓ **29/01** – Inicio Plan de Adopción Lidia apoyo de Supervisores/Asesores/Colaboradores
- ✓ **03/03** – Inicio Nueva estructura Wiki (Procesos Perscom)
- ✓ **14/03** – Traspaso Gestion de Base de conocimiento a de LidIA a las Calidades
- ✓ **17/03** – Inicio de Formacion Lidia a Retención Comercial

linea directa

6. Roadmap Proyecto



linea directa

Tareas 1Q - 2024

Proyecto LidIA

Corto Plazo

RRHH

06/03 - RUS enviado IT - Fase 1

15/03 - RUS enviado IT - Fase 2

21/03 - ACA entregado – Fase 1

26/03 - ACA Aceptado por PersCom – Fase 1

27/03 - Inicio Desarrollo IT – Fase 1

Conocimiento

20/03 - Información, Análisis, Conclusiones y Borrador Guide Line contenido Antiokupación y Especialistas

Medio Plazo

10/04 - Plan de Comunicación - Fase 2

11/04 - Definición KPI´s – Fase 2

12/04 - Aprobación Guide Line “Antiokupacion” & “Especialistas”

09/04 - Preparación pruebas entregable 1 Info Organigrama - Fase 1

15/04 - ACA en revisión - Fase 2

Largo Plazo (2Q)

10/05 - PaT Entregable - Fase 1

20/05 – OK al PaP - Fase 1

30/05 - PaP Entregable - Fase 1

Fase 1 Contenido Intranet carga manual

Fase 2 Contenido Intranet carga automática

Fase 3 Identificación Usuario

linea directa

Tareas 2Q - 2024

Proyecto LidIA

Corto Plazo

09/04 - Preparación entregable 1- Info Organigrama – Fase 1

16/04 - Entregado ACA por IT – Fase 2

17/04 - Aceptación ACA áreas afectadas – Fase 2

19/04 - Aceptación RUS 3 áreas afectadas – Fase 3

Medio Plazo

28/06 - OK PaP - Fase 1 y 2

05/07 - PaP Lidia Generativa - Early adopter Contenido RRHH

→ **11/07 -** Entregable ACA por IT Fase 3

- Planificado 31/05/2023
- Replanificado por IT a 30/06

Largo Plazo (3Q)

30/09 – PaP Fase 3

Fase 1	Contenido Intranet carga manual
Fase 2	Contenido Intranet carga automática
Fase 3	Identificación Usuario

linea directa

Tareas 3Q - 2024

Proyecto LidIA

Corto Plazo

04/07 - PaP Controlado LidIA Grupos Early Adopter RRHH
08/07 - Nuevo Sistema Ágil actualización contenidos en la Base de conocimiento de la IA **(IT)**
10/07 - PaP Controlado LidIA Grupos Early Adopter Conocimiento
15/07 - Definición de RUS MVP - Repositorio Información y UX interface
08/08 - OK ACA Fase 3 RRHH (Identificación usuario)
30/09 – Cambio enrutador Lidia (CLU)

→ ~~**30/09** Grupos de Control de Negocio Nuevos Productos~~

Medio Plazo

- Despliegue en producción de “Lidia RRHH” + “Lidia Conocimiento ”: documentos de Antiokupación , Especialistas y Mascotas tras test en julio/Agosto early adopters).
- PaP Identificación Usuario ~~& Información BI~~
- ACA MVP Biblioteca Conocimiento
- ACA MVP Interface y UX LidIA
- Cierre protocolo de Gobierno de Lidia

Largo Plazo (4Q)

- Despliegue en producción MVP de “LiDiA” conocimiento. (Biblioteca e Interface UX)
- Subida de contenidos críticos del catálogo de las áreas front. (Comercial, Cartera, SyP)
- Cierre y subida contenido del nuevo producto “Multirriesgo” (en función del PaP de este proyecto)
- Inicio análisis para cerrar roadmap de “LiDiA” Conocimiento y back office (proyecto plan 2025)

Bloqueado - CRITICO

- 08/07 - Entrenamiento IA Contenido CAU

linea directa

Tareas 4Q - 2024

Proyecto LidIA

Corto Plazo

31/10 - PaP Controlado LidIA Grupo Supervisores y Colaboradores Formacion Cartera y Comercial y a todos los usuarios del Back.

04/11 - PaP Controlado LidIA Grupo Chat Cartera

06/11 - PaP Controlado LidIA 2 Grupos Retención Cartera

~~Definir siguientes grupos con acceso controlado a LidIA~~

Medio Plazo

23/12 - OK PaP MVP Biblioteca Conocimiento

18/12 - Subida contenidos a Conocimiento Negocio alto uso

- Contenidos priorizados por grupo de Chat Cartera
- Contenidos priorizados por Área Cartera
- Contenidos priorizados por Área Comercial

23/12 - Inicio análisis para cerrar roadmap de "LiDiA" Conocimiento y back office (proyecto plan 2025)

31/12 - Acceso a Lidia IA a toda Cartera y Comercial (contenidos priorizados indicados)

Largo Plazo (2025)

- OK PaP MVP Interface y UX LidIA
- Subida de contenidos uso medio catálogo de las áreas front. (Comercial, Cartera, SyP)
- Cierre y subida contenido del nuevo producto "Multirriesgo" (en función del PaP de este proyecto)

linea directa

Tareas 1Q - 2025

Proyecto LidIA

Corto Plazo

14/01 – Presentado y Aprobado Plan de Adopción (Amelia)

20/03 – PaP CM Lidia (Power BI)
21/03 – Inicio Creación de CM Perscom LidIA en Power BI

Lorem Impum

Medio Plazo


Largo Plazo (2026)

linea directa

Roadmap 2025

Proyecto LidIA

- Gobierno de Información
  - Montar un grupo de trabajo para organizar y estructurar la información y documentación de la compañía. Cerrar los responsables del conocimiento.
  - Identificar Conocimiento por bloques completos, uniformes y sin incongruencias.
- Consolidar el Conocimiento Corporativo
  - Crear un entorno del conocimiento Único, centralizado y organizado.
  - Actualizar la base de conocimiento para la IA de manera constante
  - Estructura de información enfocada en producto..
- Enfocar en la Experiencia del Usuario
  - Mejorar la interfaz y las interacciones.
  - Simplificar y acelerar el trabajo del operador.
- Evolucionar Tecnológicamente
  - Implementar una arquitectura modular y escalable para estabilizar la arquitectura
  - Soportar el crecimiento futuro.
- Plan de Adopción y Comunicación

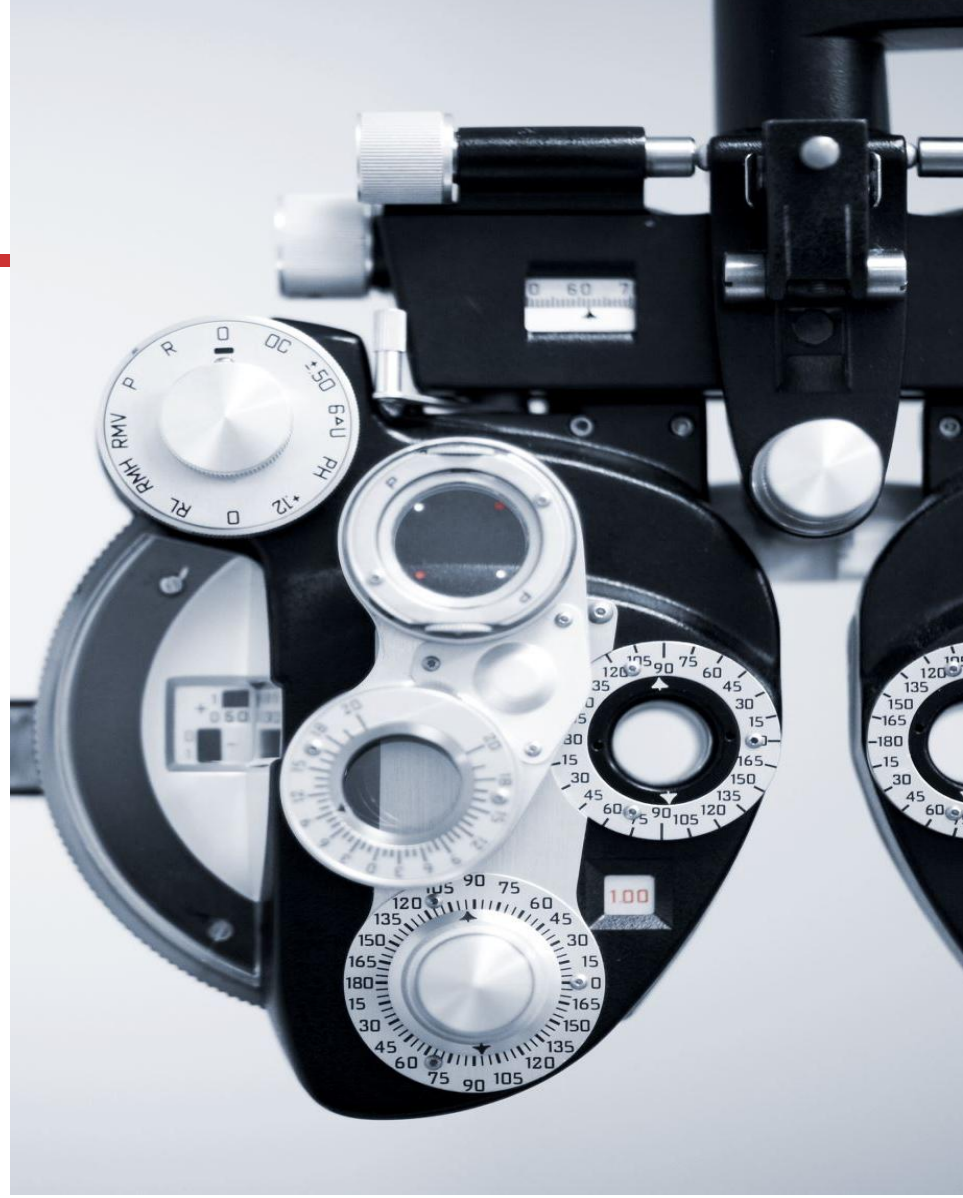

linea directa

Seguimiento proyecto “Posibles Riesgos detectados”

15.09.2024

linea directa

Posibles Riesgos

Proyecto LidIA

Sistema no centrado en el usuario Repositorio	**Baja usabilidad y experiencia de usuario.** Decisión Tecnológica por su integración con Sistema de IA.	Proponer una revisión de UX/UI junto a todos los equipos afectados. Hacer piloto con usuario finales para validar la usabilidad
Sistema de aprobación info muy complejo ✓ Repositorio	**Sistema propuesto en Kanban,** el sistema es demasiado complejo y podría causar retrasos en la disponibilidad de la información del negocio en LidIA.	RIESGO MINIMIZADO: Simplificando el sistema de aprobación en Wiki, eliminado el flujo de aprobación en kanbanize.
Costes elevados de licencias ✓ Repositorio	**Costes elevados de licencias de usuario de plataforma Wiki y Kanbanize**	RIESGO MINIMIZADO: Cambio alcance de ACA eliminando del flujo kanbanize
Migración de información Actual Información IA	**Migración de información actual (Mascotas, Antiokupación y Especialistas)de BBCC de la IA al nuevo repositorio.** No es posible coexistir con ambos sistemas	….

Riesgo con impacto directo en la adopción y eficiencia del sistema por parte de los usuarios finales

Posibles Riesgos

Proyecto LidIA

Complejidad en el flujo de pruebas de información Información IA	**Validación de contenidos en entorno de training para tener fiabilidad de las respuestas de la IA** Este sistema puede ralentizar los ciclos de actualización en producción y aumentar la carga de trabajo de los equipos gestores.	Proponer automatización de las pruebas en entornos de training mediante scripts de validación que verifiquen la integridad del contenido sin necesidad de intervención manual constante. Adicionalmente, se podría reducir el ciclo de testing al priorizar pruebas en los cambios críticos y permitir que ciertos contenidos de bajo riesgo pasen directamente a producción con revisiones posteriores.
Cambio de Mindset de usuario Adopción IA Generativa	**Validación de contenidos en entorno de training para tener fiabilidad de las respuestas de la IA** Este sistema puede ralentizar los ciclos de actualización en producción y aumentar la carga de trabajo de los equipos gestores.	Proponer automatización de las pruebas en entornos de training mediante scripts de validación que verifiquen la integridad del contenido sin necesidad de intervención manual constante. Adicionalmente, se podría reducir el ciclo de testing al priorizar pruebas en los cambios críticos y permitir que ciertos contenidos de bajo riesgo pasen directamente a producción con revisiones posteriores.
Resistencia a utilizar el repositorio único Adopción IA Generativa	Al imponer el uso exclusivo del repositorio Wiki para la información de la IA, existe el riesgo que las areas de negocio, acostumbradas a otros repositorios (Notes…) **muestren resistencia a la migración y adopción de este nuevo sistema**	Proponer automatización de las pruebas en entornos de training mediante scripts de validación que verifiquen la integridad del contenido sin necesidad de intervención manual constante. Adicionalmente, se podría reducir el ciclo de testing al priorizar pruebas en los cambios críticos y permitir que ciertos contenidos de bajo riesgo pasen directamente a producción con revisiones posteriores.

Riesgo con impacto directo en la adopción y eficiencia del sistema por parte de los usuarios finales

Posibles Riesgos

Proyecto LidIA

Cambio de mindset en los usuarios al interactuar con la IA Generativa

Información IA

El uso del chat de la IA Generativa implica un cambio significativo en

Proponer automatización de las pruebas en entornos de training mediante scripts de validación que verifiquen la integridad del contenido sin necesidad de intervención manual constante. Adicionalmente, se podría reducir el ciclo de testing al priorizar pruebas en los cambios críticos y permitir que ciertos contenidos de bajo riesgo pasen directamente a producción con revisiones posteriores.

Riesgo con impacto directo en la adopción y eficiencia del sistema por parte de los usuarios finales

Históricos



linea directa

Posibles Riesgos

Proyecto LidIA

Tareas en proceso para terminar antes del 30/06 y 31/08

Antes de finales de Agosto

1. OK ACA– Fase 3 RRHH Julio
2. PaP Controlado LidIA
   - Grupos Early Adopter
     - RRHH
     - Conocimiento Nuevos Productos
3. Grupos de Control de Negocio Nuevos Productos
4. Entrenamiento IA Contenido CAU

Tareas Q3

Antes de finales de septiembre

1. Despliegue en producción de “Lidia RRHH” + “Lidia Conocimiento ” : documentos de Antiokupacíón , Especialistas y Mascotas tras test en julio/Agosto early adopters).
2. PaP Identificación Usuario ~~& Información BI~~
3. ACA MVP Biblioteca Conocimiento
4. ACA MVP Interface y UX LidIA
5. Cierre protocolo de Gobierno de Lidia

Tareas Q4

Antes de finales de diciembre

1. Despliegue en producción MVP de “LiDiA” conocimiento. (Biblioteca e Interface UX)
2. Subida de contenidos críticos del catálogo de las áreas front. (Comercial, Cartera, SyP)
3. Cierre y subida contenido del nuevo producto “Multirriesgo” (en función del PaP de este proyecto).
4. Inicio análisis para cerrar roadmap de “LiDiA” Conocimiento y back office (proyecto plan 2025)
